

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



## COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

# Relazione Semestrale al 31 dicembre 2019

**Il Soggetto Attuatore**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

*ex legibus n° 116/2014 e n°164/2014*

**Maurizio Croce**



---

## 1. ISTITUZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO

### 1.1 – Il Commissario Straordinario Delegato

Le attività dei Commissari regionali straordinari delegati hanno avuto inizio con l'articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale possano essere utilizzate anche tramite accordi di programma sottoscritti dalle Regioni interessate e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, consentendo alle Regioni di operare con la massima flessibilità operativa e di far confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad una programmazione organica ed unitaria rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico.

Alla luce della disposizione di legge sopra richiamata, in data 30/03/2010 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programma finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, elencati nell'Allegato 1 allo stesso Accordo di Programma e volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori sono stati autorizzati ad avvalersi di uno o più Commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, da nominarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### 1.2 - Il Presidente della Regione nelle funzioni di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24/06/2014 n° 91, pubblicato in pari data sulla GURI, sono subentrati nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati, relativamente ai territori di competenza, i Presidenti delle Regioni i quali, ai sensi dei commi 2ter e 4 dell'art. 10 del DL 91/2014 convertito con legge 11/08/2014 n. 116, sono individuati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

### 1.3 - Il soggetto Attuatore ex art. 10 L. 116/2014

i Presidenti delle Regioni i quali, ai sensi dei commi 2 ter e 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 91/2014 convertito con legge 11/08//2014 n. 116, possono "*delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*" e "*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le*

---

*attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116 - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana il dott. Maurizio Croce, già Commissario Straordinario Delegato, al quale sono stati altresì delegati i poteri di firma del Commissario di Governo.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 518 del 18/03/2015 è stato successivamente nominato Soggetto Attuatore il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ing. Calogero Foti, riconfermato nell'incarico con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 529 del 03/07/2015.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 570 del 15/09/2017 è stato nominato Soggetto Attuatore il Dott. Maurizio Croce che riveste tale incarico anche alla data odierna.

#### **1.4 - La Normativa vigente**

Le attività del Commissario Delegato sono comprese in diverse normative che conferiscono allo stesso competenze e poteri di deroga utili all'attuazione degli interventi, e più precisamente:

- IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO: decreto-legge 24/06/2014 n° 91, pubblicato in pari data sulla GURI, sono subentrati nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati, relativamente ai territori di competenza, i Presidenti delle Regioni i quali, ai sensi dei commi 2ter e 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 91/2014 convertito con legge 11/08/2014 n. 116 al fine di completare le attività di cui agli Accordi di Programma;
- PROGRAMMAZIONI DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO: LEGGE 11 novembre 2014, n. 164 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (G.U. n. 262 dell'11 novembre 2014), che prevede, all'art. 7, comma 2 come a partire dalle programmazioni 2015 in materia di contrasto al dissesto idrogeologico siano assicurate dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

---

## **1.5 - La Struttura Commissariale**

Secondo quanto disposto dall'art. 1 dell'OPCM 3886 del 09 luglio 2010, come modificato ed integrato dall'art. 21 dell'OPCM 3916 del 30 dicembre del 2012 che ha ulteriormente dettagliato i compiti e i poteri del Commissario Straordinario Delegato-Soggetto Attuatore, ai fini del sollecito espletamento delle attività tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario Straordinario Delegato può avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Il Commissario pro-tempore ne ha pertanto istituito con Disposizioni Commissariali nn. 3, 5 e 6 del 2010 un gruppo di lavoro.

Con DPCM del 20/07/2011 sono state impartite ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati di dare attuazione agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, prevedendo tra l'altro la possibilità di dotarsi di una struttura di supporto per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi.

A tal fine il gruppo di lavoro è stato incrementato avvalendosi di altro personale proveniente da Dipartimenti Regionali, dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, dal Ministero Pubblica Istruzione, dalla Regione che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 21 della OPCM 3916/10, è stato posto in posizione di comando sia a tempo pieno che parziale, nel numero massimo di 10 unità, oltre che il personale utilizzato ai sensi del C. 4 dell'Art. 1 della OPCM 3886/10.

Con l'art.7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 2011, il numero dei componenti è stato elevato a 20 unità.

Con provvedimento prot. 3845 del 07/08/2015 è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 529 del 03/07/2015.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13/12/2016 sono state assegnate all'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo dei fondi previsti per la realizzazione degli interventi prioritari e strategici per il territorio come individuati – per aree di intervento- nel Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana ex D. CIPE n. 26/2016.

In considerazione delle risorse assegnate e delle specifiche competenze attribuite all'ufficio del Commissario di Governo, con relazione prot. 5465 del 21/12/2016 il Soggetto attuatore pro tempore, ing. Calogero Foti, ha sottoposto all'attenzione del Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo la necessità di incrementare il gruppo di lavoro dell'ufficio, risultante ormai sottodimensionato, sia in termini numerici che in termini di professionalità, proponendo uno schema di dotazione organica costituita da non oltre 50 unità di personale al fine di completare tutte le attività previste nell'Accordo di programma siglato il 30 marzo 2010 e nei successivi atti integrativi e al fine di avviare ogni utile iniziativa per la completa attuazione degli interventi a valere della delibera CIPE 26/2016.

Con decreto commissariale n. 573 del 22 dicembre 2016 – in attuazione della citata delibera di giunta regionale n.411/2016 – è stata approvata una nuova dotazione organica, funzionale alle nuove competenze attribuite all'ufficio, costituita da non oltre 50 unità di personale, tra funzionari direttivi, istruttori ed eventuali collaboratori esterni, da selezionare mediante atto di interpello per il personale organico della pubblica amministrazione e tramite avviso

---

pubblico di manifestazione di interesse per i collaboratori esterni.

Con deliberazione n.169 del 21 aprile 2017 la Giunta regionale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, ha modificato la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SIGECO, in luogo Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, e individuando quest'ultimo quale organismo intermedio nell'ambito Patto per il Sud , area tematica "Ambiente", obiettivo strategico " Dissesto idrogeologico".

Con decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi così come implementati dalle ulteriori competenze affidate al Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, nonché per ridurre i tempi per il raggiungimento degli obiettivi, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016 prevedendo una struttura commissariale costituita da non oltre 51 unità di personale.

Con Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12/09/2017 è stato approvato il primo piano di rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 298/2018 è stato approvato il Secondo Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana implementando di l'ufficio del commissario con le figure necessario all'espletamento delle attività di relativa competenza;

Con Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019 "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.", si è individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico.

---

## 2. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

### 2.1 - Premessa – Piani e programmi affidati alla struttura commissariale

Con l'entrata in vigore del decreto legge 12/09/2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014 n. 164, così detto "Sblocca Italia", all'art. 7 comma 2, al Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo è stata affidata l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge 20/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116.


Al 15/12/2019 risulta affidata al Commissario di Governo l'attuazione degli interventi previsti dai provvedimenti o programmi di seguito specificati:

- A. Accordo di Programma del 30/03/2010 e successivi Atti Integrativi (I, II, III);
- B. Accordo di Programma del 30/03/2010 – IV atto Integrativo 2019;
- C. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Direzione Generale per il clima e l'energia n° 349/CLE del 14/12/2015“.
- D. Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- E. Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud Regione Siciliana);
- F. Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Palermo;
- G. Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina;
- H. Piano Operativo Ambiente – I stralcio 2019 (POA);
- I. PAC Nuove Azioni - Interventi di mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorgono il Duomo, l'intera area diocesana ed il centro storico di Agrigento in adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.150 del 20/05/2011, n. 151 del 20/06/2014, n. 203 del 10/08/2015 e n. 490 del 30/10/2017;
- J. PAC Nuove Azioni - Interventi di manutenzione delle opere di difesa degli alvei fluviali di cui al D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 1026 del 23 novembre 2015, in adempimento di quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta n. 151 del 20 giugno 2014, n. 203 del 10 agosto 2015 e n. 490 del 30 ottobre 2017 previo eventuale aggiornamento delle priorità;

In sintesi:

%	FONDO	IMPORTO
16,01%	A.P.Q.	€ 138.804.893,02
66,49%	Patto per il Sud	€ 576.375.012,00
5,64%	Patto Città Metropolitane	€ 48.864.545,48
1,84%	Fondo Progettazione	€ 15.925.200,00
0,69%	PAC	€ 6.000.000,00
5,12%	IV ATTO_AdP	€ 44.378.782,82
2,40%	POA	€ 20.771.962,98
0,35%	INTERVENTI D.D. 349/2015	€ 3.008.336,28
1,47%	DELIBERA CIPE N. 8	€ 12.756.002,61


**866.884.735,19 €**

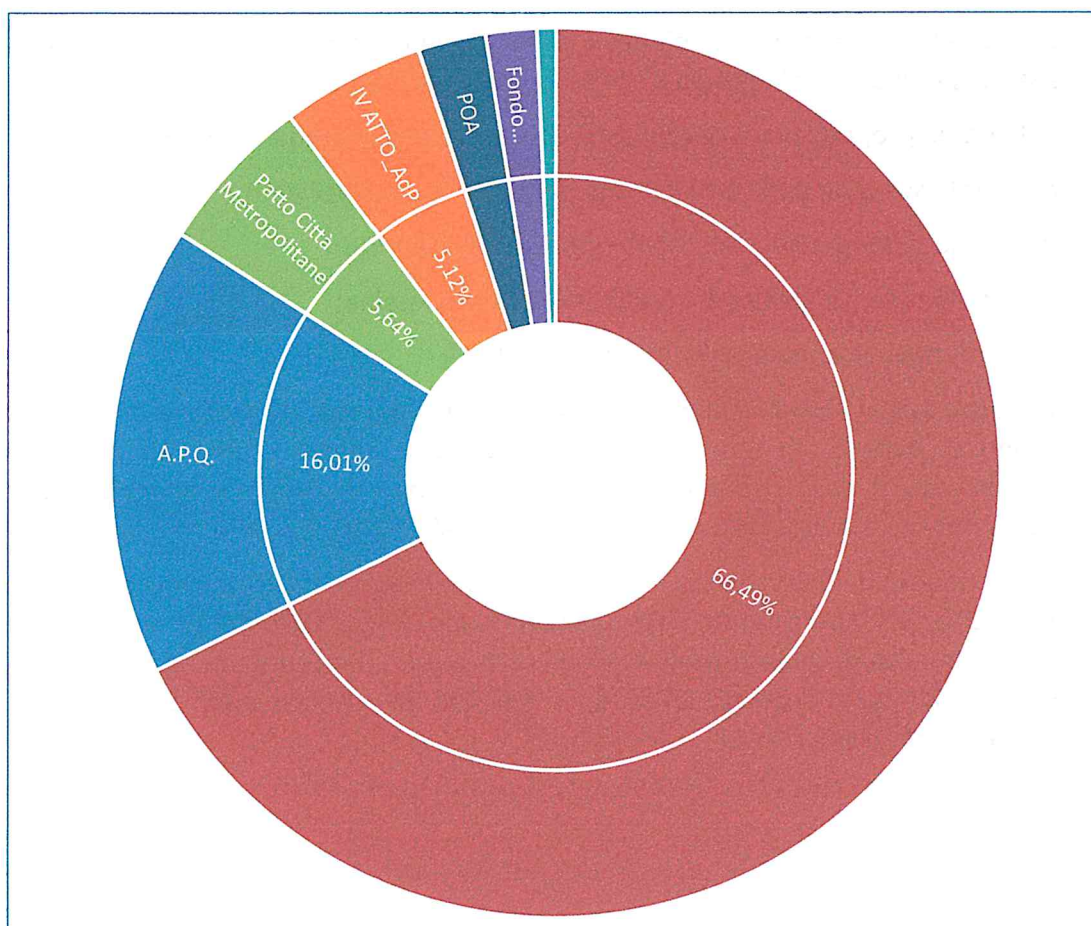

Viene qui di seguito riportata una tabella riassuntiva relativa alle risorse finanziate, impegnate ed erogate, distinte per tipologia di fondi:

Fonte di Finanziamento	Risorse Programmate	Risorse Finanziate	Risorse Impegnate	Risorse erogate
A.P.Q.	138.804.893,02 €	134.289.130,26 €	119.303.111,65 €	104.257.759,70 €
DELIBERA CIPE N. 8 (Il atto integrativo APQ)	12.756.002,61 €	12.734.713,60 €	10.657.313,52 €	10.552.818,53 €
IV ATTO Integrativo APQ	44.378.782,82 €	19.791.063,65 €	2.600,00 €	2.600,00 €
INTERVENTI D.D. 349/2015	3.008.336,28 €	3.008.336,28 €	2.360.848,96 €	1.974.216,93 €
Patto per il Sud	576.375.012,00 €	256.730.240,51 €	95.297.512,61 €	20.183.141,16 €
Patto Città Metropolitane	48.864.545,48 €	5.284.745,74 €	253.409,85 €	113.532,24 €
Fondo Progettazione	15.925.200,00 €	9.353.514,62 €	2.220,00 €	2.220,00 €
PAC	6.000.000,00 €	1.513.979,43 €	662.081,40 €	89.113,46 €
POA	20.771.962,98 €	18.317.807,62 €	-	-

**866.884.735,19 €   461.023.531,71 €   228.539.097,99 €   137.175.402,02 €**

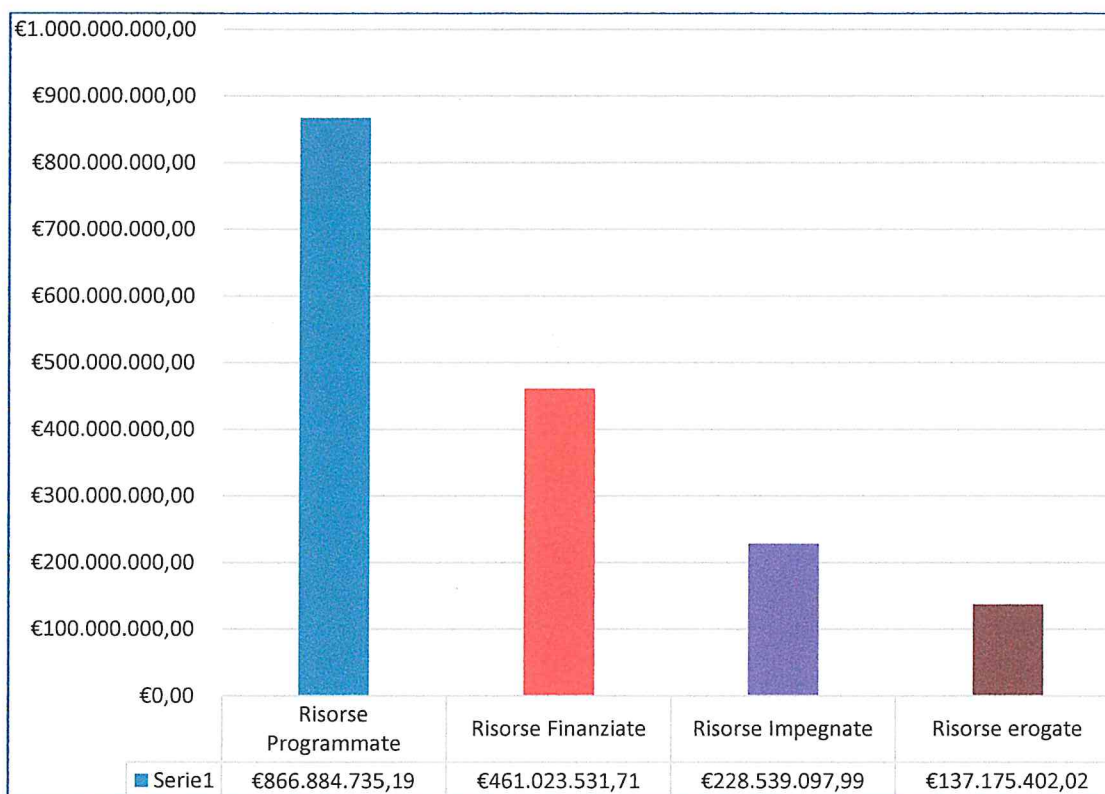




## 2.2 – Accordo di Programma 2010 ed atti integrativi

In definitiva al Commissario è attribuita la competenza dell'attuazione di n. 136 interventi così ripartiti:

- N. 113 interventi lettera "A" la cui competenza finanziaria è in capo al Commissario secondo le "risorse programmate" riportate nella precedente tabella;
- N. 23 interventi lettera "B" la cui competenza finanziaria è posta in capo al Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana e per i quali il Soggetto Attuatore è stato individuato come beneficiario del finanziamento.


L'importo complessivo è pari ad **€ 200.075.764,12** ripartiti per le singole province secondo il grafico qui di seguito riportato:

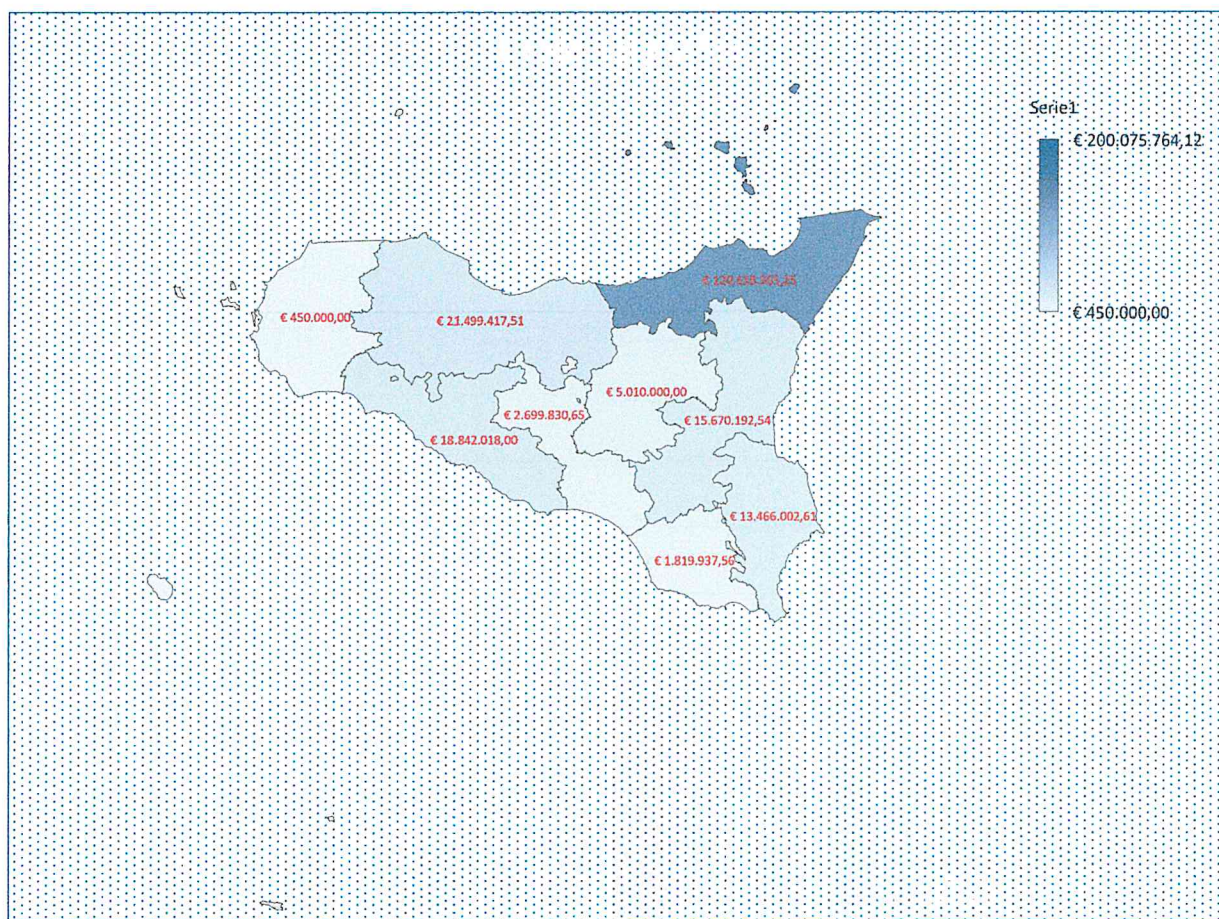

## 2.2.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 15/01/2020


Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli interventi previsti, suddivisi in relazione allo stato di attuazione:

	n. interventi	IMPORTO	
INTERVENTO REVOCATO	1	€	-
INTERVENTO COMPLETATO	110	€	163.619.179,62
LAVORI IN CORSO	9	€	8.711.467,21
INTERVENTO IN GARA	11	€	22.142.075,43
INTERVENTO PRONTO PER GARA	2	€	2.819.937,56
INTERVENTO IN ISTRUTTORIA	3	€	2.783.104,30
<b>Totale</b>	<b>136</b>	<b>€</b>	<b>200.075.764,12</b>

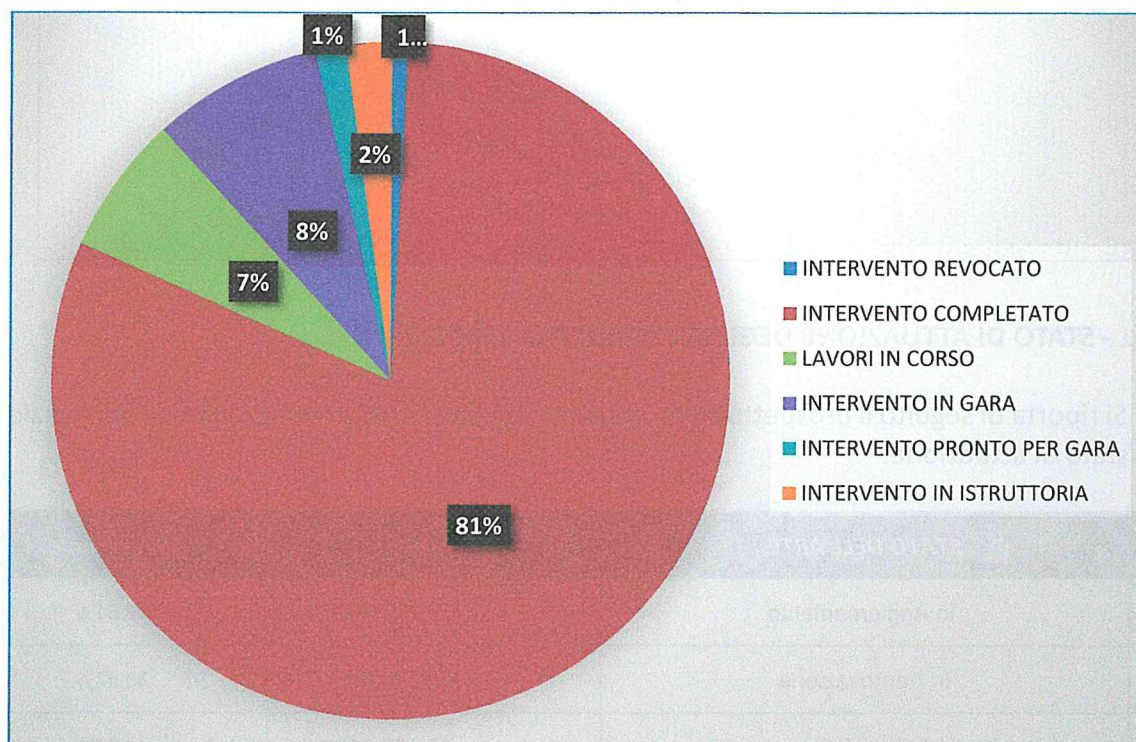

## 2.3 – Accordo di Programma 2010 - IV atto integrativo


Nel gennaio 2019 è stato sottoscritto il IV atto integrativo dell'Accordo in parola per un totale di circa 44 milioni di euro. Lo stesso è stato registrato alla Corte dei Conti nel mese di giugno 2019 e si sono già attivate le interlocuzioni con le Amministrazioni al fine di acquisire le progettualità esistenti. Gli interventi previsti hanno un importo complessivo pari ad € **44.378.782,82** ripartiti per le singole province secondo il grafico qui di seguito riportato:

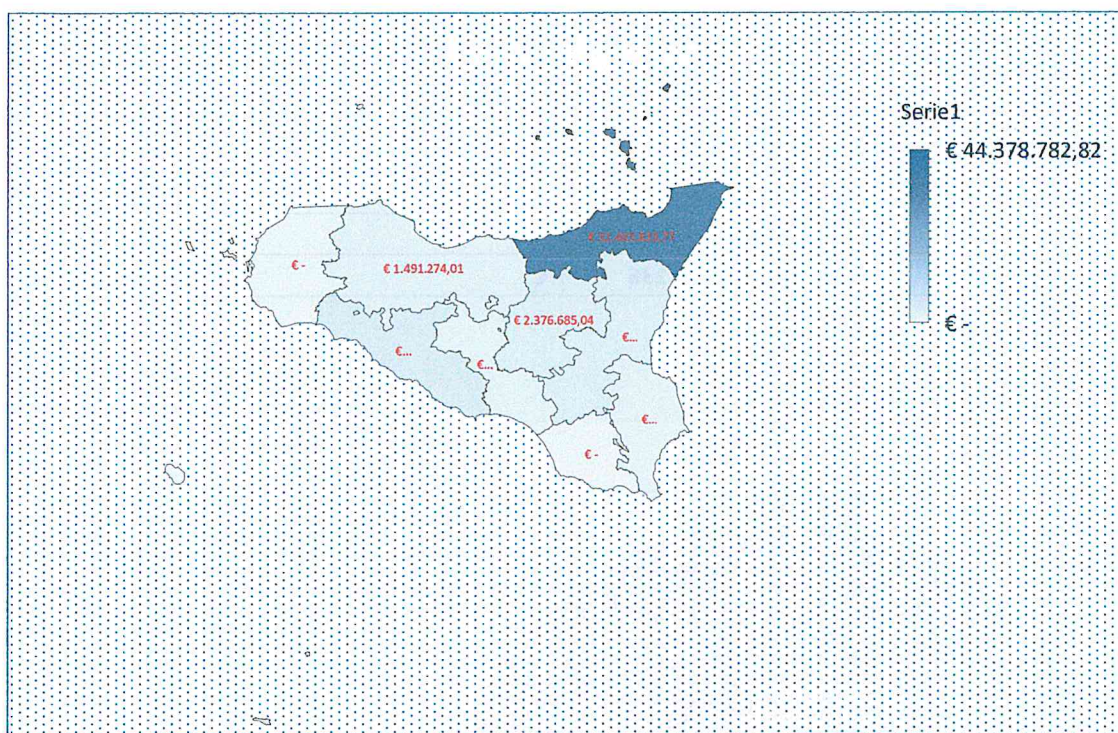

### 2.3.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 15/01/2020

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli interventi previsti, suddivisi in relazione allo stato di attuazione:

	STATO DELL'ARTE	N. Interventi	Percentuale
4	In Aggiornamento	8.713.999,92 €	19,64%
4	In Approvazione	15.897.686,30 €	35,82%
12	Gara in Corso	19.767.096,60 €	44,54%
Totale Interventi		44.378.782,82 €	

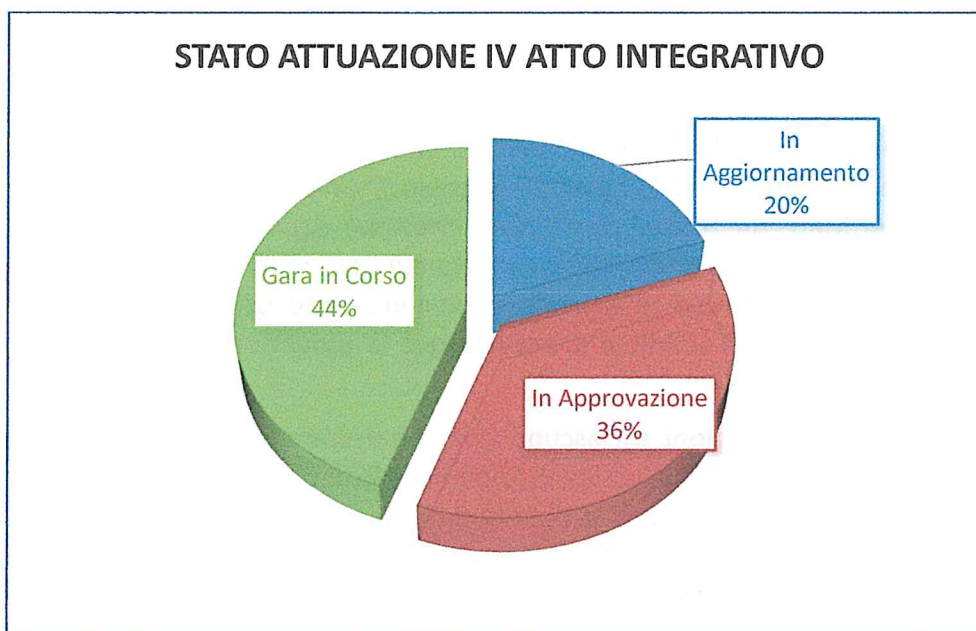

#### **2.4 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Direzione Generale per il clima e l’energia n° 349/CLE del 14/12/2015 “**

Con Decreto della Direzione Generale per il clima e l’energia D.D. n° 349/CLE del 14/12/2015 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha disposto il finanziamento di nr. 3 interventi per l’importo complessivo di **€ 3.008.336,28** da trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo ai sensi dell’art. 7, comma 2 del decreto-legge 12/09/2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014 n. 164. Di seguito viene riportata la suddivisione per provincia:




Tutti gli interventi programmati risultano **CONCLUSI**.

## 2.5 - Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

Per promuovere ed agevolare la realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, l'art. 55 della legge 28/12/2015 n. 221 ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" nel quale affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con Delibera CIPE n° 32 del 20/02/2015 nonché le risorse le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo.

Il Fondo è ripartito tra le Regioni e ciascuna quota è versata nella contabilità speciale del Presidente di ciascuna regione nella qualità di Commissario di Governo, al quale, fermi restando i poteri speciali e di deroga attribuiti dalla vigente normativa, è affidata la responsabilità diretta della creazione di un parco progetti sui quali far convergere le risorse di volta in volta disponibili per la realizzazione degli interventi.

Con Decreti MATTM STA.DEC.STA. n° 571 del **21/12/2017**, Decreto MATTM STA.DEC.STA. n° 419 del **09/08/2018** ed infine con decreto MATTM STA.DEC.STA. n° 487 del **13/12/2019** sono stati individuati **n. 66** interventi contro il dissesto idrogeologico per un importo di euro **15.925.200,00** a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione ripartiti per le singole province secondo il grafico qui di seguito riportato:

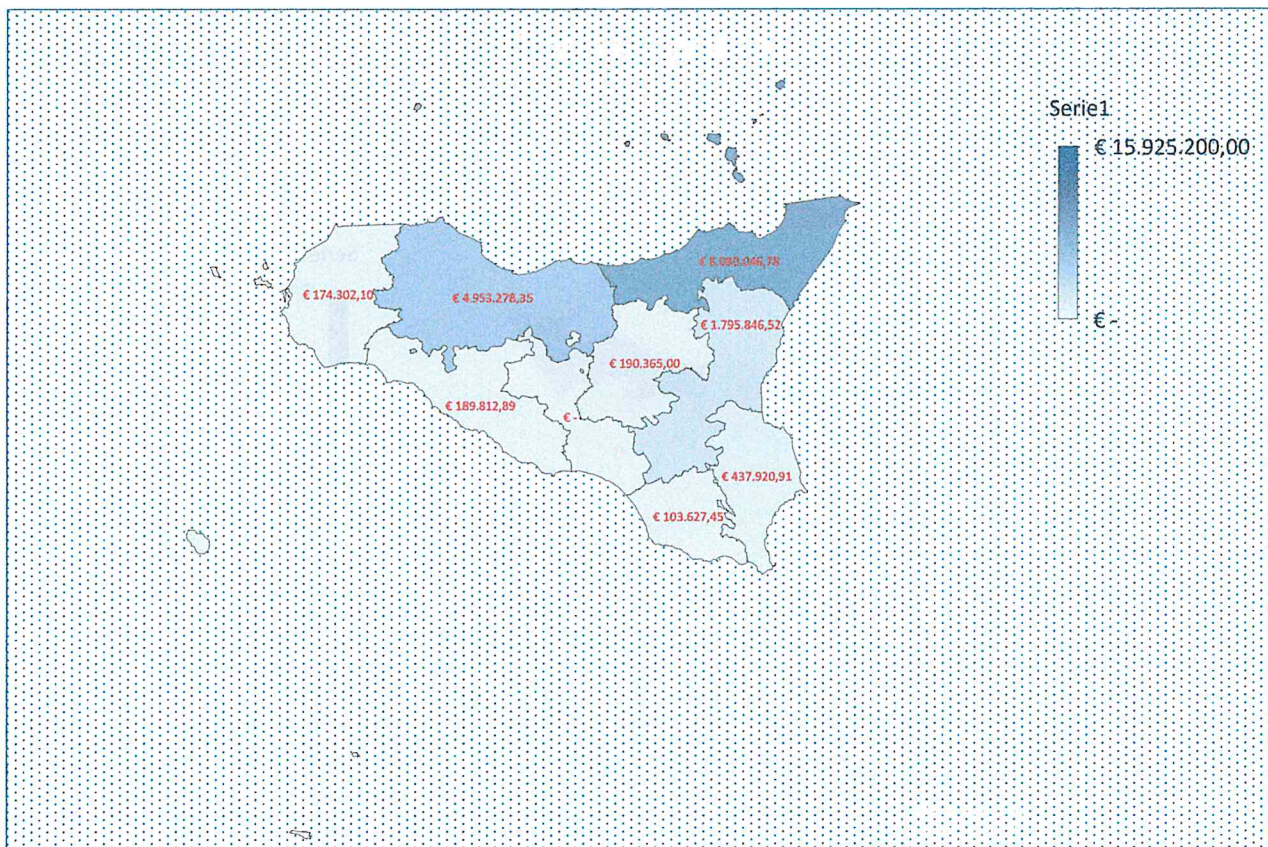

## 2.5.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 15/01/2020

La rappresentazione dell'avanzamento delle attività, nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti nel fondo progettazione deve necessariamente tenere conto del fatto che la riprogrammazione dei fondi è avvenuta alla fine del 2019 a due anni di distanza dall'emissione del primo decreto di finanziamento del fondo e ad un anno di distanza dal secondo.

La riprogrammazione si è resa necessaria in virtù del fatto che **n. 13** interventi previsti nei suddetti decreti per un importo pari ad **€ 3.340.937,07** sono stati interamente finanziati nell'ambito di altre programmazioni e sono stati sostituiti da **n. 8** interventi nuovi per un importo complessivo pari ad **€ 3.297.838,55**.


L'avvio di n. 4 procedure di gara relative ai 13 interventi revocati, la variazione complessiva del numero degli interventi nonché la variazione delle risorse programmate va necessariamente tenuta in considerazione nella lettura delle tabelle e dei grafici successivi.

In definitiva, nonostante il decreto MATTM STA.DEC.STA n° 487 del **13/12/2019** finanzia complessivamente n. **66** interventi, le tabelle ed i grafici successivi saranno a riferiti anche ai **n. 13** interventi recentemente riprogrammati per un complessivo di **n. 79** interventi, il cui stato dell'arte complessivo è il seguente:

	<i>STATO DELL'ARTE</i>	<i>N. Interventi</i>	<i>%</i>
14	Acquisizione Progettazione	4.020.869,50 €	17,72%
11	In Aggiornamento	1.566.230,91 €	13,92%
2	In Approvazione	695.174,40 €	2,53%
13	In Istruttoria	2.024.208,12 €	16,46%
25	Gara in Corso	7.456.982,09 €	31,65%
4	Gara in Corso_Revocato	1.058.559,64 €	5,06%
10	Revocato	0,00 €	12,66%
79		<b>16.822.024,66 €</b>	

## Stato Attuazione Fondo Progettazione

- Acquisizione Progettazione
- In Aggiornamento
- In Approvazione
- In Istruttoria
- Gara in Corso
- Gara in Corso\_Revocato
- Revocato

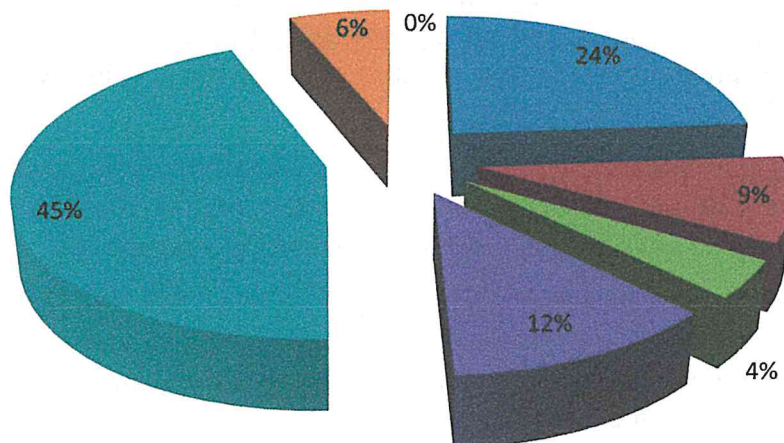

## 2.6 - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana

In data 10/09/2016 è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” con il quale le Parti si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione Siciliana, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio.

A tale fine, le Parti, tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Regione Siciliana ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell’Allegato A al Patto (Masterplan), per la cui attuazione è stata ritenuta necessaria un’azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nonché la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, e ricorrendo altresì ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc.;

L’importo complessivo degli interventi, e le risorse finanziarie previste per la loro attuazione sono indicati in dettaglio negli Allegati A (Masterplan) e B (Elenco degli interventi) al Patto e sono sinteticamente descritte, per macro-categorie, nella seguente tabella, suddivise in 5 aree di intervento:

Area di intervento	Costo totale interventi	Risorse già assegnate	Risorse FSC 2014-2020	Altre risorse disponibili
Infrastrutture	1.873.194.701,18	1.188.000.552,63	607.900.000,00	77.000.000,00
Ambiente	2.521.303.916,36	972.332.984,03	1.174.000.000,00	375.149.000,00
Sviluppo economico ed attività produttive	965.495.822,37	265.000.000,00	208.500.000,00	492.258.077,37
Turismo e cultura	267.275.503,60	0,00	216.500.000,00	50.489.821,66
Sicurezza, legalità e vivibilità del territorio	118.654.548,16	5.694.055,98	113.100.000,00	0,00
<b>Totale costi e risorse</b>	<b>5.745.924.491,67</b>	<b>2.431.027.592,64</b>	<b>2.320.000.000,00</b>	<b>994.896.899,03</b>

In particolare, l’Area d’intervento “Ambiente” risulta suddivisa in 3 Ambiti d’Intervento denominati: “Acque e Rifiuti”, “Dissesto Idrogeologico” e “Territorio”.

Con Deliberazione n° 411 del 13 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha attribuito al Presidente della Regione Siciliana in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 7, comma 2, ultima parte, del decreto legge 12/09/2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 la competenza alla gestione, al monitoraggio ed al controllo degli interventi strategici da realizzare per un fabbisogno finanziario complessivo di euro 596.599.400,00, corrispondenti agli interventi di cui al Settore Prioritario “4.Ambiente”, Ambito di intervento “Dissesto idrogeologico”, finalizzati alla mitigazione dell’erosione costiera, la messa in sicurezza di infrastrutture, la mitigazione del rischio alluvioni e del rischio frane, finanziati a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.



---

In particolare, per quanto concerne il dissesto idrogeologico, il Patto prescrive che:


- gli interventi contro il rischio di dissesto idrogeologico da finanziare con risorse pubbliche devono essere coerenti con le mappe della pericolosità e rischio e con gli obiettivi e le priorità correlate individuati nei Piani di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi della direttiva 2007/60/CE, approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei Comitati Istituzionali Integrati delle Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs. N. 219/2010 e per quanto riguarda la pericolosità da alluvione fluviale e costiera e nelle pianificazioni di assetto idrogeologico (PAI) per quanto attiene alla pericolosità geomorfologica, in applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione individuati nel DPCM 28 maggio 2015;
- i progetti per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, come risultanti dal sistema telematico Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo-ReNDIS e validati dalla Regione, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, siano ammessi a finanziamento utilizzando i criteri di scelta e di attribuzione delle risorse che, ai sensi dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono stati approvati con DPCM 28 maggio 2015 recante "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

### **Elenco degli interventi**

L'elenco degli interventi previsti nel Patto per il Sud approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 301 del 10/09/2016 e contenuto nell'Allegato B al Patto sottoscritto in pari data, ha subito diverse rimodulazioni dovute ad una verifica continua e costante degli effettivi livelli di cantierabilità degli interventi.


Le ultime due rimodulazioni approvate risalenti all'8 agosto 2019 ed al 25/10/2019 (D.D.G. nn. 283 e 384) hanno ridistribuito in modo significativo l'Allegato B degli interventi contro il dissesto idrogeologico che ad oggi risultano complessivamente essere **265** per un importo complessivo di **€ 472.467.700,36** ivi compreso il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) dell'ufficio del Commissario che ammonta ad **€ 11.286.621,00**. L'importo complessivo della dotazione finanziaria di cui al Settore Prioritario "**4. Ambiente**", Ambito di intervento "**Dissesto idrogeologico**" è stata rideterminata in **€ 576.375.012,00**. I restanti **€ 103.907.311,64** non sono stati ridistribuiti in attesa di successive verifiche sugli effettivi livelli di cantierabilità degli interventi.

La distribuzione territoriale dell'intera programmazione, al netto del PRA, è riportata nel grafico successivo:

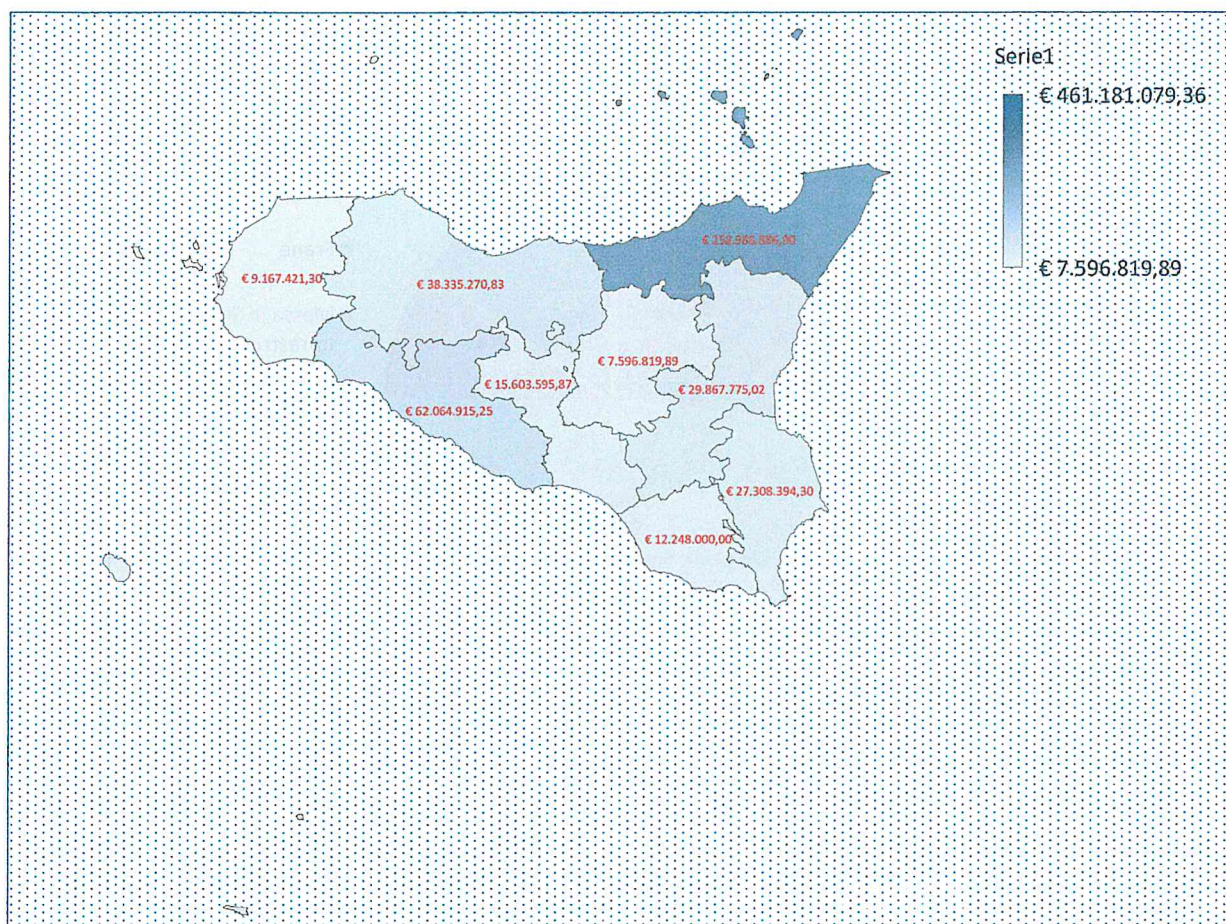

Gli interventi sono stati ripartiti in cinque sottoambiti distinti sia in termini di numero di interventi che in termini di dotazione finanziaria secondo le tabelle ed i grafici seguenti:

<i>Tipo Dissesto</i>	<i>N. Interventi</i>	<i>%</i>
Alluvioni	40	15,15%
Costiero	25	9,47%
Frane	129	48,86%
Messa in Sicurezza Infrastrutture	70	26,52%
	264	

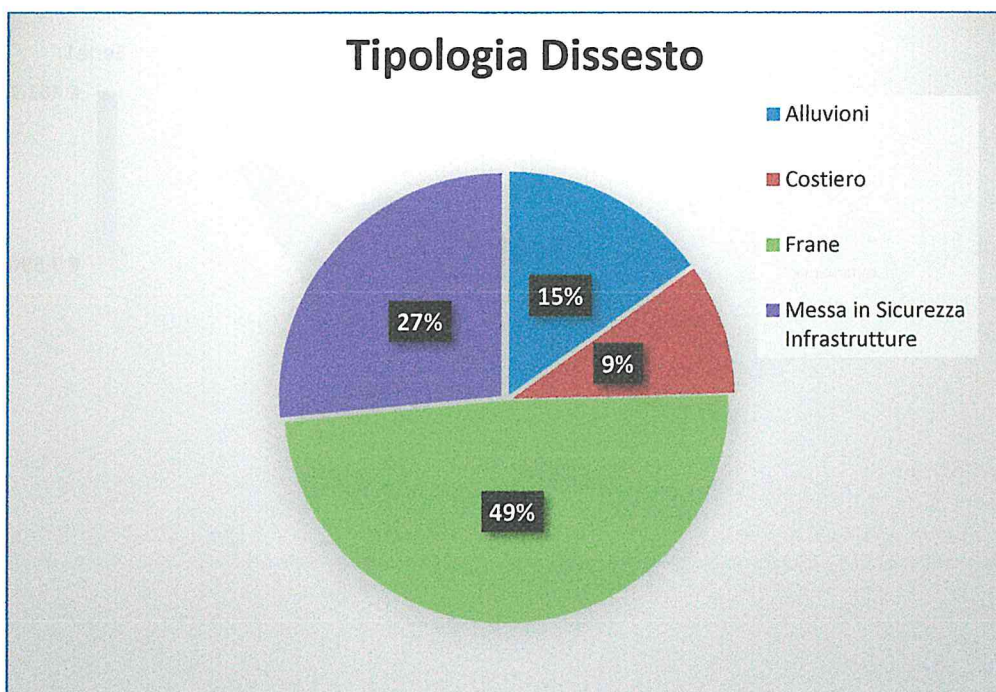


In particolare la suddivisione finanziaria tra i vari ambiti di intervento viene riportata nelle tabelle successive, anche alla luce dell'inserimento della voce Piano di rafforzamento pubblica amministrazione le cui risorse economiche sono state stanziare attraverso la rimodulazione degli interventi.

<i>N. Interventi</i>	<i>Tipo Dissesto</i>	<i>Importo Progetti</i>	<i>%</i>
40	Alluvioni	€ 70.137.254,72	15,21%
25	Costiero	€ 121.563.072,56	23,10%
129	Frane	€ 162.967.295,87	35,34%
70	Messa in Sicurezza Infrastrutture	€ 106.513.456,21	23,10%
264		<b>€ 461.181.079,36</b>	
1	<b>RAFFORZAMENTO PA</b>	<b>€ 11.286.621,00</b>	
		€ 472.467.700,36	

## 2.6.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 15/01/2020

Allo stato attuale il dettaglio dell'attuazione dei 264 interventi risulta il seguente:

STATO DELL'ARTE	N. Interventi	%
Acquisizione Progettazione	48	18,18%
In Aggiornamento	39	14,77%
In Approvazione	9	3,41%
Predisposizione Gara SIA	22	8,33%
Predisposizione Gara Lavori	7	2,65%
Istruttoria Gara SIA/LAVORI	4	1,52%
Gara SIA in Corso	48	18,18%
SIA Aggiudicati	5	1,89%
Gara LAVORI in corso	25	9,47%
Lavori Aggiudicati	5	1,89%
Lavori in Corso/Ultimati	52	19,70%
	<b>264</b>	

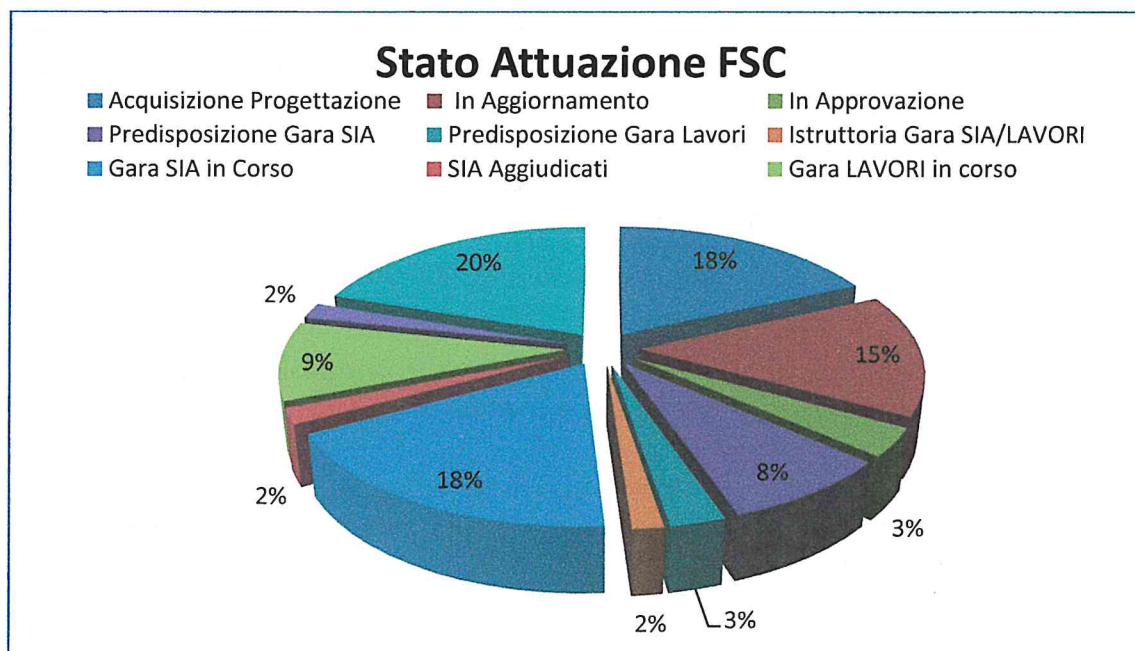

**Per il dettaglio dello stato di attuazione degli interventi del Patto per la Sicilia si rimanda alle schede dei singoli interventi allegati alla presente relazione.**

## 2.7 - Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Palermo

Con Delibera n. 26 del 10/08/2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha assegnato al Comune di Palermo la somma di euro 332.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020 e ha approvato le regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 di cui al Patto.

In data 30/04/2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della città Palermo in qualità di Autorità Urbana, hanno sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Palermo", con il quale le Parti:

- si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Città e dell'Area Metropolitana di Palermo, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
- tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Città di Palermo ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell'Allegato A al Patto, suddivisi per macro-categorie e per aree di intervento per la cui attuazione è ritenuta necessaria un'azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- si sono impegnano a dare attuazione ai contenuti del Patto mediante la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, nonché ricorrendo ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc. per un importo complessivo degli interventi pari a € 770.890.807,57 di cui:
  - € 432.059.988,83 di risorse già assegnate con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc.
  - € 332.000.000,00 di risorse FSC 2014-2020 (di cui € 61.000.000,00 Risorse finanziarie FSC al 2017);
  - € 6.830.800,00 di altre risorse (Risorse regionali (da apposito protocollo d'intesa); Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti Nazionali)
- Tra gli interventi previsti nel Patto per lo sviluppo della Città di Palermo sono contemplati gli "Interventi volti alla mitigazione del rischio di frana, crollo e smottamento dei rilievi montuosi che circondano la città" come di seguito elencati:

N°	Codice RENDIS	Titolo	Importo
1	19IRB84/G1	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo sovrastante l'area urbana di Mondello. Completamento	<b>1.764.958,00</b>
2	19IRB85/G1	Interventi di protezione dell'area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta	<b>913.287,48</b>

		massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino	
3	19IRB86/G1	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura	<b>30.545.000,00</b>
4	19IRB87/G1	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose sovrastanti l'abitato di Boccadifalco	<b>3.700.000,00</b>
5	19IR146/G1	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose di Monte Pellegrino Capo Gallo, Boccadifalco e area della colonia estiva comunale - II fase - completamento	<b>20.579.000,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>57.502.245,48</b>

- Con nota prot. 1951468 del 09/12/2016 il Comune di Palermo, stante le indicazioni riportate nel Patto per lo Sviluppo della città di Palermo e dall'art. 7 comma 2 della L.133/2014, ha richiesto al Commissario di Governo la concreta attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sotto elencati ed inseriti all'interno del predetto Patto per la Città di Palermo:

N °	Codice RENDIS	Titolo	Importo
1	19IRB84/G1	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo sovrastante l'area urbana di Mondello. Completamento	<b>1.764.958,00</b>
2	19IRB85/G1	Interventi di protezione dell'area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino	<b>913.287,48</b>
3	19IRB86/G1	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura	<b>30.545.000,00</b>
4	19IRB87/G1	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose sovrastanti l'abitato di Boccadifalco	<b>3.700.000,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>36.923.245,48</b>


- Con nota di riscontro prot. n.132 del 11 gennaio 2017 il Commissario Straordinario delegato, stante la documentazione pervenuta dal comune di Palermo, ha rappresentato la propria disponibilità a quanto richiesto in merito all'attuazione degli interventi di difesa del suolo compresi nel " Patto per lo sviluppo della città di Palermo", richiedendo l'accreditamento dei RUP dei vari interventi presso la piattaforma ANAC, e la trasmissione della stima della spesa utile e necessaria alla cantierabilità dei progetti nonché, ove possibile, la disponibilità alla progettazione mediante personale dipendente dell'amministrazione comunale.
- Con deliberazione n. 91 del 27/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione afferente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, inclusi nella linea di intervento "Riqualificazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per lo sviluppo della Città di Palermo";

- Con determinazione Dirigenziale n° 64 del 03/05/2017 il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana ha approvato lo schema di convenzione;
- In data 05/05/2017 tra il Commissario di Governo Dott. Maurizio Croce, il Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando ed il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana Arch. Mario Li Castri è stata stipulata apposita Convenzione per l'attuazione degli interventi inclusi nella linea di intervento "Riqualificazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per lo sviluppo della Città di Palermo" sottoscritto il 30/04/2016.
- La predetta Convenzione disciplina i rapporti tra la Città di Palermo, Beneficiario dei finanziamenti ed il Commissario di Governo, individuato quale Ente Attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge 116/2014 con i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
- In veste di Ente Attuatore il Commissario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, emana gli atti e i provvedimenti, cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, ed è responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa degli interventi e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

### 2.7.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 15/01/2020

Lo stato dell'arte degli interventi risulta il seguente:

<i>N.</i>	<i>STATO DELL'ARTE</i>	<i>N. Interventi</i>
1	IN APPROVAZIONE	1.764.958,00 €
3	GARA SIA IN CORSO	35.158.287,48 €
		<b>36.923.245,48 €</b>

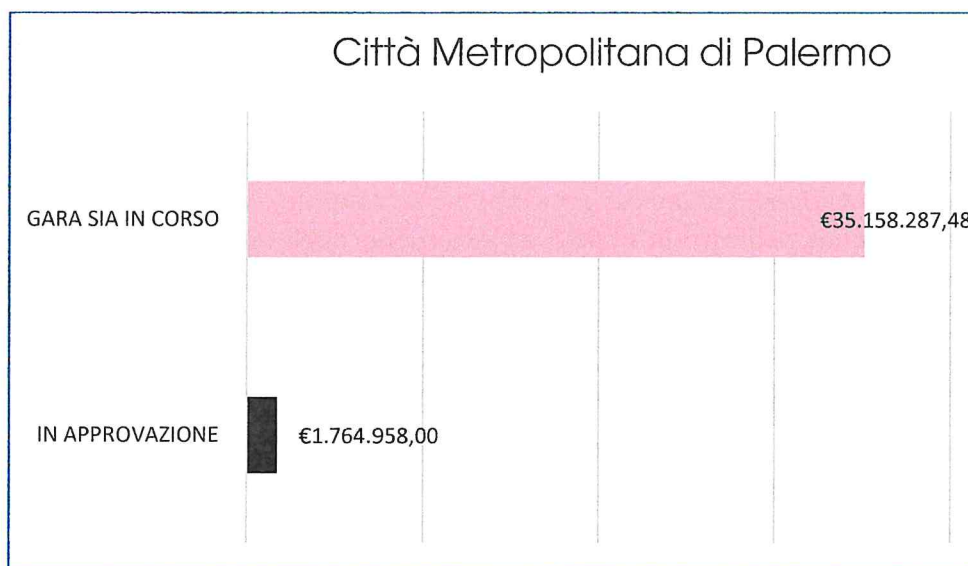

## **2.8 - Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina**

Con Delibera n. 26 del 10/08/2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha assegnato al Comune di Messina la somma di euro 332.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020 e ha approvato le regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 di cui al Patto.

In data 22/10/2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della città metropolitana di Messina in qualità di Autorità Urbana, hanno sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina", con il quale le Parti:

- si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio dell'Area Metropolitana di Messina, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
- tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Città Metropolitana di Messina ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell'Allegato A al Patto, suddivisi per macro-categorie e per aree di intervento per la cui attuazione è necessaria un'azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- si sono impegnano a dare attuazione ai contenuti del Patto mediante la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, nonché ricorrendo ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc. per un importo complessivo degli interventi pari a € 777.889.686,80 di cui:
  - € 253.915.737,21 di risorse già assegnate con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc.
  - € 332.000.000,00 di risorse FSC 2014-2020 (di cui € 61.000.000,00 Risorse finanziarie FSC al 2017);
  - € 191.973.949,59 di altre risorse (Risorse regionali (da apposito protocollo d'intesa); Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti Nazionali)

Con nota prot. 15346 del 19.01.2017 il Comune di Messina, stante le indicazioni riportate nel Patto per lo Sviluppo della città di Messina e dall'art. 7 comma 2 della L.133/2014, ha richiesto al Commissario di Governo la concreta attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sotto elencati ed inseriti all'interno del predetto Patto per la Città di Messina:

N°	Titolo	Importo
1	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel centro abitato di Pezzolo – Messina	<b>121.500,00</b>
2	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana lenta posta nel villaggio di Altolia – Messina	<b>269.800,00</b>
3	Lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del torrente Portella Arena in corrispondenza della cooperativa Futura	<b>650.000,00</b>



4	Mitigazione del rischio Alluvione con opere di sistemazione in alveo e dei sistemi arginali dei torrenti Larderia, Papardo, Salemi-Gesso, Ortolizzo a salvaguardia della popolazione e del tessuto economico	<b>7.900.000,00</b>
5	Lavori per la mitigazione del rischio idraulico mediante l'eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi con la realizzazione di manufatti preferibilmente prefabbricati a tutela della sicurezza pubblica	<b>3.000.000,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>11.941.300,00</b>

Con nota di riscontro prot. n.947 del 31 gennaio 2017 il Commissario Straordinario delegato, stante la documentazione pervenuta dal comune di Messina, ha rappresentato la propria disponibilità a quanto richiesto in merito all'attuazione degli interventi di difesa del suolo compresi nel " Patto per lo sviluppo della città di Messina", richiedendo l'accreditamento dei RUP dei vari interventi presso la piattaforma ANAC, e la trasmissione della stima della pesa utile e necessaria alla cantierabilità dei progetti nonché, dove possibile, la disponibilità alla progettazione mediante personale dipendente dell'amministrazione comunale.

Con deliberazione n. 367 del 06/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione afferente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, inclusi nella linea di intervento "Riqualficazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per lo sviluppo della Città di Messina";

In data 16/06/2017 tra il Soggetto Attuatore ed il Dirigente del Dipartimento di Protezione Civile e Difesa del Suolo del Comune di Messina è stata stipulata apposita Convenzione per l'attuazione degli interventi inclusi nella linea di intervento "Riqualficazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per la Città Metropolitana di Messina" sottoscritto il 22/10/2016.


La predetta Convenzione disciplina i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina, Beneficiario dei finanziamenti ed il Commissario di Governo, individuato quale Ente Attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge 116/2014 con i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

In veste di Ente Attuatore il Commissario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, emana gli atti e i provvedimenti, cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, ed è responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa degli interventi e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

## 2.8.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 15/01/2020

Lo stato dell'arte degli interventi risulta il seguente:

N.	STATO DELL'ARTE	N. Interventi
2	IN APPROVAZIONE	3.650.000,00 €
1	GARA SIA IN CORSO	7.900.000,00 €
2	LAVORI IN CORSO	391.300,00 €
		<b>11.941.300,00 €</b>

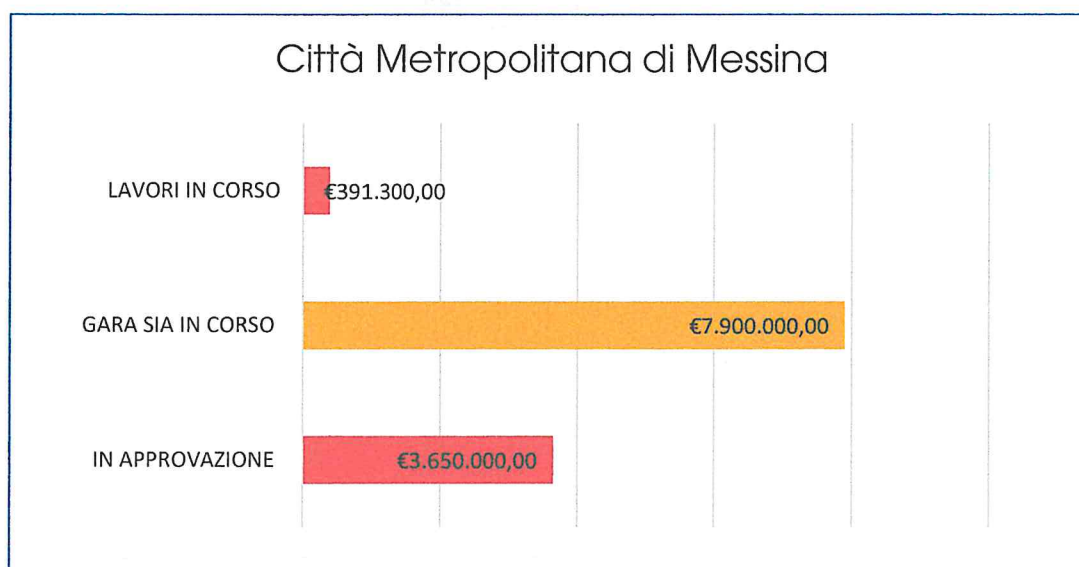


## 2.9 – Piano Operativo Ambiente (I° stralcio) – DPCM 20 febbraio 2019

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro.

Con successiva Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di € 315.119.117,19.

Infine il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 ha definito ed individuato, ai sensi della Delibera Cipe n. 35/2019, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di € 315.119.117,19 euro di cui **€ 20.776.438,01** euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana.


La ripartizione provinciale di tale somma viene illustrata nel grafico seguente:

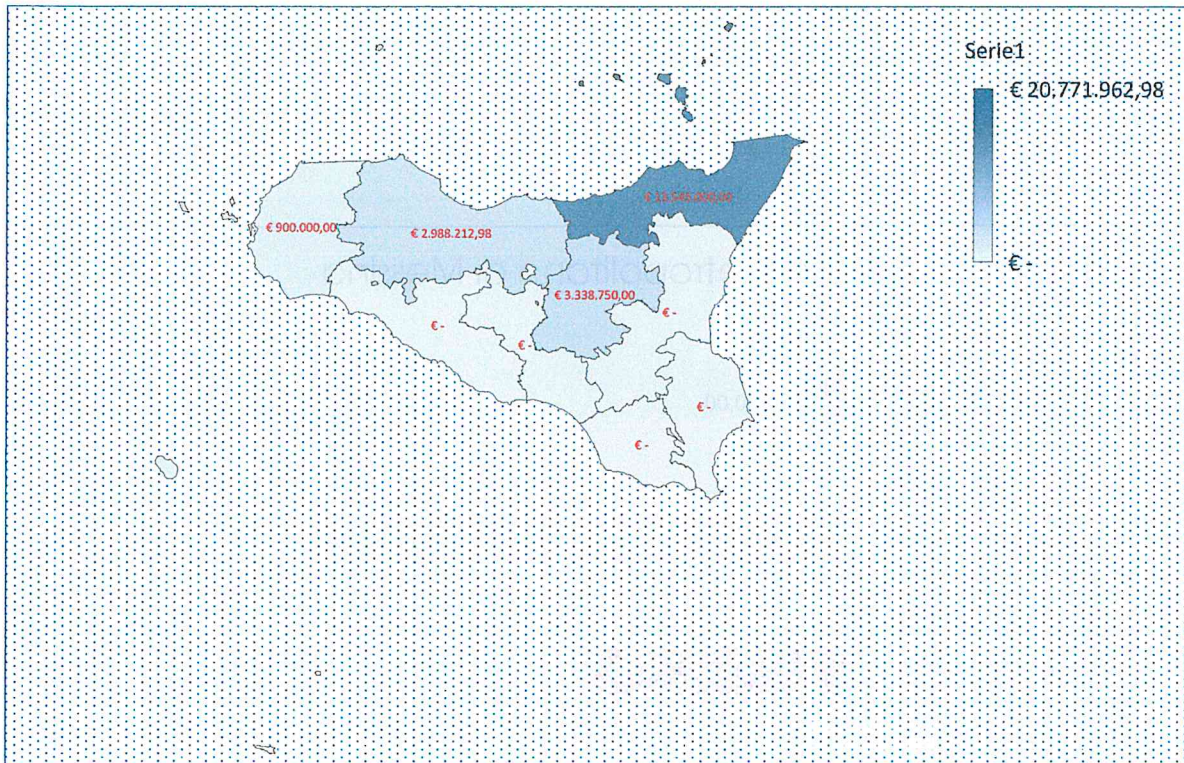

### 2.9.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 15/01/2020

Lo stato dell'arte degli interventi risulta il seguente:

N.	STATO DELL'ARTE	Importo
2	IN APPROVAZIONE	2.338.212,98 €
9	GARA LAVORI IN CORSO	18.283.750,00 €
1	SIA AGGIUDICATI	150.000,00 €
		<b>20.771.962,98 €</b>

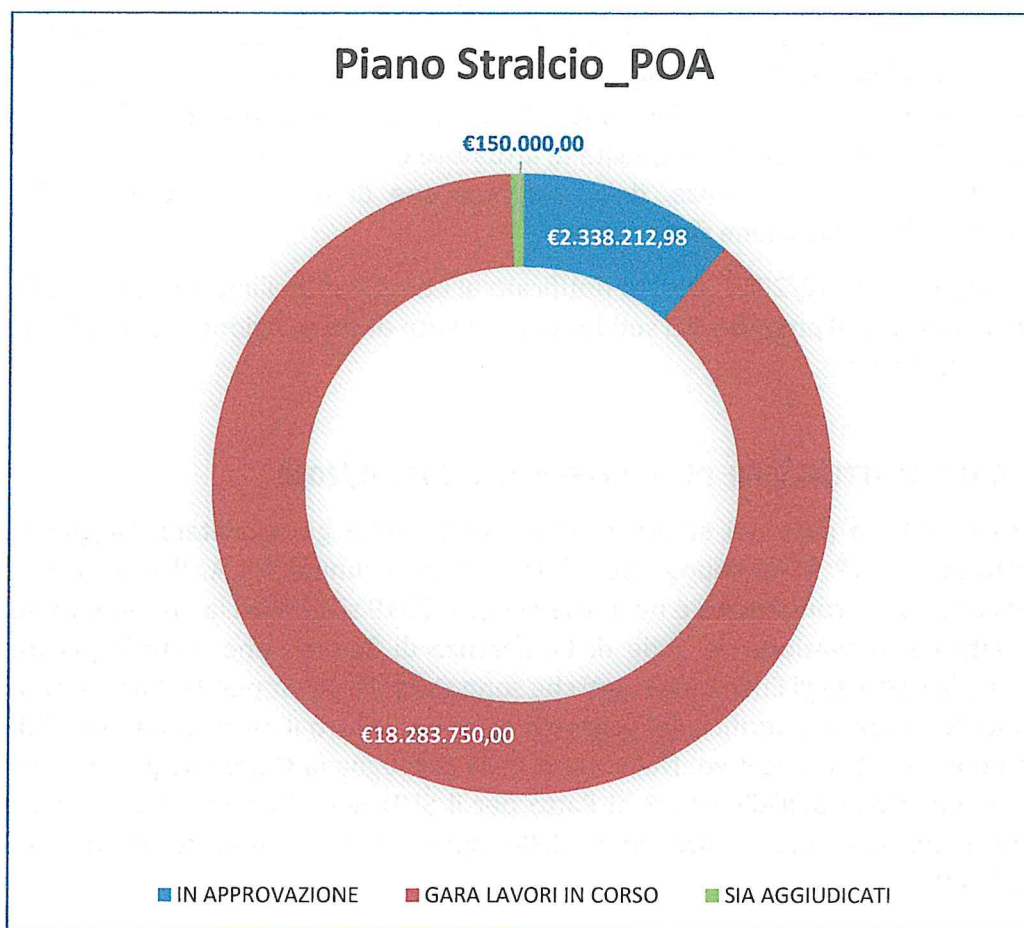

**2.10 - Interventi di mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorgono il Duomo, l'intera area diocesana ed il centro storico di Agrigento in adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.150 del 20/05/2011, n. 151 del 20/06/2014, n. 203 del 10/08/2015 e n. 490 del 30/10/2017**

Con deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, la Giunta regionale di Governo ha approvato la scheda revisionata della linea 5.B.6 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuando quali beneficiari dell'Azione A gli enti locali della Regione Siciliana con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l'Emergenza idrogeologica in Sicilia e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca.

In data 20/11/2017 è stato sottoscritto tra il Dipartimento regionale dell'Ambiente e il Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 un Accordo che regola le modalità di esecuzione degli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in adempimento di quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta n.151 del 20 giugno 2014, n. 203 del 10 agosto 2015 e n. 490 del 30 ottobre 2017.

---

L'Accordo sottoscritto è stato approvato con DDG 1041 del 21/11/2017. In particolare, per la realizzazione dell'intervento di mitigazione dei "dissesti che interessano la collina su cui sorgono il Duomo, l'intera area diocesana ed il centro storico di Agrigento", il Commissario Straordinario Delegato opera nella qualità di attuatore e stazione appaltante, svolgendo tutte le attività tecniche di pertinenza, dalla progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva utili alla realizzazione delle opere.

Con DDG 1156 del 20/12/2017, è stato notificato al Commissario l'importo di €. 1.893.803,81 per la realizzazione del progetto del suddetto intervento di cui all'Azione A1 della Scheda 5.B.6 del PAC Nuove Azioni.

### **2.10.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 15/01/2020**

Allo stato attuale la gara dei servizi di ingegneria risulta già espletata, l'aggiudicataria è individuata in un RTP il cui capogruppo è la società Technital S.p.A. Il progetto definitivo dell'opera è stato già consegnato e nel mese di luglio 2019 si è svolta la Conferenza dei Servizi per la relativa approvazione. In sede di Conferenza di Servizi sono state impartite alcune prescrizioni da parte degli Enti competenti che sono state già ottemperate. Su richiesta del RUP è attualmente in corso la verifica del progetto definitivo. Entro il mese di febbraio 2020 verrà consegnato il progetto esecutivo. Nelle more della consegna la Giunta Regionale, nell'ambito di una rimodulazione dell'Allegato B al Patto per il SUD della Regione Siciliana ha già dato copertura finanziaria alla realizzazione delle opere per un importo complessivo di € 27.000.000,00.

### **2.11 – FONDI PAC – NUOVE AZIONI - SOTTOAZIONE A2 "MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEGLI ALVEI" - Interventi di manutenzione delle opere di difesa degli alvei fluviali di cui al D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 1026 del 23 novembre 2015, in adempimento di quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta n. 151 del 20 giugno 2014, n. 203 del 10 agosto 2015 e n. 490 del 30 ottobre 2017 previo eventuale aggiornamento delle priorità.**

Con deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, la Giunta regionale di Governo ha approvato la scheda revisionata della linea 5.B.6 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuando quali beneficiari dell'Azione A gli enti locali della Regione Siciliana con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l'Emergenza idrogeologica in Sicilia e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca.


In data 27/11/2017 è stato sottoscritto tra il Dipartimento regionale dell'Ambiente, il Dipartimento Regionale Tecnico e il Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 un Accordo che regola le modalità di esecuzione degli interventi di "manutenzione delle opere di difesa degli alvei fluviali di cui all'Allegato 1 – Elenco degli interventi prioritari - e, a scorrimento, quelli individuati dall'Allegato 2 "Elenco degli interventi a scorrimento" del D.D.G. del

Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 1026 del 23 novembre 2015, in adempimento di quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta n. 151 del 20 giugno 2014, n. 203 del 10 agosto 2015 e n. 490 del 30 ottobre 2017 previo eventuale aggiornamento delle priorità.

L'Accordo sottoscritto il 27/11/2017 è stato approvato con DDG 1080 del 01/12/2017 notificato con nota del Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento Regionale Ambiente prot. 84456 del 06/12/2017, assunta al protocollo commissariale n. 6872 del 11/12/2017.

L'accordo Per la realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo il Commissario Straordinario Delegato opera nella qualità di stazione appaltante, svolgendo tutte le attività tecniche di pertinenza, dalla progettazione esecutiva, all'affidamento e direzione dei lavori ed al relativo collaudo, conformemente alle disposizioni del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e nel rispetto, comunque, dei principi comunitari, avvalendosi qualora lo ritenesse necessario delle prerogative di cui alla Legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 10, commi 4 e 5, mentre resta nelle competenze del Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'istruttoria amministrativa finalizzata all'emissione del decreto di finanziamento.


La distribuzione territoriale degli interventi finanziati a valere del D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 1026 del 23 novembre 2015 risulta la seguente:

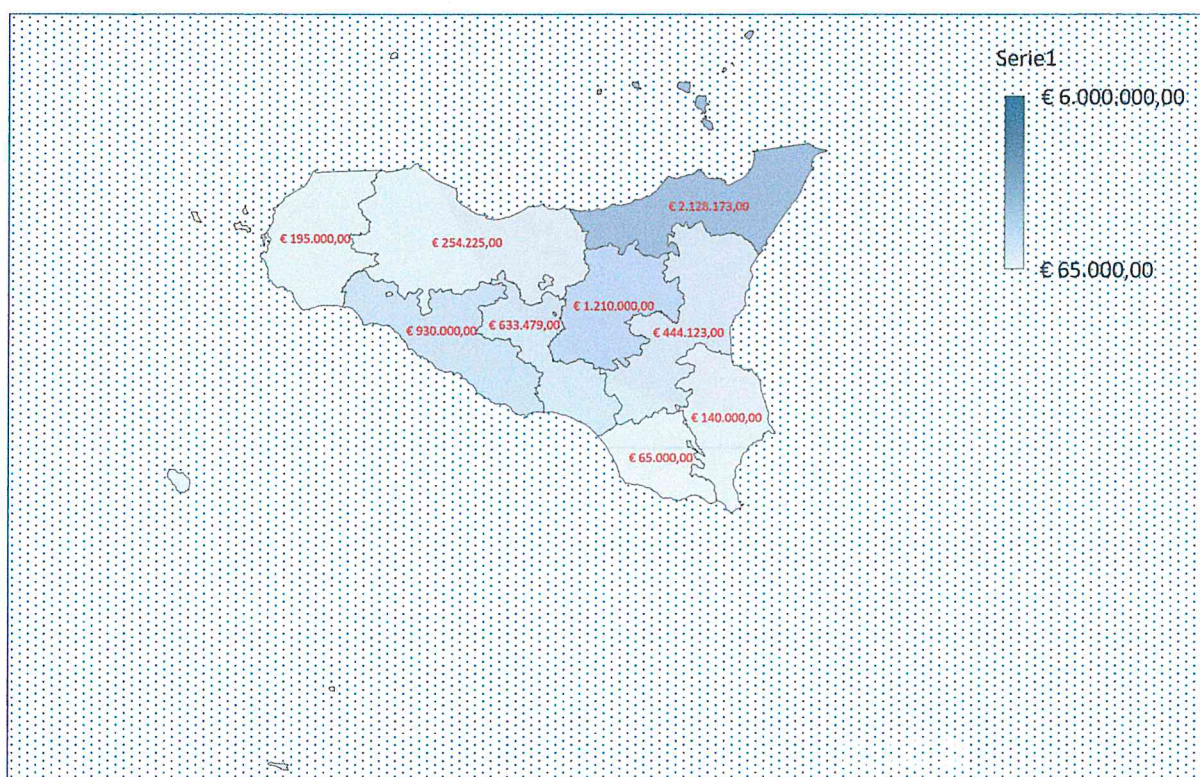

### 2.11.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 15/01/2020

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli interventi previsti, suddivisi in relazione allo stato di attuazione:

	n. interventi	IMPORTO
INTERVENTI IN GARA	2	330.000,00 €
IN ISTRUTTORIA	15	3.609.552,00 €
REVOCATI	10	1.806.223,00 €
LAVORI IN CORSO	1	254.225,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>6.000.000,00 €</b>

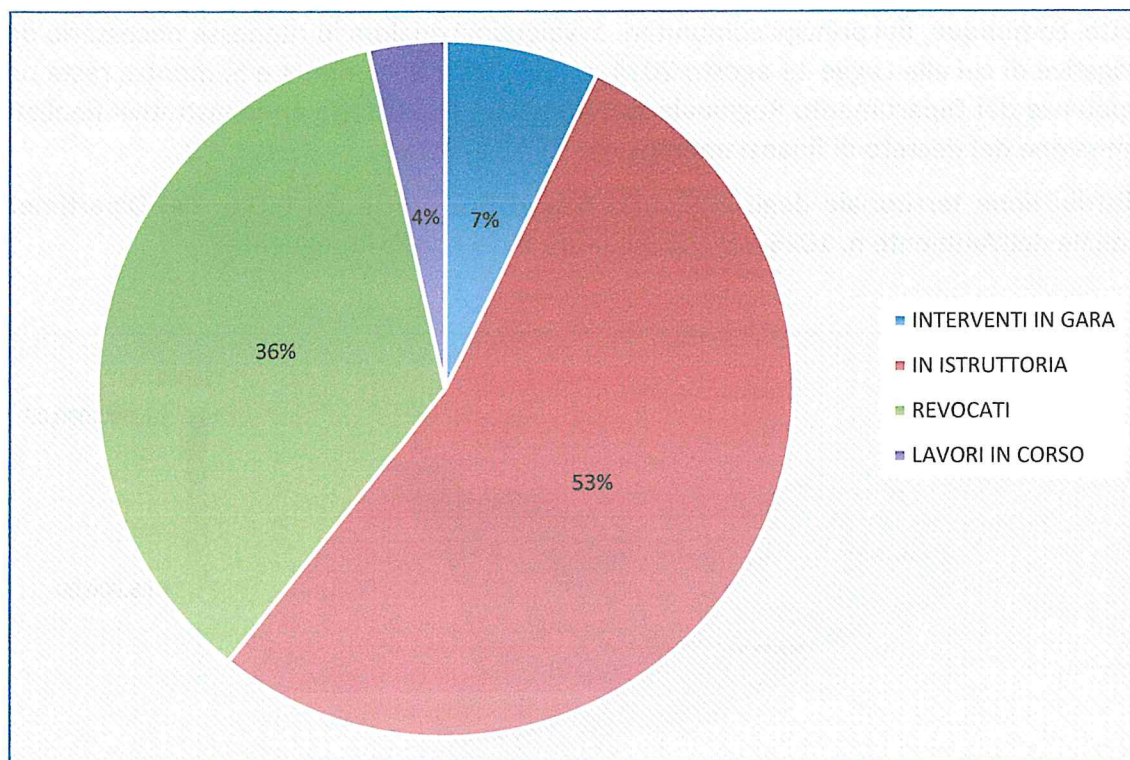

### 3. Trasferimento delle risorse e contabilità speciale

Una ricognizione dettagliata e puntuale del flusso finanziario relativo alla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario, alla data del 15 dicembre 2019, viene riportata in allegato alla presente relazione.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



## COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

# Stato Avanzamento Lavori

A green rectangular sign with a white border and four black screws at the corners. The sign is centered and surrounded by a decorative border of orange and black diagonal stripes.

**LAVORI  
IN CORSO**

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2019





Codice Caronte SI_1_17670	CASTELTERMINI	Opere di sistemazione della SP 22 Stazione Campofranco-Cozzo Disi-Casteltermini nel tratto interessato da caduta massi nel comune di Casteltermini (AG)								Codice Rendis 19IRD83/G1	
Livello di Progettazione iniziale	PRELIMINARE					Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE				
CUP	J79D16001960001					Importo Progetto	€ 850.000,00	Importo FSC	€ 850.000,00		
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione				
Decreto finanziamento	D.C. 441 del 14/05/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 877 del 19/09/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 224 del 21/02/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 201 del 07/05/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/6047 del 07/05/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 680 del 22/05/2019

**LAVORI IN CORSO**

**DATI FINANZIARI**

Importi Decreto di Finanziamento n. 441/2018			€ 850.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n.680/2019			€ 577.462,40
A	Lavori al lordo comprensivi di oneri	€ 620.000,00		A	Lavori al lordo comprensivi di oneri	€ 620.000,00	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 15.500,00		A2	Oneri per la sicurezza	€ 15.500,00	
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 604.500,00		A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 604.500,00	
B	Somme a disposizione dell'Amministratore	€ 230.000,00			Importo del ribasso (34,2598%)	€ 207.100,49	
B1	IVA al 22%	€ 136.400,00		A1	Lavori al netto del ribasso	€ 397.399,51	
B2	Imprevisti	€ 27.000,00		A2	Oneri per la sicurezza	€ 15.500,00	
B3	Accesso in discarica	€ 20.000,00		A	Lavori al netto del ribasso inclusi oneri	€ 412.899,51	
B4	Competenze tecniche 2%	€ 12.400,00		B	Somme a disposizione	€ 164.562,89	
B5	Assicurazione progettisti	€ 1.950,00		B1	IVA	€ 90.837,89	
B6	Diritti ANAC	€ 250,00		B2	Imprevisti	€ 27.000,00	
B7	Spese pubblicazione	€ 2.000,00		B3	Accesso in discarica	€ 20.000,00	
B8	Assistenza giornaliera alla D.L. - art. 178 DPR 207/2010	€ 10.000,00		B4	Competenze tecniche	€ 12.400,00	
				B5	Assicurazione progettisti	€ 1.950,00	
				B6	Diritti ANAC importo assegnato con D.C. 442/2019	€ 375,00	
B9	Spese di funzionamento ufficio commissariale	€ 20.000,00		B7	Spese gara	€ 2.000,00	
				B8	Assistenza giornaliera alla DL	€ 10.000,00	
	<b>totale</b>	<b>€ 850.000,00</b>			<b>totale</b>	<b>€ 577.462,40</b>	

**ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA**

**CAUZIONI E GARANZIE**

<b>Fidejussione</b>							
Fidejubente	Elba Assicurazioni Spa	n. Polizza	1423962	Data di sottoscrizione			
		Importo	€ 100.168,70	01/04/2019			

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Arch. Gerlando Spirio	Decreto di nomina	D.C. n. 861 del 04/12/2017	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	Ing. Michelangelo di Carlo	Decreto di nomina	D.C. n. 861 del 04/12/2017
Servizi Geologici	Dott. Roberto Bonfiglio	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 861 del 04/12/2017	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Dott. Roberto Bonfiglio	Decreto di nomina	D.C. n. 515 del 06/06/2018
Istruttore Tecnico	Geom. Frenda - Geom. Cacciatore - Geom. Bonfiglio	Decreto di nomina	D.C. n. 861 del 04/12/2017	Direttore Operativo	Geom. Giuseppe Mattaliano	Decreto di nomina	D.C. n. 515 del 06/06/2018
Coord Sicurezza Fase Progettazione	Geom. Giuseppe Mattaliano	Decreto di nomina	D.C. n. 861 del 04/12/2017	Assistente ai Lavori	Geom. Francesco Catalano	Decreto di nomina	D.C. n. 515 del 06/06/2018
Direttore Lavori	Ing. Michelangelo Di Carlo	Decreto di nomina	D.C. n. 515 del 06/06/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	

**AFFIDATARIA**

Affidataria	<b>VULLO ANTONIO SRL</b>										
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)											
C.F. e P.IVA	02604060844	Indirizzo:	Via della Resistenza n. 16, 92026 Favara (AG)	Tel/Fax:		tel: fax: e-mail:	vulloantoniosrl@pec.it	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:
Tipo di Contratto Applicato											

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

<b>TEMPISTICA</b>							
Data della consegna	27/06/2019	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	26/02/2020	Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	240	giorni impiegati in più	
						giorni impiegati in meno	

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

Anticipazione del 20%		Importo stato di avanzamento oltre iva	82.579,90 €	Decreto	D.C. del 1113 del		
-----------------------	--	--	-------------	---------	-------------------	--	--

CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	19/07/2019	Importo oltre IVA	82.579,90 €	Decreto Anticipazione 20%	06/08/2019	Importo	100.747,48 €		
1° SAL	per lavori a tutto il:	22/10/2019	Importo stato di avanzamento oltre iva	157.058,75 €	Decreto di liquidazione SAL n. 1	Importo	191.611,68 €		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	Prot. 7848 del 04/11/2019	Importo oltre IVA	157.058,75 €	D.C. n. 1745 del 28/11/2019					
<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>									
<b>COLLAUDO STATICO</b>									
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>									



Codice Caronte SI_1_17687	NARO	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana nel comune di Naro (AG)						Codice Rendis 191RA03/G1			
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				FRANE						
CUP	J29D16001300001				Importo Progetto	€ 2.585.521,80		Importo FSC	€ 2.440.039,53		
Decreto finanziamento Servizi	Importo		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	D.C. n. 209 del 02/03/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 568 del 14/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 544 del 30/04/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 223 del 08/07/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/2598 del 08/07/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 996 del 17/07/2019

**LAVORI IN CORSO**

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di finanziamento n. 209 del 02/03/2018		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 996 del 17/07/2019		
A Montare dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto		€ 1.746.601,97		A Per lavorazioni		€ 1.746.601,97
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.622.712,64		Costi relativi alla sicurezza		€ 123.889,33
				Importo a base di gara		€ 1.622.712,64
				Importo del ribasso		€ 362.221,92
				Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.260.490,72
a2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 123.889,33		Costi relativi alla sicurezza		€ 123.889,33
				Somma a disposizione di cui:		€ 1.384.380,05
B	Somma a disposizione di cui:	€ 693.437,57		IVA sui lavori		€ 304.563,61
b1	di conferimento a discarica materiali di risulta IVA inclusa	€ 18.389,30		Oneri di conferimento a discarica materiali di risulta IVA		€ 18.389,30
b2	Prove di laboratorio sui materiali IVA inclusa	€ 6.685,72		Prove di laboratorio sui materiali bIVA incl.		€ 6.685,72
b3	IVA sui lavori	€ 384.252,43		Progettazione esecutiva		€ 50.221,20
b4	Spese tecniche			Direzione dei lavori		€ 126.406,27
4.1	Progettazione esecutiva	€ 50.221,20		Collaudo statico		€ 20.055,83
4.2	direzione lavori	€ 126.406,27		Collaudo tecnico amministrativo		€ 15.362,50
4.3	collaudo statico	€ 20.055,83		Spese geologiche		€ 21.077,23
4.4	collaudo tecnico-amministrativo	€ 15.362,50		Indagini geognostiche		€ 11.430,80
b5	spese geologiche	€ 21.077,23		Incentivo art. 113		€ 34.932,04
b6	indagini geognostiche	€ 11.430,80		Contributo ANAC già impegnato con D.C. n. 1052/2018		€ 600,00
b7	incentivo art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016	€ 34.932,04		Spese gara		€ 26.100,00
b8	spese di gara			Imprevisti		€ 4.024,25
b9	contributo ANAC	€ 600,00				
b10	Imprevisti	€ 4.024,25				
totale		€ 2.440.039,54		totale		€ 2.024.228,80

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

**CAUZIONI E GARANZIE**

Fidejussione					
Fidejussore	Groupama Assicurazioni spa	n. Polizza	109379546	Data di sottoscrizione	14/06/2019
		Importo	€ 184.400,00		

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Ing. Francesco Puma	Decreto di nomina	D.C. n. 753 del 31/10/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto a contrarre D.C. n. 410 del 01/04/2017
Direttore Lavori	Ing. E. Greco Lucchina	Decreto di nomina	D.C. n. 565 del 13/06/2018	Decreto a contrarre (ex art 36)	D.C. n. 410 del 01/04/2019
Collaudatore Statico - Collaudatore Tecnico Amministrativ	Ing. Giuseppe di Marzo (D.L.&Partners)	Decreto di nomina	D.C. n. 1640 del 14/11/2019	Decreto a contrarre (ex art 36)	D.C. n. 1309 del 25/09/2019

**AFFIDATARIA**

Affidataria	CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.					
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)						
C.F. e P.IVA	4157170871	Indirizzo:	Via Anzalone n. 12, 95024 Acireale (CT)	Tel/Fax: 095 877738	e-mail/PEC	marcello@consolidamentispeciali.it

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SL_1_17689	RAVANUSA	Lavori di completamento del consolidamento della zona est dell'abitato II° Stralcio Comune di Ravanusa (AG)								Codice Rendis 19IR584/G1	
Livello di Progettazione Iniziale		DEFINITIVO				Tipo di disesto		FRANA			
CUP	J79D16001810001				Importo Progetto		€ 7.000.000,00		Importo FSC € 7.000.000,00		
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. 334 del 13/04/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 554 del 11/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1013 del 22/07/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 245 del 07/10/2019	Registrazione Contratto	Reg. 11/10981 del 07/10/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 1620 del 12/11/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 334/2018				€ 7.000.000,00		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato D.C. 1620 del 12/11/2019				
A	Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto					A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)			€ 4.897.857,80
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso (di cui €615.441,01 per Per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 4.765.174,58		A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)			€ 132.683,22
A2				€ 132.683,22		A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€ 4.765.174,58
SOMMAMO A1)+A2)				€ 4.897.857,80		Importo del ribasso (25,874%)				€ 1.232.941,27
B	Somme a disposizione dell'Am.m.ne			€ 2.102.142,20		lavori al netto del ribasso				€ 3.532.233,31
B1	IVA sui lavori 22%			€ 1.077.528,72		Importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 132.683,22
B2	Incentivo tecnico art.113 D.Lgs. 50/2016			€ 74.968,27		Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri				€ 3.664.916,53
B3	Imprevisti			€ 15.897,99		Somma a disposizione di cui:				€ 3.661.340,24
B4	Compensi per servizi di ingegneria studio geologico e indagini laboratorio			€ 684.007,49		b1	IVA 22% sui lavori			€ 806.281,64
B5	Servizio di monitoraggio post operam			€ 31.220,00		b2	Incentivo tecnico art. 113 D.Lgs 50/2016			€ 74.968,27
B6	Commissione di gara affidamento lavori			€ 30.000,00		b3	Imprevisti			€ 15.897,99
B7	Commissione di gara affidamento servizio di ingegneria			€ 27.164,92		b4	Compensi per servizi di ingegneria studio geologico e indagini laboratorio (di cui € 229.897,35 già impegnati)			€ 684.007,49
B8	Spese pubblicità gara lavori e servizi			€ 6.000,00		b5	Servizio di monitoraggio post operam			€ 31.220,00
B9	Contributo ANAC			€ 825,00		b6	Commissione di gara affidamento lavori			€ 30.000,00
B10	Conferimento in discarica compreso IVA			€ 124.603,26		b7	Commissione di gara affidamento servizio di ingegneria			€ 27.164,92
B11	Indennità di esproprio			€ 29.926,55		b8	Spese di Pubblicità gara lavori e servizi			€ 6.000,00
TOTALE				€ 7.000.000,00		b9	Contributo ANAC (già impegnato con decreto 1052/2018)			€ 600,00
						b10	Conferimento in discarica compreso IVA			€ 124.603,26
						b11	Indennità di esproprio			€ 29.926,55
						Totale B				€ 1.830.670,12
						Totale				€ 5.495.586,65

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejubente	Dall'ogg Insurance Isc	n. Polizza	2019-020-16-000093-09-000000176	Data di sottoscrizione	18/09/2019	Importo	€ 581.787,00
-------------	------------------------	------------	---------------------------------	------------------------	------------	---------	--------------

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Sebastiano Alesci	Decreto di nomina	D.C. n. 344 del 08/06/2017	Supporto al RUP Progettista Supporto alla Progettazione/Geologia	Decreto di nomina
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Salvatore Panepinto
Direttore Lavori	Ing. Salvatore Panepinto	Determina di nomina	D.C. n. 1155 del 22/11/2018	Collaudatore statico e tecnico amministrativo	Arch. Giuseppina Soldano
Collaudatore Statico	Arch. Giuseppina Soldano	Decreto di Nomina	D.C. n. 1030 del 24/07/2019	Decreto di Nomina	
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Arch. Giuseppina Soldano	Decreto di Nomina	D.C. n. 1030 del 24/07/2019	Decreto di Nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria **ATI: S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - CIESSECI S.R.L.**

dati Affidataria (nel caso di ATI Indicare i dati della Mandataria)

C.F. e P.IVA	03643290871	Indirizzo:	Piazza XXIV maggio, 12 - 95015, Maletto (CT)	Tel/Fax:	095 7720718	e-mail/PEC:	
--------------	-------------	------------	--	----------	-------------	-------------	--

nel caso di ATI Indicare i dati della Mandante CIESSECI S.R.L.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	25/10/2019	Data del concreto inizio dei lavori	07/11/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza dopo prima sospensione	
DATA I SOSPENSIONE		DATA RIPRESA DOPO I SOSPENSIONE					
DATA II SOSPENSIONE		DATA RIPRESA DOPO II SOSPENSIONE					
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più	180 gg	giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

Anticipazione del 20%		Importo stato di avanzamento oltre IVA	732.983,31 €	Decreto Anticipazione 20%	D.C. n. 1735 del 28/11/2019	Importo	894.239,64 €
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	19/11/2019	Importo oltre IVA	732.983,31 €				

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17611	REALMONTE	Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale - Comune di Realmonte (AG)								Codice Rendis 19IRA04/G1	
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto		FRANA				
CUP	J86J16001660001				Importo Progetto		€ 1.250.000,00	Importo FSC		€ 1.250.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 177/2017 - D.C. n. 147/2018 - D.C. n. 197 del 28/02/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 534 del 07/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva ed efficace	D.C. n. 1230 del 04/12/2018 D.C. n. 54 del 16/01/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 185 del 20/03/2019	Registrazione Contratto	Rep. 17/9811 del 20/03/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 456 del 09/04/2019

**LAVORI IN CORSO**

**DATI FINANZIARI**

Importi Decreto di Finanziamento n. 197/2018		€ 1.250.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 456 del 09/04/2019		€ 7.053.164,96
a1	Importo lavori a soggetti a ribasso	€ 881.235,70	A	Importo complessivo dei lavori	€ 902.534,00
				Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 21.298,30
				Importo dei lavori a base d'asta	€ 881.235,70
				Importo del ribasso d'asta	€ 353.110,26
				Lavori al netto del ribasso	€ 528.125,44
				Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 21.298,30
				Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 549.423,74
a2	oneri di sicurezza speciali da PSC	€ 21.298,30	B	Somma a disposizione di cui:	€ 3.796.139,22
B	Somma a disposizione di cui:	€ 347.466,00	B1	IVA 22% sull'importo totale dei lavori	€ 120.873,22
b1	IVA 22% di A	€ 198.557,48	B2	Spese tecniche	€ 18.050,68
b2	Spese tecniche 2% comma 7 art. 16 DPR 207/2010	€ 18.050,68	B3	Assicurazione RUP	€ 4.512,67
b3	assicurazione RUP comma 7 bis art. 92 D. Lgs 163/06	€ 4.512,67	B4	Contribut Anac	€ 375,00
b4	Contributo ANAC	€ 600,00	B5	Spese di produzione progetto	€ 3.734,07
b5	Spese di produzione progetto comma 7 bis art. 92 D. Lgs	€ 3.734,07	B6	Assistenza giornaliera in cantiere	€ 8.812,36
b6	Assistenza giornaliera in cantiere, comma 7 art. 16 DPR	€ 8.812,36	B7	Oneri a discarica	€ 82.767,85
b7	Oneri a discarica	€ 67.842,50	B8	Collaudo statico compreso oneri e IVA	€ 3.893,30
b7.1	IVA sugli oneri a discarica	€ 14.925,35	B9	Collaudo amministrativo compreso oneri e IVA	€ 2.054,17
b8	collaudo statico	€ 3.893,30	B10	Spese gara	€ 1.500,00
b9	collaudo amministrativo	€ 2.054,17	B11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 22.983,42
b10	pubblicità gara comma 10 art. 16 DPR 207/2010	€ 1.500,00		Totale	€ 3.526.582,48
b11	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 22.983,42			
	<b>totale</b>	<b>€ 1.250.000,00</b>		<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	

**CAUZIONI E GARANZIE**

**Fidejussione**

Fidejussore	HDI Assicurazioni Spa	n. Polizza	0895458865	Data di sottoscrizione	11/03/2019
Importo	€ 132.500,00				

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Arch. Salvatore Gaipa	Nomina	D.C. n. 177 del 04/04/2017	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe Tornabene - Ing. Fabrizio Cairone	Decreto di nomina	Det. Dirigenziale n. 73 del 30/05/2016
				Supporto alla Progettazione - Geologo	Geol. Giuseppe Lombardo	Decreto di nomina	Det. Dirigenziale n. 73 del 30/05/2016
Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Fabrizio Cairone	Decreto di nomina	D.C. n. 207 del 18/02/2019
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe Tornabene (DL) Dott. Geol. Giuseppe Lombardo (DL geol)	Decreto di nomina	D.C. n.320 del 06/06/2017, D.C. n. 207 del 18/02/2019	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico - Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Salvatore Misuraca	Decreto di nomina	D.C. n. 416 del 02/04/2019, Disciplinare REP. 192 DEL 01/04/2019	Decreto a contrarre (Ex art. 36)		D.C. n. 203 del 18/02/2019	

**AFFIDATARIA**

Affidataria	<b>CONSORZIO ARTEK</b>				
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)					
C.F. e P.IVA	P.I. 11533421001	Indirizzo:	Via Giuseppe Scarabelli n. 6, 00157, Roma	Tel/Fax: 06 451 3123	e-mail/PEC

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

**TEMPISTICA**

Data della consegna	18/04/2019	Data del concreto inizio dei lavori	06/05/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	18/02/2020	Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	306	giorni impiegati in più	

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

Anticipazione del 20%		Importo stato di avanzamento oltre iva	109.884,75 €	Decreto	D.C. n. 647 del
-----------------------	--	--	--------------	---------	-----------------

CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	29/04/2019	Importo oltre IVA	109.884,75 €	Anticipazione 20%	17/05/2019	Importo	134.059,40 €		
1° SAL	per lavori a tutto il:	29/06/2019	Importo stato di avanzamento oltre iva	249.900,00 €	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 1055 del 30/07/2019	Importo	304.876,00 €	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	29/06/2019	Importo oltre IVA	249.900,00 €						
2° SAL	per lavori a tutto il:	27/09/2019	Importo stato di avanzamento oltre iva	92.700,00 €	Decreto di liquidazione SAL n. 2	D.C. n. 1454 del 16/10/2019	Importo	113.094,00 €	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	07/10/2019	Importo oltre IVA	92.700,00 €						
<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>									
<b>COLLAUDO STATICO</b>									
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>									



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_18832	REALMONTE	Intervento di messa in sicurezza di una porzione di versante in località Scala dei Turchi nel comune di Realmonte (AG)							Codice Rendis 19IRF03/G1		
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				FRANA						
CUP	J87D16000050001				Importo Progetto	€ 417.000,00	Importo FSC	€ 417.000,00			
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione				
Decreto finanziamento	D.C. 1034 del 30/10/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1104 del 12/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 197 del 12/02/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 194 del 08/04/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/4739 del 08/04/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 678 del 22/05/2019

### LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		€ 417.000,00	€ 307.212,04	
Importi Decreto di Finanziamento n. 1034 del 30/10/2018			Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 678 del 22/05/2019	
A	Lavori a misura-importo complessivo dell'appalto a base		A	
	Ispezioni pulizia e disgaggio	€ 47.030,33	Lavori a misura - importo complessivo	€ 271.035,78
	Rete e ancoraggi	€ 182.000,78	Oneri speciali della sicurezza non soggetti al	€ 18.573,64
	Indagini e drenaggi	€ 23.431,03	Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 252.462,14
	Sicurezza	€ 18.573,64	Importo del ribasso (35,6450%)	€ 89.990,13
	SOMMAMO I LAVORI AL LORDO	€ 271.035,78	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 162.472,01
A1	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 6.241,53	A2 Oneri speciali della sicurezza non soggetti al	€ 18.573,64
A2	Oneri speciali della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 18.573,64	A Lavori al netto del ribasso comprensivo di oneri	€ 181.045,65
		€ 252.462,14	B Somme a disposizione di cui	€ 126.166,39
	Somma a disposizione di cui:	€ 145.964,22	B1 IVA sui lavori	€ 39.830,04
B1	IVA sui lavori	€ 59.627,87	B2 Art. 106 del D.LGS 50/2016	€ 14.769,91
		€ 14.769,91	B3 Opere di ingegneria naturalistica	€ 15.000,00
		€ 15.000,00	B4 Incenivi per funzioni tecniche per dipendenti PA	€ 5.420,72
		€ 5.420,72	B5 Polizze rischi professionali personali intrno pe	€ 1.500,00
		€ 1.500,00	B6 Competenze per assistenza controllo e	€ 5.420,72
		€ 5.420,72	B7 Oneri di conferimento a discarica	€ 2.000,00
		€ 2.000,00	B8 ributo ANAC già impegnato con d.c. n. 442/2019	€ 225,00
		€ 225,00	B9 Analisi di laboratorio	€ 3.000,00
		€ 3.000,00	B10 Spese pe eventuali occupazioni temporanee,	€ 4.000,00
		€ 4.000,00	B11 Imprevisti	€ 13.551,79
		€ 13.551,79	B12 Compensazioni ambientali	€ 21.448,21
		€ 21.448,21		
	totale	€ 417.000,00	totale	€ 307.212,04

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione				
Fidejubente	Elba Assicurazioni Spa	n. Polizza	1421756	Data di sottoscrizione
		Importo	€ 37.144,00	27/03/2019

### FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Maurizio Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 981 del 17/10/2018	Supporto al RUP	Sig.ra G. Chianetta	Decreto di nomina	D.C. n. 994 del 18/10/2018
				Progettista	Ing. C. Arcieri - Arch. S. Fanara (Collab. Progettazione-DO)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 994 del 18/10/2018
Servizi Geologici	Dott. C. Collura	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 994 del 18/10/2018	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. E. Mililotto	Decreto di nomina	D.C. n. 994 del 18/10/2018
Direttore Lavori	Ing. C. Arcieri	Decreto di nomina	D.C. n. 994 del 18/10/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico - Collaudatore Tecnico Amministrativo	Arch. Corrado Casmiro	Decreto di nomina	D.C. n. 826 del 14/06/2019	Decreto a Contrarre (Ex art. 36)		D.C. n. 586 del 08/05/2019	

### AFFIDATARIA

Affidataria	SJLES SRL										
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)											
C.F. e P.IVA	154560775	Indirizzo:	Via Salerno, n. 283 - 75025 Policoro (MT)	Tel/Fax:	tel: 0835 980975 fax: e-mail:	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

#### TEMPISTICA

Data della consegna	27/02/2019	Data del concreto inizio dei Lavori	06/03/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	137 gg	giorni impiegati in piu	
				giorni impiegati in mano			

#### VARIANTE

Trmissione PERIZIA DI VARIANTE	Prot. 4754 del 08/07/2019	Decreto Presa Atto Perizia di Variante	D.C. n. 1048 del 26/07/2019	Importo perizia variante	307.188,17	Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato D.C. n. 1048 del 26/06/2019	€ 307.188,17	
						di cui:	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 217.132,57
							Totale somme a disposizione	90.055,60
							Totale	€ 307.188,17

#### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL	per lavori a tutto il:	24/06/2019	Importo stato di avanzamento oltre Iva	70.041,15	Decreto di	D.C. n. 1102 del
--------	------------------------	------------	--	-----------	------------	------------------

CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	02/07/2019	Importo oltre iva	70.041,15	liquidazione SAL n. 1	05/08/2019	Importo	85.450,20		
2° SAL	per lavori a tutto il:	08/08/2019	Importo stato di avanzamento oltre iva	128.752,97	Decreto di liquidazione SAL n. 2	D.C. n. 1590 del 05/11/2019	Importo	157.078,62	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	21/10/2019	Importo oltre iva	128.752,97						
<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>									
<b>COLLAUDO STATICO</b>									
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>									



Codice Caronte SI_1_17834	SANT'ANGELO MUXARO	Consolidamento del costone roccioso nel comune di San'Angelo Muxaro (AG)								Codice Rendis 19IR355/G1	
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO					Tipo di dissesto		FRANA			
CUP	J69D16001890001					Importo Progetto	€ 1.508.000,00		Importo FSC	€ 1.508.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto finanziato	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 1200 del 29/11/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 223 del 20/02/2019	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 947 del 08/07/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 251 del 10/10/2019	Registrazione Contratto	Reg. 1T/11524 10/10/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. 1591 del 05/11/2019

**LAVORI IN CORSO**

DATI FINANZIARI			
Importi Decreto di Finanziamento n. 1200 del 29/11/2018			€ 1.508.000,00
A	Totale Lavori	€ 907.765,96	
	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 18.093,19	
	Lavori soggetti al ribasso	€ 889.672,77	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 600.234,04	
B1	IVA sui lavori	€ 199.708,51	
B2	Espropri	€ 3.160,85	
B3	Competenze tecniche progettazione, piano di manutenzione e piano di sicurezza in fase di prog.	€ 140.400,41	
B4	Immissioni in possesso e frazionamento	€ 9.662,64	
B5	Relazione paesaggistica	€ 6.216,05	
B6	Studio geologico, indagini geognostiche e prove	€ 25.423,06	
B7	Ufficio DL, Geologo IVA inclusa	€ 17.333,61	
B8	Competenze collaudi	€ 23.556,36	
B9	Prove di Laboratorio IVA inclusa	€ 11.814,53	
B10	Art 113 D.lgvo 50/2016	€ 18.155,32	
B11	licità, acquisizione pareri e diritti Autorità di Vigilanza	€ 8.000,00	
B12	Opere di monitoraggio	€ 25.000,00	
B13	ANAC	€ 350,00	
B14	Imprevisti	€ 37.602,79	
B15	Competenze DL misura e contabilità CSE compreso	€ 73.849,91	
	<b>totale</b>	<b>€ 1.508.000,00</b>	
Importi Decreto di impegno D.C. 1591 del 05/11/2019			
A	Importo dei lavori a misura (compreso Costi della Sicurezza e costi della Manodopera)	€ 907.765,96	
A1	b) Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.093,19	
	c) Importo dei Lavori a base d'asta soggetto a ribasso (a-b)	€ 889.672,27	
	Importo del ribasso (37,1753%)	€ 330.738,52	
	Lavori al netto del ribasso	€ 558.934,25	
B	d) Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.093,19	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri	€ 577.027,44	
	Somma a disposizione di cui:	€ 527.496,57	
b1	IVA 22% sui lavori	€ 126.946,04	
b2	Espropri	€ 3.160,85	
b3	competenze tecniche progettazione, piano di manutenzione e piano di sicurezza in fase di prog.	€ 140.400,41	
b4	competenze DL misura e contabilità CSE compreso IVA	€ 73.849,91	
b5	Immissioni in possesso e frazionamenti	€ 9.662,64	
b6	relazione paesaggistica	€ 6.216,05	
b7	studio geologico, indagini geognostiche e prove geognostiche IVA inclusa	€ 25.423,06	
b8	ufficio DL geologo IVA inclusa	€ 17.333,61	
b9	competenze collaudi	€ 23.556,36	
b10	Prove di laboratorio IVA inclusa	€ 11.814,53	
b11	art. 113 D.lgvo 50/2016	€ 18.155,32	
b12	Acquisizione pareri	€ 8.000,00	
b13	opere di monitoraggio IVA inclusa	€ 25.000,00	
b14	ANAC (€ 375,00 già impegnati con decreto n. 927/2019)	€ 375,00	
b15	imprevisti	€ 37.602,79	
	<b>totale</b>	<b>€ 1.104.524,01</b>	
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>			

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejussore	Elba Assicurazioni Spa	n. Polizza	1507286	Data di sottoscrizione			
		Importo	€ 125.481,00	04/09/2019			

FIGURE TECNICHE							
RUP	Geom. Pietro Spoto	Decreto di Nomina	D.C. 824 del 23/11/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di Nomina	D.C. 824 del 23/11/2017
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di Nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Raimondo Taibi	Decreto di nomina	D.C. n. 1415 del 10/10/2019
Direttore Lavori	Arch. Raimondo Taibi	Decreto di nomina	D.C. n. 1415 del 10/10/2019	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico						Decreto di Nomina	
Collaudatore Tecnico Amministrativo						Decreto di Nomina	

AFFIDATARIA							
Affidataria	<b>PELEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.</b>						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F. e P.IVA	050636559	Indirizzo:	Via del Tiro a Segno n.2, Narni (TR)	Tel/Fax:	0744 751294 0744 751294	e-mail/PEC:	tecnico@pelegriniconsolidamenti.com
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante							

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
TEMPISTICA	
VARIANTE	
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:	
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	
COLLAUDO STATICO	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17607	VILLAFRANCA SICULA	Lavori di regimentazione delle acque a monte del c.a. in c.da San Rocco nel comune di Villafranca Sicula (AG)								Codice Rendis 19IR896/G1	
Livello di Progettazione Iniziale		ESECUTIVO				Tipo di dissesto		ALLUVIONE			
CUP		J16I16002000001				Importo Progetto		€ 1.300.000,00		Importo FSC	€ 1.300.000,00
Decreto finanziamento Servizi		Decreto a contrarre		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		D.C. n. 15 del 12/01/2017 e D.C. n. 273 del 16/03/2018		Decreto a contrarre		D.C. n. 538 del 07/06/2018		Decreto aggiudicazione definitiva		D.C. n. 1229 del 04/12/2018 e D.C. n. 95 del 28/01/2019	
		Sottoscrizione Contratto		Rep. 193 del 02/04/2019		Registrazione Contratto		Reg. 17/4417 del 02/04/2019		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
										D.C. 584 del 08/05/2019	

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 15 del 12/01/2017		€ 1.300.000,00		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 584 del 08/05/2019		€ 829.525,29	
per lavorazioni		€ 832.716,47		A Per lavorazioni		€ 832.716,47	
di cui per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.249,93		di cui per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 16.249,93	
Importo a base di gara		€ 816.466,54		costi relativi alla manodopera		€ 202.769,97	
Somma a disposizione di cui:		€ 467.289,52		Importo a base di gara		€ 816.466,54	
b1 IVA 22% sui lavori		€ 183.197,62		Importo del ribasso (40,1627%)		€ 327.915,01	
b2 per competenze tecniche oneri compresi				lavori al netto del ribasso		€ 488.551,53	
b2.1 progettazione pre/def/ese, DL, misure e contabilità, sicurezza in		€ 95.000,00		di cui per costi relativi alla sicurezza non soggetti a		€ 16.249,93	
b2.2 Collaudi		€ 10.000,00		Lavori al netto del ribasso		€ 504.801,46	
b2.3 CNPAIA		€ 4.200,00		Somme a disposizione di cui:		324.723,83 €	
b2.4 IVA 22% di b2		€ 24.024,00		B1 Iva sui lavori		€ 111.056,32	
b5 Esproprio		€ 63.000,00		B2 Progettazione pre/def/ese, Direzione Lavori, Misure e		€ 50.117,60	
b6 oneri a conferimento a discarica		€ 7.500,00		Collaudi compreso oneri ed IVA		€ 12.688,00	
b7 per fattibilità ambientale		€ 6.000,00		per esproprio		€ 63.000,00	
b8 per imprevisti 3% circa		€ 23.698,32		B5 Oneri a conferimento a discarica		€ 7.500,00	
b9 per oneri resp.- Proc. ed Int. 2% art. 18		€ 4.163,58		per fattibilità ambientale		€ 6.000,00	
b10 per spese di gara		€ 7.500,00		B7 Imprevisti		€ 23.698,33	
b11 per spese geologiche		€ 18.000,00		B8 Incentivi RUP		€ 4.163,58	
b12 per spese sondaggi		€ 15.000,00		B9 Spese gara di cui € 375 impegnati per ANAC con D.C.		€ 7.500,00	
				spese attività geologiche		€ 18.000,00	
				B11 spese sondaggi		€ 15.000,00	
				B12 spese per ripiantumazione alberi		€ 6.000,00	
b13 per ripiantumazione alben		€ 6.000,00		totale		€ 829.525,29	
totale		€ 1.300.000,00					

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejubente	Elba Assicurazioni Spa	n. Polizza	1413351	Data di sottoscrizione	
		Importo	€ 152.262,00	12/03/2019	

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Michele Perricone	Decreto di nomina	D.C. n. 15 del 12/01/2017 e D.C. n. 273 del 16/03/2018	Supporto al RUP	Progettista	Ing. S. Orlando (Ricognizione Procedura Servizi)	Decreto di nomina	D.C. n. 1295 del 12/12/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione			Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. S. Orlando	Decreto di nomina	D.C. n. 1295 del 12/12/2018	Assistente al DL			Decreto di nomina	
Collaudatore Statico - Tecnico Amministrativo	Ing. Calogero Amato	Decreto di nomina	D.C. n. 1258 del 17/09/2019	Decreto a contrarre (ex art. 36)		D.C. n. 855 del 19/06/2019		

AFFIDATARIA

Affidataria	EDILCAP Srl									
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)										
C.F./P.IVA	05028450871	Indirizzo:	Via Verdi n. 24, 51016 Montecatini Terme (PT)	Tel/Fax:		e-mail/PEC:	edilcap@legalmail.it			

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	04/06/2019	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più	180 gg	giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17593	RESULTTANO	Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo nel comune di Resuttano (CL)					Codice Rendis 191R067/G1				
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE						
CUP	J16J16001790001			Importo Progetto	€ 1.270.000,00	Importo FSC	€ 1.270.000,00				
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto di aggiudicazione	Sottoscrizione contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione				
Decreto finanziamento	D.C. n. 583 del 30/12/2016 D.C. n. 190 del 12/04/2017 D.C. n. 1664 del 19/11/2019 (Integ. € 101.007,35)	Decreto a contrarre	D.C. n. 207 del 18/04/2017	Decreto di aggiudicazione	D.C. n. 618 del 13/09/2017	Sottoscrizione Contratto	Rep. n. 160/2018	Registrazione Contratto	Reg. n. IT 7459 del 12/06/2018	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 698 del 17/07/2018

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 190/2017		€ 1.270.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 698/2018		€ 906.166,14
A	Lavori a base d'asta di cui:	€ 853.313,81	A	Totale al netto compresi oneri della sicurezza di cui:	€ 638.214,21
a1	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 26.548,16	a2	Importo del contratto al netto del ribasso	25,5271% € 611.666,20
a2	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 826.765,65	a1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.548,01
B	Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 416.686,19	B	Somme a disposizione	€ 268.356,93
b1	Imprevisti	€ 24.609,51	b1	IVA sui lavori	€ 140.407,13
b2	IVA 22%	€ 187.729,04	b2	Imprevisti	€ 24.609,51
b3	Competenze tecniche IVA compr.	€ 124.321,55	b3	Competenze tecniche oneri ed IVA inclusi	€ 52.478,10
b4	Inc. art. 92 L. 163/2006 + prest. fuori orario di serv.	€ 35.088,27	b4	art. 113, comma 1, D.Lgs. 50/2016	€ 6.000,00
b5	Prove: statiche, trazione, schiacciamento, ecc.	€ 8.100,00	b5	Prove: statiche, trazione, schiacciamento, ecc.	€ 8.100,00
b6	Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 6.307,19	b6	Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 6.307,19
b7	Contributo AVCP	€ 375,00	b7	Contributo AVCP impegnati con D.C. n. 696 del	€ 405,00
b8	Conferimento in discarica	€ 7.200,00	b8	Conferimento in discarica	€ 7.200,00
b9	Indennità espropriazione ed occup. temporanea - frazion. e	€ 12.850,00	b9	Indennità espropriazione ed occup. temporanea -	€ 12.850,00
b10	Spese pubblicità gara	€ 10.000,00	b10	Spese pubblicità e di gara	€ 10.000,00
	totale	€ 1.270.000,00		Totale da impegnare con il presente decreto	€ 906.166,14

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejubente	Unipol SAI - Divisione SAI	n. Polizza	161150612	Data di sottoscrizione	
		Importo	€ 99.725,00		06/04/2018

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Giuseppe Barbieri	Decreto di nomina	D.C. n. 583 del 30/12/2016	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista		Incarico conferito tramite:	
Servizi di ingegneria DL Assistenza al Collaudo, Prove di Accettazione, Contabilità e CSE	RTP LITOS PROGETTI SRL - Geom. D'Anna	Decreto di nomina/affidamento	D.C. 513 del 02/08/2017	Decreto a contrarre (ex art. 36)		D.C. n. 220 del 28/04/2017	
Direttore Lavori	RTP LITOS PROGETTI SRL - Geom. D'Anna	Decreto di nomina	D.C. 513 del 02/08/2017	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	Ing. Antonio Lanza	Decreto di Nomina Affidamento	D.C. n. 870 del 12/09/2019	Nota di nomina			
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Antonio Lanza	Decreto di Nomina Affidamento	D.C. n. 870 del 12/09/2019	Decreto di Nomina			

AFFIDATARIA

Affidataria	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.												
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)													
C.F. e P.IVA	02236990814	Indirizzo:	Via SS n. 113 Km 322+800 C.da Mulinello Battiato - Alcamo (TP)	Tel/Fax:		tel: fax: e-mail:		Posizione INPS n. SEDE:		Posizione INAIL n. SEDE:		Cassa Edile n. SEDE:	

TEMPISTICA

Data della consegna	05/07/2018	Data del concreto inizio dei lavori	21/09/2018	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	30/04/2019	Nuova Scadenza	17/11/2019
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		Totale gg previsti	300	giorni impiegati in meno	

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	Decreto approvazione perizia variante	D.C. n. 1664 del 19/11/2019	Importo perizia variante	1.007.578,48	Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato	€ 1.007.578,48
tempo utile per l'ultimazione	300 gg	Nuova Scadenza	17/11/2019	importo contrattuale dopo 1 Perizia	di cui	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 18.878,17
1° atto aggiuntivo in data		data di Registrazione		Numero di registrazione		importo Variante € 661.199,67
						somme a disposizione € 327.500,64

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

Anticipazione emessa del 20%		importo stato di avanzamento oltre iva	127.642,84 €	Decreto	D.C. n. 817 del	
------------------------------	--	--	--------------	---------	-----------------	--

CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	01/08/2018		importo oltre IVA	127.642,84 €	Anticipazione del 20%	05/09/2018	Importo	€ 155.724,26		
1° SAL	per lavori a tutto il:	30/11/2018	importo stato di avanzamento oltre iva	65.135,72 €	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 446 del 08/04/2019	Importo	€ 79.587,58		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	08/02/2019		importo oltre IVA	65.235,72 €						
2° SAL	per lavori a tutto il:	17/07/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	145.824,34 €	Decreto di liquidazione SAL n. 2	D.C. n. 1132 del 08/08/2019	Importo	€ 177.905,69		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	17/07/2019		importo oltre IVA	145.824,34 €						
<b>COLLAUDO STATICO</b>										
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>										

Codice Caronte SI_1_17594	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fenomeno franoso nel comune di Santa Caterina Villarmosa (CL)						Codice Rendis 19IR025/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J4616000840001				Importo Progetto	€ 1.298.000,00	Importo FSC	€ 1.298.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 29 del 20/01/2017 - D.C. n. 738 del 24/10/2017	D.C. n. 771 del 07/11/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 83 del 23/01/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 200 del 06/05/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/5940 del 06/05/2019
							Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 677 del 22/05/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 738/2017				€ 1.298.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 677 del 22/05/2019				€ 1.083.117,03
a1	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 16.079,80						€ 737.104,31	
								€ 16.079,80	
								€ 721.024,51	
a2	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 721.024,51						€ 173.846,94	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 560.895,69						€ 547.177,57	
b1	IVA pari al 22% di A	€ 162.162,95						€ 16.079,80	
b2	Espropri ed occupazione temporanea suoli	€ 1.788,96						€ 563.257,37	
b3	Rilievo planoaltimetrico	€ 5.808,35						€ 519.859,66	
b4	progettazione direzione misura e contabilità dei lavori	€ 91.665,64						€ 123.916,62	
b5	coordinatore in materia di sicurezza	€ 32.497,97						€ 1.788,96	
b6	studio geotecnico	€ 35.285,46						€ 7.369,63	
b7	studio di prefattibilità ambientale - relazione paesaggistica	€ 4.347,31						€ 116.305,36	
b8	collaudo statico	€ 5.176,76						€ 41.233,42	
b9	collaudo amministrativo	€ 4.170,65						€ 44.770,19	
b10	IVA e contributi per oneri tecnici	€ 50.786,62						€ 5.515,87	
b11	studio geologico compreso IVA ed oneri cocontributivi	€ 23.466,07						€ 6.568,27	
b12	indagini geognostiche comprensive di IVA	€ 16.056,32						€ 5.291,72	
b13	Prove ed indagini sulle opere comprensive di IVA	€ 54.359,95						€ 23.466,07	
b14	Responsabile Unico del Procedimento (2%*0,25 di A)	€ 3.685,52						€ 16.056,32	
b15	Oneri di conferimento a discarica	€ 4.435,71						€ 54.359,95	
b16	spese per la pubblicazione atti di gara	€ 8.000,00						€ 3.685,52	
b17	imprevisti ed arrotondamenti (<5% di A)	€ 21.923,08						€ 4.435,71	
b18	oneri per piano di monitoraggio comprensivi di IVA	€ 35.278,37						€ 7.894,60	
	<b>totale</b>	<b>€ 1.298.000,00</b>						<b>€ 1.083.117,03</b>	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejubente	ITAS MUTUA	n. Polizza	E1476525	Data di sottoscrizione	14/03/2019	Importo	63.585,45 €
-------------	------------	------------	----------	------------------------	------------	---------	-------------

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Michele Dell'Uomini	Decreto di nomina	D.C. n. 752 del 31/10/2017	Supporto al RUP	Geom. Di Cara	Decreto di nomina	D.C. n. 752 del 31/10/2017
				Progettista	Società Ingegneria LITOS PROGETTI Sr	Incarico conferito tramite:	Provvedimento Sindacale n. 26 del 26/09/2007
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Geol. Gaetano Punzi	Incarico conferito tramite:	Det. Sindacale n. 25 del 26/09/2007	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Ippolito	Decreto di nomina	D.C. n. 1220 del 04/12/2018
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	D.C. n. 759 del 02/11/2017	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Papalia	Decreto di nomina	D.C. n. 1061 del 31/07/2019	Decreto a contrarre (Ex art. 36)		D.C. n. 868 del 20/06/2019	

AFFIDATARIA

Affidataria **CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpa**

dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

C.F. e P.IVA	P.I. 00966060378	Indirizzo:	Via Pier Traversari n. 63, 481251, Ravenna	Tel:	0544 218138
--------------	------------------	------------	--	------	-------------

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	18/06/2019	Data del contratto inizio dei lavori	09/07/2019	Scadenza tempo utile per l'attuazione dei lavori	30/07/2019	Nuova Scadenza	09/10/2019
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più	90	giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

Anticipazione emessa del 20%		Importo stato di avanzamento oltre iva	112.651,47 €	Decreto Anticipazione del 20%	D.C. n. 1122 del 06/08/2019	Importo	€ 137.434,79
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	24/07/2019	importo oltre IVA	112.651,47 €				

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17793	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena (CL)										Codice Rendis 19IR92/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO					MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE						
CUP	J99D16002760001					Importo Progetto	€ 652.728,00			Importo FSC	€ 652.728,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato		Decreto a contrarre		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. n. 497 del 05/06/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 630 del 02/07/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1164 del 22/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Rep. 181 del 07/03/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/73177 del 07/03/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 350 del 19/03/2019	

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento D.C. 497 del 05/06/2018		€ 652.728,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 349/2019		€ 459.705,11																																																																																					
<table border="1"> <tr><td>IMPORTO DEI LAVORI</td><td>€ 472.052,02</td></tr> <tr><td>Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori</td><td>€ 5.491,86</td></tr> <tr><td>Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori</td><td>€ 9.027,48</td></tr> <tr><td>Totale oneri di sicurezza (3,076% sull'importo dei lavori)</td><td>€ 14.519,32</td></tr> <tr><td>Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso</td><td>€ 457.532,70</td></tr> <tr><td>Somma a disposizione di cui:</td><td>€ 180.675,98</td></tr> <tr><td>IVA sui lavori</td><td>€ 103.851,44</td></tr> <tr><td>Variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 IVA</td><td>€ 42.484,68</td></tr> <tr><td>Oneri di conferimento a discarica</td><td>€ 4.200,00</td></tr> <tr><td>Incentivi funzionali tecniche dei dipendenti P.A. art. 113 D.Lgs.</td><td>€ 9.441,04</td></tr> <tr><td>Polizze rischi professionali personale interno per</td><td>€ 1.000,00</td></tr> <tr><td>Competenze per assistenza, controllo e verifica attività di</td><td>€ 9.473,82</td></tr> <tr><td>Versamenti di autorità di vigilanza LL.PP.</td><td>€ 225,00</td></tr> <tr><td>Analisi e prove di laboratorio</td><td>€ 5.000,00</td></tr> <tr><td>Spese per eventuali occupazioni temporanee, risarcimenti</td><td>€ 5.000,00</td></tr> <tr><td><b>totale</b></td><td><b>€ 652.728,00</b></td></tr> </table>		IMPORTO DEI LAVORI	€ 472.052,02	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 5.491,86	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 9.027,48	Totale oneri di sicurezza (3,076% sull'importo dei lavori)	€ 14.519,32	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 457.532,70	Somma a disposizione di cui:	€ 180.675,98	IVA sui lavori	€ 103.851,44	Variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 IVA	€ 42.484,68	Oneri di conferimento a discarica	€ 4.200,00	Incentivi funzionali tecniche dei dipendenti P.A. art. 113 D.Lgs.	€ 9.441,04	Polizze rischi professionali personale interno per	€ 1.000,00	Competenze per assistenza, controllo e verifica attività di	€ 9.473,82	Versamenti di autorità di vigilanza LL.PP.	€ 225,00	Analisi e prove di laboratorio	€ 5.000,00	Spese per eventuali occupazioni temporanee, risarcimenti	€ 5.000,00	<b>totale</b>	<b>€ 652.728,00</b>	<table border="1"> <tr><td>A</td><td>Importo dei lavori</td><td>€ 472.052,02</td></tr> <tr><td>A1</td><td>Oneri speciali sicurezza, già inclusi nei lavori</td><td>€ 9.027,46</td></tr> <tr><td>A2</td><td>Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso</td><td>€ 463.024,56</td></tr> <tr><td>A3</td><td>Importo del ribasso</td><td>€ 158.215,49</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Importo dei lavori al netto del ribasso</td><td>€ 304.809,07</td></tr> <tr><td>A5</td><td>Totale oneri della sicurezza</td><td>€ 9.027,46</td></tr> <tr><td>A6</td><td>Importo dei lavori al netto del ribasso compresi oneri</td><td>€ 313.836,53</td></tr> <tr><td>B</td><td>Somma a disposizione di cui:</td><td>€ 145.868,58</td></tr> <tr><td>B1</td><td>IVA sui lavori</td><td>€ 69.044,04</td></tr> <tr><td>B2</td><td>Variazioni contrattuali</td><td>€ 42.484,68</td></tr> <tr><td>B3</td><td>Oneri di sconferimento in discarica</td><td>€ 4.200,00</td></tr> <tr><td>B4</td><td>Incentivi funzionali tecniche dei dipendenti P.A.</td><td>€ 9.441,04</td></tr> <tr><td>B5</td><td>Polizze rischi professionali personale interno per</td><td>€ 1.000,00</td></tr> <tr><td>B6</td><td>Competenze per assistenza, controllo e verifica attività</td><td>€ 9.473,82</td></tr> <tr><td>B7</td><td>Versamenti di autorità di vigilanza LL.PP.</td><td>€ 225,00</td></tr> <tr><td>B8</td><td>Analisi e prove di laboratorio</td><td>€ 5.000,00</td></tr> <tr><td>B9</td><td>Spese per eventuali occupazioni temporanee,</td><td>€ 5.000,00</td></tr> <tr><td><b>totale</b></td><td><b>€ 459.705,11</b></td></tr> </table>		A	Importo dei lavori	€ 472.052,02	A1	Oneri speciali sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 9.027,46	A2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 463.024,56	A3	Importo del ribasso	€ 158.215,49	A4	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 304.809,07	A5	Totale oneri della sicurezza	€ 9.027,46	A6	Importo dei lavori al netto del ribasso compresi oneri	€ 313.836,53	B	Somma a disposizione di cui:	€ 145.868,58	B1	IVA sui lavori	€ 69.044,04	B2	Variazioni contrattuali	€ 42.484,68	B3	Oneri di sconferimento in discarica	€ 4.200,00	B4	Incentivi funzionali tecniche dei dipendenti P.A.	€ 9.441,04	B5	Polizze rischi professionali personale interno per	€ 1.000,00	B6	Competenze per assistenza, controllo e verifica attività	€ 9.473,82	B7	Versamenti di autorità di vigilanza LL.PP.	€ 225,00	B8	Analisi e prove di laboratorio	€ 5.000,00	B9	Spese per eventuali occupazioni temporanee,	€ 5.000,00	<b>totale</b>	<b>€ 459.705,11</b>	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	
IMPORTO DEI LAVORI	€ 472.052,02																																																																																									
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 5.491,86																																																																																									
Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 9.027,48																																																																																									
Totale oneri di sicurezza (3,076% sull'importo dei lavori)	€ 14.519,32																																																																																									
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 457.532,70																																																																																									
Somma a disposizione di cui:	€ 180.675,98																																																																																									
IVA sui lavori	€ 103.851,44																																																																																									
Variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 IVA	€ 42.484,68																																																																																									
Oneri di conferimento a discarica	€ 4.200,00																																																																																									
Incentivi funzionali tecniche dei dipendenti P.A. art. 113 D.Lgs.	€ 9.441,04																																																																																									
Polizze rischi professionali personale interno per	€ 1.000,00																																																																																									
Competenze per assistenza, controllo e verifica attività di	€ 9.473,82																																																																																									
Versamenti di autorità di vigilanza LL.PP.	€ 225,00																																																																																									
Analisi e prove di laboratorio	€ 5.000,00																																																																																									
Spese per eventuali occupazioni temporanee, risarcimenti	€ 5.000,00																																																																																									
<b>totale</b>	<b>€ 652.728,00</b>																																																																																									
A	Importo dei lavori	€ 472.052,02																																																																																								
A1	Oneri speciali sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 9.027,46																																																																																								
A2	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 463.024,56																																																																																								
A3	Importo del ribasso	€ 158.215,49																																																																																								
A4	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 304.809,07																																																																																								
A5	Totale oneri della sicurezza	€ 9.027,46																																																																																								
A6	Importo dei lavori al netto del ribasso compresi oneri	€ 313.836,53																																																																																								
B	Somma a disposizione di cui:	€ 145.868,58																																																																																								
B1	IVA sui lavori	€ 69.044,04																																																																																								
B2	Variazioni contrattuali	€ 42.484,68																																																																																								
B3	Oneri di sconferimento in discarica	€ 4.200,00																																																																																								
B4	Incentivi funzionali tecniche dei dipendenti P.A.	€ 9.441,04																																																																																								
B5	Polizze rischi professionali personale interno per	€ 1.000,00																																																																																								
B6	Competenze per assistenza, controllo e verifica attività	€ 9.473,82																																																																																								
B7	Versamenti di autorità di vigilanza LL.PP.	€ 225,00																																																																																								
B8	Analisi e prove di laboratorio	€ 5.000,00																																																																																								
B9	Spese per eventuali occupazioni temporanee,	€ 5.000,00																																																																																								
<b>totale</b>	<b>€ 459.705,11</b>																																																																																									

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejussore	Finanziaria Romana Spa	n. Polizza	06/01/21/2948809	Data di sottoscrizione	22/01/2019
		Importo	€ 75.855,00		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Maurizio Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 699 del 16/10/2017	Supporto al RUP	Collab. Sig.ra Lidia Argento	Decreto di nomina	D.C. n. 699 del 16/10/2017
				Progettista	Ing. Carmelo Arceri	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 699 del 16/10/2017
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Geom. Emanuele Miliotto (CSP) - Geol. Carmelo Collura, Geol. Carmelo Schembri (collaborazione alla progettazione)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 699 del 16/10/2017	Coord Sicurezza fase Esecuzione			
Direttore Lavori	Ing. Carmelo Arceri	Decreto di nomina	D.C. n. 699 del 16/10/2017	Assistente al DL	Geol. Carmelo Collura, Geol. Carmelo Schembri	Decreto di nomina	D.C. n. 699 del 16/10/2017
Direttore Operativo	Ing. Emanuele Miliotto	Decreto di nomina	D.C. n. 925 del 02/10/2018				
Ispettore di Cantiere	Geol. Carmelo Collura - Geol. Carmelo Schembri	Decreto di nomina	D.C. n. 925 del 02/10/2018				

AFFIDATARIA

Affidataria	Nocifora Tiranno Vincenzo						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
CF/P.IVA	018350833	Indirizzo:	Contrada Muti, 5 - 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)	Tel/Fax:	0941 703194	e-mail/PEC:	nocifora.costruzioni@alice.it

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	13/03/2019	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga	45	totale gg previsti	120	giorni impiegati in più	

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	Decreto approvazione perizia variante	D.C. n. 1250 del 16/09/2019	Importo perizia variante	459.705,11 €	Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato		€ 459.705,11
tempo utile per l'ultimazione	Nuova Scadenza		importo contrattuale dopo 1 Perizia		di cui	Importo dei lavori al netto del ribasso compresi oneri	€ 357.437,57
1° atto aggiuntivo in data	data di Registrazione		Numero di registrazione			somme a disposizione	102.267,54

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

Anticipazione emessa del 20%		Importo stato di avanzamento oltre IVA	62.767,31 €	Decreto Anticipazione del 20%	D.C. n. 809 del 12/06/2018	Importo	€ 76.576,12	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	27/05/2019	importo oltre IVA	62.767,31 €					
1° SAL	per lavori a tutto il:	19/07/2019	importo stato di avanzamento oltre IVA	208.871,98 €	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 1352 del 02/10/2019	Importo	€ 254.823,82
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	09/08/2019	importo oltre IVA	208.871,98 €					

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17610	<b>MALETTO</b>	<b>Consolidamento a protezione dell'abitato stralcio completamente relativo alla zona R4 Rocca del Castello nel comune di Maletto (CT)</b>								<b>Codice Rendis</b> 19IR995/G1	
<b>Livello di Progettazione Iniziale</b>	<b>ESECUTIVO</b>				<b>Tipo di dissesto</b>	<b>FRANA</b>					
<b>CUP</b>	J4616000850001				<b>Importo Progetto</b>	€ 1.350.000,00		<b>Importo FSC</b>	€ 1.350.000,00		
<b>Decreto finanziamento Servizi</b>	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		<b>Sottoscrizione Contratto</b>	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
<b>Decreto finanziamento</b>	D.C. n. 30/2017 - D.C. n. 186 del 27/02/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 809 del 31/08/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 149 del 07/02/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 195 del 10/04/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/4823 del 10/04/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 683 del 22/05/2019

**LAVORI IN CORSO**

**DATI FINANZIARI D.C. n. 186 del 27/02/2018**

<b>Importi Decreto di Finanziamento n.</b>		€ 1.840.000,00	<b>Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 683 del 22/05/201</b>	€ 998.813,27		
<b>A</b>	<b>Sommario lavori complessivi di cui</b>	€ 1.212.301,35	<b>A</b>	<b>Lavori</b>	€ 863.658,64	
a1	Costi della Manodopera	€ 325.281,56		Oneri per la sicurezza (non sogg. Ribasso)	€ 99.420,40	
a2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a	€ 10.928,00		Lavori soggetti al ribasso	€ 764.238,24	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.201.373,35		Importo del ribasso	€ 287.857,98	
	<b>Somma a disposizione di cui:</b>	€ 627.698,65		Lavori al netto del ribasso	€ 476.380,26	
	IVA sui lavori	€ 266.706,30		A1	Oneri della sicurezza	€ 99.420,40
	Imprevisti	€ 60.000,00		A2	Lavori al netto del ribasso compresi oneri della	€ 575.800,66
	Acquisizione aree o immobili e occupazione temporanea	€ 30.000,00		A	<b>Somme a disposizione di cui:</b>	€ 423.012,61
	Spese Tecniche relative alla progettazione, coordinamento	€ 117.944,63		B	IVA	€ 126.676,15
	Spese tecniche geologica compreso IVA e Oneri	€ 28.865,02			Indennità occupazioni temporanee	€ 2.250,00
	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-	€ 6.000,00			Spese gara e ANAC di cui 375 già impegnate con	€ 11.712,00
	Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs	€ 24.246,03			Fondo UTC	€ 17.273,17
	Collaudo tecnico e statico	€ 35.550,50			Spese per verifiche	€ 11.783,48
	Oneri conferimento in discarica	€ 27.886,17			Spese tecniche	€ 223.951,27
	Spese tecniche ex art. 167 c. 7 DPR 207/2010 compreso IVA	€ 18.500,00			Imprevisti e/o arrotondamenti	€ 29.366,54
	Spese di pubblicazione di gara e commissione aggiudicatrice	€ 12.000,00				
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>					
	<b>totale</b>	€ 1.840.000,00			<b>totale</b>	€ 998.813,27

**ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA**

**CAUZIONI E GARANZIE**

**Fidejussione**

<b>Fidejussante</b>	Elba Assicurazioni Spa	<b>n. Polizza</b>	2019/50/2209/243	<b>Data di sottoscrizione</b>	
		<b>importo</b>	€ 159.305,00		22/03/2019

**FIGURE TECNICHE**

<b>RUP</b>	Geom. Antonino Giovanni Giuffrida	<b>Decreto di nomina</b>	D.C. n. 30 del 20/01/2017	<b>Supporto al RUP</b>	Geom. Capizzi Alberto Agron. Tirendi Vincenzo	<b>Decreto di nomina</b>	D.C. n. 1661 del 19/11/2019
				<b>Progettista</b>	Studio TETA Ingegneria Srl	<b>Incarico conferito tramite:</b>	Det. sindacale n. 57 del 11/12/2009
<b>Coord Sicurezza fase Progett.</b>	Studio TETA Ingegneria Srl	<b>Incarico conferito tramite:</b>	Det. sindacale n. 57 del 11/12/2009	<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>	Arch. Giovanni Longhitano	<b>Decreto di nomina</b>	D.C. n. 1626 del 13/11/2019
<b>Direttore Lavori</b>	Ing. Giuseppe Mineo	<b>Decreto di nomina</b>	D.C. n. 1626 del 13/11/2019	<b>Assistente al DL</b>		<b>Decreto di nomina</b>	
<b>Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo</b>	Ing. Antonio Moschella	<b>Decreto di Nomina Affidamento</b>	D.C. n. 1261 del 17/09/2019	<b>Decreto a contrarre (Ex art. 36)</b>	D.C. n. 662 del 20/05/2019		

**AFFIDATARIA**

**CO.I.V. DI RACIELI SALVATORE**

dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

<b>C.F. e P.IVA</b>	02667840793 RCHSVT58TOSD123E	<b>Indirizzo:</b>	Via dei Laghi Silani 147	<b>Tel/Fax:</b>	096 24 42 89	<b>tel:</b>		<b>Posizione INPS</b>	n.	<b>Posizione INAIL</b>	n.	<b>Cassa Edile</b>	n.
				<b>fax:</b>		<b>e-mail:</b>			SEDE:		SEDE:		SEDE:

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

**TEMPISTICA**

<b>Data della consegna</b>	15/04/2019	<b>Data del concreto inizio dei lavori</b>		<b>Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori</b>		<b>Nuova Scadenza</b>	
<b>n. gg Eventuale Sospensione</b>		<b>n. gg Eventuale Proroga</b>		<b>totale gg previsti</b>	150	<b>giorni impiegati in più</b>	
						<b>giorni impiegati in meno</b>	

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

<b>Anticipazione del 20%</b>		<b>per lavori a tutto il:</b>		<b>importo oltre iva</b>	€ 115.160,13	<b>Decreto di Anticipazione del 20%</b>	D.C. n. 1579 del 05/11/2019	<b>importo</b>	€ 140.495,36
<b>CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA</b>				<b>importo oltre iva</b>	€ 115.160,13				

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**

Codice Caronte SI_1_19278	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambelia nel comune di Militello in Val di Catania (CT)						Codice Rendis 19IRF12/G1	
Livello di Progettazione Iniziale		ESECUTIVO				Tipo di dissesto		FRANE	
CUP		J74J1600010001				Importo Progetto		€ 1.270.000,00	
Decreto finanziamento Servizi		Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	
D.C. n. 27 del 09/01/2019		D.C. n. 41 del 16/01/2019		D.C. n. 193 del 13/02/2019		Rep. 196 del 10/04/2019 - (PVS) Rep 242 del 24/09/2019 -		Reg. 117/4858 del 10/04/2019 Reg. 117/9710 del 24/09/2019	
								Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
								D.C. n. 558 del 06/05/2019 -	

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 27 del 09/01/2019		€ 995.000,00		Importi Decreto n. 558 del 06/05/2019 di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
A	IMPORTO DEI LAVORI			Importo Complessivo dei Lavori	
A1	TOTALE LAVORI a misura	€ 768.563,54		€ 768.563,54	
	Oneri speciali sicurezza	€ 10.721,01		Importo dei lavori a base d'asta	
	Totale Lavori a base d'asta	€ 757.842,53		€ 757.842,53	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 226.436,46		Lavori al netto del ribasso	
B1	IVA sui lavori	€ 169.083,98		€ 483.094,30	
B2	Accantonamento 2% incentivo art. 113 comma 2-3-4 d.lgs	€ 12.297,02		Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	
B3	Accantonamento 2% incentivo art. 113 comma 2-3-4 d.lgs	€ 3.074,25		€ 493.815,31	
B4	Accantonamento per missioni e trasferte	€ 5.000,00		B Somma a disposizione di cui:	
B5	Spese pubblicità	€ 10.000,00		€ 155.991,85	
B6	ANAC	€ 600,00		b.1 IVA 22% sull'importo totale dei lavori	
B7	Polizza assicurativa dei dipendenti incaricati alla	€ 2.500,00		€ 108.639,37	
B8	Imprevisti e arrotondamenti	€ 23.881,21		b.2 Accantonamento 2% incentivo art. 113 comma 2-3-4 D.Lgs	
	Totale	€ 995.000,00		€ 12.297,02	
				b.3 Accantonamento 2% incentivo art. 113 comma 2-3-4 D.Lgs	
				€ 3.074,25	
				b.4 Accantonamento per missioni e trasferte	
				€ 5.000,00	
				b.5 Contributo ANAC	
				€ 600,00	
				b.6 Polizza assicurativa dei dipendenti incaricati alla	
				€ 2.500,00	
				b.7 Imprevisti e arrotondamenti	
				€ 23.881,21	
				Totale	
				€ 649.807,16	

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejubente	Società Cattolica di Assicurazioni Società (Appendice n.2)	n. Polizza	05117291000249	Data di sottoscrizione	09/09/2019
		Importo	€ 15.800,00		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Natale Zuccarello	Decreto di nomina	D.C. n. 18 del 09/01/2018	Supporto al RUP	Progettista	Arch. Gino Montecchi	Decreto di nomina	D.C. n. 18 del 09/01/2018
Coord Sicurezza fase Progett.	Geom. Raffaele Avallone	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 18 del 09/01/2018	Coord Sicurezza fase Esecuzione		Geom. Raffaele Avallone	Decreto di nomina	D.C. n. 18 del 09/01/2018
Direttore Lavori	Arch. Gino Montecchi	Decreto di nomina	D.C. n. 18 del 09/01/2018	Direttore Operativo e Collaboratore DL		Dott. Vincenzo Vanella	Decreto di nomina	D.C. n. 18 del 09/01/2018
Servizi geologici	Geol. Sebastiano Bongiovanni	Decreto di nomina	D.C. n. 18 del 09/01/2019					
Collaudatore Statico	Ing. Laudani Gaetano	Decreto di nomina	D.C. n. 415 01/04/2019	Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione			
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Laudani Gaetano	Decreto di nomina	D.C. n. 415 01/04/2019	Nota di nomina	Decreto di Nomina a seguito accettazione			

AFFIDATARIA

Affidataria	CIASULLO COSTRUZIONI SRL						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F. e P.IVA	2540020647	Indirizzo:	C.da Ormeta n. 164/B, 83031 - Ariano Irpino (AV)	Tel/Fax:	0825/826619	e-mail/PEC	info@ciasullocostruzioni.it

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	13/02/2019	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	28/04/2019	Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più	75	giorni impiegati in meno	

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	31/07/2019	Decreto approvazione perizia variante	D.C. n. 1142 del 08/08/2019	importo perizia variante		Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato D.C. n. 1142/2019		
tempo utile per l'ultimazione		Nuova Scadenza		importo contrattuale dopo 1 Perizia		A	Importo complessivo lavori	1.148.514,14 €
							Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	23.686,59 €
							Importo dei lavori a base d'asta	1.124.827,55 €
							Importo del ribasso d'asta	407.794,98 €
						a.1	Lavori al netto del ribasso	717.032,57 €
						a.2	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	23.686,59 €
						A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	740.719,16 €
						B	Somme a disposizione di cui	186.429,49 €
						b.1	IVA sull'importo totale dei lavori	162.958,22 €
						b.2	Accantonamento 2% incentivo art. 113	12.297,02 €
						b.3	Accantonamento 2% incentivo art. 114	3.074,25 €
						b.4	Accantonamento per missioni e trasferte	5.000,00 €
						b.5	Contributo ANAC	600,00 €
						b.6	Polizza assicurativa dei dipendenti incaricati alla progettazione	2.500,00 €
						b.7	Imprevisti e arrotondamenti	
						C	Totale costo intervento	927.148,65 €



**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

1° SAL	per lavori a tutto il:	01/04/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 145.461,96	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 566 del 07/05/2019	importo	€ 177.463,59		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	Prot. N. 80996 del 11/04/2019		importo oltre iva	€ 145.461,96						
2° SAL	per lavori a tutto il:	26/04/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 99.364,00	Decreto di liquidazione SAL n. 2	D.C. n. 720 del 30/05/2019	importo	€ 121.224,08		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	Prot. N. 93053 del 03/05/2019		importo oltre iva	€ 99.364,00						
3° SAL	per lavori a tutto il:	21/09/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 458.857,23	Decreto di liquidazione SAL n. 3	D.C. n. 1617 del 08/11/2019	importo	€ 559.805,82		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	Prot. N. 7144 del 15/10/2019		importo oltre iva	€ 458.857,23						

**COLLAUDO STATICO**
**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**

Codice Caronte SI_1_18833	VIZZINI	Consolidamento Zona Piazza De Gasperi nel comune di Vizzini (CT)						Codice Rendis 19IRA67/G1			
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				FRANA						
CUP	J97D16000020001				Importo Progetto	€ 1.500.000,00	Importo FSC	€ 1.500.000,00			
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione						
Decreto finanziamento	D.C. n. 1094 del 09/11/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1173 del 26/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 983 del 16/07/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. n. 246 del 09/10/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/11401 del 09/10/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 1576 del 05/11/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento n. 1094 del 09/11/2018		€ 1.500.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 994.793,40
Importo complessivo Lavori		€ 1.000.000,00	A	Importo dei lavori a misura		€ 1.000.000,00	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 956.633,92	A1	Importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.366,08	
Oneri speciali di sicurezza da PSXC non soggetti a ribasso		€ 43.366,08		Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso		€ 956.633,92	
Somme a disposizione di cui:		€ 500.000,00		Importo del ribasso		€ 414.595,57	
IVA sui lavori		€ 220.000,00		Lavori al netto del ribasso		€ 542.038,35	
Imprevisti		€ 48.798,66		Importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 43.366,08	
Competenze tecniche		€ 114.027,97		Totale dei lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 585.404,43	
Competenze tecniche e collaudi comprensivo di oneri e		€ 34.876,74		Somme a disposizione		€ 409.388,97	
Incentivi progettazione Art. 113 Dlgs 50/2016		€ 10.000,00		B1 IVA		€ 128.788,97	
Oneri di conferimento in centro di riutilizzo		€ 12.824,10		B2 Imprevisti sui lavori		€ 48.798,66	
Espropri		€ 653,59		B3 Spese tecniche per progettazione definitiva, DL, CSP, CSE		€ 114.027,97	
Studio geologico-tecnico, oneri compresi		€ 21.986,67		B4 Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera		€ 34.876,74	
Indagini geognostiche, oneri compresi		€ 21.832,27		B5 Incentivo interno art. 113 D.Lgs 50/196		€ 10.000,00	
Spese per prove e verifiche		€ 10.000,00		B6 Oneri di conferimento in centro di utilizzo		€ 12.824,10	
Spese per commissioni di gara		€ 5.000,00		B7 Espropri		€ 653,59	
Totale		€ 1.500.000,00		B8 Studio geologico - tecnico		€ 21.986,67	
				B9 Indagini geognostiche oneri compresi		€ 21.832,27	
				B10 Spese per prove e verifiche		€ 10.000,00	
				B11 Spese per commissioni di gara		€ 5.000,00	
				B12 ANAC		€ 600,00	
				totale		€ 994.793,40	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA							

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	City Insurance Compagnia Assic. Bucarest	n. Polizza	IM 000012293	Data di sottoscrizione	29/08/2019		
		Importo	€ 156.134,38				

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Salvatore Lentini	Decreto di nomina	D.C. n. 308 del 01/06/2017	Supporto al RUP	Progettista	Decreto di nomina	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progettazione		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Sandro Cantale	Decreto di nomina	D.C. n. 1135 del 19/11/2018
Direttore Lavori	Ing. Sandro Cantale	Decreto di nomina	D.C. n. 1135 del 19/11/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Decreto di Nomina			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Decreto di Nomina			

AFFIDATARIA

Affidataria	AVENI S.R.L.						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F. e P.IVA	02675130831	Indirizzo:	Via Moletti n. 20, Barcellona P.G. (ME)	Tel/Fax:	090 979 8103	e-mail/PEC:	avenisrl@virgilio.it

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	15/11/2019	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	11/09/2020	Riavvio Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		Totale gg previsti	301	giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

Anticipazione del 20%		importo oltre IVA	117.080,89 €	Decreto di Anticipazione del 20%	D.C. n. 1825 del 09/11/2019	importo	142.838,69 €
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	28/11/2019	importo oltre IVA	117.080,89 €				

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17621	AIDONE	Completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica_zona Castello nel comune di Aidone (EN)							Codice Rendis 19IR334/G1		
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA					
CUP	J99D16002590001				Importo Progetto	€ 1.350.000,00	Importo FSC	€ 1.350.000,00			
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazioni e Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione						
Decreto finanziamento	D.C. n. 667 del 30/10/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 720 del 20/10/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1047 del 06/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Rep. 178 del 06/03/2020	Registrazioni e Contratto	Reg. 17/3112 del 06/03/2020	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 336 del 13/03/2019

**LAVORI IN CORSO**

**DATI FINANZIARI**

Importi Decreto di Finanziamento n. 667 del 30/10/2017		€ 1.350.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE n. 336 del 13/03/2019		€ 1.004.350,51
a1	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 930.259,35	Totale lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 930.259,35
a2	Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.745,85	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 35.745,85
			Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 894.513,50
			Importo del ribasso (31,6730%)		€ 283.319,26
			Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 611.194,23
			Importo dei lavori al netto del ribasso compresi oneri		€ 646.940,08
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 894.513,50	Somme a disposizione di cui:		€ 357.410,43
	Somma a disposizione di cui:	€ 419.740,67	IVA sui lavori		€ 142.326,82
b1	IIVA sui lavori	€ 204.657,06	Incentivi tecnici		€ 17.146,54
b2	Incentivi tecnici art. 113 del DLgs 50/16	€ 17.146,54	Imprevisti 0,81 % dell'importo		€ 7.564,94
b3	Imprevisti 0,81% dell'importo	€ 7.564,94	Compenso per servizi di ingegneria e indagini di		€ 171.997,13
b4	servizi di ingegneria e indagini di laboratorio	€ 171.997,13	Commissione gara affidamento lavori e servizi di		€ 12.000,00
b5	gara affidamento lavori e servizi di ingegneria	€ 12.000,00	Spese gara lavori		€ 4.000,00
b6	spese per pubblicità e gara lavori	€ 4.000,00	Anac già impegnato con decreto n. 22/2018		€ 375,00
b7	costi vivi sul progetto	€ 375,00	Conferimento in discarica		€ 2.000,00
b8	Conferimento in discarica	€ 2.000,00			
	<b>totale</b>	<b>€ 1.350.000,00</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 1.004.350,51</b>

**ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA**

**CAUZIONI E GARANZIE**

**Fidejussione**

Fidejubente	Bene Assicurazioni Spa	n. Polizza	1003810000618	Data di sottoscrizione	21/01/2019
		Importo	€ 112.169,04		

**FIGURE TECNICHE**

RUP	P.I. Angelo Drago	Decreto di nomina	D.C. n. 364 del 13/06/2017	Supporto al RUP	Ing. Ciro Azzara	Decreto di nomina	Decreto n. 364 del 13/06/2017
				Progettista	Ing. Filippo Giustra	Determina di Nomina	Det. n. 07 del 09/03/2017
Servizi Geologici	Dott.ssa Marzia Petralia	Determina di Nomina	Det. n. 70 del 26/04/2017				
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Filippo Giustra	Decreto di nomina	D.C. n. 1028 del 29/10/2018
Direttore Lavori	Ing. Filippo Giustra	Decreto di nomina	D.C. n. 1028 del 29/10/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico				Decreto di Nomina			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Decreto di Nomina			

**AFFIDATARIA C.F.C. Soc. Coop.**

Affidataria	C.F.C. Soc. Coop.										
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)											
C.F. e P.IVA	00447840356	Indirizzo:	Via Pansa, 551 - CAP 42124 - Reggio Emilia	Tel/Fax:	0522278082	e-mail/pec:	ammeneefc@tin.it				

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

**TEMPISTICA**

Data della consegna	08/04/2019	Data del concreto inizio dei lavori	15/04/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	04/09/2019	Nuova Scadenza dopo sospensione	
DATA SOSPENSIONE		DATA RIPRESA		Nuova Scadenza dopo proroga		Nuova Scadenza dopo Perizia	
DATA FINE LAVORI		DATA ULTIMA CONCESSA NEL CERTIFICATO FINE					
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	150	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

1° SAL	per lavori a tutto il:	26/04/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 201.121,10	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 719 del 30/05/2019	Importo	€ 245.367,64		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	14/05/2019	importo oltre IVA	€ 201.121,10							
2° SAL	per lavori a tutto il:	10/08/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 201.910,10	Decreto di liquidazione SAL n. 2	D.C. n. 1564 del 04/11/2019	Importo	€ 246.330,32		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	26/09/2019	importo oltre IVA	€ 201.910,10							
3° SAL	per lavori a tutto il:	30/10/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 205.549,53	Decreto di liquidazione SAL n. 3	D.C. n. 1895 del 16/12/2019	Importo	€ 250.770,43		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	03/12/2019	importo oltre IVA	€ 205.549,53							

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17813	ISPICA	Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del Focallo - Ispica (RG)						Codice Rendis 19IR535/G1			
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO			Tipo di dissesto	COSTIERO						
CUP	J79D16001940001			Importo Progetto	€ 15.750.000,00	Importo FSC	€ 12.150.000,00				
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione					
Decreto finanziamento	D.C. n. 235 del 03/03/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 322 del 10/04/2018	Decreto aggiudicazione	D.C. n. 1186 del 28/11/2018 - D.C. n. 98 del 28/01/2019 (efficacia)	Sottoscrizione Contratto	Rep. n. 233 del 02/09/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/7930 del 02/09/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 1729 del 27/11/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 235/2018		€ 12.150.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato D.C. n. 1729/2019		€ 9.586.609,75
Importo dei lavori	€ 8.702.386,35	Lavori	€ 8.954.487,45		
Costi della sicurezza 2,90%	€ 252.101,10	Costo oneri sicurezza speciali	€ 252.101,00		
Totale Lavori (A)	€ 8.954.487,45	Resta importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 8.702.386,35		
Somma a disposizione di cui:	€ 3.195.512,55	Importo del ribasso	€ 2.028.091,14		
a) Lavori in economia		Lavori al netto del ribasso	€ 6.674.295,21		
b1) Rilievi Planaltimetrici e Batimetrici comprensivi di IVA e Cassa		Importo dei costi edila sicurezza non soggetti a ribasso	€ 252.101,10		
b2) Indagini Geognostiche comprensive di IVA e		Totale lavori al netto del ribasso	€ 6.926.396,31		
b3) Monitoraggio Satellitare comprensivo di IVA e	€ 64.217,40	Somme a disposizione	€ 2.660.213,44		
c) Allacciamenti ai pubblici servizi		B1 IVA	€ 1.523.807,19		
l) Maggiori lavori imprevisi ed arrotondamenti; 4,45%	€ 407.296,45	B2 Lavori in economia	€ 0,00		
e) Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 26		B3 Rilievi Planaltimetrici e batimetrici	€ 0,00		
f) Spese per asservimento aree		B4 Indagini geognostiche	€ 0,00		
g) R.U.P.	€ 62.681,41	B5 Monitoraggio satellitare	€ 64.217,40		
h) Studi specialistici a supporto della progettazione		B6 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00		
i) Spese per procedure di gara e pubblicità	€ 28.000,00	B7 Maggiori lavori imprevisi ed arrotondamenti	€ 407.296,45		
l) Spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei	€ 50.000,00	B8 Incremento del prezzo	€ 0,00		
m) Spese per collaudi (comprensive IVA e CASSA)	€ 80.900,78	B9 Spese per asservimento aree	€ 0,00		
n) I.V.A. 22%	€ 1.969.987,24	B10 RUP	€ 62.681,41		
o) Spese sostenute per redazione indagini propedeutiche al progetto preliminare		B11 Studi specialistici a supporto della progettazione definitiva	€ 0,00		
p) Onori di accesso alla discarica	€ 15.000,00	B12 Spese per procedure di gara e pubblicità	€ 41.355,07		
q) Spese tecniche adeguamento progetto Definitivo		B13 Spese per le verifiche ordinate dal DL	€ 50.000,00		
Piano Sicurezza e Coordinamento (compr. Oneri e IVA)	€ 23.940,02	B14 Spese per collaudi	€ 80.900,78		
Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto (compr. Oneri e IVA)	€ 16.758,02	B15 Spese sostenute per redazione indagini propedeutiche al progetto preliminare	€ 0,00		
r) Spese tecniche per progettazione Esecutiva	€ 181.614,01	B16 Oneri di accesso alla discarica	€ 15.000,00		
s) Spese tecniche Direzione Lavori e Sicurezza (comprensive di IVA e CASSA ed al netto del ribasso)	€ 234.144,43	B17 Spese tecniche di adeguamento progetto definitivo generale			
spese tecniche Geologo (comprensivo di IVA e CASSA)	€ 60.972,79	B18 Piano di sicurezza e coordinamento	€ 23.940,02		
		B19 Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto	€ 16.758,02		
		B20 Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 79.139,88		
		B21 Spese tecniche Direzione Lavori e Sicurezza	€ 234.144,43		
		B22 Spese tecniche geologo	€ 60.972,79		
		Totale	€ 9.586.609,75		
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 12.150.000,00	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejussore	City Insurance	n. Polizza	IM 000010542	Data di sottoscrizione	
		Importo	€ 6.988.770,81	22/07/2019	

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Nomina	D.C. n. 874 del 20/06/2019	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. Enzo Greco Lucchina	Nomina	D.C. n. 249 del 09/03/2018	Assistente al DL	Decreto di nomina

AFFIDATARIA

Affidataria	Doronzio Infrastrutture S.R.L.						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F./P.IVA	05065990722	Indirizzo:	Via Andria n. 153/B, Barletta (BT)	Tel/Fax:	0883 332270 0883 332217	e-mail/PEC:	info@doronzoinfrastrutture.it doronzoinfrastrutture@legalmail.it

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	547	giorni impegnati in più	giorni impegnati in meno
-----------------------------	-------------------------	--------------------	-----	-------------------------	--------------------------

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17635	AVOLA	Progetto di realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa nel comune di Avola (SR)						Codice Rendis 19IR163/G1			
Livello di Progettazione iniziale	DEFINITIVO				COSTIERO						
CUP	J69D16002030001				Importo Progetto	€ 15.825.968,49	Importo FSC	€ 10.801.968,49			
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione				
Decreto finanziamento	D.C. n. 224 del 07/03/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 317 del 10/04/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 618 del 14/05/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 240/2019 del 11/09/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/8534 del 11/09/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 1569 del 04/11/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 224/2018		€ 10.801.968,47	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato D.C. n. 1569/2019		€ 8.437.947,89
a1	Importo dei Lavori (Prezzario 2013)	€ 7.880.855,11	Importo dei lavori		€ 8.070.641,61
a2	Costi della Sicurezza 2,41%	€ 189.786,50	di cui oneriper la sicurezza contrattuale		€ 189.786,50
A) TOTALE LAVORI		€ 8.070.641,61	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 7.880.855,11
Somma a disposizione		€ 2.731.326,86	Importo del ribasso		€ 1.873.673,30
a) Lavori in economia			Importo totale dei lavori al netto del ribasso		€ 6.007.181,81
b0) Indagini a supporto della progettazione preliminare di			Oneri per la sicurezza contrattuale		€ 189.786,50
b1) Rilievi Planialtimetrici e Batimetrici comprensivi di IVA			Progettazione esecutiva		€ 70.214,14
b2) Indagini Geognostiche comprensivi di IVA e Cassa			B Somma a disposizione		€ 2.170.765,44
b3) Monitoraggio Satellitare comprensivi di IVA e Cassa		€ 116.171,00	IVA sui lavori 22%		€ 1.363.333,03
c) Allacciamenti ai pubblici servizi			Cassa e IVA su importo progettazione esecutiva		€ 18.873,56
d) Maggiori lavori imprevidi ed arrotondamenti = 1.33%		€ 107.129,90	B3 Monitoraggio satellitare comprensivo di IVA e cassa		€ 116.171,00
e) Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art 26 comma			B4 Maggiori lavori imprevidi ed arrotondamenti		€ 107.129,90
f) Spese per asservimento aree		€ 92.297,25	B5 Spese per asservimento aree		€ 92.297,25
g1) Spese tecniche adeguamento progetto definitivo generale (al netto del ribasso d'asta del 45% - Piano di sicurezza e coordinamento		€ 18.853,13	B6 Spese tecniche adeguamento progetto definitivo generale		€ 40.665,42
- Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto		€ 13.197,18	B7 Spese tecniche Direzione dei lavori e coord. Sic. In fase di esecuzione, compreso oneri e IVA		€ 244.546,06
Cassa pari al 4% su totale g1)		€ 1.282,01	B8 Incentivi		€ 56.494,49
IVA pari al 22% su totale g1)		€ 7.333,11	B9 Spese per procedure di gara, commissione aggiudicatrice e ANAC		€ 35.781,82
g2) spese tecniche progettazione esecutiva		€ 157.242,02	B10 Spese per collaudi		€ 64.565,68
Cassa pari al 4% su totale g2)		€ 6.289,68	B11 Indagini archeologiche SUB-BOTTOM Profiler - Soprintendenza del Mare		€ 15.725,50
IVA pari al 22% su totale g2)		€ 35.976,97	B12 Indagini archeologiche preventive - Soprintendenza BBCCA		€ 9.289,42
g3) Spese tecniche Direzione Lavori e Coord. Sic. in fase di		€ 192.738,07	B13 Indagini archeologiche durante i lavori - Soprintendenza BBCCA		€ 5.892,31
Cassa pari al 4% su totale g3)		€ 7.709,52	C		
IVA pari al 22% su totale g3)		€ 44.098,47	Totale		
g4) R.U.P.		€ 56.494,49			
h) Studi specialistici a supporto della progettazione					
i) Spese per procedure di gara, commissione aggiudicatrice		€ 3.500,00			
l) Spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei Lavori di					
m) Spese per collaudi (comprensivi di IVA e CASSA)		€ 64.565,68			
n) I.V.A. 22%		€ 1.775.541,15			
o) oneri di accesso alla discarica					
p) Indagini archeologiche SUB-BOTTOM profil -		€ 15.725,50			
q) Indagini archeologiche preventive - Soprintendenza BBCCA		€ 9.289,42			
r) Indagini archeologiche durante i lavori - Soprintendenza		€ 5.892,31			
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 10.801.968,47	Totale		

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejubente	Allianz Spa	n. Polizza	731.255.450	Data di sottoscrizione	
		Importo	€ 863.617,74		27/06/2019

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Pasquale Giambuzza	Decreto di nomina	D.C. n. 499 del 31/07/2017	Supporto al RUP Progettista	nota di nomina
Coord. Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Massimo Brocato (Artec Associati S.r.l.)
					Decreto di nomina
					D.C. n. 1802 del 05/12/2019
Direttore Lavori	Ing. Massimo Brocato (Artec Associati S.r.l.)	Decreto di nomina	D.C. n. 1802 del 05/12/2019	Assistente al DL	Incarico conferito tramite:

AFFIDATARIA

Affidataria	Cost. ATI PACOS S.R.L. - MESSINA COSTRUZIONI S.R.L. - URANIA S.R.L.				
dati Affidataria PACOS S.R.L.					
C.F./P.IVA	0261710844	Indirizzo:	c/da Margonia, 55 576, Naro (AG)	Tel/Fax:	e-mail:
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante MESSINA COSTRUZIONI S.R.L.					
C.F./P.IVA	01303330854	Indirizzo:	Via Palermo n. 140 - 93014 Mussomeli (CL)	Tel/Fax:	0934 951487
nel caso di ATI indicare i dati della Mandante URANIA S.R.L.					
C.F./P.IVA	0212600832	Indirizzo:	Via Cesare Battisti Is. 73 n. 374, 98100 Messina	Tel/Fax:	090 2938731 0902932081
				e-mail:	urania costruzioni@legaimail.it

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più	700	giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17815	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Lavori urgenti di stabilizzazione scarpate ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona c.da Casuzze Scalo Mandrie nel comune di Portopalo di Capo Passero (SR)								Codice Rendis 191R945/G1	
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dossier	COSTIERO					
CUP	J69D16001910001				Importo Progetto	€ 800.000,00	Importo FSC	€ 800.000,00			
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione						
Decreto finanziamento	D.C. n. 184 del 27/02/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 569 del 15/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1195 del 29/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Rep. 180 del 07/03/2019	Registrazione Contratto	Rep. 117/176 del 07/03/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 297 del 08/03/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		€ 800.000,00		Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Importi Decreto di Finanziamento					
a1	oneri speciali (indiretti) di sicurezza da psc	€ 490.244,06		Sommano lavori	€ 512.458,26
b1	importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 22.214,20		Oneri speciali (indiretti) di sicurezza da psc	€ 22.214,20
				Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 490.244,06
				Importo del ribasso d'asta (32,2573%)	€ 158.139,50
				Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 332.104,56
				Oneri speciali (indiretti) di sicurezza da psc	€ 22.214,20
				Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 354.318,76
	Somma a disposizione di cui:	€ 287.541,73		Totale Somme a disposizione di cui:	€ 252.751,05
c1	IVA 22%	€ 112.740,82		IVA 22% sui lavori	€ 77.950,13
c2	spese tecniche (progettazione, studio ambientale, CSP) incluso oneri	€ 35.778,50		Spese tecniche (progettazione, studio ambientale, C.S.P.	€ 35.778,50
c3	spese tecniche (DD.LL. M.C. CSE) inclusi oneri	€ 39.692,79		Spese tecniche D.LL M.C. C.S.E. inclusi oneri	€ 39.692,79
c4	spese tecniche geologiche	€ 17.972,06		Spese tecniche geologico	€ 17.972,06
c5	spese tecniche specialistiche	€ 10.000,00		Spese tecniche specialistiche (meteo-marino, morfologico)	€ 10.000,00
c6	spese per indagini geologiche e geognostiche	€ 3.000,00		Spese per indagini geologiche e geognostiche	€ 3.000,00
c7	spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	€ 2.328,50		Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	€ 2.328,50
c8	spese pubblicazione ed espletamento gare	€ 5.000,00		Spese ANAC ed espletamento gara di cui € 375,00	€ 5.000,00
c9	onorario RUP	€ 1.921,71		Onorario responsabile Unico del procedimento	€ 1.921,71
c10	Sistema di monitoraggio e controllo ambientale	€ 10.000,00		Sistema di monitoraggio e controllo ambientale	€ 10.000,00
c11	Oneri vari (N.O. oo.mm. Oneri accesso discarica)	€ 25.000,00		Oneri vari (N.O. oo.mm. Oneri accesso discarica)	€ 25.000,00
c12	Imprevisti 5%	€ 24.107,35		Imprevisti 5%	€ 24.107,35
	<b>totale</b>	<b>€ 800.000,00</b>		<b>Totale importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 607.069,81</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejussante	Reale Mutua Assicurazioni	n. Polizza	2019/50/2503066	Data di sottoscrizione	
		Importo	80.000,00 €		31/01/2019

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Mario Poidomani	Nomina	D.C. n. 498 del 31/07/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Antonio Lanza	Decreto di nomina	D.C. n. 1233 del 05/12/2019
Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Antonio Lanza	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 1233 del 05/12/2019	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Domenico Fiorentini	Decreto di nomina Disciplinare incarico	D.C. n. 403 del 28/03/2019 REP. N. 190 del 27/03/2019
				Decreto a contrarre (Ex art. 36)	D.C. n. 267 del 06/03/2019		
Direttore Lavori	Ing. Domenico Fiorentini	Decreto di nomina Disciplinare incarico	D.C. n. 403 del 28/03/2019 Discipl. REP. N. 190 del 27/03/2019	Decreto a contrarre (Ex art. 36)	D.C. n. 267 del 06/03/2019		
Collaudatore Statico				Decreto di Nomina			
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Decreto di Nomina			

AFFIDATARIA

Affidataria	<b>CIPAR S.R.L.</b>										
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)											
C.F. e P.IVA	P.I. 03365580830	Indirizzo:	Via Trazzera marina, 573 98071 Capo d'Orlando (ME)	Tel/Fax:	tel: 0982 48383 fax: e-mail:	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	05/11/2019	Data del quadro orario dei lavori	20/11/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	05/05/2020	Nuova Scadenza	
n. gg. Esenzione Sospensione		n. gg. Sospensione		NUM. gg. in più	180	giorni Esenzione	
						giorni Impiegati in materia	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESI:

Anticipazione 20%									
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	22/11/2019	importo oltre IVA	70.863,75 €	Decreto di Anticipazione 20%	D.C. n. 1507 del 17/12/2019	importo		86.453,78 €	

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17628	ANTILLO	Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19 nel comune di Antillo (ME)								Codice Rendis 191RA27/G1	
Livello di Progettazione	ESECUTIVO				Tipo di dissesto		MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE				
CUP	J59D16001780001				Importo Progetto		€ 1.250.000,00	Importo FSC		€ 1.250.000,00	
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	D.C. 758 del 02/11/2017	Decreto a contrarre	D.C. 766 del 03/11/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 96 del 28/01/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 197 del 10/04/2019	Registrazione Contratto	Reg. 1T/4865 del 10/04/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 711 del 29/05/2019

**LAVORI IN CORSO**

**DATI FINANZIARI**

Importi Decreto di Finanziamento n. 758/2017		€ 1.250.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 711/2019		€ 1.033.600,71
A	Lavori	€ 820.766,70	A	LAVORI	€ 820.766,70
A2	Importo oneri per la sicurezza delle lavorazioni	€ 22.630,41	A2	Di cui importo Oneri per la sicurezza delle lavorazioni	€ 22.630,41
A3	Importo incidenza manodopera	€ 160.528,83	A3	Importo incidenza manodopera	€ 160.528,42
	<b>Somma a disposizione di cui:</b>	<b>€ 429.233,30</b>		Lavori soggetti al ribasso	€ 798.136,29
B1	IVA sui lavori 22%	€ 180.568,67		Importo del ribasso	€ 177.036,21
B2	Oneri ed incentivi D.L. 163/2006 s.m.i.	€ 4.103,83			€ 621.100,08
B3	Per progettazione, direzione lavori, misura e	€ 79.677,94		Oneri per la sicurezza delle lavorazioni	
B4	Oneri previdenziali 4% su B3- 79.677,94	€ 3.187,12		Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 643.730,49
B5	Per IVA al 22% su (B3+B4)	€ 18.230,31	B	Somme a disposizione di cui:	€ 389.870,22
B6.1	Studio geologico già depurato del ribasso d'asta	€ 15.936,87	B1	IVA sui lavori	€ 141.620,71
B6.2	Per indagini geognostiche, in situ e sismiche	€ 12.809,78	B2	Corrispettivi ed incentivi D.L.	€ 4.103,83
B6.3	Per monitoraggio geologico	€ 10.432,66	B3	Progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità,	€ 101.095,37
B6.4	Per oneri previdenziali Epap 2% su B6.1	€ 318,74	B4	Studio geologico	€ 19.831,84
B6.5	Per IVA al 22% su studio geologico + oneri	€ 3.576,23	B5	Indagini geognostiche in situ e sismiche	€ 15.627,93
B6.6	Per IVA al 22% indagini geognostiche e	€ 5.113,34	B6	Monitoraggio geologico	€ 12.727,85
B7	Per prove in situ ed accertamenti in laboratorio	€ 10.000,00	B7	Spese per prove in situ ed accertamenti laboratorio	€ 10.000,00
B8.1	Per competenze collaudo statico	€ 14.846,19	B8	Competenze collaudo statico	€ 18.836,85
B8.2	Per cassa di previdenza al 4% su B8.1	€ 593,85	B9	Competenze collaudo tecnico-amministrativo	€ 6.849,76
B8.3	Per IVA al 22% su (B8.1 + B8.2)	€ 3.396,81	B10	Indennità di esproprio	€ 12.558,98
B9.1	Per competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 5.398,61	B11	Tecniche per frazionamento	€ 4.440,80
B9.2	Per cassa di previdenza al 4% su B8.1	€ 215,94	B12	Spese per vulture e pratiche catastali	€ 1.000,00
B9.3	Per IVA al 22% su (B8.1 + B8.2)	€ 1.235,20	B13	Oneri di accesso in discarica	€ 9.000,00
B10.1	Per indennità di esproprio	€ 12.558,98	B14	Spese di gara e ANAC	€ 8.584,88
B10.2	Per tecniche per frazionamento (onario +	€ 4.440,80	B15	Imprevisti e lavori in economia	€ 23.591,42
B10.3	Spese per vulture e pratiche catastali varie	€ 1.000,00		<b>Totale</b>	<b>€ 1.033.600,71</b>
B11	Per oneri di accesso in discarica	€ 9.000,00			
B12	Per spese di gara	€ 9.000,00			
B13	Per imprevisti e lavori in economia	€ 23.591,42			
	<b>totale</b>	<b>€ 1.250.000,00</b>			

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

**CAUZIONI E GARANZIE**

Fidejussione		Fidejussore		Data di sottoscrizione		Importo	
Fidejussore	CIG PANNONIA ELSO MAGYAR ALTALANOS Blitostlo-Zrt - Budapest Ungheria	n. Polizza	BIT0017982/000	Data di sottoscrizione	04/04/2019	Importo	€ 156.815,00

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Geom. Sebastiano Costa	Decreto di nomina	D.C. n. 264 del 19/05/2017	Supporto al RUP	Progettista	Ing. Chillemi Antonio	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:	Det. 21 del 06/02/2017
				Servizi geologici	Geol. Vito Trearichi			Incarico conferito tramite:	Det. n. 80 del 08/06/17
Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione			Decreto di nomina		
Direttore Lavori	Ing. Antonio Chillemi	Decreto di nomina	D.C. 463 del 10/04/2019						
Collaudatore Statico	Ing. Carmelo Aliberti	Decreto di nomina/Affidamento	D.C. n. 987 del 16/07/2019	Decreto a contrarre (ex art. 36)			D.C. n. 664 del 20/05/2019		
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Decreto di Nomina							

**AFFIDATARIA**

Affidataria		COSPIN SRL UNIPERSONALE	
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)			
C.F./P.IVA	04712420878	Indirizzo:	Corso Sicilia n. 40, 95131 Catania
Tel/Fax:	095 715 3679	e-mail/PEC:	cospinr1@gmail.com
Tipo di Contratto Applicato			

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

**TEMPISTICA**



Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori	30/09/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	17/02/2020	Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	140 gg	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno	

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

Anticipazione 20%					Decreto di Anticipazione 20%	D.C. n. 1483 del 22/10/2019	importo	157.070,12 €		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	09/10/2019		importo oltre IVA	128.746,00 €						
SAL 1	per lavori a tutto il:	20/11/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	97.168,47 €	Decreto di SAL 1	D.C. n. 1822 del 09/12/2019	Importo	118.545,53 €		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	21/11/2019		importo oltre IVA	97.168,47 €						

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**

Codice Caronte SI_1_17602	CASALVECCHIO SICULO	Mitigazione delle cause di rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto nel comune di Casalvecchio Siculo (ME)						Codice Rendis 191R381/G1	
Livello di Progettazione Iniziale		ESECUTIVO				Tipo di dissesto		ALLUVIONE	
CUP		J46J16000780001				Importo Progetto		€ 495.000,00	
Decreto finanziamento Servizi		Importo finanziato		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	
Decreto finanziamento		D.C. n. 582 del 30/12/2016 e D.C. n. 733 del 23/10/2017		Decreto a contrarre		D.C. n. 268 del 15/03/2018		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		D.C. n. 251 del 28/02/2019		Decreto aggiudicazione		D.C. n. 251 del 28/02/2019		D.C. n. 745 del 04/06/2019	

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento n. 582 del 30/12/2016 e n. 733 del 23/10/2017		Importi Decreto - Rimodulazione quadro economico - Impegno somme n. 745 del 04/06/2019		
		€ 495.000,00		€ 390.515,41		
a1	Importo lavorazioni	€ 228.816,08		A	Per lavorazioni	€ 232.731,18
					Costi relativi alla sicurezza	€ 3.915,10
					Importo a base di gara	€ 228.816,08
				A1	Importo del ribasso (37,4288%)	€ 85.643,11
				A2	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 143.172,97
					Costi relativi alla sicurezza	€ 3.915,10
a2	Importo oneri per la sicurezza delle lavorazioni	€ 3.915,10				€ 147.088,07
B	Somma a disposizione di cui:	€ 262.268,82		B	Somma a disposizione di cui:	€ 243.427,34
b1	per IVA sui lavori 22%	€ 51.200,86		B1	Iva 22% sui lavori	€ 32.359,38
b2	Corrispettivi ed incentivi	€ 2.327,31		B2	Corrispettivi ed incentivi	€ 2.327,31
b3	Per progettazione	€ 7.000,00		B3	Progettazione	€ 7.000,00
b4	Per DL, Coordinatore sicurezza, Contabilità	€ 38.998,93		B4	Direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità	€ 38.998,93
b5	Per geologo in fase di direzione lavori	€ 5.597,88		B5	Geologia in fase di direzione lavori	€ 5.597,88
b6	Per collaudo statico	€ 5.401,46		B6	Collaudo Statico	€ 5.401,46
b7	Per collaudo amministrativo	€ 2.990,56		B7	Collaudo amministrativo	€ 2.990,56
b8	per IVA e cassa sulle competenze tecniche (3-4-5-6-7)	€ 15.597,10		B8	Iva e cassa sulle competenze tecniche (3-4-5-6-7)	€ 15.597,10
b9	Per monitoraggio area intervento	€ 109.800,00		B9	Monitoraggio area intervento	€ 109.800,00
b10	per oneri accesso discarica	€ 5.000,00		B10	Oneri accesso discarica	€ 5.000,00
b11	per spese gara	€ 10.000,00		B11	Spese gara e Anac di cui € 225,00 già impegnati con D.C. n.	€ 10.000,00
b12	per imprevisti e lavori in economia <5%	€ 8.354,72		B12	Imprevisti e lavori in economia < 5%	€ 8.354,72
	<b>totale</b>	<b>€ 495.000,00</b>			<b>Totale</b>	<b>€ 390.515,41</b>

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejussore	ALLIANZ Spa	n. Polizza	113971832	Data di sottoscrizione	16/04/2019
		Importo	€ 40.700,00		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Piero Mifa	Decreto di nomina	D.C. n. 77 del 30/01/2018	Supporto al RUP	Progettista	Decreto di nomina Determina Sindacale
Coord. Sicurezza fase Progett.						
Direttore Lavori/CSE	Ing. Claudio Faranna	Decreto di nomina/Affidamento	D.C. n.175 del 11/02/2019	Decreto a contrarre (ex art. 36)		D. C. n. 1174 del 26/11/2018
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Carmelo Vadalà	Decreto di nomina/Affidamento	D.C. n. 986 del 16/07/2019	Decreto a contrarre (ex art. 36)		D.C. n. 691 del 23/05/2019
Collaudatore Tecnico Amministrativo				Decreto di Nomina		

AFFIDATARIA

Affidataria	CICCONE COSTRUZIONI SRL					
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)						
C.F./P.IVA	01759720848	Indirizzo:	Via Vittorio Emanuele, n. 38 - 92025 Casteltermidi (AG)	Tel/Fax:	0922 913941	e-mail/PEC:
						studiociccone@pec.giuffre.it

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	Data del coprocesso (inizio dei lavori)	10/07/2019	Scadenza termine utile per l'ultimazione dei lavori	05/01/2020	Nuova scadenza
DATA SOSPENSIONE	DATA RIPRESA				Nuova scadenza dopo 22 gg.
n. gg Eventuale Sospensione	n. gg Eventuale Proroga	giorni gg. previsti	180 gg	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

Anticipazione 20%		importo stato di avanzamento oltre iva	€ 29.417,61	Decreto di liquidazione Anticipazione 20%	D.C. n. 1323 del 26/09/2019	importo	€ 35.889,48	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	28/08/2019	importo oltre IVA	€ 29.417,61					
1° SAL emesso il:	per lavori a tutto il:	03/10/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	€ 97.918,19	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 1667 del 20/11/2019	importo	€ 119.460,19
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	09/10/2019	importo oltre IVA	€ 97.918,19					

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17603	CASALVECCHIO SICULO	Consolidamento della zona ovest dell'abitato nel comune di Casalvecchio Siculo (ME)						Codice Rendis 19R479/G1			
Livello di Progettazione Iniziale		DEFINITIVO			Tipo di dissesto		FRANA				
CUP	J46J16000870001	Importo Progetto		€ 985.000,00		Importo FSC		€ 985.000,00			
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Decreto aggiudicazione definitiva	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione						
Decreto finanziamento	D.C. n. 77 del 08/02/2017 - D.C. n. 724 del 20/10/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 768 del 03/11/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1103 del 12/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Rep. 174 del 19/02/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/2261 del 19/02/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 324 del 13/03/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento n. 724 del 20/10/2017		€ 985.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 840.518,24
a1	importo lavori soggetti a ribasso	€ 588.035,39			A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL LORDO	€ 600.600,09
a2	oneri per la sicurezza	€ 12.564,70				Oneri per la sicurezza	€ 12.564,70
A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 600.600,09				Importo lavori soggetti a ribasso	€ 588.035,39
						Importo del ribasso 20%	€ 117.607,08
						Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 470.428,31
						Oneri per la sicurezza	€ 12.564,70
						Totale Lavori al netto del ribasso comprensivi di	€ 482.993,01
B	Somma a disposizione di cui:	€ 384.399,91			B	Somma a disposizione di cui:	€ 357.525,23
b1	IVA sui lavori al 22%	€ 132.132,02			B1	Iva sui lavori 22%	€ 106.258,46
b2	Corrispettivi per incentivi	€ 3.003,00			B2	Corrispettivi per incentivi	€ 3.003,00
b3	Proget. DL - misura e contabilità - Coord. Sicurezza	€ 101.836,43			B3	Prog. - DL - mis e contab. - Coordin. Sicurezza	€ 101.836,43
b4	Studio Geologico	€ 34.764,54			B4	Studio geologico	€ 34.764,54
b5	Indagini geognostiche	€ 12.014,19			B5	Indagini geognostiche	€ 12.014,19
b6	Monitoraggio intervento	€ 50.806,29			B6	Monitoraggio intervento	€ 50.806,29
b7	collaudo Statico	€ 14.865,19			B7	Collaudo statico	€ 14.865,19
b8	Collaudo tecnico/amministrativo	€ 5.405,52			B8	Collaudo tecnico/amministrativo	€ 5.405,52
b9	oneri accesso a discarica	€ 4.000,00			B9	Oneri accesso a discarica	€ 4.000,00
b10	spese di gara	€ 8.000,00			B10	Spese di gara e Anac	€ 6.998,88
b11	imprevisti e lavori in economia	€ 17.572,73			B11	Imprevisti e lavori in economia	€ 17.572,73
	<b>totale</b>	<b>€ 985.000,00</b>				<b>Totale</b>	<b>€ 840.518,24</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>							

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	Elba Assicurazioni SPA, cod. agenzia 099, Fencis Srl - Paternò	n. Polizza	1383734	Data di sottoscrizione	22/01/2019		
		importo	€ 500.000,00				

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Pietro Mifa	Decreto di nomina	D.C. n. 89 del 01/02/2018	Supporto al RUP	Ing. Antonio Chillemi	Decreto di nomina	Det. Comunale n. 141 del 05/11/2015
				Progettista		Incarico conferito tramite:	
				Supporto alla Progettazione/Geologo		Determina di nomina	
Servizi Geologici	Geol. Fabio Uchino	Decreto di nomina	Det. Comunale 135 del 19/10/2015				
Coord Sicurezza fase Progett.						Decreto di nomina	
Direttore Lavori/CSE	Ing. Antonio Chillemi	Decreto di nomina	D.C. n. 984 del 18/10/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico/Tecnico Amministrativo	Ing. Domenico Dimaggio	Decreto di nomina/Affidamento	D.C. n. 702 del 27/05/2019	Decreto a contrarre (ex art. 36)		D.C. n. 522 del 17/04/2019	

AFFIDATARIA

Affidataria	<b>Gallone Antonio impresa individuale</b>						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
P.IVA/C.F.	00095900866	Indirizzo:	Via Pergusa 298/B - 94100 - Enna	Tel/Fax:	0935531969		
Tipo di Contratto Applicato				email/pec	agallone@tisc alinet.it		

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori	06/05/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza dopo prima sospensione	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più		giorni impiegati in meno	
		totale gg previsti	90 gg.				
Data della consegna	06/05/2019	Data del concreto inizio dei lavori	06/05/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	90 gg. 04/08/2019	Nuova Scadenza	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

Anticipazione 20%		Decreto di liquidazione Anticipazione 20%	D.C. n. 718 del 30/05/2019	importo	117.850,19 €		
-------------------	--	---	----------------------------	---------	--------------	--	--

CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	09/10/2019	importo oltre IVA	96.598,60 €					
1° SAL	per lavori a tutto il:	importo stato di avanzamento oltre IVA	143.845,62 €	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 1127 07/08/2019	importo	175.491,66 €	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA		importo oltre IVA	143.845,62 €					
<b>COLLAUDO STATICO</b>								
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>								



Codice Caronte SL_1_17792	FORZA D'AGRO'	Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco Parrino nel comune di Forza D'Agrò (ME)						Codice Rendis 19IRD84/G1			
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE					
CUP	J79D16001970001				Importo Progetto	€ 1.100.000,00	Importo FSC	€ 1.100.000,00			
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione				
Decreto finanziamento	D.C. 221 del 06/03/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 223 del 07/03/18	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 79 del 23/01/19 - D.C. n. 114 del 31/01/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. n. 187 del 31/03/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/9878 del 21/03/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 641 del 15/05/2019

### LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		€ 1.100.000,00		Imperti Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 641 del 15/05/2019		€ 892.871,01	
Importi Decreto di Finanziamento n. 221/2018							
A	Importo dei lavori	€ 876.492,64		Importo dei lavori complessivo		€ 1.107.902,74	
	sicurezza	-		Oneri della sicurezza		€ 26.251,64	
	spese tecniche	-		Importo lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 1.081.651,10	
	imprevisti sui lavori	€ 30.678,98		Importo del ribasso percentuale		€ 393.483,04	
	IVA su spese tecniche	-		Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 688.168,06	
				Oneri della sicurezza		€ 26.251,64	
	IVA sui lavori	€ 192.828,38		Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri		€ 714.419,70	
B	Somma a disposizione di cui:	€ 223.507,36		Somma a disposizione di cui:		€ 178.451,31	
				IVA sui lavori		€ 157.172,33	
				ANAC importo già impegnato co d.c. n. 627/2018		€ 600,00	
				Imprevisti		€ 20.678,98	
	totale	€ 1.100.000,00		totale		€ 892.871,01	
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>							

### CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejussore	ELBA assicurazioni SpA	n. Polizza	10034310000004	Data di sottoscrizione	25/02/2019		
		Importo	€ 150.772,00				

### FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Francesco Cardile	Decreto di nomina	D.C. n. 562 del 22/08/2017	Supporto al RUP	Progettista	Decreto di nomina	
Supporto Tecnico e di Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina	
Direttore Lavori	Ing. Natale Cucè	Decreto di nomina	D.C. n. 210 del 05/03/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	

### AFFIDATARIA

Affidataria	<b>CONSORZIO CAMPALE STABILE</b>						
dati Affidataria (nei caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F./P.IVA	03697610651	Indirizzo:	Via delle Puglie N° 47 - CAP 82100 - Benevento (BN)	Tel/Fax:	0824.45712 - 0824.381670 / 0824.381710	e-mail/PEC:	info@c-c-s.it consorziocampanstabile@legalmail.it

### SUBAPPALTI AUTORIZZATI

#### TEMPISTICA

Data della consegna	11/03/2019	Data del concreto inizio dei lavori	13/03/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	20/11/2019
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga	54 gg	totale gg previsti	200	giorni impiegati in mesi	

### VARIANTE

#### STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

Anticipazione 20%				Decreto di liquidazione	D.C. n. 774 del 07/06/2019	Importo	€ 174.318,41	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	21/05/2019	importo oltre IVA	142.883,94 €	Anticipazione 20%				
Sal 1	per lavori a tutto il:	04/06/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	181.764,17 €	Decreto di liquidazione SAL 1	D.C. n. 1042 del 25/07/2019	Importo	€ 221.752,29
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	28/06/2019	importo oltre IVA	181.764,17 €					
Sal 2	per lavori a tutto il:	26/09/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	252.910,37 €	Decreto di liquidazione SAL 2	D.C. n. 1871 del 12/12/2019	Importo	€ 207.303,58
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	01/10/2019	importo oltre IVA	252.910,37 €					

#### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

#### COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_17600	FRAZZANO' Lavori di consolidamento dell'abitato est del comune di Frazzano (ME)							Codice Rendis 19IR248/G1	
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA			
CUP	J96J16001120001				Importo Progetto	€ 2.649.938,67	Importo FSC	€ 2.649.938,67	
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 175 del 04/04/2017 e D.C. n. 698 del 16/10/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 737 del 24/10/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 876 del 19/09/2018	Rep. n. 170 del 08/01/2019	Reg. n. 291 del 08/01/2019 Serie 1/T	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 106 del 30/01/2019

<b>LAVORI IN CORSO</b>								
DATI FINANZIARI								
Importi Decreto di Finanziamento n. 175 del 04/04/2017 e D.C. n. 698 del 16/10/2017 € 2.649.938,67								
				Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato € 2.096.302,21				
a1	Importo lavori compresa manodopera		€ 1.728.710,43		Importo totale dei lavori			€ 1.750.559,73
b1	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 21.849,30		Importo lavori compresa manodopera			€ 1.728.710,43
				Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				€ 21.849,30
				Importo del ribasso				€ 320.209,03
				Lavori al netto del ribasso esclusi oneri				€ 1.408.501,40
				Importo dei lavori al netto comprensivi di oneri				€ 1.430.350,70
A	Importo totale lavori		€ 1.750.559,73		Somma a disposizione di cui:			
B	Somma a disposizione di cui:		€ 899.378,94		IVA 22% su A			€ 314.677,15
b1	IVA sui lavori 22% su A		€ 385.123,14		Imprevisti			€ 43.840,28
b2	Imprevisti		€ 61.959,83		Incentivi e spese per la programmazione			€ 35.011,19
b3	Incentivi e spese per la programmazione		€ 35.011,19		Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			€ 0,00
b4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 35.377,51		Direzione lavori geologo e assistenza ala			€ 21.217,19
b5	Direzione lavori geologo e assistenza ala		€ 17.050,14		Competenze direzione lavori misura e			€ 0,00
b6	Competenze direzione lavori misura e		€ 93.801,36		Collaudo statico ed amministrativo			€ 57.455,35
b7	Collaudo statico ed amministrativo		€ 45.283,22		Competenze supporto al RUP, verifica			€ 15.042,29
b8	Competenze supp. al RUP verifica prog. esecutiva - come da determina n. contributo soggettivo su (B4+B5+B6+B7+B8)		€ 15.283,35		Commissione giudicatrice			€ 16.045,97
b9	Commissione giudicatrice		€ 16.045,97		Contributo ANAC			€ 600,00
b10	Contributo ANAC		€ 600,00		Elenco ditte da espropriare e stima indennità			€ 125.119,55
b11	Elenco ditte da espropriare e stima indennità		€ 107.000,00		Monitoraggio dell'opera IVA compresa			€ 14.902,54
b12	Monitoraggio dell'opera IVA compresa		€ 14.902,54		Assicurazione e spese attinenti			€ 4.000,00
b13	Assicurazione e spese attinenti		€ 4.000,00		Prove di laboratorio sui materiali			€ 18.000,00
b14	Prove di laboratorio sui materiali		€ 18.000,00					
b15								
b16								
				A+B totale		€ 2.649.938,67		
						totale		€ 2.096.302,21
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>								

<b>CAUZIONI E GARANZIE</b>							
Fidejussione							
Fidejussente	Unipol SAL ASSICURAZIONI SpA	n. Polizza	I/64554/96/164064795	Data di sottoscrizione	21/12/2018		
		Importo	€ 132.479,08				

<b>FIGURE TECNICHE</b>								
RUP	Geom. Calogero Gianguzzi		Decreto di nomina	D.C. n. 175 del 04/04/2017	Supporto al RUP	Progettista	Decreto di nomina	
				Incarico conferito tramite:				
Supporto Tecnico, Geotecnico, Ingegnere, e di Coord. Sicurezza fase Progett			Incarico conferito tramite:		Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Giovanni Lentini (CSE)	Decreto di nomina	D.C. n. 717 del 26/07/2018
Direttore Lavori	Ing. Rosario Bonanno (DI)		Decreto di nomina	D.C. n. 717 del 26/07/2018				
Collaudatore Statico/Tecnico Amministrativo	Ing. Antonio Miceli		Decreto di nomina/affidamento	D.C. n. 747 del 04/06/2019	Decreto a contrarre (ex art. 36)	D.C. n. 226 del 21/02/2019		
				Decreto di Nomina				

<b>AFFIDATARIA</b>							
Affidataria <b>ATI BE.I.CO. SRL - COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA</b>							
Dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F./P.IVA	03202100875	Indirizzo:	Via Monsignor Domenico Orlando, 14 - Catania	Tel/fax:	095496433	e-mail:	beicauff@tiscali.it
Tipo di Contratto Applicato							
Nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA							
<b>SUBAPPALTI AUTORIZZATI</b>							

<b>TEMPISTICA</b>								
Data della consegna	30/09/2019		Data del decreto inizio dei lavori	19/02/2019		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	22/09/2019	
n. gg Eventuale Sospensione	dal 03/08/2019 al 25/08/2019		n. gg Eventuale Proroga	30 gg		giorni impiegati in più	180 gg	
				giorni impiegati in meno		14/11/2019		

<b>VARIANTE</b>								
PERIZIA DI VARIANTE N.1	Decreto approvazione perizia variante		D.C. n. 1818 del 09/12/2019		Importo perizia variante		2.096.302,21 €	
tempo utile per l'ultimazione	Nuova Scadenza		14/11/2019		Importo contrattuale dopo 1 Perizia			
1° atto aggiuntivo in data	data di Registrazione				Numero di registrazione			
				Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato € 2.096.302,01				
				A Lavori al netto del ribasso compreso oneri per la sicurezza				€ 1.493.836,42
				B Somma a disposizione				602.465,59
				Totale				2.096.302,01

<b>STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:</b>									
<b>Anticipazione 20%</b>									
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	20/02/2019		Importo oltre IVA	286.070,14 €	Decreto di liquidazione Anticipazione 20%	D.C. n. 350 del 19/03/2019	Importo	349.005,57 €	
1° SAL	per lavori a tutto II:		10/05/2019	Importo stato di avanzamento oltre IVA	630.000,00 €	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 786 del 19/05/2019	Importo	768.600,00 €
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	14/05/2019		Importo oltre IVA	630.000,00 €					
2° SAL	per lavori a tutto II:		30/06/2019	Importo stato di avanzamento oltre iva	380.097,44 €	Decreto di liquidazione SAL n. 2	D.C. n. 1107 del 05/08/2019	Importo	463.718,88 €
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	09/07/2019		Importo oltre IVA	380.097,44 €					
<b>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE</b>									
<b>COLLAUDO STATICO</b>									
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>									

Codice Caronte SI_1_17604	FURCI SICULO	<i>Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento delle Frazioni Grotte e Calcare e centro urbano alla strada statale SS114 ME - CT</i>					Codice Rendis 191R483/G1
------------------------------	--------------	---	--	--	--	--	-----------------------------

Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di disesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP	J19116001190001				Importo Progetto	€ 2.230.000,00	Importo FSC € 2.230.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazioni e Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
Decreto finanziamento	D.C. 28 del 20/01/2017 - D.C. n. 755 del 02/11/2017	Decreto a contrarre DC. n. 767 del 03/11/2017	Decreto aggiudicazione definitiva D.C. n. 1102 del 12/11/2018	Sottoscrizione Contratto Rep. 183 del 13/03/2019	Registrazioni e Contratto Reg. 17/3454 del 13/03/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 489 del 12/04/2019

**LAVORI IN CORSO**

DATI FINANZIARI			
Importo Decreto di Finanziamento n. 755/2017		€ 2.230.000,00	Importo Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 489 del 12/04/2019
1	Importo lavori a base di gara	€ 1.323.188,59	A Importo complessivo dei lavori € 1.363.267,89
2	Oneri diritti di sicurezza	€ 40.079,30	B Costo oneri sicurezza non soggetti al ribasso € 40.079,30
			Importo dei lavori a base d'asta € 1.323.188,59
			Importo del ribasso d'asta € 314.728,35
			Lavori al netto del ribasso € 1.008.460,26
			Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso € 40.079,30
			Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri € 1.048.539,54
	Importo per Lavori	€ 1.363.267,89	B Somma a disposizione di cui: € 794.087,74
	Somma a disposizione dell'Amm/nc	€ 866.732,12	b.1 IVA sui lavori € 230.678,70
1	IVA Lavori 22,00%	€ 299.918,94	b.2 Imprevisti € 67.840,08
2	Imprevisti < 5%	€ 67.840,08	b.3 Competenze RUP € 6.816,34
3	Competenze RUP	€ 6.816,34	b.4 Progettazione definitiva € 41.312,94
4	progettazione definitiva	€ 32.560,64	b.5 Progettazione esecutiva e coordinamento € 45.272,97
5	progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in	€ 35.681,72	b.6 Direzione lavori, misura e contabilità, € 109.064,69
6	direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento	€ 85.958,93	b.7 Collaudo statico-amministrativo € 30.409,39
7	Collaudi Statico-Administrativo	€ 23.967,05	b.8 Contributo Anac € 600,00
8	studio geotecnico	€ 16.330,96	b.9 Studio geotecnico € 20.720,72
9	studio geologico	€ 49.274,63	b.10 Studio geologico € 49.274,63
10	indagini geognostiche	€ 31.284,54	b.11 indagini geognostiche € 31.284,54
11	piano di monitoraggio post-operam	€ 36.528,47	b.12 Piano di monitoraggio post-operam € 36.528,47
12	spese pubblicità	€ 15.000,00	b.13 Commissione giudicatrice € 9.284,27
13	rilevi e allacciamenti ai pubblici servizi	€ 28.000,00	b.14 Rilievi e allacciamenti ai pubblici servizi € 28.000,00
14	spese per prove laboratorie e verifiche	€ 20.000,00	b.15 Spese per prove di laboratorio e verifiche € 20.000,00
15	oneri accesso in discarica	€ 10.000,00	b.16 Oneri accesso alla discarica € 10.000,00
16	lavori in economia	€ 57.000,00	b.17 Lavori in economia € 57.000,00
17	contributo previdenziale spese tecniche 4,00 %	€ 7.779,97	
18	IVA spese tecniche e contributo previd. 22,00 %	€ 42.789,85	
	<b>totale</b>	<b>€ 2.230.000,00</b>	<b>totale</b>
			<b>€ 1.842.627,28</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>			

CAUZIONI E GARANZIE					
Fidejussione					
Fidejussione	Tekio Marine Europe S.A.	n. Polizza Importo	28019955328 € 144.594,00	Data di sottoscrizione	04/02/2019

FIGURE TECNICHE						
RUP	Geom. Orazio Spadaro	Decreto di nomina	D.C. n. 113 del 25/07/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	
Supporto Tecnico - Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Antonio Leo	Decreto di nomina	Del. n.154 del 10/07/2002	Servizi geologici	Dott. Geol. Antonio Savoca	Incarico conferito tramite: Del. G.M. 155 del 10.07.2002
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Claudio Faranna	Decreto di nomina/affidamento	D.C. n. 1538 del 29/10/2019	Decreto a contrarre (ex art. 36)	D.C. n. 1245 del 16/09/2019	
Collaudatore Statico/Tecnico Amministrativo	Ing. Antonio Chillemi	Decreto di nomina	D.C. n. 989 del 19/07/2019	Decreto a contrarre (ex art. 36)	D.C. n. 536 del 29/04/2019	

AFFIDATARIA						
Affidataria	<b>ARES S.R.L.</b>					
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)						
C.F. e P.IVA	07847991002	Indirizzo:	Via Merulana 99 - 00185 Roma (RM)	Tel/Fax:	06 7003684	e-mail/PEC:
		<a href="mailto:ares.srl@picapec.it">ares.srl@picapec.it</a>				

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

TEMPISTICA						
Data della consegna	15/04/2019	Data del concreto meno dei lavori	15/04/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	26/09/2019	Nuova Scadenza
						17/11/2019
n. gg Eventuale Sospensione	dal 09/08/2019 al 30/09/2019	n. gg Eventuale Proroga	75 gg	totale gg previsti	165	giorni impiegati in più
						giorni impiegati in meno

**VARIANTE STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

Anticipazione del 20%						
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	15/04/2019	importo oltre IVA	209.707,91 €	Decreto di liquidazione Anticipazione 20%	D.C. n. 623 del 14/05/2019	importo 255.843,65 €
1° SAL	per lavori a tutto il: 05/08/2019	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 73.538,35	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 1327 del 10/09/2019	importo 89.716,79 €
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	05/08/2019	importo oltre IVA	€ 73.538,35			
2° SAL	per lavori a tutto il: 18/10/2019	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 176.579,18	Decreto di liquidazione SAL n. 2	D.C. n. 1545 del 30/10/2019	importo 215.426,60 €
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	18/10/2019	importo oltre IVA	€ 176.579,18			

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE COLLAUDO STATICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia"



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17754	<b>GALATI</b> <b>MAMERTINO</b>	<b>Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato nel comune di Galati Mamertino (ME)</b>						<b>Codice Rendis</b> 19IR987/G1
<b>ESECUTIVO</b>				<b>FRANA</b>				
CLUP: J49D16002120001				Importo Progetto: € 1.840.000,00		Importo FSC: € 1.840.000,00		
Decreto finanziamento Servizi		Importo finanziato		Decreto a contrarre		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
D.C. n. 195 del 26/02/2018		Decreto a contrarre D.C. n. 895 del 26/09/2018		Decreto aggiudicazione definitiva D.C. n. 485 del 12/04/2019		Sottoscrizione Contratto Rep. 217 del 11/06/2019 - Registrazione Contratto Reg. 117/2885 del 11/06/2019		
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
D.C. n. 195 del 26/02/2018		Decreto a contrarre D.C. n. 895 del 26/09/2018		Decreto aggiudicazione definitiva D.C. n. 485 del 12/04/2019		Sottoscrizione Contratto Reg. 217 del 11/06/2019 - Registrazione Contratto Reg. 117/2885 del 11/06/2019		
Decreto finanziamento		Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		
D.C. n. 195 del 26/02/2018		Decreto a contrarre D.C. n. 895 del 26/09/2018		Decreto aggiudicazione definitiva D.C. n. 485 del 12/04/2019		Sottoscrizione Contratto Reg. 217 del 11/06/2019 - Registrazione Contratto Reg. 117/2885 del 11/06/2019		

**LAVORI IN CORSO**

<b>DATI FINANZIARI</b>				<b>Importi Decreto di finanziamento n. 195 del 26/02/2018</b>				<b>Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 853 del 19/06/2019</b>			
€ 1.840.000,00				€ 1.840.000,00				€ 1.303.561,32			
<b>A</b>		Sommano i lavori complessivi		€ 1.212.301,35		<b>A</b>		Sommano i lavori complessivi di cui:		€ 521.619,54	
<b>a1</b>		Costi della manodopera		€ 325.281,56		<b>a.1</b>		Costi della Manodopera		€ 325.281,56	
<b>a2</b>		Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (0,901426% sui lavori)		€ 10.928,00		<b>a.2</b>		Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (0,901426%)		€ 10.928,00	
								Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.201.373,35	
								Importo del ribasso (35,8223%)		€ 430.359,57	
								Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 771.013,78	
								Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.928,00	
										€ 781.941,78	
<b>B</b>		Somma a disposizione di cui:		€ 627.698,65		<b>B</b>		Somma a disposizione di cui:		€ 521.619,54	
<b>b1</b>		IVA sui lavori		€ 266.706,30		<b>b.1</b>		IVA sui lavori		€ 172.027,19	
<b>b2</b>		Imprevisti		€ 60.000,00		<b>b.2</b>		Imprevisti		€ 60.000,00	
<b>b3</b>		Acquisizione aree immobili e occupazione temporanea		€ 30.000,00		<b>b.3</b>		Acquisizione aree o immobili e occupazione		€ 30.000,00	
<b>b4</b>		Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento		€ 117.944,63		<b>b.4</b>		Spese tecniche relative alla progettazione,		€ 117.944,63	
<b>b5</b>		Spese relazione geologica compreso IVA e Oneri		€ 28.865,02		<b>b.5</b>		Spese relazione geologica compreso IVA e Oneri		€ 28.865,02	
<b>b6</b>		Spese tecniche di carattere strumentale (art.92, comma 7-		€ 6.000,00		<b>b.6</b>		Spese tecniche di carattere strumentale (art.92, c,		€ 6.000,00	
<b>b7</b>		Incentivi per la progettazione (art. 92, comma 5 del D.Lgs		€ 24.246,03		<b>b.7</b>		Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 del D.lgs		€ 24.246,03	
<b>b8</b>		Collaudo tecnico e statico		€ 35.550,50		<b>b.8</b>		Collaudo tecnico e statico		€ 35.550,50	
<b>b9</b>		oneri conferimento a discarica		€ 27.886,17		<b>b.9</b>		Oneri conferimento in discarica		€ 27.886,17	
<b>b10</b>		Verifiche tecniche ex art. 167 c. 7 DPR 207/2010 compreso IVA		€ 18.500,00		<b>b.10</b>		Verifiche tecniche ex art. 167 c.7 DPR 207/2010		€ 18.500,00	
<b>b11</b>		pubblicazione spese di gara e commissione aggiudicatrice		€ 12.000,00		<b>b.11</b>		Contributo ANAC impegnati con decreto n. 442/2019		€ 600,00	
										€ 521.619,54	
										€ 1.303.561,32	
										€ 1.840.000,00	
										€ 1.840.000,00	
										ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

<b>CAUZIONI E GARANZIE</b>											
<b>Fidejussione</b>											
Fidejutente	Elba Assicurazione Spa	n. Polizza	1453460	Data di sottoscrizione	27/05/2019						
		Importo	€ 161.534,00								

<b>FIGURE TECNICHE</b>											
RUP	Arch. Giuseppa Cavolo	Decreto di nomina	D.C. n. 445 del 11/07/2017	Supporto al RUP	Ing. M. Ferrante	Decreto di nomina	D.C. n. 563 del 13/06/2018				
Direttore Operativo - Ispettore di cantiere - Collab. DL	Geom. Giacomo Amico (DO) - Geom. Ferdinando Micalizzi (IC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 933 del 05/07/2019	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Ferdinando Chiofalo	Decreto di nomina	D.C. n. 933 del 05/07/2019				
Direttore Lavori	Ing. Antonio Barone	Decreto di nomina	D.C. n. 933 del 05/07/2019	Assistente al DL	Ing. Antonio di Ganci	Decreto di nomina	D.C. n. 933 del 05/07/2019				
Collaudatore Statico	Ing. Peppino Frisenda	Decreto a contrarre (ex art. 36)		Decreto di Nomina		D.C. n. 1404 del 09/10/2019					
		Decreto di Nomina				D.C. n. 1639 del 14/11/2019					
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Peppino Frisenda	Decreto a contrarre (ex art. 36)		Decreto di Nomina		D.C. n. 1404 del 09/10/2019					
		Decreto di Nomina				D.C. n. 1639 del 14/11/2019					

<b>AFFIDATARIA</b>											
Affidataria <b>MI.CO. S.R.L.</b>											
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)											
C.F. e P.IVA	01418060859	Indirizzo:	Via L. da Vinci 57/Musumeli (CL)	Tel/Fax:		Tel:		Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:
Tipo di Contratto Applicato											
<b>SUBAPPALTI AUTORIZZATI</b>											
<b>TEMPISTICA</b>											
Data della consegna	15/10/2019	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza					
gg. Eventuale sospensione		gg. Eventuale ritardo		giorni impiegati all'asta		giorni impiegati in mora					
<b>VARIANTE</b>											
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:											
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE											
COLLAUDO STATICO											
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO											



Codice Caronte SI_1_17801	GALLODORO	Messa in sicurezza del tratto a monte della strada SP 13 dal KM 1600 al KM 1900 nel comune di Gallodoro (ME)						Codice Rendis 19IR640/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA		
CUP	J59D16001880001				Importo Progetto	€ 1.700.000,00	Importo FSC	€ 1.700.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre	Importo finanziamento	Decreto a contrarre	D.C. n. 837 del 18/06/2019	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento	D.C. n. 66 del 25/01/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 555 del 11/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 6 del 07/01/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 188 del 26/03/2019	Registrazione Contratto
							Reg. 17/4111 26/03/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
								D.C. n. 464 del 10/04/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		€ 1.700.000,00		€ 1.263.604,09	
Importi Decreto di Finanziamento n. 66 del 25/01/2018		€ 1.700.000,00		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
Progetto Originario		€ 1.077.337,21		A Importo complessivo dei lavori di cui:	
Importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.672,70		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
Base d'asta Progetto esecutivo I intervento		€ 1.058.664,51		Importo dei lavori a base d'asta	
				Importo del ribasso d'asta (33,7880%)	
				Lavori al netto del ribasso	
				Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	
				Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	
				Somma a disposizione di cui:	
IVA sui lavori		€ 237.014,19		B1 IVA sui lavori	
Somma a disposizione di cui:		€ 622.662,79		B2 Lavori in economia esclusi dall'appalto	
Lavori in economia esclusi dall'appalto				B3 Rilievi, sondaggi, acceramenti e oneri di conferimento	
Rilievi, sondaggi, acceramenti ed indagini compreso IVA		€ 13.519,86		B4 Allacciamenti a pubblici servizi e oneri conferimento a	
Allacciamenti a pubblici servizi e oneri conferimento a discarica		€ 19.726,47		B5 Imprevisti	
Imprevisti (4,65%)		€ 50.069,44		B6 Competenze progettazione esecutiva e	
Competenze Progettazione esecutiva e Coordinamento		€ 63.619,09		B7 Competenze direzione lavori e coordinamento	
Competenze direzioni lavori e coordinamento sicurezza in		€ 69.024,63		B8 Contributo ANAC	
Contributo ANAC		€ 600,00		B9 Spese per attività tecnico-amministrative di	
Spese per attività tecnico amministrative, di supporto di		€ 7.000,00		B10 Competenze geologiche	
Competenze geologiche		€ 26.787,21		B11 Competenze tecniche interne: RUO, programmazione	
COMPETENZE TECNICHE INTERNE: RUP,		€ 21.546,74		B12 Spese per oneri di gara	
Spese per oneri di gara		€ 8.000,00		B13 Oneri esproprio	
ONERI ESPROPRIO		€ 37.163,99		B14 Accertamenti laboratorio compreso IVA	
accertamenti laboratorio compreso IVA		€ 10.321,20		B15 Collaudo amministrativo	
Collaudo amministrativo		€ 2.078,40		B16 Collaudo strutturale	
Collaudo strutturale		€ 10.070,82		B17 IVA ed eventuali altre imposte	
I.V.A. ed eventuali altre imposte (contributi Casse e Visti		€ 46.120,75		totale	
totale		€ 1.700.000,00		€ 1.263.604,09	
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejussante	Allianz Spa
n. Polizza	500418614
Data di sottoscrizione	26/02/2019
Importo	€ 171.201,32

FIGURE TECNICHE					
RUP	Arch. Sebastiano La Maestra	Decreto di nomina	D.C. n. 632 del 19/09/2017	Supporto al RUP	Decreto di nomina
				Progettista	Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Rosario Oliva (CSE)	Decreto di nomina	D.C. n. 1151 del 29/08/2019	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. Antonio Sciglio	Decreto di nomina	D.C. n. 553 del 08/06/2018	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico	Ing. Lo Giudice	Decreto a contrarre (ex art. 36)	D.C. n. 837 del 18/06/2019	Decreto di Nomina	D.C.n. 1262 del 17/09/2019
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Lo Giudice	Decreto a contrarre (ex art. 36)	D.C. n. 837 del 18/06/2019	Decreto di Nomina	D.C.n. 1262 del 17/09/2019

AFFIDATARIA	
Affidataria	ITEMO S.R.L.
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
C.F. e P.IVA	Cf: 01561980549 - Pi: 01851800365
Indirizzo:	Lorso Liberta n. 153, 401018 - San Cesareo sul Panaro (MO)
Cell.	3959783116
e-mail/PEC	ITEMO@ARUBAPEC.IT
Tipo di Contratto Applicato	

SUBAPPALTI AUTORIZZATI
TEMPISTICA
VARIANTE
STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
COLLAUDO STATICO
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17727	<b>GUALTIERI SICAMINO'</b>	<b>Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri - unica via di fuga dell'abitato nel comune di Gualtieri Sicaminò (ME)</b>						<b>Codice Rendis</b> 191R973/G1			
Livello di Progettazione Iniziale CUP	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE					
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Importo Progetto	Importo FSC	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione					
Decreto finanziamento	D.C. n. 909 del 14/12/2017 -	Decreto avvio gara	D.C. n. 102 del 29/01/2019	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 703 del 27/05/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 232 del 06/08/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/6705 del 06/08/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 1353 del 02/10/2019

**LAVORI AGGIUDICATI**

**DATI FINANZIARI**

Importi Decreto di Finanziamento n. 1283 DEL 11/12/2018		€ 610.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 448.216,78
A	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 387.489,52	A	Lavorazioni	€ 387.489,52
A1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.099,07		Costi relativi alla sicurezza	€ 9.099,07
A2	Lavori a base d'asta soggetti al ribasso	€ 378.390,45		Importo a base di gara	€ 378.390,45
B	Somma a disposizione di cui:	€ 222.510,48		Importo del ribasso	€ 132.609,20
B1	IVA sui lavori	€ 85.247,69		Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 245.781,25
B2	Imprevisti	€ 980,00		Costi relativi alla sicurezza	€ 9.099,07
B3	Spese per espropri e procedure di registrazione e	€ 98.138,38	B	Somma a disposizione di cui:	€ 193.336,46
B4	Spese per frazionamenti e pratiche catastali	€ 6.000,00	B1	IVA	€ 56.073,67
B5	Comp. per aggiornamento prezzi progettazione esecutiva	€ 998,25	B2	Imprevisti	€ 980,00
B6	Comp. Geologo, indagini geologiche oneri compresi	€ 2.746,82	B3	Spese per espropri e procedure di registrazione e trascrizioni atti	€ 98.138,38
B7	Comp. Tec. Prog. Esecutiva, rilievi, PSC, oneri	€ 20.562,00	B4	Spese per frazionamenti e pratiche catastali	€ 6.000,00
B8	Collaudo amministrativo	€ 387,49	B5	Comp. Per aggiornamento prezzi progettazione esecutiva	€ 998,25
B9	Collaudo statico in corso d'opera	€ 1.800,00	B6	Comp. Geologo, indagini geologiche	€ 2.746,82
B10	Contributo anac	€ 225,00	B7	Comp. Tec. Progettazione esecutiva, rilievi, PS	€ 20.562,00
B11	Incentivi DL, Misura e Contabilità, Sicurezza	€ 2.712,43	B8	Collaudo amministrativo	€ 387,49
B12	Rup, personale amministrativo	€ 2.712,42	B9	Collaudo statico in corso d'opera	€ 1.800,00
	<b>totale</b>	<b>€ 610.000,00</b>	B10	Contributo Anac	€ 225,00
			B11	incentivi DL	€ 2.712,43
			B12	RUP personale amministrativo	€ 2.712,42
				<b>totale</b>	<b>€ 448.216,78</b>

**ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA**

**CAUZIONI E GARANZIE**

**Fidejussione**

Fidejussore	Elba Assicurazioni Spa	n. Polizza	1477522	Data di sottoscrizione	03/07/2019
		Importo	€ 63.838,00		

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Ing. Nicola Miccio	Decreto di nomina	D.C. n. 340 del 08/06/2017	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:	
Ispettore di Cantiere	Geom. Francesco Calderone	Decreto di nomina	D.C. n. 1131 del 15/11/2018	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Nicola Miccio	Decreto di nomina	D.C. n. 1131 del 15/11/2018
Direttore Lavori	Ing. Nicola Miccio	Decreto di nomina	D.C. n. 1131 del 15/11/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	Ing. Leo Antonino Onorifici	Decreto a contrarre (ex art. 36)			D.C. n. 1492 del 23/10/2019		
		Decreto di Nomina			D.C. n. 1673 del 20/11/2019		
Collaudatore Tecnico Amministrativo		Nota di nomina					
		Decreto di Nomina					

**AFFIDATARIA**

Affidataria	<b>VULLO CALOGERO</b>										
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)											
C.F. e P.IVA	00308790849	Indirizzo:	Via Aldo Moro n. 168 Favara (AG) 93010 Vallelunga	Tel/Fax:	0922 422028	Posizione INPS	n. SEDE:	Posizione INAIL	n. SEDE:	Cassa Edile	n. SEDE:
Tipo di Contratto	Applicato										

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

Subappaltatore:

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17751	LCC MESSINA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla - LCC Messina							Codice Rendis 19IRD74/G1		
Livello di Progettazione Iniziale	PRELIMINARE				Tipo di dissesto	ALLUVIONE					
CUP	J26J16000750001				Importo Progetto	€ 645.000,00	Importo FSC	€ 645.000,00			
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione				
Decreto finanziamento	D.C. n. 934 del 22/12/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 711 del 24/07/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 341 del 18/03/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 214 del 05/06/2019	Registrazione Contratto	Reg. 117/7589 del 05/06/2019	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 819 del 13/06/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 934 del 22/12/2017		€ 645.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n° 819 del 17/06/2017		€ 423.033,07
Importo dei lavori (comprensivo di oneri per la sicurezza e Manodopera)	€ 487.000,00		A	Importo Complessivo dei Lavori di cui:	
	€ 110.007,00			Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 7.940,00
				Importo dei lavori a base d'asta	€ 479.060,00
				Importo del ribasso d'asta (37,2300%)	€ 178.354,04
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.940,00		a.1	Lavori al netto del ribasso	€ 300.705,96
Importo a base di Gara al netto di oneri per la sicurezza e	€ 479.060,00		a.2	Costi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 7.940,00
			A	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri	€ 308.645,96
Somma a disposizione di cui:	€ 158.000,00		B	Somma a disposizione di cui:	€ 114.387,11
1 IVA 22% sui lavori (A)	€ 107.140,00		b.1	Iva 22% sull'importo totale dei lavori	€ 67.902,11
2 Incentivi 2% art. 113 D.lgs 50/2016	€ 9.740,00		b.2	Incentivi, 2% art. 113 D. lgs 50/2016	€ 9.740,00
3 Spese di cancelleria a disposizione D.L.	€ 4.870,00		b.3	Spese di cancelleria a disposizione D.L.	€ 4.870,00
4 Spese di missione personale e D.L.	€ 6.000,00		b.4	Spese di missione personale e D.L.	€ 6.000,00
			b.5	Spese ANAC impegnati con decreto n. 1052/2018	€ 225,00
5 Oneri per l'organo di vigilanza	€ 600,00		b.6	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00
6 Rilievi accertamenti indagini	€ 5.000,00		b.7	Polizza assicurativa RUP e D.L.	€ 2.000,00
7 Polizza assicurativa RUP e D.L.	€ 2.000,00		b.8	Imprevisti (circa 3,8%)	€ 18.650,00
8 Spese pubblicità di gara	€ 4.000,00				
9 Imprevisti (circa 3,8%)	€ 18.650,00				
<b>totale</b>	<b>€ 645.000,00</b>			<b>totale</b>	<b>€ 423.033,07</b>

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejubente	Elba Assicurazioni Spa	n. Polizza	1442303	Data di sottoscrizione	06/05/2019				
Importo			€ 84.044,30						

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Ferdinando Micalizzi	Decreto di nomina	D.C. n. 793 del 14/11/2017	Supporto al RUP	Progettista	Decreto di nomina	Incarico conferito tramite:
Componenti Gruppo di Progettazione: D.O. GEOL GRUPPO DI SUPPORTO	Geom. Muscumarra - Geom. Anastasi - Geol. Schirò - Geom. Adriano - Geom. Ciatto -	Decreto di nomina	D.C. n. 106 del 01/03/2017	Coord Sicurezza fase Progettazione ed Esecuzione	Geom. A. Chiofalo (CSE - CSP)	Decreto di nomina	D.C. n. 314 del 09/04/2018
Direttore Lavori	Ing. A. Di Gangi	Decreto di nomina	D.C. n. 106 del 01/03/2017	Assistente al DL		Decreto di nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria **SOC. CECIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO**

dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

C.F./P.IVA	780590790	Indirizzo:	Via G. Marconi n. 18 - 88836 Cotronei (KR)	Tel/Fax:	09 62 49 15 55	e-mail/PEC:	<a href="mailto:cecimsas@pec.it">cecimsas@pec.it</a>	
Tipo di Contratto Applicato								

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:

TEMPISTICA

Data della consegna	17/07/2019	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova scadenza	
n. gg lavorativi Sospensione		n. gg lavorativi Piora		totale gg previsti	180 gg	giorni impegnati in più	
						giorni impegnati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



Codice Caronte SI_1_17608	LENI	Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella_completamento - Leni (ME)						Codice Rendis 19/R948/G1			
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO				Tipo di disesto	COSTIERO					
CUP	J69D16002050001				Importo Progetto	€ 3.650.000,00	Importo F50	€ 3.650.000,00			
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato	Decreto a contrarre			Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione				
Decreto finanziamento	D.C. n. 19 del 16/01/2017 - D.C. n. 821 del 23/11/2017 - D.C. n. 276 del 26/03/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 556 del 12/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 882 del 25/06/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 243 del 03/10/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/10723 del 03/10/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 1484 del 22/10/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 821/2017 e n. 276/208		€ 3.650.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 2.869.851,82
A1	Importo lavori soggetto a ribassi	€ 2.522.239,89	A	Lavori e oneri per la sicurezza	€ 2.587.151,36
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 64.911,47		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 64.911,47
	Totale Oneri di Sicurezza	€ 2.587.151,36		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.522.239,89
B	Somma a disposizione di cui:	€ 1.062.848,64		Importo dei lavori netti ribassati	€ 633.712,77
B1	IVA sui lavori	€ 569.173,30		Importo totale dei lavori al netto del ribasso	€ 1.888.527,12
B2	Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento	€ 12.611,20		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 64.911,47
B3	Servizi di ingegneria afferenti alla progettazione e	€ 103.207,29	B	Somma a disposizione di cui:	€ 916.413,23
B4	Assistenza geologica e sedimentologica all D.L.	€ 7.922,46	B1	IVA sui lavori	€ 429.756,49
B5	Monitoraggio topobatimetrico	€ 101.504,00	B2	Ufficio del RUP	€ 12.611,20
B6	Studi su Modello Matematico	€ 18.683,08	B3	Servizi di ingegneria afferenti alla progettazione e l'esecuzione	€ 103.207,29
B7	Collaudi	€ 14.836,45	B4	Assistenza geologica e sedimentologica alla DL	€ 7.922,46
B8	Spese per pubblicazioni, gara, etc.	€ 30.000,00	B5	Monitoraggio topobatimetrico	€ 101.504,00
B9	Imprevisti (oneri compresi) ed arrotondamenti	€ 204.910,86	B6	Studi sul modello matematico	€ 18.683,08
			B7	Collaudi	€ 14.836,45
			B8	Gara e Anac	€ 22.981,40
			B9	Imprevisti	€ 204.910,86
				totale	€ 2.869.851,82
	totale	€ 3.650.000,00	<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>		

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione

Fidejussore	Elba Assicurazioni Spa	n. Polizza	1506851	Data di sottoscrizione	04/09/2019
		Importo	€ 253.950,00		

FIGURE TECNICHE

RUP	Arch. Domenico Arcoraci	Decreto di nomina	D.C. n. 29 del 09/01/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina:		Coord Sicurezza fase Esecuzione Misur. e Contabilità	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. Fabio Arena	Decreto di nomina	D.C. n. 1641 del 18/11/2019	Direttore Operativo Ispettore di Cantiere	P.O. Marino Mondello (DO) Geom. Costantino - Geom. Cataffi (IC) Decreto di nomina D.C. n. 1641 del 18/11/2019

AFFIDATARIA

Affidataria	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F./P.IVA	02669810836	Indirizzo:	Via Consolare antica n. 572/B - Capo d'Orlando (ME)	Tel/Fax:	0921 390446	e-mail/PEC:	info@costruzionibruno.it
Tipo di Contratto Applicato							

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



<b>Codice Caronte</b> SI_1_17758	<b>LIBRIZZI</b>	<b>Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato nel comune di Librizzi (ME)</b>						<b>Codice Rendis</b> 19IR464/G1
Livello di Progettazione iniziale		<b>DEFINITIVO</b>			Tipo di dissesto	<b>FRANA</b>		
CUP		J49D16002010001			Importo Progetto	€ 3.935.000,00	Importo FSC	€ 3.935.000,00
Decreto finanziamento Servizi		Importo finanziato	Decreto a contrarre	Decreto a contrarre	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto finanziamento		D.C. n. 908 del 28/09/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1128 del 15/11/2018	Decreto aggiudicazione efficace	D.C. n. 1032 del 24/07/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 256 del 23/10/2019
						Registrazione Contratto	Reg. 17/12940 del 23/10/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
								D.C. n. 1600 del 06/11/2019

**LAVORI IN CORSO**

**DATI FINANZIARI**

Importi Decreto di Finanziamento n. 908 del 28/09/2018		€ 3.935.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 3.154.446,86
1 Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti pari a 1,94%)		€ 2.595.509,26	A1	Lavori	€ 2.595.509,26
2 Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)		€ 48.190,17	A2	Costo oneri sicurezza speciale	€ 48.190,17
3 Resto importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 2.547.319,09		Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.547.319,09
				Importo del ribasso	€ 649.948,47
Somma a disposizione di cui:		€ 1.339.490,74	A2	Importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.897.370,62
a IVA sui lavori		€ 571.012,04	A1	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 48.190,17
b Monitoraggio post-operam IVA compresa		€ 48.496,13	B	Somme a disposizione	€ 1.208.886,07
c Competenze tecniche per Progettazione,		€ 424.409,33	B1	IVA	€ 428.023,37
d Competenze tecniche per Studio Geologico e Indagini		€ 65.596,73	B2	Monitoraggio post operam	€ 48.496,13
f Incentivi per funzioni tecniche (2% dell'importo dei lavori)		€ 51.910,19	B3	Competenze tecniche per progettazione, geotecnica, calcoli strutturali, DL, collaudi	€ 424.409,33
4 Spese di Gara		€ 18.000,00	B4	Competenze tecniche per studio geologico e indagini	€ 65.596,73
5 Risoluzioni interferenze		€ 12.000,00	B5	Incentivi per funzioni tecniche	€ 51.910,19
6 Oneri per eventuale occupazione temporanea		€ 11.000,00	B6	Spese gare	€ 30.383,99
7 Versamento contributo ANAC		€ 600,00	B7	Risoluzioni interferenze	€ 12.000,00
8 Oneri conferimento in discarica, quantità come da computo metrico, IVA inclusa		€ 32.900,00	B8	Oneri per eventuale occupazione temporanea	€ 11.000,00
9 Oneri, arrotondamenti e eventuali lavori in economia		€ 103.566,32	B9	ANAC	€ 600,00
			B10	Oneri per conferimento in discarica	€ 32.900,00
			B11	Imprevisti, arrotondamenti e lavori in economia	€ 103.566,32
totale		€ 3.935.000,00		Totale	€ 3.154.446,86
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>					

**CAUZIONI E GARANZIE**

<b>Fidejussione</b>					
Fidejubbente	Elba Assicurazioni Spa	n. Polizza	1506857	Data di sottoscrizione	04/09/2016
		Importo	€ 311.289,00		

**FIGURE TECNICHE**

<b>RUP</b>	Geom. Tindaro Falliano	Decreto di nomina	D.C. n. 309 del 01/06/2017	Supporto al RUP	Ing. Michele Gatto	Decreto di nomina	D.C. n. 258 del 13/03/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Progettista		Decreto di nomina	
				Coord Sicurezza fase Esecuzione - Misura e Contabilità	Ing. A. Edoardo Schepisi	Decreto di nomina	D.C. n. 1040 del 05/11/2018
<b>Direttore Lavori</b>	Ing. A. Edoardo Schepisi	Decreto di nomina	D.C. n. 1040 del 05/11/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
<b>Collaudatore Statico</b>	Ing. Arturo Alonci	Decreto di nomina	D.C. n. 1477 del 22/10/2019				
<b>Collaudatore Tecnico Amministrativo</b>	Ing. Massimiliano Mobilia	Decreto di nomina	D.C. n. 1477 del 22/10/2019			Decreto di nomina	

**AFFIDATARIA**

Affidataria	<b>COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa</b>						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F./P.IVA	02669810836	Indirizzo:	Via Consolare antica n. 572/B - Capo d'orlando (ME)	Tel/Fax:	0921 390446	e-mail/PEC:	info@costruzionibruno.it
Tipo di Contratto Applicato							

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

Subappaltatore:	
-----------------	--

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

<b>Codice Caronte</b> SI_1_17718	<b>LIPARI</b>	<b>Riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di protezione spiaggia in località Canneto (Unci) - Lipari (ME)</b>						<b>Codice Rendis</b> 19IR431/G1									
Livello di Progettazione iniziale		<b>DEFINITIVO</b>				Tipo di dissesto		<b>COSTIERO</b>									
CUP		J69D16002020001				Importo Progetto		€ 3.285.000,00	Importo FSC	€ 2.585.000,00							
Decreto finanziario Servizi		Decreto a contrarre		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione							
Decreto finanziamento		D.C. n. 1149 del 20/11/2018	Decreto a contrarre		D.C. n. 1193 del 28/11/2018	Decreto a contrarre		D.C. n. 487 del 12/04/2019	Sottoscrizione Contratto		Rep. 227 del 18/07/2019	Registrazione Contratto		Reg. 17/3886 del 18/07/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione		D.C. n. 1287 del 20/09/2019

**LAVORI IN CORSO**

**DATI FINANZIARI**

<b>Importi Decreto di Finanziamento n. 1149 del 20/11/2018</b>		€ 2.585.000,00		<b>Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato</b>		€ 1.827.056,89		
A	Totale Lavori al Lordo compreso oneri e costi	€ 1.862.780,57		Lavori		€ 1.862.780,57		
A2	Oneri della sicurezza diretti inclusi nei lavori	€ 38.011,76		Oneri per la sicurezza contrattuale		€ 10.721,70		
A2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 10.721,70		Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 1.852.058,87		
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.852.058,87		Importo lavori netti ribassati		€ 619.884,10		
B	Somma a disposizione di cui:	€ 722.219,43		Importo totale dei lavori al netto del ribasso		€ 1.232.174,77		
B1	Iva sui Lavori	€ 409.811,73		Oneri per la sicurezza contrattuale		€ 10.721,70		
B2	Ufficio del responsabile unico del procedimento	€ 9.260,29		<b>Somme a disposizione</b>		<b>€ 584.160,42</b>		
B3	Progettazione definitiva	€ 58.631,46		B1		IVA		€ 273.437,22
B4	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza	€ 37.831,44		B2		Ufficio RUP		€ 9.260,29
B5	DL, misura e contabilità, liquidazione e coordinatore	€ 84.878,71		B3		Progettazione definitiva compreso oneri e IVA		€ 58.631,46
B6	Indagini archeologiche e relazione	€ 14.640,00		B4		Progettazione esecutiva e CSP compreso oneri e IVA		€ 37.831,44
B7	Caratterizzazione dei sedimenti nella vasca di sedimentazione	€ 4.880,00		B5		DL misura e contabilità liquidazione CSE compresi oneri e IVA		€ 84.878,71
B8	Monitoraggio biocenos costiere pre e post opera	€ 27.450,00		B5.1		Rimborso spese missione DL		€ 215,50
B9	Rilievi topobatimetrici di monitoraggio	€ 18.300,00		B6		Indagini archeologiche e relazione		€ 14.640,00
B10	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 9.294,77		B7		Caratterizzazione dei sedimenti nella vasca di sedimentazione T calandra		€ 4.880,00
B11	Spese per gara	€ 2.500,00		B8		Monitoraggio biocenos costiere pre e post opera		€ 27.450,00
B12	Imprevisti	€ 44.741,03		B9		Rilievi topobatimetrici di monitoraggio		€ 18.300,00
	<b>totale</b>	<b>€ 2.585.000,00</b>		B10		Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera		€ 9.294,77
				B11		ANAC		€ 600,00
				B12		Imprevisti		€ 44.741,03
						<b>totale</b>		<b>€ 1.827.056,89</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>								

**CAUZIONI E GARANZIE**

<b>Fidejussione</b>							
Fidejubente	Generali Italia Spa	n. Polizza	390607078	Data di sottoscrizione	03/06/2018		
		Importo	€ 291.707,80				

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Geom. Carmelo Meduri	Decreto di nomina	D. C. n. 903 del 14/12/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di		Decreto di nomina		Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonio Barone	Decreto di nomina	D.C. n. 531 del 18/04/2019
Supporto archeologico subacqueo e Indagini Strumentali	Soc. Coop. ATLANTIS a r.l.	Decreto a contrarre (ex art. 36)	D.C. n. 1412 del 10/10/2019				
		Decreto di nomina	D.C. n. 1703 del 26/11/2019				

Direttore Lavori	Arch. Giuseppe Di Leo (DL) -	Decreto di nomina	D.C. n. 531 del 18/04/2019	Direttore Operativo	Geom. Giacomo Amico - Geom. Giuseppe Presti	Decreto di nomina	D.C. n. 531 del 18/04/2019
------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------	---------------------	---	-------------------	----------------------------

**AFFIDATARIA**

Affidataria	<b>S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE</b>						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F./P.IVA	01234850806	Indirizzo:	Via Stazione vecchia, n. 16, 89018, Villa San Giovanni (RC)	Tel/Fax:	0965 795696	e-mail/PEC:	
Tipo di Contratto Applicato							

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

Subappaltatore:	
-----------------	--

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Codice Caronte SI_1_22501	MESSINA II STRALCIO	Interventi urgenti per il prolungamento della barriera radente esistente collocata a protezione del tratto di litorale compreso tra il complesso edilizio "Case Raciti" ed il campo di calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel comune di Messina (ME)								Codice Rendis	
Livello di Progettazione		ESECUTIVO				Tipo di dissesto		COSTIERO			
CUP		J45J18000210001				Importo Progetto		€ 737.963,48		Importo FSZ	€ 737.963,48
Decreto finanziamento Servizi		Decreto a contrarre		Decreto a contrarre		Decreto a contrarre		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento		D.C. n. 909 del 28/09/2018		D.C. n. 926 del 02/10/2018		D.C. n. 1163 del 22/11/2018		Sottoscrizione Contratto		Reg. n. 173 del 18/02/2019	
		Decreto a contrarre		Decreto di aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Reg. n. 17/2200 del 18/02/2019		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
										D.C. n. 431 del 03/04/2019	

LAVORI IN CORSO							
DATI FINANZIARI							
Importi Decreto di Finanziamento n. 909 del 28/09/2018		€ 737.963,48		Importi Decreto di Impegno D.C. n. 431 del 03/04/2019		€ 499.577,26	
A	Totale dei lavori	€ 573.467,79			Totale lavori	€ 573.467,79	
a1	Costo manodopera	€ 89.008,04			Costo manodopera	€ 89.008,04	
a2	Oneri di sicurezza	€ 6.000,00			Oneri di sicurezza	€ 6.000,00	
	Importo lavori soggetti al ribasso	€ 567.469,79			Importo lavori soggetti al ribasso	€ 567.469,79	
B	Somme a disposizione	€ 164.495,69			Importo del ribasso	€ 195.398,54	
B1	IVA	€ 126.162,91			Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 372.069,25	
B2	Polizza assicurativa	€ 1.200,00			Oneri di sicurezza	€ 6.000,00	
					Totale lavori al netto del ribasso compreso di oneri	€ 378.069,25	
B3	Imprevisti e lavori in economia	€ 23.063,42			Somme a disposizione	€ 121.508,01	
B4	Prove di laboratorio sui materiali	€ 1.800,00			IVA	€ 83.175,23	
B5	Spese di gara e contributo AVCP	€ 800,00			Polizza assicurativa	€ 1.200,00	
B6	Incentivi per la progettazione	€ 11.469,36			Imprevisti e lavori in economia	€ 23.063,42	
	Totale	€ 737.963,48			Prove di laboratorio sui materiali	€ 1.800,00	
					Spese di gara e contributo AVCP	€ 800,00	
					Incentivi per la progettazione	€ 11.469,36	
					Totale	€ 499.577,26	

CAUZIONI E GARANZIE							
Fidejussione							
Fidejubente	ELBA Assicurazioni Spa	n. Polizza	1374419	Data di sottoscrizione	09/01/2019		
		Importo	€ 92.375,17				

FIGURE TECNICHE							
RUP	Ing. Vito Leotta	Decreto di nomina	D.C. n. 191 del 12/02/2019	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	Ing. F. Bongiovanni - Geom. L. Currò	Decreto di nomina	D.C. n. 792 del 13/11/2017
				Servizi geologici			
Direttore Operativo	Geom. Letterio Rodillosso	Decreto di nomina	D.C. n. 191 del 12/02/2019	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Letterio Rodillosso	Decreto di nomina	D.C. n. 191 del 12/02/2019
Direttore Lavori	Ing. Armando Mellini	Decreto di nomina	D.C. n. 191 del 12/02/2019	Ispettore di cantiere	Agr. Antonello Aiello- Sig. Aldo Porretti	Decreto di nomina	D.C. n. 191 del 12/02/2019

AFFIDATARIA							
Affidataria <b>GANGI IMPIANTI SRL</b>							
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F. e P.IVA	IT05738830826	Indirizzo:	Via Porta di Conte 6, 90024 Gangi (PA)	Tel: 0921644652 Fax: 0921644652	gangimpianti@legaimail.com	Posizione INPS	n. SEDE:
						Posizione INAIL	n. SEDE:
						Cassa Edile	n. SEDE:
Tipo di Contratto Applicato							

SUBAPPALTI AUTORIZZATI							
Subappaltatore:							
TEMPISTICA							
Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori	26/11/2018	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più	120	giorni impiegati in meno	

VARIANTE								
PERIZIA DI VARIANTE N.1	Decreto approvazione perizia variante	D.C. n. 1068 del 31/07/2019	importo perizia variante	499.577,26	Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato			€ 499.577,26
tempo utile per l'ultimazione	Nuova Scadenza		importo contrattuale dopo 1 Perizia		A	Totale lavori	399.642,66 €	
1° atto aggiuntivo in data	data di Registrazione		Numero di registrazione		B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	99.934,60 €	
					A+B	Totale	499.577,26 €	

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:								
1° SAL emesso il:	per lavori a tutto il:	25/02/2019	Importo stato di avanzamento oltre Iva	351.200,00 €	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 681 del 22/05/2019	importo oltre IVA	428.464,00 €
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	25/02/2019		importo oltre IVA	351.200,00 €				

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
COLLAUDO STATICO							
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17816	MESSINA	Riqualficazione ambientale e risanamento igienico-sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte nel comune di Messina						Codice Rendis 19IR011/G3			
Livello di Progettazione iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	ALLUVIONE					
CUP	J49D16002100001				Importo Progetto	€ 30.000.000,00	Importo FSC	€ 29.990.000,00			
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione				
Decreto finanziamento	D.C. n. 805 del 15/11/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 941 del 28/12/2017	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 598 del 09/05/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. n. 239 del 10/09/2019	Registrazione Contratto	Reg. Serie 1T 8427 d el 10/09/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 1433 del 14/10/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 805 del 15/11/2017		€ 29.990.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato		€ 21.808.350,15
a1	Importo dei lavori	€ 24.831.100,27	A1	Lavori e oneri per la sicurezza	€ 25.048.804,19
b1	Costi straordinari per la sicurezza	€ 217.703,92		Costi straordinari per la sicurezza	€ 217.703,92
b2	Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso			Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 24.831.100,27
	Somma a disposizione di cui:	€ 4.941.195,81		Importo dei lavori netti ribassati	€ 9.222.792,09
c1	IVA 10% (su lavori + oneri sicurezza)	€ 2.504.880,42	A2	Importo totale dei lavori al netto del ribasso	€ 15.608.308,18
c2	Espropriazioni	€ 59.300,00	B	Costi straordinari per la sicurezza	€ 217.703,92
c3	Pubblizzazioni bandi e procedure U.R.E.G.A.	€ 25.000,00	B1	Somme a disposizione	€ 5.982.338,05
c4	Incentivo progettazione (ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e del	€ 476.927,28	B2	IIVA	€ 3.481.722,66
c5	Accantonamento ai sensi dell'art. 90 c. 5 e 92c. 7 bis		B3	Espropriazioni	€ 59.300,00
c6	Allecciamenti ai pubblici servizi	€ 50.000,00	B4	Commissione giudicatrice	€ 88.500,00
c7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 50.000,00	B5	Incentivo progettazione	€ 476.927,28
c8	Oneri di accesso discarica, mc. 52753,63 x €/mc 10,00	€ 527.536,30	B6	Accantonamento	€ 0,00
c9	Spese per assicurazione dei dipendenti (art 24 c. 4 d.lgs 50/16)	€ 26.500,00	B7	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 50.000,00
c10	Imprevisti (max 5% di A)	€ 1.221.051,81	B8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 50.000,00
			B9	Oneri di accesso discarica	€ 527.536,30
			B10	Spese per assicurazioni dei dipendenti	€ 26.500,00
			B11	Imprevisti	€ 1.221.051,81
				Spese ANAC	€ 800,00
				totale	€ 21.808.350,15
				totale	€ 29.990.000,00

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejubente	CIG PANNONIA ELSO MAGYAR ALTALANOS BIZTOSITO ZRT BUDAPEST	n. Polizza	BIT0018784/0000	Data di sottoscrizione	01/08/2019
		Importo	€ 3.436.311,00		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Armando Mellini	Decreto di nomina	D.C. n. 586 del 05/09/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Angelo Lucentini	Decreto di nomina	D.C. n. 586 del 05/09/2017
Supporto Tecnico		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Letterio Rodillosso	Decreto di nomina	D.C. n. 1548 del 30/11/2019
Direttore Lavori	Ing. Antonio Cortese	Decreto di nomina	D.C. n. 586 del 05/09/2017	Ispettori di Cantiere	Geom. Matteo Mucari - Geom. Marco Mancuso	Decreto di nomina	D.C. n. 1476 del 22/10/2019
Collaudatore Statico/Tecnico Amministrativo	Ing. Marcello Sterrantino	Decreto di nomina	D.C. n. 1552 del 30/10/2019				

AFFIDATARIA

Affidataria	Consorzio Stabile P.C. - CIESSECI S.R.L.						
dati Affidataria							
C.F. e P.IVA	P.I. 05092830875	Indirizzo:	Via Bonina, 12 - Maletto (CT)	Tel:	PEC	<a href="mailto:consorziostablepc@impresapec.it">consorziostablepc@impresapec.it</a>	
Tipo di Contratto Applicato							

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto inizio dei lavori	23/10/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		totale gg previsti	45 gg	giorni impiegati in più	
						giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17721	MESSINA SOMMA URGENZA	Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME)								Codice Rendis 19IR510/G1		
Livello di Progettazione	ESECUTIVO				COSTIERO							
CUP	J49D16002030001				Importo Progetto	€ 4.500.000,00		Importo FSc	€ 200.000,00			
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato		Decreto a contrarre		Sottoscrizione e Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di impegno a seguito aggiudicazione				
Decreto finanziamento	D.C. n. 177 del 26/02/2019	Decreto a contrarre		D.C. n. 179 del 26/02/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 281 del 04/04/2018	Sottoscrizione e Contratto	Rep. n. 159/2018 del 22/05/2018	Registrazione Contratto	Reg. n. 1T 6391 del 22/05/2018	Decreto di impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 514 del 06/06/2018

LAVORI ULTIMATI

DATI FINANZIARI				Importi Decreto di Impegno D.C. n. 514 del 06/06/2018				€ 140.225,57							
Importi Decreto di Finanziamento n. 177/2018				€ 200.000,00											
A	LAVORI			€ 144.870,76			LAVORI di cui			€ 144.870,76					
A1	Costo manodopera			€ 21.358,18			Costo di manodopera			€ 21.358,18					
A2	Oneri di Sicurezza (da PSC)						oneri di sicurezza (da PSC)								
Lavori a base d'asta				€ 144.870,76				Lavori a base d'asta				€ 144.870,76			
B	Somma a disposizione di cui:			€ 110.258,48			IMPORTO DEL RIBASSO 33,8201%			33,8201%			€ 48.995,44		
B1	IVA sui lavori			€ 31.871,57			totale lavori al netto del ribasso			€ 95.875,32					
B2	Polizza assicurativa			€ 1.500,00			Somma a disposizione di cui:			€ 44.350,24					
B3	Imprevisti e lavori in economia (l'8,4% di A)			€ 12.262,83			IVA sui lavori			€ 21.092,57					
B4	Prove di laboratorio sui materiali			€ 2.500,00			2% art. 92 c.5 D Lgs 163/2006 (cooprogettazione)			€ 1.500,00					
B5	Spese per la gestione dei lavori (il 2% di A)			€ 2.897,42			Competenze tecniche progettazione geotecnica			€ 12.262,83					
B6	Spese di gara e Contributo AVCP			€ 1.200,00			Per competenze tecniche DL, misure e			€ 2.500,00					
B7	Incentivi per la progettazione (2% di A)			€ 2.897,42			Collaudo statico			€ 2.897,42					
B8	Sommano B			€ 55.129,24			Imprevisti			€ 1.200,00					
totale				€ 200.000,00				Indagini e prove geognostiche				€ 2.897,42			
								totale				€ 140.225,57			

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione									
Fidejubente	ELBA Assicurazioni Spa	n. Polizza	1236954	Data di sottoscrizione					
		Importo	€ 22.838,00						

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Armando Mellini	Decreto di nomina	D.C. n. 361 del 20/04/2018	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista	Ing. F. Bongiovanni - Geom. L. Currò	Decreto di nomina	D.C. n. 792 del 13/11/2017
				Servizi geologici			
Direttore Operativo	Geom. Letterio Rodillo	Decreto di nomina	D.C. n. 401 del 04/05/2018	Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Letterio Rodillo	Decreto di nomina	D.C. n. 792 del 13/11/2017
Direttore Lavori	Ing. Armando Mellini	Decreto di nomina	D.C. n. 361 del 20/04/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	

AFFIDATARIA

Affidataria										
GANGI IMPIANTI SRL										
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)										
C.F. e P.IVA	IT05738830826	Indirizzo:	Via Porta di Conte 6, 90024 Gangi (PA)	Tel: 0921644652	gangiimpianti@legalmail.com	Posizione INPS SEDE:		Posizione INAIL SEDE:		Cassa Edile SEDE:
Tipo di Contratto Applicato										

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna		Data del concreto imposito dei lavori	11/04/2018	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	10/06/2018	Nuova Scadenza	26/06/2018
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga	15	giorni imprevisti in più	60	giorni impegnati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:									
1° SAL	per lavori a tutto il:	20/06/2018	Importo stato di avanzamento oltre iva	€ 84.100,00	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 900 del 27/09/2018	importo		102.602,00 €
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	20/06/2018		importo oltre IVA	€ 84.100,00					

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	07/06/2018	STATO FINALE emesso il	14/12/2018	importo oltre iva	100.668,85 €
-----------	------------	------------------------	------------	-------------------	--------------

Decreto di approvazione di certificato di regolare esecuzione e atti contabilità finale D.C. n. 1637 del 13/11/2019

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17599	MISTRETTA	Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato nel comune di Mistretta (ME)						Codice Rendis 19IR224/G1
Livello di Progettazione Iniziale		ESECUTIVO				FRANA		
CUP		J86J16001540001				Importo Progetto		€ 1.400.000,00
Decreto finanziamento Servizi		Importo		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto		Importo FSC
Decreto finanziamento		D.C. n. 76 del 08/02/2017	Decreto a contrarre	D.C. n. 566 del 14/06/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1138 del 20/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Rep. 177 del 19/02/2019
						Registrazione Contratto		Reg. 17/2264 del 19/02/2019
								Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
								D.C. n. 264 del 06/03/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 76 del 08/02/2017		€ 1.400.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 264 del 06/03/2019		€ 1.009.715,22																																																																																																													
<table border="1"> <tr><td>Incantieramento</td><td>€ 14.841,00</td></tr> <tr><td>Opere di consolidamento</td><td>€ 908.225,00</td></tr> <tr><td><b>Somma Lavori</b></td><td><b>€ 923.066,10</b></td></tr> <tr><td>Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori</td><td>€ 14.841,10</td></tr> <tr><td>Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso</td><td>€ 908.225,00</td></tr> <tr><td><b>Somma a disposizione di cui:</b></td><td><b>€ 476.933,90</b></td></tr> <tr><td>Acquisizione aree</td><td>€ 2.149,16</td></tr> <tr><td>Imprevisti ed arrotondamenti -5%</td><td>€ 45.289,73</td></tr> <tr><td>IVA 22%</td><td>€ 203.074,04</td></tr> <tr><td>Competenze geologo</td><td>€ 25.000,00</td></tr> <tr><td>Spese per indagini geologiche</td><td>€ 15.000,00</td></tr> <tr><td>Spese tecniche relative alla progettazione,</td><td>€ 145.414,92</td></tr> <tr><td>Polizza assicurativa Progettista - RUP-D.L.</td><td>€ 1.500,00</td></tr> <tr><td>Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.</td><td>€ 1.000,00</td></tr> <tr><td>Oneri di conferimento a discarica</td><td>€ 10.000,00</td></tr> <tr><td>Competente R.U.P. - Collaboratori Amministrativi</td><td>€ 6.000,00</td></tr> <tr><td>Piano di monitoraggio post-operam compreso IVA ed</td><td>€ 17.006,05</td></tr> <tr><td>Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn.</td><td>€ 1.500,00</td></tr> <tr><td>Per lavori in economia</td><td>€ 4.000,00</td></tr> <tr><td><b>totale</b></td><td><b>€ 1.400.000,00</b></td></tr> </table>		Incantieramento	€ 14.841,00	Opere di consolidamento	€ 908.225,00	<b>Somma Lavori</b>	<b>€ 923.066,10</b>	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 14.841,10	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 908.225,00	<b>Somma a disposizione di cui:</b>	<b>€ 476.933,90</b>	Acquisizione aree	€ 2.149,16	Imprevisti ed arrotondamenti -5%	€ 45.289,73	IVA 22%	€ 203.074,04	Competenze geologo	€ 25.000,00	Spese per indagini geologiche	€ 15.000,00	Spese tecniche relative alla progettazione,	€ 145.414,92	Polizza assicurativa Progettista - RUP-D.L.	€ 1.500,00	Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 1.000,00	Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00	Competente R.U.P. - Collaboratori Amministrativi	€ 6.000,00	Piano di monitoraggio post-operam compreso IVA ed	€ 17.006,05	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn.	€ 1.500,00	Per lavori in economia	€ 4.000,00	<b>totale</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>	<table border="1"> <tr><td>a1</td><td><b>Totale lavori al lordo complessivi</b></td><td><b>€ 923.066,10</b></td></tr> <tr><td></td><td>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</td><td>€ 14.841,10</td></tr> <tr><td></td><td>lavori a base d'asta soggetti a ribasso</td><td>€ 908.225,00</td></tr> <tr><td></td><td>A detrarre il ribasso d'asta del 35,1668%</td><td>€ 319.393,67</td></tr> <tr><td>b1</td><td>Importo dei lavori al netto</td><td>€ 588.831,33</td></tr> <tr><td>b2</td><td>Oneri della sicurezza</td><td>€ 14.841,10</td></tr> <tr><td></td><td><b>Tot. Lavori al netto + oneri sicurezza da contratto</b></td><td><b>€ 603.672,43</b></td></tr> <tr><td></td><td><b>Somma a disposizione di cui:</b></td><td><b>€ 406.042,79</b></td></tr> <tr><td></td><td>IVA sui Lavori 22%</td><td>€ 132.807,93</td></tr> <tr><td></td><td>Acquisizione aree</td><td>€ 2.149,16</td></tr> <tr><td></td><td>Imprevisti ed arrotondamenti</td><td>€ 45.289,73</td></tr> <tr><td></td><td>Competenze geologo</td><td>€ 25.000,00</td></tr> <tr><td></td><td>Spese per indagini geologiche</td><td>€ 15.000,00</td></tr> <tr><td></td><td>Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento</td><td>€ 145.414,92</td></tr> <tr><td></td><td>Polizza assicurativa Progettista RUP e DL</td><td>€ 1.500,00</td></tr> <tr><td></td><td>Versamento ANAC</td><td>€ 375,00</td></tr> <tr><td></td><td>Oneri di conferimento a discarica</td><td>€ 10.000,00</td></tr> <tr><td></td><td>Competenze RUP - Collaboratori Amministrativi</td><td>€ 6.000,00</td></tr> <tr><td></td><td>Piano di monitoraggio post-operam compreso IVA ed oneri</td><td>€ 17.006,05</td></tr> <tr><td></td><td>Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche,</td><td>€ 1.500,00</td></tr> <tr><td></td><td>Per lavori in economia</td><td>€ 4.000,00</td></tr> <tr><td></td><td><b>Totale Somme a disposizione</b></td><td><b>€ 406.042,79</b></td></tr> <tr><td></td><td><b>Totale Costo Intervento</b></td><td><b>€ 1.009.715,22</b></td></tr> </table>		a1	<b>Totale lavori al lordo complessivi</b>	<b>€ 923.066,10</b>		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.841,10		lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 908.225,00		A detrarre il ribasso d'asta del 35,1668%	€ 319.393,67	b1	Importo dei lavori al netto	€ 588.831,33	b2	Oneri della sicurezza	€ 14.841,10		<b>Tot. Lavori al netto + oneri sicurezza da contratto</b>	<b>€ 603.672,43</b>		<b>Somma a disposizione di cui:</b>	<b>€ 406.042,79</b>		IVA sui Lavori 22%	€ 132.807,93		Acquisizione aree	€ 2.149,16		Imprevisti ed arrotondamenti	€ 45.289,73		Competenze geologo	€ 25.000,00		Spese per indagini geologiche	€ 15.000,00		Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento	€ 145.414,92		Polizza assicurativa Progettista RUP e DL	€ 1.500,00		Versamento ANAC	€ 375,00		Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00		Competenze RUP - Collaboratori Amministrativi	€ 6.000,00		Piano di monitoraggio post-operam compreso IVA ed oneri	€ 17.006,05		Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche,	€ 1.500,00		Per lavori in economia	€ 4.000,00		<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 406.042,79</b>		<b>Totale Costo Intervento</b>	<b>€ 1.009.715,22</b>	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	
Incantieramento	€ 14.841,00																																																																																																																	
Opere di consolidamento	€ 908.225,00																																																																																																																	
<b>Somma Lavori</b>	<b>€ 923.066,10</b>																																																																																																																	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 14.841,10																																																																																																																	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 908.225,00																																																																																																																	
<b>Somma a disposizione di cui:</b>	<b>€ 476.933,90</b>																																																																																																																	
Acquisizione aree	€ 2.149,16																																																																																																																	
Imprevisti ed arrotondamenti -5%	€ 45.289,73																																																																																																																	
IVA 22%	€ 203.074,04																																																																																																																	
Competenze geologo	€ 25.000,00																																																																																																																	
Spese per indagini geologiche	€ 15.000,00																																																																																																																	
Spese tecniche relative alla progettazione,	€ 145.414,92																																																																																																																	
Polizza assicurativa Progettista - RUP-D.L.	€ 1.500,00																																																																																																																	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 1.000,00																																																																																																																	
Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00																																																																																																																	
Competente R.U.P. - Collaboratori Amministrativi	€ 6.000,00																																																																																																																	
Piano di monitoraggio post-operam compreso IVA ed	€ 17.006,05																																																																																																																	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn.	€ 1.500,00																																																																																																																	
Per lavori in economia	€ 4.000,00																																																																																																																	
<b>totale</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>																																																																																																																	
a1	<b>Totale lavori al lordo complessivi</b>	<b>€ 923.066,10</b>																																																																																																																
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.841,10																																																																																																																
	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 908.225,00																																																																																																																
	A detrarre il ribasso d'asta del 35,1668%	€ 319.393,67																																																																																																																
b1	Importo dei lavori al netto	€ 588.831,33																																																																																																																
b2	Oneri della sicurezza	€ 14.841,10																																																																																																																
	<b>Tot. Lavori al netto + oneri sicurezza da contratto</b>	<b>€ 603.672,43</b>																																																																																																																
	<b>Somma a disposizione di cui:</b>	<b>€ 406.042,79</b>																																																																																																																
	IVA sui Lavori 22%	€ 132.807,93																																																																																																																
	Acquisizione aree	€ 2.149,16																																																																																																																
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 45.289,73																																																																																																																
	Competenze geologo	€ 25.000,00																																																																																																																
	Spese per indagini geologiche	€ 15.000,00																																																																																																																
	Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento	€ 145.414,92																																																																																																																
	Polizza assicurativa Progettista RUP e DL	€ 1.500,00																																																																																																																
	Versamento ANAC	€ 375,00																																																																																																																
	Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00																																																																																																																
	Competenze RUP - Collaboratori Amministrativi	€ 6.000,00																																																																																																																
	Piano di monitoraggio post-operam compreso IVA ed oneri	€ 17.006,05																																																																																																																
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche,	€ 1.500,00																																																																																																																
	Per lavori in economia	€ 4.000,00																																																																																																																
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 406.042,79</b>																																																																																																																
	<b>Totale Costo Intervento</b>	<b>€ 1.009.715,22</b>																																																																																																																

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Ridobente	Svizzera Assicurazioni	n. Polizza	2241076	Data di sottoscrizione	01/02/2019
		Importo	€ 151.625,03		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Rosario Mazzurco	Decreto di nomina	D.C. n.76 del 08/02/2017	Supporto al RUP Progettista	Arch. Di Magro Giampiero	Decreto di nomina	D.C. n. 803 del 29/08/2018
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Arch. Giampiero Di Magro	Decreto di nomina	D.C. n. 803 del 29/08/2018	Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Chiofalo (CSE) - geom. Presti (DO)	Decreto di nomina	D.C. n. 962 del 09/07/2019
Direttore Lavori	Arch. Di Leo	Decreto di nomina	D.C. n. 962 del 09/07/2019	Assistente al DL	Ing. Di Ganci	Decreto di nomina	D.C. n. 962 del 09/07/2019
Geologo	Geol. Giuseppe Schirò	Decreto di Nomina	D.C. n. 1460 del 17/10/2019				
Collaudatore Statico - Tecnico Amministrativo		Decreto a contrarre (ex art. 36)	D.C. n. 1555 del 30/10/2019				

AFFIDATARIA

Affidataria	ALPI SRL						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F. e P.IVA	00832250928	Indirizzo:	Via Di Prosecco, n. 2, 34131 - Trieste	Tel/Fax:	040 215 8357		
Tipo di Contratto Applicato							

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

TEMPISTICA

Data della consegna	30/10/2019	Data del contratto (inizio dei lavori)		Scadenza tempi utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni consegnati in più		giorni impegnati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
COLLAUDO STATICO							
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							

Codice Caronte SI_1_17771	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria nel comune di Montalbano Elicona (ME)						Codice Rendis 191R178/G1			
Livello di Progettazione Iniziale		ESECUTIVO			FRANA						
CUP	J49D16002040001	Importo Progetto			€ 1.300.000,00		Importo FSC € 1.300.000,00				
Decreto finanziamento Servizi	Decreto a contrarre		Decreto aggiudicazione definitiva		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione				
Decreto finanziamento	D.C. n. 308 del 06/04/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 420 del 09/05/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 1076 del 08/11/2018	Sottoscrizione Contratto	Rep. 179 del 07/03/2019	Registrazione Contratto	Reg. 11/3175 del 07/03/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 733 del 31/05/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		€ 1.300.000,00		€ 917.920,78	
Importi Decreto di Finanziamento n. 308 del 06/04/2018		Importi Decreto di Impegno n. 733 del 31/05/2019 con relativa approvazione QE		Rimodulato	
A	importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo	€ 875.858,46	A	Lavori al netto del ribasso	€ 529.423,74
a1	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 842.603,43	a1	Oneri della sicurezza	€ 32.982,03
a2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 32.982,03	a2	Lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza	€ 562.405,77
B	Somma a disposizione di cui:	€ 424.414,54	B	Somma a disposizione di cui:	€ 355.515,01
b1	IVA 22% sui lavori	€ 192.628,80	b1	IVA	€ 123.729,27
b2	RUP (0,25 del 2%)	€ 4.377,93	b2	RUP	€ 4.377,93
b3	Competenze tecniche progettazione, Direzione lavori e sicurezza	€ 103.238,26	b3	Competenze tecniche progettazione, Direzione	€ 103.238,26
b4	collaudo statico e tecnico-amministrativo oneri inclusi	€ 21.512,93	b4	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 21.512,93
b5	oneri conferimento a discarica	€ 2.000,00	b5	Oneri conferimento discarica	€ 2.000,00
b6	oneri di gara	€ 8.000,00	b6	Oneri di gara	€ 8.000,00
b7	per espropri ed oneri afferenti	€ 8.965,49	b7	Espropri e oneri	€ 8.965,49
b8	competenze geologo oneri inclusi	€ 27.444,12	b8	Competenze geologo oneri inclusi	€ 27.444,12
b9	indagini geognostiche oneri inclusi	€ 23.081,67	b9	Indagini geognostiche oneri inclusi	€ 23.081,67
b10	c10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 5.000,00	b10	e per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 5.000,00
b11	c11) per monitoraggio post intervento oneri inclusi	€ 15.000,00	b11	Monitoraggio post intervento oneri inclusi	€ 15.000,00
b12	c12)imprevisti < 5%	€ 13.165,34	b12	imprevisti	€ 13.165,34
C	totale	€ 1.300.000,00	C	totale	€ 917.920,78
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA					

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione					
Fidejubente	Allianz Assicurazioni	n. Polizza	732090423	Data di sottoscrizione	16/01/2019
		Importo	€ 152.749,41		

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Massimiliano Mobilia	Decreto di nomina	D.C. 980 del 17/10/2018	Supporto al RUP		Decreto di nomina	
				Progettista		Decreto di nomina	
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord. Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord. Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Filippo Gullo	Decreto di nomina	D.C. n. 1004 del 24/10/2018
Direttore Lavori	Ing. Filippo Gullo	Decreto di nomina	D.C. n. 1004 del 24/10/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	Ing. Antonio Fabrizio	Decreto a contrarre (ex art. 36)				D.C. n. 1255 del 16/09/2019	
		Decreto di Nomina				D.C. n. 1612 del 07/11/2019	

AFFIDATARIA

Affidataria	ZEUS COSTRUZIONI SRL					
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)						
P.IVA	01903320859	Indirizzo:	Via Nazionale 85 93010 Vallerlunga Pratomeno (CL)	Tel/Fax:	0934 814199	

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

Anticipazione 20%		Decreto di Anticipazione 20%	D.C. n. 1387 del 07/10/2019	importo	112.227,00 €
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	19/09/2019	importo oltre IVA	137.227,00 €		

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17605	REITANO	Stralcio dei lavori di completamento della via Archimede e Piazza San Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato nel comune di Reitano (ME)					Codice Rendis 19IR813/G1
ESECUTIVO		MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE					
CLP		J8616001520001		Importo Progetto		€ 2.980.000,00	
CLP		J8616001520001		Importo ISC		€ 2.013.885,40	
Decreto di Finanziamento Servizi	Decreto di Impegno	Decreto di Contrarre	D.C. n. 755 del 05/06/2019 (ex art. 36)	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
Decreto di Finanziamento	D.C. n. 16 del 12/01/2017	Decreto di Contrarre	D.C. n. 374 del 24/04/2018	Decreto di aggiudicazione ufficiale	D.C. n. 300 del 11/03/2019	Sottoscrizione Contratto	
					Rep. 205 del 22/05/2019	Registrazione Contratto	
					Reg. 11/6818 del 22/05/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
						D.C. n. 721 del 30/05/2019	

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento n. 16/2017		€ 2.013.885,40	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 721 del 30/05/2019		€ 1.571.813,85
A	Importo dei lavori	€ 1.303.130,36			Importo dei lavori	€ 1.303.130,66	
A1	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori non	€ 35.866,31			Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori non	€ 17.822,66	
A2	di sicurezza, già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€ 17.822,66			Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.285.308,00	
	a detrarre	€ 53.688,97			Importo del ribasso	€ 362.354,03	
A3	importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.249.441,39			Lavori al netto del ribasso	€ 922.953,97	
B	Somme a disposizione di cui:	€ 710.755,04			Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 17.822,66	
B1	IVA sui lavori	€ 286.688,68			Totale lavori comprensivo di oneri della sicurezza	€ 940.776,63	
B2	per competenze tecniche compreso IVA ed oneri	€ 216.462,39			Somme a disposizione di cui:	€ 631.037,22	
B3	per competenze tecniche geologo compreso IVA ed	€ 10.000,00			IVA	€ 206.970,86	
B4	Per competenze ufficio R.U.P. (2%)	€ 28.062,61			Competenze tecniche compreso IVA e oneri	€ 216.462,39	
B5	Oneri accesso a discarica	€ 10.000,00			Competenze tecniche geologo compreso IVA e oneri	€ 10.000,00	
B6	per pubblicazione bando di gara, commissione di gara e	€ 29.000,00			Competenze Ufficio RUP	€ 26.062,61	
B7	Per imprevisti e arrotondamenti inferiore 5%	€ 21.089,36			Oneri accesso a discarica	€ 10.000,00	
B8	Per realizzazione monitoraggio	€ 50.000,00			Commissione di gara e contributo ANAC	€ 29.000,00	
B9	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn.	€ 17.000,00			Imprevisti e arrotondamenti	€ 21.089,36	
B10	Per lavori in economia	€ 14.000,00			Realizzazione monitoraggio	€ 50.000,00	
					Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche	€ 17.000,00	
					Lavori in economia	€ 14.000,00	
					Redazione studio ambientale	€ 30.452,00	
					Totale	€ 1.571.813,85	
					ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione						
Fidejudente	Unipol Sai Assicurazioni SPA	n. Polizza	166789238	Data di sottoscrizione	26/04/2018	
		Importo	€ 171.146,05			

FIGURE TECNICHE

RUP	Geom. Rocco Togaro	Decreto di nomina	D.C. 16 del 12/01/2017	Supporto al RUP	Progettista	Sig.ra Quiles	Decreto di nomina	D.C. n. 1284 del 19/09/2019
Direttore Lavori	Arch. Marcello Lo Monaco	Decreto di nomina	D.C. n. 363 del 20/03/2019	Assistente al DL		Geom. Pagliaro	Decreto di nomina	D.C. n. 1284 del 19/09/2019
Collaudatore Statico - Tecnico Amministrativo	Ing. Elisa Leone	Decreto a contrarre (ex art. 36)					D.C. n. 755 del 05/06/2019	
		Decreto di Affidamento					D.C. n. 1263 del 17.09.2019	

AFFIDATARIA

Affidataria: <b>ATI BE.I.CO. COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.</b>							
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria) BE.I.CO. S.R.L.							
C.F./P.IVA	03202100875	Indirizzo:	Via Monsignor Domenico Orlando n. 14, 95126 Catania	Tel/Fax:	095 7126341	e-mail/PEC:	beicuff@tiscali.it
Tipo di Contratto Applicato							

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.

C.F./P.IVA	4292090877	Indirizzo:	Via Monsignor Domenico Orlando n. 14, 95126 Catania	Tel/Fax:	095 7126341	e-mail/PEC:	
Tipo di Contratto Applicato							

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA							
Data della consegna Parziale	13/06/2019	Data del contratto	09/09/2019	Scadenza termini utile per l'aggiudicazione dei lavori	15/01/2020	Data Fine Lavori	
Data consegna finale	05/07/2019	Data di prova	09/09/2019				
n. gg. eventuali Sospensioni		n. gg. Eventuali Proroghe		Totale gg. Previsti	150 gg.	giorni impiegati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
Anticipazione del 20% emesso	24/07/2019	per lavori a tutto il:		Importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 188.155,28	Decreto di liquidazione Anticipazione	D.C. n. 1109 del 05/08/2019
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	17/07/2019			importo oltre IVA	€ 188.155,28		importo
1° SAL emesso il:	03/10/2019	per lavori a tutto il:	25/09/2019	Importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 230.855,56	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 1532 del 28/10/2019
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	27/09/2019			importo oltre IVA	€ 230.855,56		importo
2° SAL emesso il:		per lavori a tutto il:	07/11/2019	Importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 179.328,34	Decreto di liquidazione SAL n. 2	D.C. n. 1870 del 12/11/2019
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	13/11/2019			importo oltre IVA	€ 179.328,34		importo

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

COLLAUDO STATICO  
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SL_1_37591	SANT'AGATA DI MILITELLO	Lavori urgenti a protezione di tratto del lungomare SP162 antistante la Caserma dei Carabinieri nel Comune di S. Agata di Militello (ME)						Codice Rendis 19IRD99/G1	
Livello di Progettazione iniziale		SOMMA URGENZA				Tipo di dissesto		MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE	
CUP		J46116000860001				Importo Progetto		€ 2.200.000,00	
Decreto finanziamento Servizi		Importo finanziato		Decreto a contratto		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	
Decreto finanziamento		Decreto a contratto		Decreto aggiudicazione		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto	
D.C. n. 53 del 31/01/2017		D.C. n. 53 del 31/01/2017		D.C. n. 69 del 06/02/2017		REP.148 del 04/04/2017		IL 05/04/2017 c/o Ufficio Terroitoriale di Palermo 2	
								Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
								Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	
								D.C. n. 197 del 14/04/2017	

LAVORI ULTIMATI

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 53/2017		€ 200.000,00		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 197 del 14/04/2017		€ 120.699,42	
Importo dei lavori		€ 155.000,00		Totale lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 15.000,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.199,20		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.199,20	
Sommano i lavori a base d'asta		€ 148.800,80		Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 148.800,80	
Totale Oneri di Sicurezza				Importo del ribasso		€ 59.423,60	
Somma a disposizione di cui:		€ 90.000,00		Totale lavori al netto del ribasso		€ 89.377,20	
Incentivo per le funzioni tecniche di cui all'Art 113 del D.lgs		€ 3.100,00		Oneri e costi della sicurezza non soggetti al ribasso		€ 6.199,20	
Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori)		€ 34.100,00		Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 95.576,40	
Per versamento quota Autorità Vigilanza		€ 225,00		Somme a disposizione di cui:		€ 25.123,02	
Imprevisti e/o Arrotondamento		€ 6.575,00		IVA sui lavori		€ 21.026,81	
Per Oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)		€ 500,00		Per polizza assicurativa		€ 500,00	
Per polizza assicurativa		€ 500,00		Imprevisti e/o arrotondamenti			
				Oneri per il conferimento in discarica (compreso IVA)		€ 271,21	
				Spese di gara		€ 225,00	
				Incentivi progettazione		€ 3.100,00	
Totale somme a disposizione amministrazione		€ 45.000,00		totale		€ 120.699,42	
totale		€ 200.000,00				ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejubente	CBL Insurance Europe DAC	n. Polizza	314261/DE	Data di sottoscrizione			
		Importo	€ 28.611,00	29/03/2017			

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giovanni Lentini	Decreto di nomina	D.C. n. 44 del 26/01/2017	Supporto al RUP	Arch. Venuto - Arch. Papaprone	Decreto di nomina	D.C. n. 44 del 26/01/2017
Supporto Tecnico Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Rosario Oliva	Decreto di nomina	D.C. n. 56 del 01/02/2017
Direttore Lavori	Arch. Maurizio Venuto	Decreto di nomina	D.C. n. 56 del 01/02/2017	Assistente al DL		Decreto di nomina	
Collaudatore Statico	Ing. Battaglia	Decreto di nomina	D.C. n. 118 del 08/03/2017				
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Arch. Orsi	Decreto di nomina	D.C. n. 118 del 08/03/2017				

AFFIDATARIA

Affidataria	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F./P.IVA	02669810836	Indirizzo:	Via Campidoglio, 73 - 98076 Sant'Agata di Militello (ME)	Tel/Fax:	0921/390446 0921/337442	e-mail/PEC:	info@costruzionibruno.it
Tipo di Contratto Applicato							

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:	
-----------------	--

TEMPISTICA

Data della consegna	09/04/2017	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	09/02/2017	Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuali Proroga		giorni impegnati in meno	60	giorni impegnati in meno	

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	02/03/2017	per lavori a tutto il:	02/03/2017	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 90.315,00	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 268 del 22/05/2017	importo	€ 110.184,30
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	24/04/2017			importo oltre IVA	€ 90.315,00				
STATO FINALE emesso il:	02/03/2017	per lavori a tutto il:	02/03/2017	importo stato di avanzamento oltre IVA	€ 5.256,57	Decreto di liquidazione Rate di Saldo	D.C. n. 809 del 16/11/2017	importo	€ 6.413,02
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA				importo oltre IVA	€ 5.256,57				

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Emesso il	06/03/2017	STATO FINALE emesso il	02/03/2017	importo oltre IVA	5.256,57
-----------	------------	------------------------	------------	-------------------	----------

COLLAUDO STATICO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17592	SANT'AGATA DI MILITELLO	Lavori urgenti per la ricostruzione di un muro di sostegno diruto sulla S.P. 162 del lungomare di S. Agata di Militello, tratto compreso tra la Via Campidoglio e Vallone Posta (ME)						Codice Rendis 19IRD77/G1
ESECUTIVO				MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE				
Livello di Progettazione				Tipo di dissesto				
CUP J46J16000860001				Importo Progetto € 2.200.000,00				Importo FSE € 2.079.300,58
Decreto finanziamento Servizi		Decreto a contratto		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento		Decreto a contratto		Sottoscrizione Contratto		Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
D.C. n. 120 del 09/03/2017		D.C. n. 199 del 18/04/2017		D.C. n. 628 del 18/09/2017		REP. 158/2018 e Atto Aggiuntivo Rep. 171/2019		D.C. n. 810 del 04/09/2018 D.C. n. 993 del 18/10/2018

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI				Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 694 del 23/05/2019			
Importi Decreto di Finanziamento n. 199/2017				€ 2.079.300,58			
A1 Lavori a misura				€ 1.586.000,00			
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 18.000,00			
Sommano				€ 1.604.000,00			
B Somma a disposizione di cui:				€ 950.601,16			
B1 IVA sui lavori (22%)				€ 352.880,00			
B2 Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92,				€ 32.080,00			
B3 Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali,				€ 16.040,00			
B4 Oneri conferimento discarica (IVA Compresa)				€ 8.000,00			
B5 Rilievi e indagini geologiche (IVA compresa)				€ 3.280,00			
B6 Prove di laboratorio (IVA compresa)				€ 48.120,00			
B7 Imprevisti e arrotondamenti				€ 600,00			
B8 Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7				€ 6.300,58			
B9 Spese per pubblicità				€ 475.300,58			
Sommano				€ 475.300,58			
totale				€ 2.079.300,58			
A Lavori a misura - importo complessivo dell'appalto a base di gara				€ 2.339.766,04			
A2 Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza) non soggetti a ribasso				€ 110.339,52			
Importo totale dei lavori soggetti a ribasso				€ 2.229.426,52			
Ribasso offerto in sede di gara 42,8652%				€ 955.648,14			
Lavori a misura al netto del ribasso del 42,8652%				€ 1.273.778,38			
A2 Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza) non soggetti a				€ 110.339,52			
Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza				€ 1.384.117,90			
B Somma a disposizione di cui:				€ 517.734,27			
B1 IVA sui lavori				€ 304.505,94			
B2 Spese tecniche per Incentivi alla progettazione				€ 46.795,32			
B3 Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i				€ 4.000,00			
B4 Oneri conferimento in discarica				€ 4.000,00			
B5 Rilievi accertamenti e indagini				€ 6.212,87			
B6 Spese per prove di laboratorio				€ 6.212,87			
B7 Imprevisti				€ 600,00			
B8 Spese tecniche di carattere strumentale sostenute				€ 10.117,12			
B9 Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori				€ 6.300,37			
B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				€ 139.202,65			
B11 Interventi di ripristino causa danni di forza maggiore				€ 1.901.852,17			
Sommano				€ 1.901.852,17			
totale				€ 1.901.852,17			

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione							
Fidejussore	Compagnia Assicurativa Euroins	n. Polizza	EI081702353	Data di sottoscrizione	23/11/2018		
		Importo	169.963,46				

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Giovanni Lentini	Decreto di nomina	D.C. n. 27 del 18/01/2017	Supporto al RUP Progettista	Ing. Ciro Azzara, Ing. Marco Ferrante	Decreto di nomina	D.C. n. 150 del 30/10/2019
Supporto Tecnico, Geotecnico, specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Rosario Bonanno	Decreto di nomina	D.C. n. 626 del 18/09/2017
Direttore Lavori	Ing. Rosario Bonanno	Decreto di nomina	D.C. n. 626 del 18/09/2017	Direttore Operativo Ispettore di Cantiere	Geom. Antonino Letizia (D.O.) Geom. Luigi Castano (I.C.)	Decreto di nomina	D.C. n. 626 del 18/09/2017
Collaudatore Statico	Ing. Carmelo Battaglia	Decreto di nomina	D.C. n. 118/2017				
Collaudatore Tecnico Amministrativo	Ing. Francesco Orsi	Decreto di nomina	D.C. n. 118/2017				

AFFIDATARIA

Affidataria RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.r.l.							
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F./P.IVA	02987670839	Indirizzo:	Via Poli, 29 - 00187 ROMA	Tel/Fax	06 6781331 06 69292801	e-mail/PEC:	info@ricciardello-com
Tipo di Contratto Applicato							

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

Subappaltatore:							
TEMPISTICA							
Data della consegna	20/10/2017	Data del concreto inizio dei lavori	23/01/2018	Scadenza tempo utile per l'affidamento dei lavori	20/08/2018	Nuova Scadenza	
n. di Esercizio Sospensione		n. di Esercizio Prolunga		totale gg previsti	210	giorni impiegati in più	
						giorni impiegati in meno	

VARIANTE

PERIZIA DI VARIANTE N.1	27/03/2018	Decreto approvazione perizia variante	D.C. n. 694 del 23/05/2019	importo perizia variante	1.901.852,17	Importi Decreto approvazione Variante_QE Rimodulato	
tempo utile per l'affidamento		Nuova Scadenza		importo contrattuale dopo la Perizia		di cui	Totall lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza
1° atto aggiuntivo in data		data di Registrazione		Numero di registrazione			Somme a disposizione
							€ 1.385.084,16
							516.768,01
						TOTALE	€ 1.901.852,17

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL emesso il:	01/02/2018	per lavori a tutto il:	26/01/2018	importo stato di avanzamento oltre iva	423.600,00 €	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 836 del 10/09/2018	Importo	€ 516.792,00		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	31/01/2018			importo oltre IVA	423.600,00 €						
2° SAL emesso il:	24/09/2018	per lavori a tutto il:	17/09/2018	importo stato di avanzamento oltre iva	469.700,00 €	Decreto di liquidazione SAL n. 2	D.C. n. 178 del 12/02/2019	Importo	€ 573.034,00		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	24/01/2019			importo oltre IVA	469.700,00 €						
3° SAL emesso il:	16/01/2019	per lavori a tutto il:	16/01/2019	importo stato di avanzamento oltre iva	414.577,89 €	Decreto di liquidazione SAL n. 3	D.C. n. 1079 del 1/08/2019	Importo	€ 505.785,02		
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	01/02/2018			importo oltre IVA	414.577,89 €						
Emesso il				STATO FINALE emesso il				importo oltre iva			

COLLAUDO STATICO  
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Caronte SI_1_17676	CEFALU'	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù (PA)							Codice Rendis 19IR101/G1		
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO			Tipo di dissesto		FRANA					
CUP	J89D16003200001			Importo Progetto	€ 1.827.000,00	Importo FSC	€ 1.827.000,00				
Decreto finanziamento Servizi	Importo finanziato		Decreto a contrarre		Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto		Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	D.C. n. 781 del 09/08/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1133 del 19/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 591 del 09/05/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. 228 del 24/07/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/4623 del 24/07/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 1279 del 19/09/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI

Importi Decreto di Finanziamento n. 781/2018			€ 1.827.000,00	Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato			€ 1.242.358,10	
A1	Importo dei lavori da CME, soggetto a ribasso d'asta	€ 1.285.884,43	A	Lavorazioni			€ 1.308.711,62	
A2	Oneri della sicurezza	€ 22.827,19		Costi relativi alla sicurezza			€ 22.827,19	
A	Totale Lavori	€ 1.308.711,62		Importo a base di gara			€ 1.285.884,00	
B	Somme a disposizione di cui:	€ 518.288,38		A1	Importo del ribasso			€ 471.919,59
B1	IVA sui lavori	€ 287.916,56		A2	Lavori al netto del ribasso d'asta			€ 813.964,84
B2	Spese per pubblicità bando di gara	€ 5.000,00		Costi relativi alla sicurezza			€ 22.827,19	
B3	Spese per espropri	€ 7.587,81		B	Somme a disposizione			€ 405.566,07
B4	Competenze RUP e Supporto al RUP	€ 8.899,24		B1	IVA sui lavori			€ 184.094,25
B5	Commissione art. 77 DL 50/2016 e s.m.i	€ 4.500,00		B2	ANAC			€ 600,00
B6	Progettazione Def., Esec. Ed Esecuzione dei lavori	€ 137.321,07		B3	Spese per espropri			€ 7.587,81
B7	Studio Geologico (Progettazione)	€ 11.972,66	B4	Competenze RUP e Supporto RUP			€ 8.899,24	
B8	Verifiche e collaudi	€ 36.789,88	B5	Progettazione def. esec. ed esecuzione dei lavori			€ 137.321,07	
B9	prove di accettazione materiali e di collaudo tiranti	€ 5.000,00	B6	Studio geologico			€ 11.972,66	
B10	Imprevisti	€ 13.301,16	B7	Verifiche e collaudi			€ 36.789,88	
			B8	Spese per prove di accettazione materiali e di collaudo tiranti			€ 5.000,00	
			B9	Imprevisti			€ 13.301,16	
				totale			€ 1.242.358,10	
				totale			€ 1.827.000,00	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA								

CAUZIONI E GARANZIE

Fidejussione						
Fidejubente	Credendo - Excess e Surety	n. Polizza	017606/DE	Data di sottoscrizione	20/06/2019	
		Importo	€ 223.423,48			

FIGURE TECNICHE

RUP	Ing. Ivan Joseph Duca	Decreto di nomina	D.C. n. 629 del 18/09/2017	Supporto al RUP Progettista		Decreto di nomina Incarico conferito tramite:
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Fabio Cafiso	Decreto di nomina D.C. n. 1080 del 08/11/2018
Direttore Lavori	Ing. Fabio Cafiso	Decreto di nomina	D.C. n. 1080 del 08/11/2018	Assistente al DL		Decreto di nomina

AFFIDATARIA

Affidataria	COST. ATI GHELLER S.R.L. - FOX S.R.L.S.						
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)							
C.F.	02230600245	Indirizzo:	Via Montegrappa n. 7, Solagna (VI)	Tel/Fax:	0424 558330	e-mail/PEC:	info@gheller.it
Tipo di Contratto Applicato							

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante FOX S.R.L.S.

C.F.	03267800831	Indirizzo:	Contrada TORRETTA SNC 98063 Gioiosa Marea (ME)	Tel/Fax:	Tel. 0941 243141 Cell. 320 6042492	e-mail/PEC:	fox.srls@gmail.com
------	-------------	------------	--	----------	---------------------------------------	-------------	--------------------

SUBAPPALTI AUTORIZZATI

TEMPISTICA

Data della consegna	24/09/2019	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga		giorni impiegati in più	270	giorni impiegati in meno	
totale gg previsti							

VARIANTE

STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:							
ANTICIPAZIONE del 20%							
Anticipazione 20% emessa il:	23/10/2019	per lavori a tutto il:		Importo stato di avanzamento oltre iva	167.358,41 €	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 1544 del 30/10/2019
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	23/10/2019					Importo	€ 204.177,26
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE							
COLLAUDO STATICO							
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO							



Codice Caronte SI_1_17679	COLLESANO	Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce nel comune di Collesano (PA)						Codice Rendis 19IR108/G1			
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVO				Tipo di dissesto	FRANA					
CUP	J49D16001910001				Importo Progetto	€ 1.268.000,00	Importo Fsc	€ 1.268.000,00			
Decreto finanziamento Servizi	Decreto finanziamento	Decreto a contrarre	D.C. n. 1194 del 29/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 884 del 01/07/2019	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione			
Decreto finanziamento	D.C. n. 949 del 04/10/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1194 del 29/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 884 del 01/07/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. n. 244 del 03/10/2019	Registrazione Contratto	Reg. 17/410731 del 03/10/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione	D.C. n. 1482 del 22/10/2019

**LAVORI IN CORSO**

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento n. 949 del 04/10/2018		Importi Decreto di Impegno con relativa approvazione QE Rimodulato	
		€ 1.248.600,00		€ 871.922,85	
A	Importo dei Lavori	€ 810.454,20		Importo dei lavori a misura (costi sicurezza e manodopera)	€ 810.454,20
A1	Importo dei costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.423,99		A1 Importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.423,99
A2	Importi dei Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 778.030,21		A Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 778.030,21
B	Somma a disposizione di cui:	€ 438.145,80		Importo del ribasso	€ 296.764,06
B1	IVA 22 % sui lavori	€ 178.299,92		Lavori al netto del ribasso	€ 481.266,15
B2	Imprevisti sui lavori < 5% e arrotondamenti, IVA compresa	€ 39.998,61		Importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.423,99
B3	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva	€ 25.122,24		Totale dei lavori al netto del ribasso compreso	€ 513.690,14
B4	Spese tecniche per Direzione dei Lavori misure e	€ 42.429,18		B Somme a disposizione	€ 358.232,71
B5	Spese tecniche per Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione comprensive di oneri e IVA	€ 24.742,00		B1 IVA sui lavori	€ 113.011,83
B6	Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera comprensive di oneri ed IVA	€ 8.140,68		B2 Imprevisti sui lavori e arrotondamenti IVA compresa	€ 39.998,61
B7	Spese tecniche per Collaudo statico comprensive di oneri e IVA	€ 18.655,75		B3 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva	€ 25.122,24
B8	Studio geologico comprensivo di oneri e IVA	€ 23.848,34		B4 Spese tecniche per Direzione lavori	€ 42.429,18
B9	Incentivo interno art. 113 D. Lgs. 50/16 (2% importo lavori)	€ 16.209,08		B5 Spese tecniche per CSP e CSE	€ 24.742,00
B10	Oneri accesso in discarica, IVA compresa	€ 5.700,00		B6 Spese tecniche per collaudo tecnico-	€ 8.140,68
B11	Pubblicazione bando	€ 1.000,00		B7 Spese tecniche per collaudo statico	€ 18.655,75
B12	Indagini ed ispezioni geologiche	€ 14.400,00		B8 Studio geologico	€ 23.848,34
B13	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 10.000,00		B9 Incentivo interno art. 113 D.Lgs 50/16	€ 16.209,08
B14	Commissione di gara	€ 15.000,00		B10 Oneri accesso a discarica	€ 5.700,00
B15	Oneri assicurativi verificatore	€ 600,00		B11 Pubblicazione bando	€ 1.000,00
B16	Monitoraggio	€ 14.000,00		B12 Indagini e ispezioni geologiche	€ 14.400,00
	<b>totale</b>	<b>€ 1.248.600,00</b>		B13 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 10.000,00
				B14 ANAC	€ 375,00
				B15 Oneri assicurativi verificatore	€ 600,00
				B16 Monitoraggio	€ 14.000,00
				<b>totale</b>	<b>€ 871.922,85</b>

**ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA**

**CAUZIONI E GARANZIE**

Fidejussione	
Fidejubente	City Insurance
n. Polizza	IM 000012709
Data di sottoscrizione	06/09/2019
Importo	€ 144.568,00

**FIGURE TECNICHE**

RUP	Geom. Fabio Fiandaca	Decreto di nomina	D.C. n. 279 del 04/04/2018	Supporto al RUP Progettista	Decreto di nomina
Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.		Decreto di nomina		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto a contrarre (ex art 36) D.C. n. 1333 del 30/09/2019
Direttore Lavori	Ing. Michele Zafonti	Decreto di nomina	D.C. n. 1577 del 05/11/2019	Dcreto a contrarre (Ex art. 36)	D.C. n. 1333 del 30/09/2019
Collaudatore Statico				Dcreto a contrarre (Ex art. 36)	D.C. n. 1702 del 26/11/2019

**AFFIDATARIA**

Affidataria	<b>CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.S</b>				
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)					
C.F. e P.IVA	07751331005	Indirizzo:	Via San Leonardo n. 17 Parma (PR)	Tel/Fax:	
e-mail/PEC:	stabileaurora@arubapec.it				

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

Subappaltatore:	
TEMPISTICA	

Data della consegna	15/07/2019	Data del concreto inizio dei lavori	15/07/2019	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	09/09/2020	Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	300	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno	
<b>VARIANTE</b>							
<b>COLLAUDO STATICO</b>							
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>							



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia"



Codice Carante SI_1_17601	MEZZOJUSO	Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci nel comune di Mezzojuso (PA)						Codice Rendis 19R317/G1
Livello di Progettazione Iniziale	ESECUTIVA				Tipo di dissesto	FRANE		
CUP	J16J16002340001				Importo Progetto	€ 1.000.000,00	Importo FSC	€ 1.000.000,00
Decreto finanziamento Servizi	Decreto avvio gara	Decreto a contrarre	Decreto D.C. n. 1129 del 15/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 297 del 08/03/2019	Sottoscrizione Contratto	Registrazione Contratto	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
Decreto finanziamento	D.C. n. 174 del 04/04/2017 - D.C. n. 789 del 20/08/2018	Decreto a contrarre	D.C. n. 1129 del 15/11/2018	Decreto aggiudicazione definitiva	D.C. n. 297 del 08/03/2019	Sottoscrizione Contratto	Rep. N. 213 del 30/05/2019	Registrazione Contratto
							Reg. 17/7262 del 30/05/2019	Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione
								D.C. 820 del 13/06/2019

LAVORI IN CORSO

DATI FINANZIARI		Importi Decreto di Finanziamento n. 789/2018	€ 1.000.000,00	Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato n. 820 del 13/06/2019	€ 663.378,35	
A	Importo lavori al lordo	€ 694.594,25		A	Importo totale dei lavori	€ 694.594,25
A1	Importo dei lavori escluso sicurezza soggetti a ribasso	€ 690.012,35			Oneri di sicurezza speciali da PSC	€ 4.581,90
	Opere provvisoriale e impianti temporanei per la	€ 4.581,90			Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 690.012,35
					Importo del ribasso percentuale (39,987%)	€ 275.919,38
				A1	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 414.092,97
				A2	Oneri di sicurezza speciali da PSC	€ 4.581,90
					Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri	€ 418.674,87
B	Somma a disposizione di cui:	€ 305.405,75		B	Somma a disposizione di cui:	€ 244.703,48
B1	IVA 22%	€ 152.810,74		b.1	Iva 22% sull'importo totale dei lavori	€ 92.108,47
B2	Competenze tecniche progettazione, DL, misure e cont., CSE	€ 37.500,00		b.2	per competenze tecniche progettazione, D.L., misura	€ 47.580,00
B3	Iva e tasse sulle competenze	€ 10.080,00		b.3	per competenze ufficio RUP	€ 3.472,97
B4	Competenze Ufficio RUP	€ 3.472,97		b.4	per competenze ufficio di direzione lavori	€ 20.000,00
B5	Competenze ufficio di direzione dei lavori	€ 20.000,00		b.5	per competenze geologiche (compreso oneri ed IVA)	€ 17.421,76
B6	Competenze geologiche compreso IVA	€ 17.421,76		b.6	per indagini Geognostiche e Geotecniche	€ 15.000,00
B7	Indagini Geognostiche-Geotecniche	€ 15.000,00		b.7	per collaudo statico (compreso oneri ed IVA)	€ 14.737,31
				b.8	per collaudo amministrativo (compreso IVA e tasse)	€ 8.797,73
B8	Collaudo statico (compreso Iva e tasse)	€ 14.737,31		b.9	per contributo ANAC già impegnato con decreto n.	€ 375,00
B9	Collaudo Amministrativo (compreso IVA e tasse)	€ 8.797,73		b.10	per monitoraggio frana	€ 5.000,00
B10	Contributo Anac	€ 375,00		b.11	per prove di laboratorio	€ 5.000,00
B11	Monitoraggio frana	€ 5.000,00		b.12	per imprevisti	€ 15.210,24
B12	Prove di laboratorio	€ 5.000,00			Sommano B	
B13	Imprevisti	€ 15.210,24				
	totale	€ 1.000.000,00			totale	€ 663.378,35

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

CAUZIONI E GARANZIE	
Fidejussione	
Fidejubente	Italiana Assicurazioni Spa
n. Polizza	2019/13/6445466
Data di sottoscrizione	18/04/2019
Importo	€ 125.548,03

FIGURE TECNICHE					
RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di nomina	D.C. n. 726 del 20/10/2017	Supporto al RUP	Decreto di nomina
				Progettista	Ing. Michele Zafonti
					Incarico conferito tramite:
					D.C. n. 552 del 08/06/2018
Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Michele Zafonti	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Esecuzione	Decreto di nomina
Direttore Lavori	Ing. Michele Zafonti	Decreto di nomina	D.C. n. 552 del 08/06/2018	Assistente al DL	Decreto di nomina
Collaudatore Statico	Ing. Giovanni Lascari	Decreto di nomina	D.C. n. 1542 del 30/10/2019	Nota di nomina	
				Decreto di Nomina a seguito	
				accettazione	

AFFIDATARIA	
Affidataria	Consorzio Stabile Telegare
dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)	
C.F. e P.IVA	08078101212
Indirizzo:	Via Edmondo De Amicis n° 24 Caltagirone (CT)
Tel e Fax:	0933-1940766 Cell. 3339712066
Tipo di Contratto	
Applicato	
e-mail/PEC:	CONSORZIOSTABILETELEGARE@PEC.IT

SUBAPPALTI AUTORIZZATI	
Subappaltatore:	
TEMPISTICA	

Data della consegna	06/03/2020	Data del concreto inizio dei lavori		Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori		Nuova Scadenza	
n. gg Eventuale Sospensione		n. gg Eventuale Proroga	totale gg previsti	240 gg	giorni impiegati in più	giorni impiegati in meno	

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

ANTICIPAZIONE del 20%										
Anticipazione 20% emesso il:	20/09/2019	per lavori a tutto il:		importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 83.734,97	Decreto di liquidazione anticipazione 20%	D.C. n. 1347 del 02/10/2019	importo	€ 102.156,66	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	20/09/2019		importo oltre IVA	€ 83.734,97						
1° SAL emesso il:	02/12/2019	per lavori a tutto il:	25/11/2019	importo stato di avanzamento oltre Iva	€ 94.106,34	Decreto di liquidazione SAL n. 1	D.C. n. 1841 del 10.12.2019	importo	114.809,73	
CERTIFICATO DI PAGAMENTO EMESSO DAL RUP IN DATA	02/12/2019		importo oltre IVA	€ 94.106,34						

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**

<b>Codice Caronte</b> SI_1_17596	<b>PETRALIA SOPRANA</b>	<b>Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - Gulini - Fasanò nel comune di Petralia Soprana (PA)</b>							<b>Codice Rendis</b> 19R147/G1		
<b>Livello di Progettazione Iniziale</b>	<b>ESECUTIVO</b>				<b>Tipo di dissesto</b>	<b>FRANA</b>					
<b>CUP</b>	J9616001030001				<b>Importo Progetto</b>	€ 1.450.000,00	<b>Importo FSC</b>	€ 1.450.000,00			
<b>Decreto finanziamento Servizi</b>	<b>Decreto a contrarre</b>	<b>Importo finanziato</b>	<b>Decreto a contrarre</b>	<b>Decreto a contrarre</b>	<b>Sottoscrizione Contratto</b>	<b>Registrazione Contratto</b>	<b>Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione</b>				
<b>Decreto finanziamento</b>	D.C. n. 78 del 08/02/2017 D.C. n. 1015 del 26/10/2018	<b>Decreto a contrarre</b>	D.C. n. 1142 del 20/11/2018	<b>Decreto aggiudicazione definitiva</b>	D.C. n. 990 del 16/07/2019	<b>Sottoscrizione Contratto</b>	Rep. 252 del 15/10/2019	<b>Registrazione Contratto</b>	Reg. 1T/11933 del 15/10/2019	<b>Decreto di Impegno a seguito aggiudicazione</b>	D.C. n. 1642 del 18/11/2019

**LAVORI IN CORSO**

**DATI FINANZIARI**

<b>Importi Decreto di Finanziamento n. 1015/2018</b>		<b>€ 1.450.000,00</b>	<b>Importi Decreto di impegno con relativa approvazione QE Rimodulato D.C. 1642/2019</b>		<b>€ 979.760,09</b>
<b>Sommario i lavori a base d'asta</b>		<b>€ 1.017.008,73</b>	<b>Lavori</b>		<b>€ 1.017.008,73</b>
a1	oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 4.931,45	Costo oneri sicurezza speciali		€ 4.931,45
a2	importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.012.077,28	Resto importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 1.012.077,28
<b>B Somma a disposizione di cui:</b>		<b>€ 432.991,27</b>	<b>Importo del ribasso</b>		<b>€ 385.442,55</b>
b1	Per IVA (22% di A)	€ 223.741,92	Lavori al netto del ribasso		€ 626.634,73
b2	Per comp. di prog. definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, Mis. e Cont. e DL per competenze collaudo statico IVA e tasse comprese	€ 90.774,48	Importo dei costi edila sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.931,45
b3	Per competenze collaudo tecnico amministrativo IVA e tasse comprese	€ 14.828,89	Totale lavori al netto del ribasso		€ 631.566,18
b4	Per competenze collaudo tecnico amministrativo IVA e per competenza RUP 0,25*2%	€ 5.895,58	Somme a disposizione		€ 348.193,91
b5		€ 5.085,04	IVA		€ 138.944,56
b6	Per competenze geologiche IVA e tasse comprese	€ 15.004,88	Comp. Di prog. definitiva ed esecutiva, DL, CSE		€ 90.774,48
b7	per IVA e tasse sulle competenze (PROG. DL MIS. E CONT. COORD. ECC)	€ 20.769,20	Competenze collaudo statico		€ 14.828,89
b8	Per pubblicazione bando	€ 10.000,00	Competenze collaudo tecnico amministrativo		€ 5.895,58
b9	per imprevisti	€ 16.649,30	Competenze RUP		€ 5.085,04
b10	per espropriazioni e atti espropriativi	€ 9.641,98	Competenze geologiche		€ 15.004,88
	per contributo ANAC	€ 600,00	Iva e tasse su competenze		€ 20.769,20
b11	per prove sui materiali e di laboratorio	€ 10.000,00	Pubblicazione bando		€ 10.000,00
b12	per oneri di accesso alla discarica	€ 10.000,00	Imprevisti		€ 16.649,30
			Espropriazione e atti espropriativi		€ 9.641,98
			ANAC		€ 600,00
			Prove sui materiali e di laboratorio		€ 10.000,00
			Oneri di accesso alla discarica		€ 10.000,00
	<b>totale</b>	<b>€ 1.450.000,00</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 979.760,09</b>

**Eventuali Economie**

**CAUZIONI E GARANZIE**

**Fidejussione**

<b>Fidejubente</b>	Allianz Spa	<b>n. Polizza</b>	732291860	<b>Data di sottoscrizione</b>	04/09/2019
		<b>Importo</b>	€ 141.912,92		

**FIGURE TECNICHE**

<b>RUP</b>	<b>Arch. Mario Cerani</b>	<b>Decreto di nomina</b>	D.C. n. 78 del 08/02/2017	<b>Supporto al RUP</b>		<b>Decreto di nomina</b>	
				<b>Progettista</b>		<b>Decreto di nomina</b>	
<b>Coord Sicurezza fase Progett.</b>		<b>Incarico conferito tramite:</b>		<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>	<b>Ing. Michele Zafonti</b>	<b>Decreto di nomina</b>	D.C. n. 1130 del 15/11/2018
<b>Direttore Lavori</b>	<b>Ing. Michele Zafonti</b>	<b>Decreto di nomina</b>	D.C. n. 1130 del 15/11/2018	<b>Assistente al DL</b>		<b>Decreto di nomina</b>	
<b>Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo</b>				<b>Decreto a contrarre</b>	D.C. n. 1751 del 02/12/2019		

**AFFIDATARIA**

Affidataria **EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.**

dati Affidataria (nel caso di ATI indicare i dati della Mandataria)

<b>C.F./P.IVA</b>	01427670854	<b>Indirizzo:</b>	Via Aosta n. 5 - Mussomeli (CL)	<b>Tel/Fax:</b>	0934 951018	<b>e-mail/PEC:</b>	
<b>Tipo di Contratto Applicato</b>							

nel caso di ATI indicare i dati della Mandante

**SUBAPPALTI AUTORIZZATI**

**TEMPISTICA**

**VARIANTE**

**STATO DI AVANZAMENTO EMESSI:**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

**COLLAUDO STATICO**

**COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



## COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2019

**“PATTO PER IL SUD”**

**PATTO PER IL SUD**  
REGIONE SICILIANA



**REGIONE  
SICILIANA**

Importo FSC € 472.467.700,36

Numero Interventi : 264

Patto per il SUD

ENTE BENEFICIARIO	CARONTE	RENDIS	P r o v	Titolo Intervento	CUP	F O N D I	Costo Intervento	IMPORTO	Tipo Dissesto	LIVELLO PROGETTAZIONE	APPALTO	STATO DELL'ARTE DICEMBRE 2019
ACI CASTELLO	SI_1_17613	19IR032/G3	CT	Regimentazione delle acque piovane in via Trieste nella Fraz. di Ficarazzi	J29D16001320001	FSC	€ 399.888,16	399.888,16 €	Alluvione	Definitiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
ACIREALE	SI_1_17614	19IR601/G1	CT	Interventi di sistemazione idraulica dell'area del territorio comunale zona Wagner	J49D16001930001	FSC	€ 1.500.000,00	180.000,00 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
ACIREALE	SI_1_17615	19IR026/G1	CT	Consolidamento e sistemazione idraulica del Torrente Lavinaio Platani	J49D16001940001	FSC	€ 2.500.000,00	300.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
ACIREALE	SI_1_17616	19IR603/G1	CT	Sistemazione idraulica dell'area del territorio comunale tra S.Giovanni e Aci Platani	J49D16001950001	FSC	€ 5.200.000,00	350.000,00 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
ACQUAVIVA PLATANI	SI_1_17618	19IR989/G1	CL	Consolidamento e sistemazione del tratto di strada viale Trieste e Aree adiacenti.	J69D16001850001	FSC	€ 1.400.000,00	1.400.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
AGIRA	SI_1_17620	19IR065/G1	EN	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza di Via Savonarola e del sud del centro abitato	J89D16003210001	FSC	€ 1.300.000,00	1.300.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
AGRIGENTO	SI_1_22493	19IR346/G1	AG	Interventi di mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorgono il duomo e l'intera area diocesana di Agrigento	J45D16000010009	FSC	€ 27.000.000,00	27.000.000,00 €	Frana	Preliminare	LAVORI	IN APPROVAZIONE
AIDONE	SI_1_17621	19IR334/G1	EN	Completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica_zona Castello	J99D16002590001	FSC	€ 1.350.000,00	1.350.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
ALCARA LI FUSI	SI_1_17622	19IRA39/G1	ME	Recupero funzionale e sistemazione del torrente Bongiorno	J29D16001420001	FSC	€ 400.000,00	400.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
ALCARA LI FUSI	SI_1_17624	19IR767/G1	ME	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato - zona Baratta	J29D16001430001	FSC	€ 3.450.000,00	3.450.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI AGGIUDICATI
ALCARA LI FUSI	SI_1_17623	19IR770/G1	ME	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato - zona circonvallazione nord	J29D16001410001	FSC	€ 1.160.000,00	232.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
ALCARA LI FUSI	SI_1_22494	19IR772/G1	ME	Interventi di consolidamento della Zona Villicano	J23H19000700001	FSC	€ 1.920.000,00	1.920.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
ALI'	SI_1_17625	19IRA30/G1	ME	Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale	J39D16001750001	FSC	€ 2.013.205,67	217.387,04 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
ALIMENA	SI_1_17626	19IR080/G1	PA	Consolidamento della zona a valle del centro abitato "Pasciovalli-Fontanazza" e conseguente riassetto ambientale	J19D16004990001	FSC	€ 1.020.000,00	82.706,52 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
ANTILLO	SI_1_17628	19IRA27/G1	ME	Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19	J59D16001780001	FSC	€ 1.250.000,00	1.250.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	LAVORI IN CORSO
ANTILLO	SI_1_17629	19IRA94/G1	ME	Sistemazione idraulica del torrente Antillo a salvaguardia delle infrastrutture sportive e degli abitati di Canigliari, Romito e Cicala.	J59D16001770001	FSC	€ 2.500.000,00	500.000,00 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
ANTILLO	SI_1_17630	19IR621/G1	ME	Lavori di regimentazione dell'alveo torrente Acqua Vena - completamento del consolidamento del versante e realizzazione di un'area di Protezione Civile.	J59D16001690001	FSC	€ 980.000,00	2.080.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
ANTILLO	SI_1_17631	19IRA57/G1	ME	Consolidamento e salvaguardia dell'abitato di canigliari zona ovest e della zona chiesa Sacra Famiglia	J59D16001760001	FSC	€ 1.800.000,00	360.000,00 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
ANTILLO	SI_1_17632	19IR617/G1	ME	Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato	J59D16001670001	FSC	€ 2.400.000,00	480.000,00 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
ANTILLO	SI_1_17633	19IR313/G1	ME	Consolidamento a valle del centro urbano in località giorgina - piano calcare	J59D16001660001	FSC	€ 2.500.000,00	2.500.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
AVOLA	SI_1_17635	19IR163/G1	SR	Progetto di realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa- Avola (SR)	J69D16002030001	FSC	€ 15.825.968,49	10.801.968,49 €	Costiero	Definitiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO

BALESTRATE	SI_1_17636	19IR082/G1	PA	Progetto generale esecutivo per il consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia Croce_Completamento	J69D16001810001	FSC	€ 1.800.000,00	121.889,53 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
BARCELONA POZZO DI GOTTO	SI_1_24408	19IRA09/G1	ME	Sistemazione del piano viabile, regimentazione delle acque e sistemazione versanti della strada di collegamento malettoficarella-castoreale		POC	€ 2.800.000,00	2.800.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	ACQUISIZIONE PROGETTO
BARRAFRANCA	SI_1_17638	19IRA48/G1	EN	Mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di collettori e sistemi di captazione per la regimazione delle acque piovane	J29D16001350001	FSC	€ 4.500.000,00	443.015,29 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
BASICO'	SI_1_17639	19IR182/G1	ME	Lavori di consolidamento della porzione del centro abitato a protezione degli alloggi popolari delle zone di espansione residenziali.	J79D16001880001	FSC	€ 1.600.000,00	320.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
BISACQUINO	SI_1_17640	19IRB06/G1	PA	Interventi urgenti di ripristino delle funzionalità della "via Quaranta" ed eliminazione del rischio idraulico residuo sul "Burrone monte Peloso"	J99D16002570001	FSC	€ 3.663.628,79	3.663.628,79 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
BIVONA	SI_1_17641	19IRD58/G1	AG	Lavori di messa in sicurezza Strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano.	J79D16001790001	FSC	€ 1.500.000,00	2.430.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
BORGETTO	SI_1_17642	19IR895/G1	PA	Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto	J36J16001650001	FSC	€ 1.500.000,00	1.500.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
BROLO	SI_1_17643	19IRA84/G1	ME	Recupero e riqualificazione del borgo murato - versante nord del centro storico	J89D16003260001	FSC	€ 4.070.000,00	418.697,15 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
BROLO	SI_1_17644	19IRA42/G1	ME	Progetto per il consolidamento della Fraz. Jannello Inferiore	J89D16003280001	FSC	€ 4.820.000,00	351.374,38 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
BUCCHERI	SI_1_17645	19IRB70/G1	SR	Mitigazione del rischio Idrogeologico lungo la strada di ingresso C.U. ex strada SS124 del Comune di Buccheri.	J79D16001820001	FSC	€ 670.000,00	95.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
CALATABIANO	SI_1_17646	19IR918/G1	CT	Consolidamento e sistemazione idrogeologica del versante C.da Piano Piraino.	J19D16005010001	FSC	€ 3.000.000,00	600.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
CALATAFIMI SEGESTA	SI_1_23298		TP	Lavori di consolidamento del piazzale Belvedere Francesco Vivona nel Comune di Calatafimi - Segesta		FSC	€ 750.000,00	750.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
CALTABELLOTTA	SI_1_17647	19IR010/G1	AG	Completamento del consolidamento del costone roccioso San Pellegrino ed a salvaguardia del centro abitato.	J19D16004980001	FSC	€ 3.072.778,03	3.072.778,03 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
CALTAGIRONE	SI_1_24409	19IR029/G1	CT	Progetto di consolidamento del Centro storico QUARTIERE SANTO STEFANO		POC	€ 3.350.000,00	3.350.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	ACQUISIZIONE PROGETTO
CALTANISSETTA	SI_1_17648	19IRD82/G1	CL	Opere di Sistemazione della sede viaria della SP 231 di Caltanissetta al km 2 e al km 3	J99D16002740001	FSC	€ 600.000,00	120.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
CAMMARATA	SI_1_17649	19IR013/G1	AG	Consolidamento zona Sant'Agostino - Terra Rossa_1° Stralcio Esecutivo	J39D16001670001	FSC	€ 3.600.000,00	3.600.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI AGGIUDICATI
CAMPOBELLO DI MAZARA	SI_1_17650	19IRA81/G1	TP	Lavori di consolidamento del versante roccioso ovest di Torretta Granitola	J19D16005040001	FSC	€ 1.500.000,00	300.000,00 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
CANICATTI'	SI_1_17651	19IRD64/G1	AG	Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia Dama - Dammuso - Capo D'Acqua" con la SS. 640	J59D16001860001	FSC	€ 2.500.000,00	2.500.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	LAVORI IN CORSO
CAPACI	SI_1_17652	19IR951/G1	PA	Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci - Capaci (PA)	J19D16005000001	FSC	€ 4.998.000,00	4.998.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
CAPIZZI	SI_1_17653	19IR940/G1	ME	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere Fortina	J99D16002620001	FSC	€ 399.000,00	78.920,45 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
CAPO D'ORLANDO	SI_1_17654	19IR953/G1	ME	Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale	J19D16005080001	FSC	€ 950.000,00	950.000,00 €	Alluvione	Preliminare	LAVORI	IN APPROVAZIONE
CAPO D'ORLANDO	SI_1_22495	CDC_T1_02	ME	"Interventi urgenti, ed integrati, per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Capo 'Orlando - Lungomare A. Doria nel centro Urbano e San gregorio ".	C17H19001010006	FSC	€ 450.000,00	450.000,00 €	Costiero	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
CAPO D'ORLANDO	SI_1_17655	19IRB22/G1	ME	Mitigazione rischio idrogeologico a sud del promontorio Capo	J19D16005070001	FSC	€ 2.430.000,00	2.430.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	PREDISPOSIZIONE GARA LAVORI
CARINI	SI_1_17656	19IR976/G1	PA	Intervento di protezione da caduta massi finalizzata al riuso del nucleo abitativo sottostante il costone in C/da Giagaffe nell'ambito dei lavori di consolidamento dei costoni rocciosi di Montagna Longa in zona R4 lato Nord.	J29D16001310001	FSC	€ 420.351,58	77.084,17 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO



CARLENTINI	SI_1_17657	19IRA73/G1	SR	Opere per la regimentazione e riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato	J19D16005020001	FSC	€ 1.180.000,00	236.000,00 €	Alluvione	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
CARLENTINI	SI_1_17658	19IRA72/G1	SR	Consolidamento del muro e del versante adiacente a via G. da Procida	J19D16005030001	FSC	€ 1.872.000,00	221.546,85 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	SIA AGGIUDICATI
CARONIA	SI_1_17659	19IR479/G1	ME	Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro.	J39D16001740001	FSC	€ 2.387.000,00	477.400,00 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
CASALVECCHIO SICULO	SI_1_17602	19IR381/G1	ME	Mitigazione delle cause di rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto	J46J16000780001	FSC	€ 495.000,00	495.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
CASALVECCHIO SICULO	SI_1_17603	19IR805/G1	ME	Consolidamento della zona ovest dell'abitato	J46J16000870001	FSC	€ 985.000,00	985.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
CASALVECCHIO SICULO	SI_1_17662	19IR242/G1	ME	Lavori di consolidamento a difesa dell'abitato dell'area a valle della Scuola Media	J49D16001990001	FSC	€ 2.585.049,29	2.585.049,29 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	PREDISPOSIZIONE GARA LAVORI
CASTEL DI IUDICA	SI_1_22496	19IRF16/G1	CT	Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato di Serro Calderato - 1° Stralcio	J43H19001120001	FSC	€ 1.112.000,00	1.112.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	IN APPROVAZIONE
CASTEL DI LUCIO	SI_1_17663	19IR474/G1	ME	19IR474/G1 - Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato.	J59D16001680001	FSC	€ 1.600.000,00	224.761,38 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
CASTEL DI LUCIO	SI_1_17664	19IRA22/G1	ME	Consolidamento della zona Castello - sotto rocca a salvaguardia e protezione de C.A.	J59D16001700001	FSC	€ 1.400.000,00	179.870,23 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
CASTEL DI LUCIO	SI_1_17837	19RA21/G1	ME	Consolidamento via Durante e via Santa Lucia	J59D16001710001	FSC	€ 2.500.000,00	321.028,53 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	SERVIZI	ISTRUTTORIA GARA SIA
CASTELDACCIA	SI_1_17665	19IR149/G1	PA	Intervento di sistemazione idraulica del vallone Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del rischio	J49D16001900001	FSC	€ 6.450.000,00	7.450.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	SI_1_17666	19IR109/G1	TP	Messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso su cui si erge il centro storico di Castellammare del Golfo	J26J16000760001	FSC	€ 2.159.600,00	431.920,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	SI_1_17667	19IRB10/G1	TP	Interventi necessari a ridurre le condizioni di rischio di caduta massi in corrispondenza del molo	J29D16001370001	FSC	€ 650.000,00	650.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	ACQUISIZIONE PROGETTO
CASTELL'UMBERTO	SI_1_17668	19IR312/G1	ME	Lavori di consolidamento del versante tratto Piazzale Case Calà Lesina e Manera-Favara nel centro abitato di Sfaranda.	J69D16001960001	FSC	€ 2.000.000,00	400.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
CASTELL'UMBERTO	SI_1_17669	19IR247/G1	ME	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a Rischio R4 in Contrada Sfaranda	J69D16001950001	FSC	€ 2.200.000,00	2.200.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
CASTELTERMINI	SI_1_17670	19IRD83/G1	AG	Opere di sistemazione della SP 22 Stazione Campofranco-Cozzo Disi-Casteltermini nel tratto interessato da caduta massi	J79D16001960001	FSC	€ 850.000,00	850.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	LAVORI IN CORSO
CASTIGLIONE DI SICILIA	SI_1_17671	19IRB12/G1	CT	Lavori di salvaguardia del versante sottostante Via Arciprete Cai del centro abitato di Castiglione	J59D16001610001	FSC	€ 1.000.000,00	60.000,00 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
CASTIGLIONE DI SICILIA	SI_1_17672	19IR035/G1	CT	Lavori di consolidamento del Torrente S.Giacomo a valle del centro abitato	J59D16001620001	FSC	€ 1.300.000,00	70.000,00 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA

CASTRONOVO DI SICILIA	SI_1_17673	19IR098/G1	PA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua II ° stralcio di completamento	J69D16001820001	FSC	€ 612.000,00	122.400,00 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
CASTRONOVO DI SICILIA	SI_1_17674	19IR097/G1	PA	Intervento di consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato del comune di Castronovo	J69D16001830001	FSC	€ 1.000.000,00	1.000.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
CASTRONOVO DI SICILIA	SI_1_19616		PA	Progetto per la messa in sicurezza e consolidamento del versante a monte della SP 40 in C.da S.Andrea/Manicasuppatra il Comune di Castronovo di Saicilia ed il Bivio con la SP 189		FSC	€ 1.682.268,89	336.453,78 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
CATTOLICA ERACLEA	SI_1_18830	19IR471/G1	AG	Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa	J85B1600001001	FSC	€ 4.650.000,00	4.095.507,44 €	Costiero	Preliminare	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
CAVAGRANDE DR dello Sviluppo Rurale e Territoriale	SI_1_18831		SR	Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità della Riserva RNO di Cavagrande	J64J16000010001	FSC	€ 4.000.000,00	2.000.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
CEFALU'	SI_1_17675	19IRD65/G1	PA	Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù	J89D16003160001	FSC	€ 277.747,87	55.549,57 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
CEFALU'	SI_1_17676	19IR101/G1	PA	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù	J89D16003200001	FSC	€ 1.827.000,00	1.827.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
CIANCIANA	SI_1_17677	19IR338/G1	AG	Fenomeno franoso in via Don Luigi Sturzo e Strada Statale 118 "Corleonese-Agrigentina"	J99D16002550001	FSC	€ 150.000,00	150.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	PREDISPOSIZIONE GARA LAVORI
CIMINNA	SI_1_22497	19IR105/G1	PA	Consolidamento dell'area dissestata del vecchio centro urbano a valle della Matrice - 3° Stralcio	J23H1900069001	FSC	€ 2.000.000,00	2.000.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
CINISI	SI_1_17678	19IR295/G1	PA	Lavori di messa in sicurezza della scogliera di Magaggiari	J39D16001680001	FSC	€ 1.240.066,00	190.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	ISTRUTTORIA GARA SIA
COLLESANO	SI_1_17679	19IR108/G1	PA	Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce	J49D16001910001	FSC	€ 1.268.000,00	1.268.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
COLLESANO	SI_1_17680	19IR960/G1	PA	Consolidamento del costone roccioso e sistemazione dei ruderi del castello _opere di mitigazione	J49D16001920001	FSC	€ 3.766.000,00	450.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1	SI_1_22521			"CONTRATTO DI COSTA" TIRRENO 1, sottoscritto tra il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana ed i comuni di Acquadolci, Brolo, Capo D'Orlando, Capri Leone, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D'Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova e Tusa		FSC	€ 30.893.503,24	30.893.503,24 €	Costiero	Definitiva	LAVORI	ACQUISIZIONE PROGETTO
FAVIGNANA	SI_1_17827	19IR175/G1	TP	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di un'area del centro abitato di Marettimo	J69D16001870001	FSC	€ 398.500,00	79.700,00 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
FIUMEDINISI	SI_1_17726	19IR266/G1	ME	Consolidamento a completamento degli interventi eseguiti dalla Prov. di ME del costone a monte della SP 27	J49D16002000001	FSC	€ 4.010.000,00	4.010.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
FIUMEDINISI	SI_1_17817	19IRA02/G1	ME	Ripristino delle difese spondali del Torrente Fiumedinisi - Completamento accessorio	J49D16002170001	FSC	€ 750.000,00	900.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	LAVORI	ACQUISIZIONE PROGETTO
FONDACHELLI-FANTINA	SI_1_17752	19IR299/G1	ME	Lavori di completamento del consolidamento della Fraz. Rubino	J69D16001940001	FSC	€ 1.381.433,10	150.608,59 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
FORZA D'AGRO'	SI_1_17792	19IRD84/G1	ME	Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco Parrino	J79D16001970001	FSC	€ 1.100.000,00	1.100.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	LAVORI IN CORSO
FRANCAVILLA DI SICILIA	SI_1_17753	19IRA66/G1	ME	Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda idraulica destra del torrente San Paolo a protezione dell'abitato.	J89D16003250001	FSC	€ 1.260.000,00	252.000,00 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
FRAZZANO'	SI_1_17600	19IR248/G1	ME	Lavori di consolidamento dell'abitato est del comune di Frazzanò	J96J16001120001	FSC	€ 2.649.938,67	2.649.938,67 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO

FURCI SICULO	SI_1_17604	19IR483/G1	ME	Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento delle Frazioni Grotte e Calcare e centro urbano alla strada statale SS114 ME - CT.	J19J16001190001	FSC	€ 2.230.000,00	2.230.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
FURCI SICULO	SI_1_17737	19IRD68/G1	ME	Intervento di sistemazione idraulica Torrete Pagliara	J19D16005170001	FSC	€ 3.000.000,00	157.821,21 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
FURCI SICULO <b>SOMMA URGENZA</b>	EX 17737 SI_1_22498	19IRD68/G2	ME	Lavori somma urgenza relativi alla "Risagomatura della sezione idraulica dell'alveo nel tratto che va dalla passerella provvisoria esistente di collegamento dei centri abitanti fino a monte degli attraversamenti viario e ferroviario, per ripristino dell'efficienza e della funzionalità idraulica - Comuni di Furci Siculo e Roccalumera (Me)"	G13H1900018002	FSC	150.000,00 €	150.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
FURNARI	SI_1_17738	19IR412/G1	ME	Messa in sicurezza idraulica tratti vallivi delle aste torrentizie e delle saie nelle Contrade Feliciotto, Siena e Bazia	J29D16001400001	FSC	€ 1.395.000,00	279.000,00 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
FURNARI	SI_1_17739	19IR328/G1	ME	Sistemazione e protezione delle aree costiere in erosione nel territorio comunale	J29D16001390001	FSC	€ 1.590.000,00	318.000,00 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
GALATI MAMERTINO	SI_1_17754	19IR987/G1	ME	Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato	J49D16002120001	FSC	€ 1.840.000,00	1.840.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
GALLODORO	SI_1_17755	19IR567/G1	ME	Consolidamento e riqualificazione ambientale del costone c.da Landro a difesa del centro abitato	J59D16001850001	FSC	€ 945.000,00	94.971,83 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
GALLODORO	SI_1_17801	19IR640/G1	ME	Messa in sicurezza del tratto a monte della strada SP 13 dal KM 1600 al KM 1900	J59D16001880001	FSC	€ 1.700.000,00	1.700.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
GIARDINI NAXOS	SI_1_17740	19IR540/G1	ME	Intervento di sistemazione idraulica Torrente S. Giovanni	J69D16002000001	FSC	€ 1.200.000,00	1.200.000,00 €	Alluvione	Definitiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
GIARDINI NAXOS	SI_1_17831	19IRC19/G1	ME	Lavori di ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzato al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera comunale 3° stralcio di completamento	J69D16002050001	FSC	€ 8.780.000,00	840.000,00 €	Costiero	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
GIOIOSA MAREA	SI_1_22499		ME	Intervento di stabilizzazione della linea di costa di un tratto di arenile della frazione S. Giorgio fortemente erosa dalle mareggiate del febbraio-marzo 2019 nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno 1	J73H19000660001	FSC	€ 275.000,00	275.000,00 €	Costiero	Esecutiva	LAVORI	LAVORI AGGIUDICATI
GIOIOSA MAREA	SI_1_17756	19IR571/G1	ME	Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi	J79D16001930001	FSC	€ 2.928.175,00	2.928.175,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
GUALTIERI SICAMINO'	SI_1_17727	19IR973/G1	ME	Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri - unica via di fuga dell'abitato	J96J16001180001	FSC	€ 610.000,00	610.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
GUALTIERI SICAMINO'	SI_1_17728	19IR548/G1	ME	Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria	J99D16002670001	FSC	€ 650.000,00	650.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
GUALTIERI SICAMINO'	SI_1_17729	19IR971/G1	ME	Ampliamento ammodernamento e messa in sicurezza in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri	J99D16002690001	FSC	€ 2.690.000,00	2.690.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
GUALTIERI SICAMINO'	SI_1_22500	19IR972/G1	ME	Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada comuale collegante il centro di Gualtieri con la frazione di Sicamino'	B94B15000170002	FSC	€ 5.000.000,00	5.000.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
ISPICA	SI_1_17813	19IR535/G1	RG	Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del Focallo - Ispica (RG)	J79D16001940001	FSC	€ 15.750.000,00	12.150.000,00 €	Costiero	Definitiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
ITALA	SI_1_17741	19IR615/G1	ME	Completamento delle opere di consolidamento e regimentazione idraulica del quartiere del medico C.da Quartarello	J19D16005130001	FSC	€ 1.500.000,00	201.157,34 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
ITALA	SI_1_17757	19IR963/G1	ME	Consolidamento e regimentazione idraulica del versante a monte del centro abitato	J19D16005150001	FSC	€ 1.650.000,00	215.804,80 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO

LCC Caltanissetta	SI_1_17697	19IRD67/G1	CL	Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189	J49D16002180001	FSC	€ 12.500.000,00	242.675,80 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
LCC Messina	SI_1_17751	19IRD74/G1	ME	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla	J26J16000750001	FSC	€ 645.000,00	645.000,00 €	Alluvione	Preliminare	LAVORI	LAVORI IN CORSO
LENI	SI_1_17608	19IR948/G1	ME	Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella_completamento - Leni (ME)	J26J16000690001	FSC	€ 3.650.000,00	3.650.000,00 €	Costiero	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
LEONFORTE	SI_1_17715	19IR582/G1	EN	Sistemazione pendici sud di Leonforte-zona sovrastante scuola media G.Verga	J99D16002600001	FSC	€ 805.000,00	112.369,89 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
LERCARA FRIDDI	SI_1_17808	19IR777/G1	PA	Consolidamento Costone roccioso Colle madore	J89D16003240001	FSC	€ 1.000.000,00	200.000,00 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
LETOJANNI	SI_1_17742	19IRD70/G1	ME	Intervento di sistemazione idraulica Torrente S. Filippo	J39D16001790001	FSC	€ 4.000.000,00	800.000,00 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
LIBRIZZI	SI_1_17758	19IR464/G1	ME	Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato	J49D16002010001	FSC	€ 3.935.000,00	3.935.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
LIMINA	SI_1_17730	19IRA80/G1	ME	"Progetto di consolidamento della strada provinciale 12 nei pressi della chiesa delle Preci a protezione del centro	J59D16001720001	FSC	€ 1.291.142,00	182.506,74 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
LIMINA	SI_1_17731	19IRA79/G1	ME	Progetto di consolidamento sulla provinciale SP12 in prossimità della Via Martiri di Bologna a monte	J59D16001730001	FSC	€ 1.800.000,00	207.812,33 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
LIMINA	SI_1_17759	19IR243/G1	ME	Progetto di consolidamento c./da Fornace a monte del centro abitato in zona R4	J59D16001740001	FSC	€ 680.000,00	57.638,14 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
LIMINA	SI_1_17760	19IR258/G1	ME	Lavori di consolidamento a valle dell'abitato a nord di Limina e la messa in sicurezza della Chiesa di San Filippo	J59D16001750001	FSC	€ 1.750.000,00	103.717,66 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
LIPARI	SI_1_17718	19IR431/G1	ME	Riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di protezione spiaggia in località Canneto (Uncl) - Lipari (ME)	J69D16002020001	FSC	€ 3.285.000,00	2.585.000,00 €	Costiero	Definitiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
LIPARI	SI_1_24410	19IR975/G1	ME	INTERVENTI DI REQUILIBRIO LITORANEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELLA SPIAGGIA IN LOCALITA CANNETO		POC	€ 8.260.000,00	8.260.000,00 €	Costiero	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
LIPARI	SI_1_17821	19IRD85/G1	ME	Messa in sicurezza e rifunionalizzazione della strada di collegamento centro abitato - frazione Pecorini a mare - Filicudi	J69D16002060001	FSC	€ 2.200.000,00	69.009,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
LONGI	SI_1_17761	19IRB09/G1	ME	Completamento consolidamento a protezione della C.A. zona sottostante Piazza Eroi e via S. Croce	J79D16001830001	FSC	€ 1.680.000,00	168.878,06 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
LUCCA SICULA	SI_1_17685	19IRB25/G1	AG	Realizzazione del canale di gronda nella zona a monte a difesa del centro abitato_Lucca Sicula.	J79D16001800001	FSC	€ 1.930.000,00	143.180,45 €	Alluvione	Definitiva	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
MALETTO	SI_1_17610	19IR995/G1	CT	Consolidamento a protezione dell'abitato stralcio completamento relativo alla zona R4 Rocca del Castello	J46J16000850001	FSC	€ 1.350.000,00	1.350.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
MALETTO	SI_1_17743	19IR968/G1	CT	Consolidamento di un tratto di pendio in C.da Spirini	J49D16001980001	FSC	€ 905.955,00	86.404,80 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
MALVAGNA	SI_1_17762	19IR944/G1	ME	Lavori urgenti di consolidamento del centro abitato della zona a valle della via nuova	J99D16002630001	FSC	€ 1.780.000,00	89.315,70 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
MANDANICI	SI_1_17763	19IR579/G1	ME	Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato quartiere Rocca- Carasà e della circonvallazione a monte.	J19D16005190001	FSC	€ 1.580.000,00	34.543,47 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
MANDANICI	SI_1_17764	19IR578/G1	ME	Completamento consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del c.a. quartiere	J19D16005090001	FSC	€ 2.000.000,00	400.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO

MANIACE	SI_1_17609	19IR979/G1	CT	Opere di difesa idraulica finalizzata alla protezione idrogeologica del centro abitato_Contrada Cavallaro_Impluvio Secondario.	J36J16001480001	FSC	€ 590.786,84	590.786,84 €	Alluvione	Esecutiva	LAVORI	PREDISPOSIZIONE GARA LAVORI
MANIACE	SI_1_17707	19IR982/G1	CT	Messa in sicurezza, adeguamento e ammodernamento della strada di collegamento della C/da Petrosino.	J39D16001700001	FSC	€ 2.000.000,00	128.026,60 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
MARINEO	SI_1_17795	19IRD86/G1	PA	Consolidamento versante della Rocca di Marineo	J99D16002720001	FSC	€ 3.901.049,43	780.209,89 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
MASCALI	SI_1_17710	19IRA87/G1	CT	Mitigazione del rischio idrogeologico della frazione Nunziata	J59D16001650001	FSC	€ 2.050.000,00	410.000,00 €	Alluvione	Definitiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
MASCALUCIA	SI_1_17708	19IRA62/G1	CT	Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga.	J69D16001920001	FSC	€ 3.075.053,15	3.075.053,15 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
MAZZARINO	SI_1_17693	19IR596/G1	CL	Intervento per la mitigazione del rischio nella Via S. Francesco di Paola.	J59D16001630001	FSC	€ 866.958,70	149.633,99 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	SIA AGGIUDICATI
MESSINA	SI_1_17719	19IR522/G1	ME	Mitigazione del rischio di erosione costiera del tratto di costa a protezione di Mezzana - Tono - Messina	J49D16002020001	FSC	€ 3.410.259,18	682.051,84 €	Costiero	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
MESSINA	SI_1_17720	19IR521/G1	ME	Mitigazione del rischio di erosione costiera del tratto di costa a protezione di Casabianca - Tono - Messina	J49D16002140001	FSC	€ 3.649.775,00	729.955,00 €	Costiero	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
MESSINA SOMMA URGENZA	SI_1_17721	19IR510/G1	ME	Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME)	J49D16002030001	FSC	€ 4.500.000,00	200.000,00 €	Costiero	Preliminare	LAVORI	LAVORI ULTIMATI
MESSINA	SI_1_17732	19IR684/G1	ME	Riqualificazione e sistemazione idraulica, risagomatura e profilatura alveo, Ricostruzione muri d'argine ed attraversamento stradale - Collegamento Villaggi - Eventi Alluvionali. - (Sistemaz. idraulica e realizzazione strada di	J49D16002110001	FSC	€ 3.470.000,00	223.923,52 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	SIA AGGIUDICATI
MESSINA	SI_1_17816	19IR011/G3	ME	Riqualificazione ambientale e risanamento igienico-sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte	J49D16002100001	FSC	€ 30.000.000,00	29.990.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
MESSINA	SI_1_22503	19IRF20/G1	ME	Lavori occorrenti per la realizzazione di una strada "Via di Fuga" complementae alla viabilità esistente di collegamento tra la S.S. 114 ed il villaggio Santo Stefano Briga del Comune di Messina		FSC	€ 5.521.965,00	5.521.965,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	PDFTE	LAVORI	ACQUISIZIONE PROGETTO
MESSINA_ II STRALCIO	SI_1_22501		ME	Interventi urgenti per il prolungamento della barriera radente esistente collocata a protezione del tratto di litorale compreso tra il complesso edilizio "Case Raciti" ed il campo di calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel comune di Messina	J45J18000210001	FSC	€ 737.963,48	737.963,48 €	Costiero	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
MESSINA_17721 III STRALCIO	SI_1_22502		ME	Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) - Completamento	J45J19000200001	FSC	€ 3.562.036,52	3.562.036,52 €	Costiero	PDFTE	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
MEZZOJUSO	SI_1_17601	19IR317/G1	PA	Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci	J16J16002340001	FSC	€ 1.000.000,00	1.000.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	SI_1_19278	19IRF12/G1	CT	Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambella	J74J16000010001	FSC	€ 1.270.000,00	995.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
MIRABELLA IMBACCARI	SI_1_17714	19IRA61/G1	CT	Lavori di completamento per il consolidamento e la sistemazione delle aree a rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	J19D16005050001	FSC	€ 1.400.000,00	174.768,24 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
MIRTO	SI_1_17766	19IRA88/G1	ME	Consolidamento del versante a valle della S.P. 157 lato nord zona adiacente la caserma dei carabinieri e strutture parco.	J79D16001870001	FSC	€ 2.632.000,00	299.917,42 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
MISILMERI	SI_1_17809	19IR138/G1	PA	Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del Quartiere San giusto - 3° stralcio	J29D16001380001	FSC	€ 5.180.000,00	600.000,00 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
MISTRETTA	SI_1_17599	19IR224/G1	ME	Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato	J86J16001540001	FSC	€ 1.400.000,00	1.400.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
MISTRETTA	SI_1_17767	19IR559/G1	ME	Consolidamento in zona Palo, nei pressi del distributore Agip e della Caserma Carabinieri	J89D16003270001	FSC	€ 3.500.000,00	450.000,00 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA

MONFORTE SAN GIORGIO	SI_1_17768	19IR992/G1	ME	Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° STRALCIO	J19D16005100001	FSC	€ 1.548.000,00	1.548.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
MONFORTE SAN GIORGIO	SI_1_22504	19IRF22/G1	ME	Realizzazione di una via di fuga a servizio del centro abitato di Monforte San Giorgio	J13H19000890001	FSC	€ 2.997.000,00	2.997.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
MONTALBANO ELICONA	SI_1_17597	19IR170/G1	ME	Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio ed al Cimitero del centro urbano.	J46J16000830001	FSC	€ 1.569.000,00	1.569.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
MONTALBANO ELICONA	SI_1_17770	19IR936/G1	ME	Consolidamento tra la Via Giardino e la Via Palermo a salvaguardia delle abitazioni	J49D16002050001	FSC	€ 866.000,00	133.523,32 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
MONTALBANO ELICONA	SI_1_17771	19IR178/G1	ME	Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria	J49D16002040001	FSC	€ 1.300.000,00	1.300.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
MONTALLEGRO	SI_1_17686	19IR288/G1	AG	Interventi urgenti di messa in sicurezza del costone roccioso zone ovest centro abitato denominata contrada Bonifacio.	J99D16002560001	FSC	€ 1.500.000,00	112.157,97 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	ISTRUTTORIA GARA SIA
MONTELEPRE	SI_1_17796	19IRD87/G1	PA	Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre	J49D16002150001	FSC	€ 1.915.000,00	105.817,20 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
MOTTA SANT'ANASTASIA	SI_1_17822	19IR929/G1	CT	Consolidamento zona Neck	J39D16001820001	FSC	€ 1.306.714,97	1.306.714,97 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
MUSSOMELI	SI_1_17694	19IR889/G1	CL	"Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su infrastruttura in c.da Cordoverse".	J89D16003330001	FSC	€ 5.000.000,00	354.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
MUSSOMELI	SI_1_17695	19IRD66/G1	CL	"Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli - Caltanissetta"	J89D16003340001	FSC	€ 13.800.000,00	936.886,54 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
MUSSOMELI	SI_1_17704	19IR524/G1	CL	Dissesto presso il castello Manfredonico.	J89D16003220001	FSC	€ 1.997.227,50	196.450,90 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	SIA AGGIUDICATI
MUSSOMELI	SI_1_22505	19IRC69/G1	CL	Realizzazione di opere di urbanizzazione e collegamento tra via Fuori le Mura e la Via Palermo		FSC	€ 890.000,00	890.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	LAVORI	IN APPROVAZIONE
NARO	SI_1_17687	19IRA03/G1	AG	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana.	J29D16001300001	FSC	€ 2.585.521,80	2.440.039,53 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
NASO	SI_1_17772	19IR947/G1	ME	Opere di consolidamento del centro abitato in C/da Malò - 1 LOTTO	J79D16001860001	FSC	€ 1.200.000,00	240.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
NASO	SI_1_17773	19IRB16/G1	ME	Opere di consolidamento del centro abitato in contrada Malò - lotto di completamento	J79D16001850001	FSC	€ 1.544.000,00	308.800,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
NASO	SI_1_17774	19IRB14/G1	ME	Opere di consolidamento del centro abitato versante Sud - lotto di completamento	J79D16001840001	FSC	€ 9.000.000,00	700.000,00 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
NISCEMI	SI_1_22506	19IRF14/G1	CL	Stabilizzazione del versante ovest del centro abitato - Zona S.P. 12 - Sbocco Calanco - Canale		FSC	€ 1.200.000,00	1.200.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	PDFTE	LAVORI	ACQUISIZIONE PROGETTO
NIZZA DI SICILIA	SI_1_17744	19IR781/G1	ME	Realizzazione canale di gronda Olivarella	J87B16000900001	FSC	€ 990.000,00	198.000,00 €	Alluvione	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
NOTO	SI_1_24411	19IRA01/G1	SR	Lavori di ricostruzione, protezione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale del litorale in località Lido di Noto		POC	€ 12.000.000,00	12.000.000,00 €	Costiero	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
NOVARA DI SICILIA	SI_1_17775	19IRA37/G1	ME	Completamento consolidamento costone rocca castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia	J99D16002640001	FSC	€ 2.700.000,00	270.445,32 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
PACE DEL MELA	SI_1_17612	19IR126/G1	ME	Consolidamento del versante est del centro abitato	J29D16001330001	FSC	€ 980.000,00	980.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
PACE DEL MELA	SI_1_17746	19IRD71/G1	ME	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Mela	J66J16001540001	FSC	€ 5.870.000,00	5.870.000,00 €	Alluvione	Preliminare	LAVORI	LAVORI IN CORSO

PALERMO_FERRO DI CAVALLO	SI_1_18842		PA	Intervento di bonifica e messa in sicurezza del canale denominato "Ferro di Cavallo" di Mondello nel Comune di Palermo		FSC	€ 5.500.000,00	5.500.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	LAVORI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
PANTELLERIA	SI_1_17820	19IR409/G1	TP	Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree p4: Lago di Venere, Gadir.	J29D16001340001	FSC	€ 3.290.472,59	3.290.472,59 €	Costiero	Definitiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
PANTELLERIA	SI_1_17830	19IR413/G1	TP	Consolidamento del fronte ex cava Rodittis, C.da Mursia Pantelleria, Cala dell'Alca	J29D16001360001	FSC	€ 954.064,54	190.812,91 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
PATTI	SI_1_17776	19IR835/G1	ME	Mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana sita a sud di piazza Gramsci del centro abitato di Patti	J49D16002080001	FSC	€ 933.000,00	102.203,98 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
PATTI	SI_1_17777	19IR962/G1	ME	Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la mitigazione del rischio Geomorfologico	J49D16002070001	FSC	€ 1.400.000,00	133.217,08 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
PETRALIA SOPRANA	SI_1_17596	19IR147/G1	PA	Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - Gulini - Fasanò	J96J16001030001	FSC	€ 1.450.000,00	1.450.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
PETTINEO	SI_1_17778	19IR228/G1	ME	Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina- Comune di Pettineo (ME)	J59D16001830001	FSC	€ 1.790.000,00	118.316,84 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
PIEDIMONTE ETNEO	SI_1_22491	19IR361/G1	CT	Opere di regimentazione acque all'interno del centro abitato (Via Cassisi-Via Notara-Via Roma-Via Bellini-Via Nuova del Convento e Via Cimitero)	J83H19000460001	FSC	€ 6.141.000,00	6.141.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	LAVORI	PREDISPOSIZIONE GARA LAVORI
PIRAINO	SI_1_22507	19IRA46/G1	ME	Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella	J69D16001990001	FSC	€ 200.000,00	200.000,00 €	Costiero	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
PIRAINO	SI_1_17779	19IR188/G1	ME	Consolidamento del centro abitato di Gliaca versante sud-est del Comune di Piraio	J69D16001990001	FSC	€ 2.605.000,00	521.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	ISTRUTTORIA GARA SIA
POLIZZI GENEROSA	SI_1_17810	19IR950/G1	PA	Lavori di consolidamento della zona sud est del C.U.	J39D16001730001	FSC	€ 1.650.000,00	200.828,92 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SI_1_17814	19IR949/G1	SR	Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa.	J69D16001900001	FSC	€ 669.394,81	133.878,96 €	Costiero	Definitiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SI_1_17815	19IR945/G1	SR	Lavori urgenti di stabilizzazione scarpate ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona c.da Casuzze Scalo Mandrie.	J69D16001910001	FSC	€ 800.000,00	800.000,00 €	Costiero	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
RACALMUTO	SI_1_24412	19IR039/G1	AG	CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO A TUTELA CENTRO ABITATO VIA GEN. MACALUSO		POC	€ 620.000,00	620.000,00 €	Frana	Preliminare	LAVORI	ACQUISIZIONE PROGETTO
RAFFADALI	SI_1_17683	19IR933/G1	AG	Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza idrogeologica ed idraulica della strada di collegamento Raffadali_Loppola_Giancaxio.	J69D16001780001	FSC	€ 1.942.427,17	1.942.427,17 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
RAFFADALI	SI_1_17688	19IRA71/G1	AG	Lavori di consolidamento attraverso alla demolizione e messa in sicurezza di edifici siti in via Don Castrenze.	J69D16001800001	FSC	€ 1.500.000,00	155.013,64 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
RAFFADALI	SI_1_17835	19IRC73/G1	AG	Opere per l'eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del rione Barca - completamento	J69D16002090001	FSC	€ 9.000.000,00	630.235,60 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
RAGALNA	SI_1_17711	19IRB02/G1	CT	Interventi sul territorio di messa in sicurezza per il rischio idraulico e di esondazione del vallone Rosario_1 stralcio	J49D16001970001	FSC	€ 1.000.000,00	120.559,34 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
RANDAZZO	SI_1_17712	19IR362/G1	CT	Consolidamento e messa in sicurezza dell'area sottostante l'insediamento abitativo_Torrente Annunziata	J29D16001490001	FSC	€ 1.000.000,00	200.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA

RAVANUSA	SI_1_17689	19IR584/G1	AG	Lavori di completamento del consolidamento della zona est dell'abitato II° Stralcio.	J79D16001810001	FSC	€ 7.000.000,00	7.000.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
REALMONTE	SI_1_17611	19IRA04/G1	AG	Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale	J86J16001660001	FSC	€ 1.250.000,00	1.250.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
REALMONTE	SI_1_17690	19IRA47/G1	AG	Lavori di consolidamento della zona sud-ovest c.a in prossimità della scuola elementare posto a valle di via Palermo.	J89D16003180001	FSC	€ 1.335.000,00	148.787,90 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
REALMONTE	SI_1_17691	19IRA41/G1	AG	Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido.	J89D16003190001	FSC	€ 1.740.000,00	188.423,00 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
REALMONTE	SI_1_18832	19IRF03/G1	AG	Intervento di messa in sicurezza di una porzione di versante in località Scala dei Turchi nel Comune di Realmonte	J87D16000050001	FSC	€ 417.000,00	417.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
REITANO	SI_1_17605	19IR813/G1	ME	Stralcio dei lavori di completamento della via Archimede e Piazza San Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato	J86J16001520001	FSC	€ 2.980.000,00	2.013.885,40 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
RESUTTANO	SI_1_17593	19IR067/G1	CL	Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo.	J16J16001790001	FSC	€ 1.270.000,00	1.270.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
ROCCAVALDINA	SI_1_17745	19IR459/G1	ME	Mitigazione rischio idrogeologico e messa in sicurezza centro abitato di San Salvatore	J29D16001450001	FSC	€ 990.000,00	990.000,00 €	Alluvione	Definitiva	LAVORI	PREDISPOSIZIONE GARA LAVORI
ROCCAVALDINA	SI_1_17780	19IRB20/G1	ME	Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina	J29D16001460001	FSC	€ 1.000.000,00	1.000.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	ACQUISIZIONE PROGETTO
ROCCAVALDINA	SI_1_17781	19IR123/G1	ME	Consolidamento del centro abitato zona Sottoforno - a monte dell'abitato ed a valle delle Pendici	J29D16001440001	FSC	€ 1.150.000,00	230.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
ROMETTA	SI_1_17782	19IR118/G1	ME	Consolidamento del versante est del centro abitato	J59D16001810001	FSC	€ 1.170.000,00	229.608,84 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
SALEMI	SI_1_17825	19IRB81/G1	TP	Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti_(TP)	J69D16001860001	FSC	€ 1.500.000,00	1.500.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
SALEMI	SI_1_17832	19IR177/G1	TP	Mitigazione del Rischio idrogeologico del costone roccioso di Monte delle Rose	J69D16001880001	FSC	€ 1.554.515,80	1.554.515,80 €	Frana	Preliminare	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
SALEMI	SI_1_17836	19IR823/G1	TP	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro urbano interessato da un movimento franoso in c.da Monte delle Rose nel Comune di Salemi	J69D16002040001	FSC	€ 2.100.000,00	420.000,00 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
SAN CATALDO	SI_1_17595	19IR028/G1	CL	Consolidamento del centro storico (ex zona franosa) con interventi nelle vie Quatra e tratto di via Casale.	J36J16001500001	FSC	€ 2.035.000,00	2.035.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
SAN GIUSEPPE JATO	SI_1_17811	19IR311/G1	PA	Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina)	J99D16002610001	FSC	€ 1.650.000,00	1.650.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
SAN GREGORIO DI CATANIA	SI_1_22508	19IRA63/G1	CT	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della collina - Monte Catira - ed opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei.	J69D16001930001	FSC	€ 1.092.572,92	1.092.572,92 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
SAN MARCO D'ALUNZIO	SI_1_17783	19IR246/G1	ME	Lavori di consolidamento centro abitato Catorelli SS. Annunziata - Completamento	J89D16003300001	FSC	€ 2.138.836,63	2.138.836,63 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO



SAN MARCO D'ALUNZIO	SI_1_17784	19IR245/G1	ME	Lavori di consolidamento centro urbano zona Scresci	J89D16003310001	FSC	€ 3.194.412,81	350.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
SAN MARCO D'ALUNZIO	SI_1_19280	19IR244/G1	ME	Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - Completamento	J87D16000060001	FSC	€ 3.940.000,00	3.940.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
SAN MAURO CASTELVERDE	SI_1_17812	19IR703/G1	PA	Consolidamento della Fraz. Borrello limitatamente al centro storico	J19D16005060001	FSC	€ 14.500.000,00	763.448,80 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
SAN PIER NICETO	SI_1_17785	19IRA20/G1	ME	Lavori di completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico centro abitato e/da Ringa	J99D16002700001	FSC	€ 3.800.000,00	356.267,01 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
SAN PIERO PATTI	SI_1_17786	19IR184/G1	ME	Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi	J19D16005140001	FSC	€ 7.723.716,59	7.723.716,59 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
SAN PIERO PATTI	SI_1_17800	19IR183/G1	ME	Lavori di consolidamento a protezione del versante nord del centro abitato	J19D16005160001	FSC	€ 1.529.000,00	1.529.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	PREDISPOSIZIONE GARA LAVORI
SAN SALVATORE DI FITALIA	SI_1_17787	19IR970/G1	ME	Consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso soprastante la C/da Scrisera	J29D16001470001	FSC	€ 1.269.850,00	172.462,87 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
SAN SALVATORE DI FITALIA	SI_1_17788	19IRB04/G1	ME	Lavori di ripristino dell'assetto ambientale idrogeologico del versante in Loc. Chiaramonte	J29D16001480001	FSC	€ 1.383.000,00	276.600,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
SANTA CATERINA VILLARMOISA	SI_1_17594	19IR025/G1	CL	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fenomeno franoso.	J46J16000840001	FSC	€ 1.298.000,00	1.298.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
SANTA DOMENICA VITTORIA	SI_1_17734	19IR454/G1	ME	Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S. Antonio-Vico Quasimodo.	J39D16001760001	FSC	€ 1.062.300,00	137.245,24 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
SANTA LUCIA DEL MELA	SI_1_17789	19IR160/G1	ME	Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini.	J69D16002010001	FSC	€ 1.570.000,00	1.570.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
SANTA LUCIA DEL MELA	SI_1_22509	19IRF23/G1	ME	Completamento intervento di sistemazione idraulica del Torrente Mela	C65B18001260008	FSC	€ 3.000.000,00	3.000.000,00 €	Alluvione	Definitiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
SANTA TERESA DI RIVA	SI_1_17748	19IR628/G1	ME	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Savoca	J99D16002660001	FSC	€ 2.850.000,00	194.003,55 €	Alluvione	Definitiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
SANTA TERESA DI RIVA	SI_1_17833	19IR528/G1	ME	Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Santa Teresa di Riva	J99D16002730001	FSC	€ 9.553.600,00	10.621.735,00 €	Costiero	Definitiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
SANTA VENERINA	SI_1_17713	19IRA74/G1	CT	Opere di bonifica e rinaturalizzazione del Torrente Fago e riqualificazione del contesto ambientale	J39D16001710001	FSC	€ 1.325.000,00	1.325.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	LAVORI	ACQUISIZIONE PROGETTO
SANT'AGATA DI MILITELLO <b>SOMMA URGENZA</b>	SI_1_17591	19IRD99/G1	ME	"Lavori urgenti a protezione di tratto del lungomare SP162 antistante la Caserma dei Carabinieri nel Comune di S. Agata di Militello"	J46J16000860001	FSC	€ 2.200.000,00	120.699,42 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	LAVORI ULTIMATI
SANT'AGATA DI MILITELLO	SI_1_17592	19IRD77/G1	ME	Lavori urgenti per la ricostruzione di un muro di sostegno diruto sulla S.P. 162 del lungomare di S. Agata di Militello, tratto compreso tra la Via Campidoglio e Vallone Posta	J46J16000860001	FSC	€ 2.200.000,00	2.079.300,58 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO


SANT'AGATA DI MILITELLO	SI_1_17747	19IR809/G1	ME	Lavori urgenti di sistemazione idraulica del torrente Pidocchio a difesa del C.da Torrecandele_Completamento	J49D16002090001	FSC	€ 3.518.697,53	703.739,51 €	Alluvione	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
SANT'ALESSIO SICULO	SI_1_17723	19IR293/G1	ME	Interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione - T.te Agrò e suoi affluenti - Sant'Alessio Siculo (ME)	J59D16001820001	FSC	€ 1.500.000,00	300.000,00 €	Costiero	Esecutiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
SANT'ALESSIO SICULO	SI_1_24413	19IR932/G1	ME	OPERE A SALVAGUARDIA DELLA COSTA E DELL'ABITATO		POC	€ 13.000.000,00	13.000.000,00 €	Costiero	Esecutiva	LAVORI	IN APPROVAZIONE
SANT'ANGELO DI BROLO	SI_1_17829	19IRD89/G1	ME	"Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo"	J89D16003370001	FSC	€ 1.635.000,00	1.635.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	LAVORI AGGIUDICATI
SANT'ANGELO DI BROLO	SI_1_22510	19IRG14/G1	ME	Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento dle tratto della S.P. 140 all'ingresso nord del centro urbano - Via di Fuga	J83H1900060001	FSC	€ 2.950.000,00	2.950.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
SANT'ANGELO MUXARO	SI_1_17692	19IR048/G1	AG	Interventi di consolidamento del versante meridionale a salvaguardia del centro abitato e della zona archeologica.	J69D16001840001	FSC	€ 1.160.000,00	161.534,52 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
SANT'ANGELO MUXARO	SI_1_17834	19IR355/G1	AG	Consolidamento del costone roccioso	J69D16001890001	FSC	€ 1.508.000,00	1.508.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
SAPONARA	SI_1_17790	19IR996/G1	ME	Progetto per la messa in sicurezza centro abitato della frazione di Scarcelli, Saponara (ME)	J39D16001810001	FSC	€ 4.200.000,00	486.948,52 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	SIA AGGIUDICATI
SAVOCA	SI_1_17802	19IR623/G1	ME	Consolidamento a protezione del Castello, del museo della chiesa S. Michele e della strada comunale	J49D16002130001	FSC	€ 1.100.000,00	220.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
SCIACCA	SI_1_17684	19IR537/G1	AG	Intervento di stabilità del viadotto Cansalamone.	J89D16003150001	FSC	€ 2.930.000,00	349.830,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
SCICLI	SI_1_17799	19IRD90/G1	RG	Via di Fuga Circovalazione ovest di Scicli Corpo B	J49D16002160001	FSC	€ 2.300.000,00	98.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
SIRACUSA	SI_1_17818	19IRB69/G1	SR	Lavori di riqualificazione e consolidamento strutturale del viadotto di accesso lato nord alla città di Siracusa sul tratto comunale della ex SS114 SR-CT	J39D16001690001	FSC	€ 5.100.000,00	1.020.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Definitiva	SERVIZI	IN AGGIORNAMENTO
SOVRACOMUNALE	SI_1_17791	19IRD91/G1	CL	Messa in sicurezza della SP 132 Casalicchio Valle	J79D16001980001	FSC	€ 1.500.000,00	134.970,96 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
SOVRACOMUNALE	SI_1_17793	19IRD92/G1	CL	Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena	J99D16002760001	FSC	€ 652.728,00	652.728,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	LAVORI IN CORSO
SOVRACOMUNALE	SI_1_17794	19IRD93/G1	PA	Messa in sicurezza della SP40 tra Carini Montelepre e Giardinello	J69D16002080001	FSC	€ 1.500.000,00	129.178,89 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
SOVRACOMUNALE	SI_1_17824	19IRD94/G1	CL	Messa in sicurezza Strada provinciale Serradifalco - bivio Canicattì	J19D16005200001	FSC	€ 2.640.000,00	528.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
SOVRACOMUNALE	SI_1_17826	19IRD95/G1	CL	Messa in sicurezza della SP 23 Villalba - Montedoro	J79D16001990001	FSC	€ 2.000.000,00	400.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
SPADAFORA	SI_1_17749	19IR850/G1	ME	Intervento per la messa in sicurezza del torrente Tonnarazza dal rischio esondazioni a protezione della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte Ferrovario	J79D16001890001	FSC	€ 1.570.000,00	314.000,00 €	Alluvione	Definitiva	SERVIZI	IN APPROVAZIONE
SUTERA	SI_1_17823	19IRD96/G1	CL	Lavori di costruzione della strada esterna comunale Donna Spusa-Piano Superiore - stralcio di completamento	J76J16000890001	FSC	€ 2.300.000,00	2.300.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	LAVORI AGGIUDICATI

TAORMINA	SI_1_17750	19IRC36/G1	ME	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Sirina	J89D16003290002	FSC	€ 2.450.000,00	126.966,46 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
TERME VIGLIATORE	SI_1_17724	19IR890/G1	ME	Lavori di difesa e riqualificazione del litorale costiero - Terme Vigliatore (ME)	J89D16003320001	FSC	€ 1.950.000,00	390.000,00 €	Costiero	Esecutiva	SERVIZI	IN APPROVAZIONE
TERRASINI	SI_1_17797	19IRD97/G1	PA	Sistemazione e messa in sicurezza del sottopasso di Terrasini	J79D16001950001	FSC	€ 1.800.000,00	161.185,66 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
TORREGROTTA	SI_1_17725	19IR481/G1	ME	Opere di difesa della fascia costiera a salvaguardia delle Infrastrutture Litoranee	J99D16002650001	FSC	€ 4.570.000,00	914.000,00 €	Costiero	Definitiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
TORRETTA	SI_1_17807	19IR783/G1	PA	Sistemazione idraulica del Torrente Torretta	J89D16003170001	FSC	€ 7.483.787,78	371.889,11 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
TORTORICI	SI_1_17803	19IR965/G1	ME	Muri e paratie montovalle e opere idrauliche - zona S.Paolo_COMPLETAMENTO	J19D16005120001	FSC	€ 2.300.000,00	460.000,00 €	Frana	Esecutiva	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
TROINA	SI_1_17598	19IR203/G1	EN	Consolidamento del versante nord della Rocca S. Pantheon a monte della Via Madonna del Soccorso	J76J16000640001	FSC	€ 1.320.000,00	1.320.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	GARA LAVORI IN CORSO
TROINA	SI_1_19279	19IRB34/G1	EN	Mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di un ponte di seconda categoria nell'attuale attraversamento a guado nel fiume Troina, lungo la trazzera Troina-Cesarò	J77D16000000001	FSC	€ 1.703.000,00	1.703.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
TROINA	SI_1_22511	19IR204/G1	EN	Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel Monte Muganà - Troina - Completamento		FSC	€ 1.270.000,00	1.270.000,00 €	Frana	Preliminare	LAVORI	IN APPROVAZIONE
TUSA	SI_1_17804	19IRB19/G1	ME	Lavori di consolidamento del versante a valle della via Sant'Agostino dell'abitato di Tusa	J39D16001800001	FSC	€ 1.170.000,00	234.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
TUSA	SI_1_17805	19IRB18/G1	ME	Lavori di consolidamento relativi al costone roccioso Castello lato est e Castello lato ovest	J39D16001780001	FSC	€ 1.300.000,00	260.000,00 €	Frana	Definitiva	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
VALDINA	SI_1_17806	19IR991/G1	ME	Consolidamento centro abitato frazione Tracocchia versante ovest	J59D16001840001	FSC	€ 980.000,00	980.000,00 €	Frana	Definitiva	LAVORI	IN APPROVAZIONE
VALLEDOLMO	SI_1_17706	19IRD75/G1	PA	Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità della strada Valledolmo-Vallelunga pratameno in corrispondenza del ponte in c.da Celso	J39D16001720001	FSC	€ 280.000,00	280.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
VALLELUNGA PRATAMENO	SI_1_17703	19IR552/G1	CL	Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente "Salacio" (San Giovanni - Margiazzo) a valle del centro abitato.	J89D16003350001	FSC	€ 9.115.000,00	408.000,00 €	Alluvione	Preliminare	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
VALLELUNGA PRATAMENO	SI_1_17705	19IR556/G1	CL	Lavori di sistemazione e consolidamento parete soggetta a fenomeni franosi crollo nord c.a.	J89D16003230001	FSC	€ 1.056.800,00	147.335,68 €	Frana	Preliminare	SERVIZI	PREDISPOSIZIONE GARA SIA
VENETICO	SI_1_17819	19IRD98/G1	ME	Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico	J69D16002070001	FSC	€ 2.000.000,00	199.331,21 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
VENETICO	SI_1_22512	19IRC32/G1	ME	Lavori di consolidamento del versante sud-est del centro abitato di Venetico superiore	J63H19001070001	FSC	€ 7.109.095,23	7.109.095,23 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
VILAFRANCA SICULA	SI_1_17607	19IR896/G1	AG	Lavori di regimentazione delle acque a monte del c.a. in c.da San Rocco.	J16J16002000001	FSC	€ 1.300.000,00	1.300.000,00 €	Alluvione	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
VILAFRANCA TIRRENA	SI_1_17735	19IR841/G1	ME	Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle Acque Meteoriche lungo la via Regione Siciliana.	J79D16001910001	FSC	€ 735.000,00	735.000,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	LAVORI	IN AGGIORNAMENTO
VILAFRANCA TIRRENA	SI_1_17736	19IRA91/G1	ME	Lavori di riqualificazione del lungomare Cristoforo Colombo con annessa manutenzione delle opere di protezione dell'arenile.	J79D16001900001	FSC	€ 5.050.000,00	417.518,16 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	GARA SIA IN CORSO
VILLALBA	SI_1_17696	19IR092/G1	CL	Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a monte della via G. Garibaldi.	J99D16002580001	FSC	€ 939.914,00	939.914,00 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva	LAVORI	GARA SIA IN CORSO

VILLAROSA	SI_1_17716	19IRD76/G1	EN	Realizzazione muro di contenimento al km 7+500 della Stradaprovinciale n. 6 (via di fuga) in territorio di Villarosa con ripristino del manto stradale.	J99D16002750001	FSC	€ 492.173,55	98.434,71 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Preliminare	SERVIZI	ACQUISIZIONE PROGETTO
VIZZINI	SI_1_18833	19IRA67/G1	CT	Consolidamento Zona Piazza De Gasperi	J97D16000020001	FSC	€ 1.500.000,00	1.500.000,00 €	Frana	Esecutiva	LAVORI	LAVORI IN CORSO
PRA				RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE (UCOM) - PRA		FSC	€ 11.286.621,00	11.286.621,00 €	PRA			
CATANIA	DRPC		DRPC	D.R.P.C. Interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionale dal 17-21 ottobre 2018		FSC		4.950.000,00 €	Frana	Esecutiva		LAVORI IN CORSO
MESSINA	DRPC		DRPC	Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interassato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada A718 Messina - Catania		FSC		16.311.717,13 €	Messa in sicurezza Infrastrutture	Esecutiva		LAVORI IN CORSO
								<b>472.467.700,36 €</b>				


MACROVOCI	
STATO DELL'ARTE	N. Interventi
ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE	48
IN AGGIORNAMENTO	39
IN APPROVAZIONE	9
PRESISPOSIZIONE GARA SIA	22
PREDISPOSIZIONE GARA LAVORI	7
ISTRUTTORIA GARA SIA/LAVORI	4
GARA SIA IN CORSO	48
GARA LAVORI IN CORSO	25
SIA AGGIUDICATI	5
LAVORI AGGIUDICATI	5
LAVORI IN CORSO_DRPC	50
LAVORI ULTIMATI	2
RAFFORZAMENTO PA	1
Totale Interventi FSC	265

STATO DELL'ARTE	N.	%
Acquisizione Progettazione	48	18,18%
In Aggiornamento	39	14,77%
In Approvazione	9	3,41%
Predisposizione Gara SIA	22	8,33%
Predisposizione Gara Lavori	7	2,65%
Istruttoria Gara SIA/LAVORI	4	1,52%
Gara SIA in Corso	48	18,18%
SIA Aggiudicati	5	1,89%
Gara LAVORI in corso	25	9,47%
Lavori Aggiudicati	5	1,89%
Lavori in Corso/Ultimati	52	19,70%
	264	100,00%

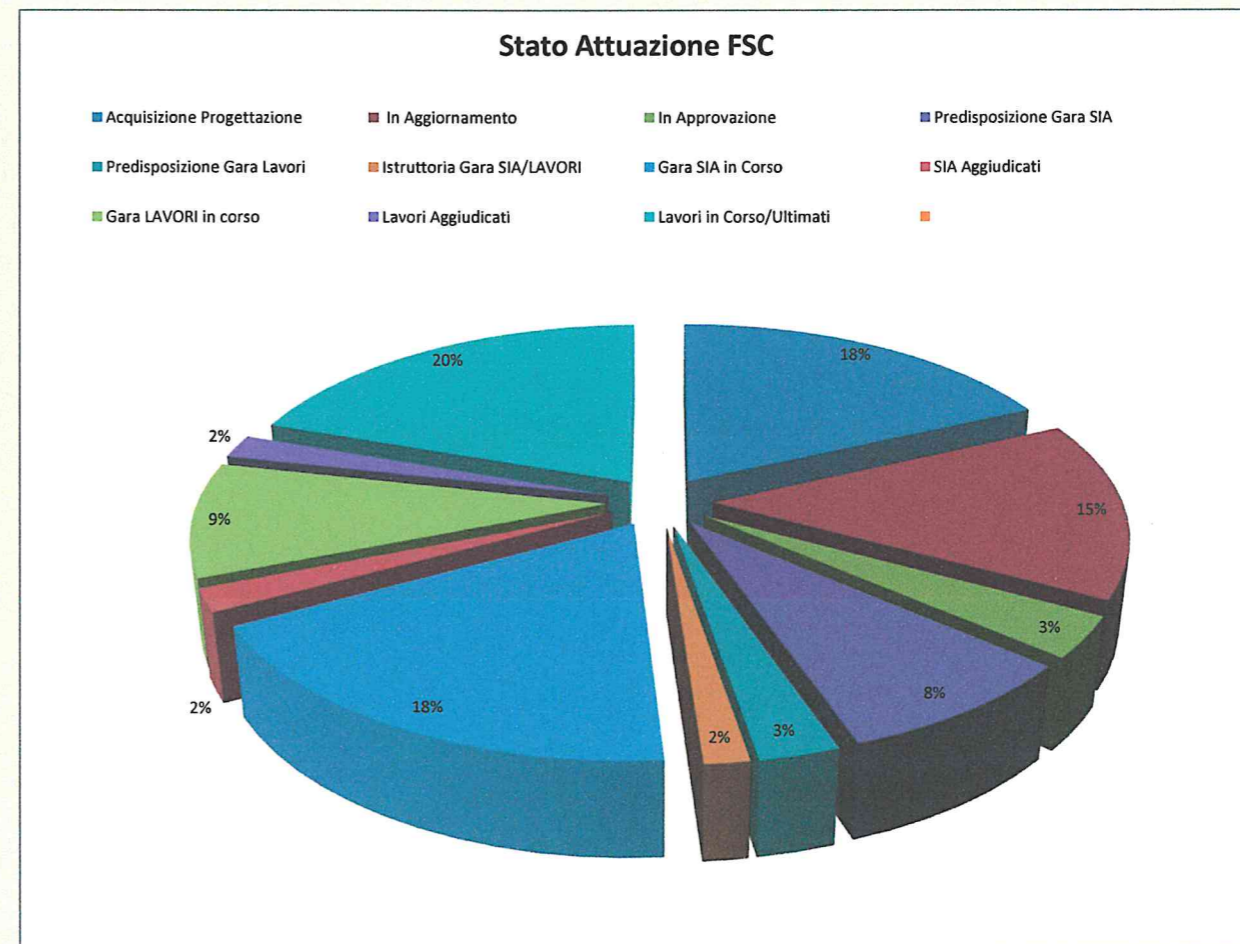

MACROVOCI			
N.	Tipo Dissesto	Importo Progetti	%
40	Alluvioni	€ 70.137.254,72	15,21%
25	Costiero	€ 121.563.072,56	23,10%
129	Frane	€ 162.967.295,87	35,34%
70	Messa in Sicurezza Infrastrutture	€ 106.513.456,21	23,10%
264		<b>€ 461.181.079,36</b>	
1	<b>RAFFORZAMENTO PA</b>	<b>€ 11.286.621,00</b>	
		<b>€ 472.467.700,36</b>	

Tipo Dissesto	N.	%
Alluvioni	40	15,15%
Costiero	25	9,47%
Frane	129	48,86%
Messa in Sicurezza Infrastrutture	70	26,52%
	264	

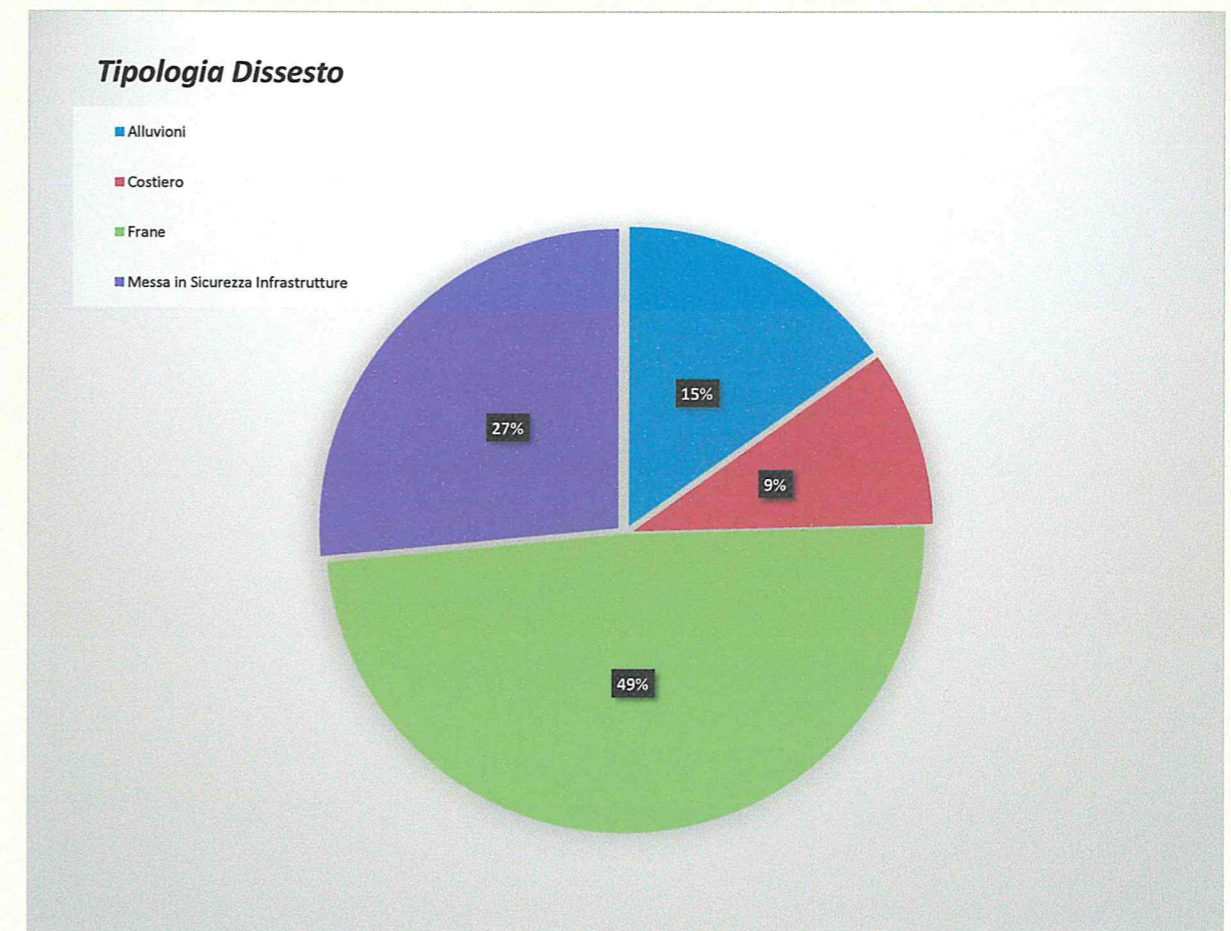

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA




## COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2019

Città Metropolitane Palermo e Messina



Importo FSC € 48.864.545,48

Numero Interventi : 9


## CITTA' METROPOLITANE DI MESSINA E PALERMO

Prov	Cod. Interno	Cod. Rendis	Comune	Titolo Intervento	CUP	Importo	LIVELLO PROGETTUALE	STATO DELL'ARTE DICEMBRE 2019
PA	PSPA_84	19IRB84/G1	PALERMO	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo sovrastante l'area urbana di Mondello. Completamento	D96E06000060000	€ 1.764.958,00	Definitivo	<i>In Approvazione</i>
PA	PSPA_85	19IRB85/G1	PALERMO	Interventi di protezione dell'area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino.	D77B15000550001	€ 913.287,48	Definitivo	<i>Gara SIA in corso</i>
PA	PSPA_86	19IRB86/G1	PALERMO	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura.	D77B04000320001	€ 30.545.000,00	Preliminare	<i>Gara SIA in corso</i>
PA	PSPA_87	19IRB87/G1	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti sovrastanti l'abitato di boccadifalco - completamento	D77B15000540001	€ 3.700.000,00	Preliminare	<i>Gara SIA in corso</i>
ME	PSME_78	19IRC78/G1	MESSINA	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel centro abitato di Pezzolo - Messina	J45D16000020001	€ 121.500,00	Esecutivo	<i>LAVORI IN CORSO</i>
ME	PSME_79	19IRC79	MESSINA	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana lenta posta nel villaggio di Altolia - Messina	J45D16000030001	€ 269.800,00	Esecutivo	<i>LAVORI IN CORSO</i>
ME	PSME_68	19IR668/G1	MESSINA	Lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del torrente Portella Arena in corrispondenza della cooperativa Futura	J45D16000040001	€ 650.000,00	Preliminare	<i>In Approvazione</i>
ME	PSME_75	19IRC75/G1	MESSINA	Mitigazione del rischio Alluvione con opere di sistemazione in alveo e dei sistemi arginali dei torrenti Larderia, Papardo, Salmei-Gesso, Ortoliuzzo a salvaguardia della popolazione e del tessuto economico	J45D16000010001	€ 7.900.000,00	PDFTE	<i>Gara SIA in corso</i>
ME	PSME_74	19IRC74/G1	MESSINA	Lavori per la mitigazione del rischio idraulico mediante l'eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi con la realizzazione di manufatti preferibilmente prefabbricati a tutela della sicurezza pubblica.	J45D16000050001	€ 3.000.000,00	Preliminare	<i>In Approvazione</i>


€ 48.864.545,48



Città Metropolitana di Palermo		
N.	STATO DELL'ARTE	IMPORTO
1	IN APPROVAZIONE	1.764.958,00 €
3	GARA SIA IN CORSO	35.158.287,48 €
		<b>36.923.245,48 €</b>

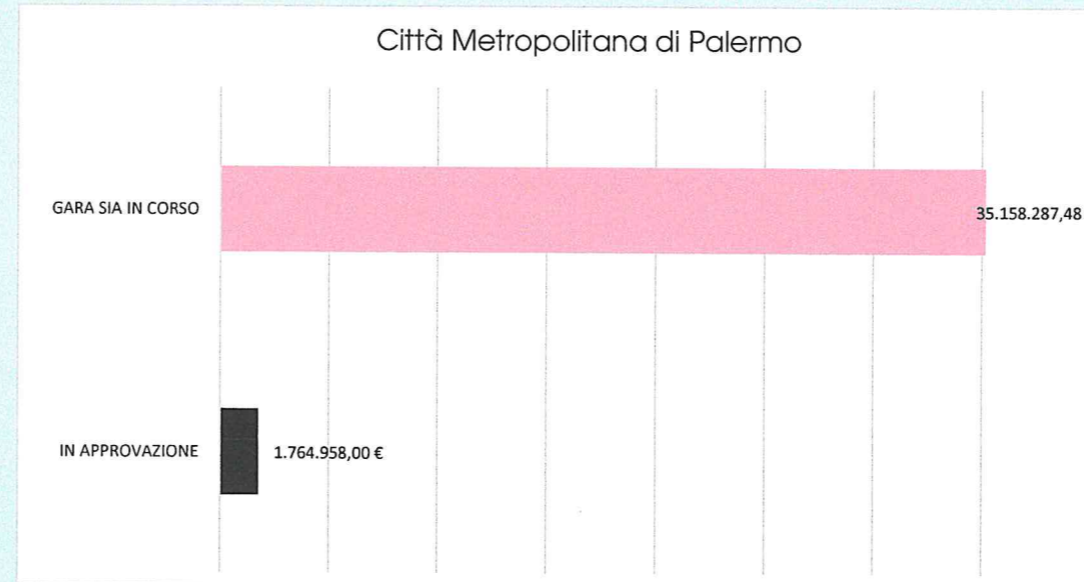

Città Metropolitana di Messina		
N.	STATO DELL'ARTE	N. Interventi
2	IN APPROVAZIONE	3.650.000,00 €
1	GARA SIA IN CORSO	7.900.000,00 €
2	LAVORI IN CORSO	391.300,00 €
		<b>11.941.300,00 €</b>

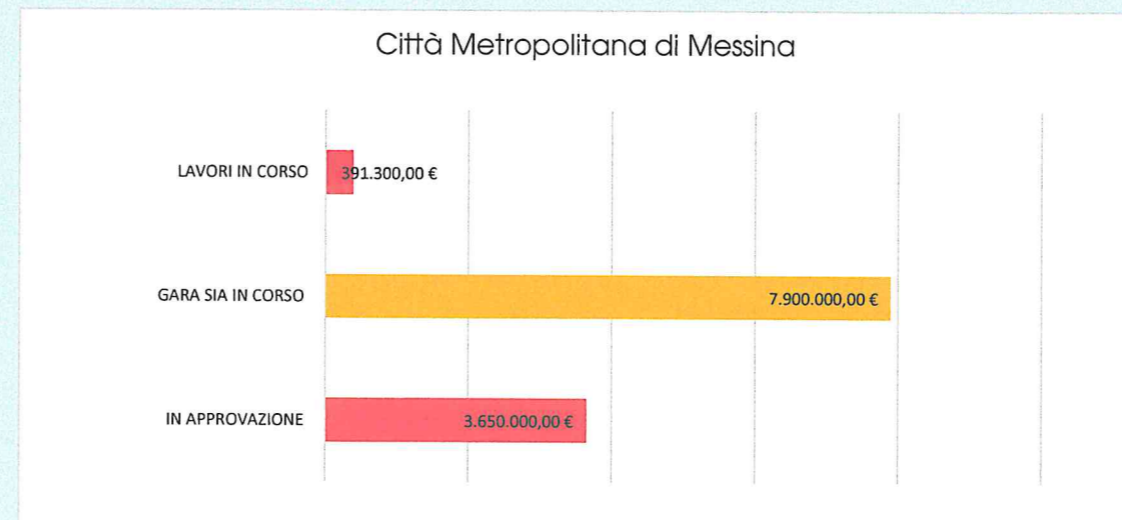

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA




## COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2019

Fondo Progettazione



Importo FSC € 16.822.024,66

Numero Interventi : 69

## INTERVENTI FONDO PROGETTAZIONE

FP	COD_Interno	ENTE BENEFICIARIO	Codice Rendis	Prov	TITOLO INTERVENTO	CUP	Importo Globale	Importo Progettazione	Livello Progettazione	STATO DELL'ARTE DICEMBRE_2019
FP	FP_AG904	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	19IR904/G1	AG	Consolidamento della Via Santuario	H57B16000000006	€ 1.000.000,00	121.989,00 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_MEB63	ANTILLO	19IRB63/G1	ME	Lavori di regimentazione Alveo Torrente acqua vena, completamento del consolidamento dei versanti, sponda sx e dx, ripristino degli attraversamenti idraulici esistenti	G59D00000000002	€ 4.700.000,00	136.817,10 €	Definitivo	IN AGGIORNAMENTO
FP	FP_MEA12	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	19IRA12/G1	ME	Progetto per i lavori urgenti di sistemazione delle Saie Riti, Bizarro, Acquacalda e Cappuccini	H66J98000000006	€ 6.500.000,00	228.290,00 €	PDFTE	IN AGGIORNAMENTO
FP	FP_MEA10	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	19IRA10/G1	ME	Lavori per la difesa del litorale di Barcellona P.G. nel tratto tratto tra il torrente Termini e il Torrente Longano	H67B15000390006	€ 7.450.000,00	342.357,30 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_PA893	BELMONTE MEZZAGNO	19IR893/G1	PA	Realizzazione di un canale di gronda di raccolta piogge intense del versante S. Caterina lungo il margine Nord-est dell'abitato	J85D13000180001	€ 3.000.000,00	- €	Definitivo	REVOCATO
FP	FP_MEA49	BROLO	19IRA49/G1	ME	Recupero ambientale a salvaguardia del torrente Pozzo	J89D15003280005	€ 7.150.000,00	89.613,00 €	Definitivo	IN AGGIORNAMENTO
FP	FP_TP156	CAMPOBELLO DI MAZARA	19IR156/G1	TP	Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera	J14J15000010001	€ 1.400.000,00	54.488,70 €	Definitivo	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_PAB59	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	19IRB59/G1	PA	Interventi di ripascimento artificiale della spiaggia compresa tra la foce del fiume Imera e la foce	D77B16000030007	€ 45.000.000,00	511.940,25 €	Definitivo	IN APPROVAZIONE
FP	FP_MEB64	CAPO D'ORLANDO	19IRB64/G1	ME	Intervento urgente per la difesa e salvaguardia di tratti dell'arenile di Capo d'Orlando	J14J15000020001	€ 4.985.000,00	253.586,16 €	PDFTE	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_ME235	CASTELMOLA	19IR235/G1	ME	Progetto per il consolidamento dell'abitato di Castelmola nei tratti	J74J15000000001	€ 2.000.000,00	69.457,50 €	Definitivo	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_CT039	CATANIA	19IR039/G3	CT	Completamento collettore pluviale B	D63G15000290006	€ 48.821.000,00	403.975,08 €	Definitivo	IN AGGIORNAMENTO
FP	FP_ME919	CONDRO'	19IR919/G1	ME	Mitigazione rischio idrogeologico a protezione del centro abitato mediante sistemazione e risagomatura	J14J15000000001	€ 1.550.000,00	159.595,80 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_ME389	FICARRA	19IR389/G1	ME	Consolidamento del centro urbano in località Natoli	E32J09000030002	€ 1.369.619,08	- €	Definitivo	REVOCATO

FP	FP_ME526	FIUMEDINISI	19IR526/G1	ME	Lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Armi a difesa del centro abitato	F47B10000780005	€ 4.500.000,00	- €	Definitivo	REVOCATO
FP	FP_MEB31	FLORESTA	19IRB31/G1	ME	La vori di messa in sicurezza del versante a monte del centro abitato di Floresta	G54H16000150001	€ 825.291,25	102.984,18 €	PDFTE	IN AGGIORNAMENTO
FP	FP_SR886	FRANCOFONTE	19IR886/G1	SR	lavori di consolidamento per la mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	J54J15000010001	€ 2.380.000,00	216.347,88 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_ME988	GALATI MAMERTINO	19IR988/G1	ME	Consolidamento centro abitato zona S. Antonio	F47B15000370006	€ 770.000,00	96.969,60 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_ME422	GALATI MAMERTINO	19IR422/G1	ME	Consolidamento e messa in sicurezza del versante località Piliari	J49H12000480001	€ 1.200.000,00	135.664,20 €	PDFTE	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_MEC57	GALATI MAMERTINO	19IRC57/G1	ME	Lavori di disaggio massi a protezione dell'abitato di C.da Galini- Lotto di completamento	J44J15000000001	€ 450.000,00	22.396,50 €	Definitivo	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_ME470	LENI	19IR470/G1	ME	Lavori di consolidamento del fronte roccioso e delle grotte antistanti la spiaggia Rinella	D25I14000240003	€ 725.000,00	92.074,50 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_MEC17	LETOJANNI	19IRC17/G1	ME	Riqualficazione e recupero ambientale torrente Papale Comune di Letojanni	E39D15002480002	€ 2.800.000,00	116.698,00 €	PDFTE	GARA IN CORSO_REVOCATO
FP	FP_ME983	LETOJANNI	19IR983/G1	ME	Consolidamento mediante opere strutturali e di ingegneria natuarlistica di prtezione passiva e attiva con canalizzazione delle acque e riforestazione	E36J16000390002	€ 7.000.000,00	507.381,00 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_MEC59	LETOJANNI	19IRC59/G1	ME	Mitigazione dell'erosione cost. tratto di litorale compreso tra via Catania e torrente Letojanni	E36J15001890002	€ 6.500.000,00	308.191,50 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_ME966	LIBRIZZI	19IR966/G1	ME	Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasi	F43B17000050001	€ 2.025.000,00	192.074,40 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_ME903	LIBRIZZI	19IR903/G1	ME	Consolidamento e canalizzazione del centro abitato nella frazione Nasidi	F43G12000230002	€ 2.025.000,00	192.074,40 €	PDFTE	IN AGGIORNAMENTO
FP	FP_ME975	LIPARI	19IR975/G1	ME	Interventi di riequilibrio litoraneo ed adugramento delle opere di protezione della spiaggia in località canneto	J62J16000000001	€ 8.260.000,00	371.488,14 €	PDFTE	GARA IN CORSO_REVOCATO
FP	FP_ME561	MALVAGNA	19IR561/G1	ME	Consolidamento a protezione del c.a. versante sud - completamento	B97B13000180002	€ 1.150.000,00	132.245,40 €	PDFTE	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE

FP	FP_CT980	MANIACE	19IR980/G1	CT	Opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del centro abitato contrada Gala	E33B14000060006	€ 3.980.000,00	56.597,40 €	Definitivo	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_ME676	MESSINA	19IR676/G1	ME	Messa in sicurezza idraulica del torrente galati tra c/da Baracce e c/da Pozzo	F47B00000000001	€ 2.550.000,00	108.558,00 €	PDFTE	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_ME494	MESSINA	19IR494/G1	ME	Progetto della strada di collegamento tra la SS 113 ed il Villaggio di Rodia	F47B15000520001	€ 1.800.000,00	84.138,00 €	PDFTE	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_MEC82	MESSINA	19IRC82/G1	ME	"Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio	F44H16000310009	€ 8.100.000,00	365.733,90 €	PDFTE	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_MEC80	MESSINA	19IRC80/G1	ME	"Sistemazione dell'area in frana compresa tra via Noviziato Casazza - Via Sciva e Viale Italia"	F47B15000530001	€ 2.900.000,00	340.410,00 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_ME539	MOIO ALCANTARA	19IR539/G1	ME	Progetto di ripristino delle difese spondali lungo il torrente Fortino a protezione del centro abitato	H97B05000070009	€ 3.284.289,05	- €	Definitivo	REVOCATO
FP	FP_ME450	MOTTA CAMASTRA	19IR450/G1	ME	Consolidamento e risanamento ambientale dell'area prospiciente la casa comunale sita in P.zza Croce a nor di Rocca Mancusa	J54J15000020001	€ 1.360.000,00	53.490,78 €	Definitivo	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_MEB97	NASO	19IRB97/G1	ME	Consolidamento e Messa in Sicurezza Per La Mitigazione del rischio idrogeologico in località San Giuliano a Monte Della SS. 116 Randazzo- Capo D'Orlato	F77B16000040005	€ 1.026.476,00	123.799,32 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_SRA01	NOTO	19IRA01/G1	SR	Lavori di ricostruzione, protezione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale del litorale in lido di Noto	J84J16000070001	€ 12.000.000,00	496.003,50 €	PDFTE	GARA IN CORSO_REVOCATO
FP	FP_MEA36	NOVARA DI SICILIA	19IRA36/G1	ME	Mitigazione rischio idrogeologico a protezione abitato in Novara centro Via Benedetto Croce e c/da Roccazza Fraz. San Basilio	H97B16000020002	€ 1.950.000,00	186.946,20 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_MEC41	PAGLIARA	19IRC41/G1	ME	Lavori di sistemazione idraulica della Via Vallone Piazza a salvaguardia del centro abitato - codic	J34J15000000001	€ 1.500.000,00	74.370,00 €	PDFTE	GARA IN CORSO_REVOCATO
FP	FP_PA021	PALERMO	19IR021/G3	PA	Interventi di manutenzione canali di Maltempo e sistemazione degli argini canale	N	€ 5.500.000,00	272.500,00 €	Documento Preliminare Progettazione	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_PAB86	PALERMO	19IRB86/G1	PA	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE	N	€ 30.545.000,00	- €	PDFTE	REVOCATO
FP	FP_PAB94	PALERMO	19IRB94/G1	PA	Interventi di completamento degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti e scarpate di M. Pellegrino sovrastanti il tratto centrale di Via Monte Ercta	D74J16000040001	€ 1.900.000,00	248.010,00 €	Documento Preliminare Progettazione	GARA IN CORSO


FP	FP_PAB90	PALERMO	19IRB90/G1	PA	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gsallo sovrastanti gli abitati di Sferracavallo e Barcarello	D74J16000010001	€ 8.925.000,00	831.180,00 €	Documento Preliminare Progettazione	GARA IN CORSO
FP	FP_PAB91	PALERMO	19IRB91/G1	PA	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti gli abitati di Addaura e Mondello	D77B04000370007	€ 12.707.000,00	1.088.675,70 €	Documento Preliminare Progettazione	GARA IN CORSO
FP	FP_PAB92	PALERMO	19IRB92/G1	PA	Interventi finalizzati alla Mitigazione del Rischio da crollo delle pareti di Monte Gallo area N/E I	D74J17000120001	€ 5.000.000,00	534.450,00 €	Documento Preliminare Progettazione	GARA IN CORSO
FP	FP_PAC31	PALERMO	19IRC31/G1	PA	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da Crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su Via Falconara	D74J16000020001	€ 850.000,00	142.800,00 €	Documento Preliminare Progettazione	GARA IN CORSO
FP	FP_PAB89	PALERMO	19IRB89/G1	PA	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di monte Pellegrino sovrastanti il parco urbano della Favorita, il Viale Margherita di Savoia e il Viale Diana	D74J16000030001	€ 9.489.000,00	873.818,40 €	Documento Preliminare Progettazione	GARA IN CORSO
FP	FP_PAB88	PALERMO	19IRB88/G1	PA	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di monte gallo sovrastanti gli abitati di Partanna e Tommaso Natale	N	€ 4.085.000,00	449.904,00 €	Documento Preliminare Progettazione	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_ME961	PATTI	19IR961/G1	ME	Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la mitigazione del rischio geomorfologico - dissesto Cuturi, case nuove Russo	C47B15003840001	€ 1.980.000,00	188.997,48 €	PDFTE	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_MEA19	PATTI	19IRA19/G1	ME	Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana situata a sud di Piazza Gramsci	J49D16002080001	€ 933.000,00	- €	Definitivo	REVOCATO
FP	FP_ENC64	PIAZZA ARMERINA	19IRC64/G1	EN	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti Via Mazzini	I34J16000060002	€ 2.000.000,00	190.365,00 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_MEC06	RACCUJA	19IRC06/G1	ME	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico degli agglomerati urbani della frazione Zappa	F77B16000220009	€ 2.200.041,73	204.043,06 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_RGB98	RAGUSA	19IRB98/G1	RG	Risanamento versanete Sud e Sud-Est di Ragusa Ibla sovrastante la via Ottaviano - mitigazione rischio	F26J10000540001	€ 3.369.647,00	103.627,45 €	Definitivo	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_AG928	RAVANUSA	19IR928/G1	AG	Completamento del consolidamento delle aree a valle del centro abitato	J74J15000010001	€ 1.934.519,54	67.823,89 €	Definitivo	IN AGGIORNAMENTO
FP	FP_ME935	ROMETTA	19IR935/G1	ME	Realizzazione delle opere di protezione delle aree costiere e delle spiagge del territorio comunale	C59D10000460002	€ 12.200.000,00	183.234,15 €	Definitivo	IN APPROVAZIONE
FP	FP_TPB62	SALAPARUTA	19IRB62/G1	TP	Progetto per il consolidamento mediante opere di risagomatura e rinforzo opere di sostegno; Opere di regimentazione della acque e riforestazione; Opere strutturali di stabilizzazione del versante	D57H10002930001	€ 980.000,00	119.813,40 €	PDFTE	IN ISTRUTTORIA

FP	FP_ME244	SAN MARCO D'ALUNZIO	19IR244/G1	ME	Lavori di consolidamento centro abitato a valle di via Cappuccini - Completamento	F83G15000600009	€ 3.940.000,00	- €	Definitivo	REVOCATO
FP	FP_ME533	SAN PIERO PATTI	19IR533/G1	ME	Opere di consolidamento zona centro abitato compresa tra la via Leonardo Da Vinci e la Via Catania	G17B08000080002	€ 2.010.000,00	69.706,98 €	Definitivo	GARA IN CORSO
FP	FP_MEA78	SAN SALVATORE DI FITALIA	19IRA78/G1	ME	Consolidamento e messa in sicurezza dell'area Ovest del C.A. in prossimità della Piazza S. Antonio	H26J16000060002	€ 1.500.000,00	56.983,50 €	Definitivo	IN AGGIORNAMENTO
FP	FP_ME543	SANTA TERESA DI RIVA	19IR543/G1	ME	Intervento di mitigazione del rischio idraulico, della fiamara d'Agrò a difesa del centro abitato	F97B14000230009	€ 3.417.000,00	- €	PDFTE	REVOCATO
FP	FP_ME938	SCALETTA ZANCLEA	19IR938/G1	ME	Messa in sicurezza di C. Scaletta e ricostruzione della spiaggia a tutela delle strutture varie	J54J15000030001	€ 4.650.000,00	87.151,95 €	Definitivo	IN AGGIORNAMENTO
FP	FP_ME911	SCALETTA ZANCLEA	19IR911/G1	ME	Completamento dei lavori di protezione dell'abitato della Fraz. Divieto cod. PAI 102-5SZ- 020	J54J15000000001	€ 1.541.386,48	58.016,01 €	Definitivo	IN AGGIORNAMENTO
FP	FP_MEC39	SCALETTA ZANCLEA	19IRC39/G1	ME	Consolidamento centro abitato di Giudomandri Superiore rimboschimento prog. Completamento	B57B16000100002	€ 1.300.000,00	142.501,80 €	PDFTE	IN AGGIORNAMENTO
FP	FP_ME828	SINAGRA	19IR828/G1	ME	Realizzazione di una via di Fuga del centro storico del paese, mediante l'adeguamento del percorso esistente	C61B13000680001	€ 1.000.000,00	44.509,50 €	Definitivo	GARA IN CORSO
FP	FP_SRC04	SIRACUSA	19IRC04/G1	SR	Progetto mitigazione del rischio idrogeologico dell'ara denominata Pantanelli	B37B12000120002	€ 6.247.861,80	221.573,03 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_EN202	SPERLINGA	19IR202/G1	EN	Consolidamento dell'area sovrastante il centro abitato e parco SubUrbano zona Castello	J64J15000000001	€ 1.800.000,00	- €	PDFTE	REVOCATO
FP	FP_MEC50	TAORMINA	19IRC50/G1	ME	Opere di salvaguardia e restauro geoambientale della spiaggia di "Isola Bella"	E89D16000510003	€ 2.895.383,74	€ -	PDFTE	REVOCATO
FP	FP_ME612	TAORMINA	19IR612/G1	ME	Consolidamento in C/DA Costa Don Lappio - Completamento	E87B15000140002	€ 800.000,00	100.233,00 €	PDFTE	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_ME239	TAORMINA	19IR239/G1	ME	Progetto relativo al consolidamento del costone roccioso di C.da Villagonia	E87B15000160002	€ 2.200.000,00	74.447,10 €	Definitivo	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_ME162	TRIPI	19IR162/G1	ME	Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della S.P. n. 115 Tripliciana	H26J14000460002	€ 1.300.000,00	142.501,80 €	PDFTE	GARA IN CORSO

FP	FP_ME887	TRIPI	19IR887/G1	ME	Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Baracca- Piazza Drago	H26E12000220002	€ 1.807.638,97	177.212,12 €	PDFTE	GARA IN CORSO
FP	FP_ME217	TRIPI	19IR217/G1	ME	Mitigazione rischio idrogeologico area centro abitato cod. 010-5TR-133	H25B18002240006	€ 810.361,28	101.360,10 €	PDFTE	IN ISTRUTTORIA
FP	FP_ME557	VILLAFRANCA TIRRENA	19IR557/G1	ME	Lavori di ristrutturazione del ponte sul torrente Calvaruso	D71E16000310002	€ 1.483.000,00	26.933,04 €	Definitivo	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_MEE91	MESSINA	19IRE91/G1	ME	I Stralcio Funzionale_Torrente Lardereria	F47B16000500009	€ 10.926.396,28	708.118,28 €	PDFTE	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_CTF02	CATANIA	19IRF02/G1	CT	Opere di mitigazione del rischio idraulico lungo l'asta del Canale Buttaceto a valle dell'immissione	D65B17000750006	€ 34.208.310,32	834.812,04 €	Preliminare	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_ME516	MESSINA	19IR516/G1	ME	Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti Litorale Ionico	F44H15001190009	€ 2.472.000,00	52.221,19 €	Definitivo	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_MEC81	MESSINA	19IRC81/G1	ME	3° Stralcio di completamento Siti: Marmora, Rodia Puccino, Acqualadrone, Capo Rasocolmo	F47B16000490009	€ 8.530.000,00	381.198,42 €	Preliminare	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_MEE71	TORREGROTTA	19IRE71/G1	ME	CANALIZZAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DEFLUSSO ACQUE PIOVANE (SA PAI 003- E05)	F91E17000230006	€ 1.480.000,00	73.718,80 €	Preliminare	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_CTF04	MISTERBIANCO	19IRF04/G1	CT	OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NELL'AREA PRODUTTIVA E COMMERCIALE DI C.DA MEZZOCAMPO	G84J17000110006	€ 17.800.000,00	500.462,00 €	Preliminare	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
FP	FP_MED39	MESSINA	19IRD39/G1	ME	Mitigazione rischio alluvione T.ti San Filippo, Zafferia, Mili e Marmora, Il stralcio T. San filippo	F43H19001050008	€ 21.517.385,25	720.374,78 €	PDFTE	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
								<b>16.822.024,66 €</b>		



MACROVOCI - Dati Aggregati			
N.	STATO DELL'ARTE	N. Interventi	%
14	Acquisizione Progettazione	4.020.869,50 €	17,72%
11	In Aggiornamento	1.566.230,91 €	13,92%
2	In Approvazione	695.174,40 €	2,53%
13	In Istruttoria	2.024.208,12 €	16,46%
25	Gara in Corso	7.456.982,09 €	31,65%
4	Gara in Corso_Revocato	1.058.559,64 €	5,06%
10	Revocato	0,00 €	12,66%
79		16.822.024,66 €	100,00%

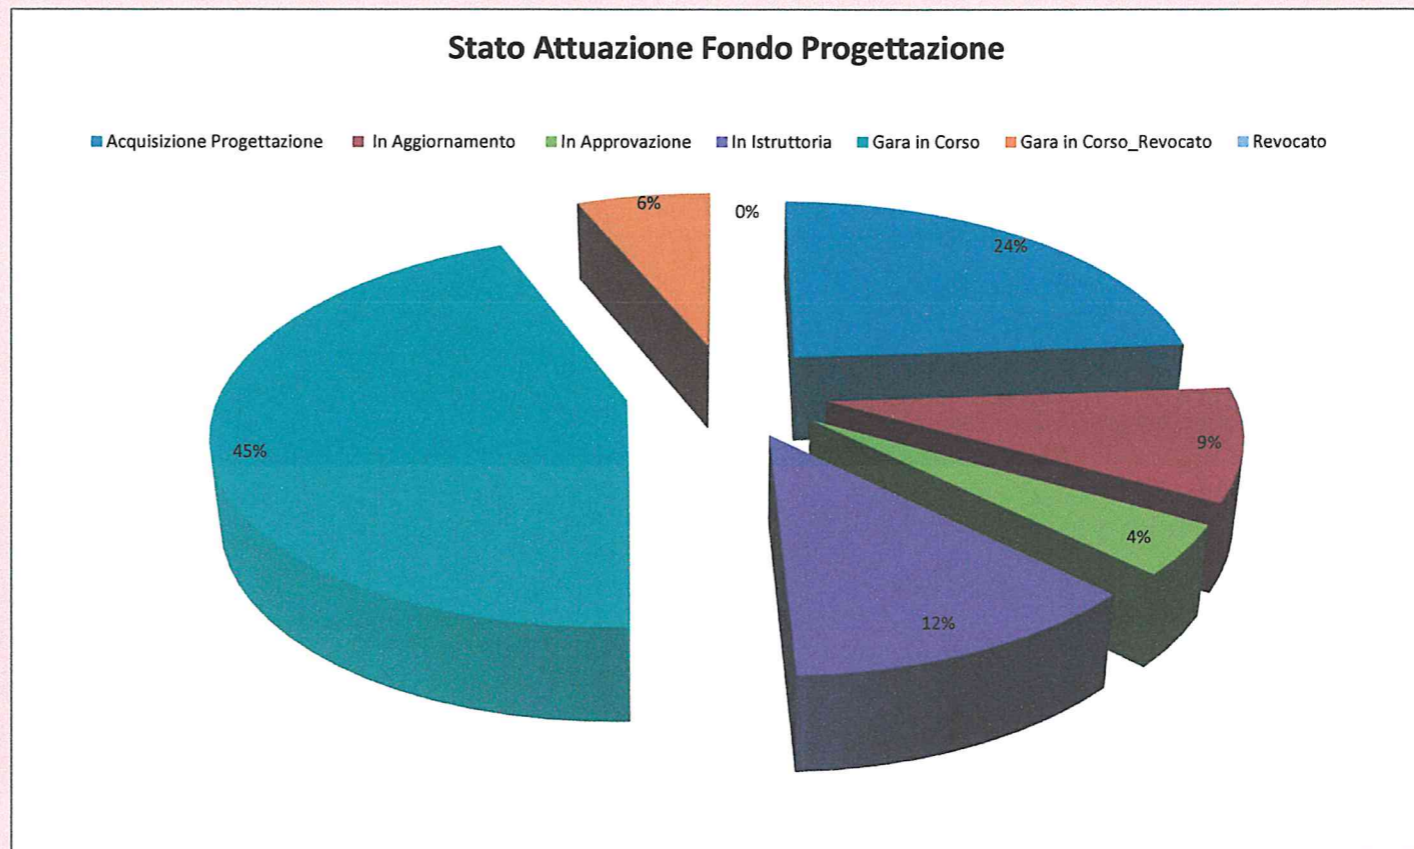




## COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2019

### FONDI PAC



Importo FSC € 7.893.803,81

Numero Interventi : 29

## PIANO AZIONE E COESIONE

COD_INTERNO	ENTE BENEFICIARIO	P R V O	INTERVENTO	IMPORTO LAVORI	TIPOLOGIA DISSESTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	STATO DELL'ARTE DICEMBRE 2019
PAC_AG001	AGRIGENTO	AG	Servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione definitiva, esecutiva ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 1.893.803,81	DUOMO	DEFINITIVA	GARA SIA IN CORSO
PAC III_AG002	CALTABELLOTTA VILLAFRANCA SICULA	AG	Lavori di risagomatura e di pulizia dell'alveo del fiume Verdura nel tratto compreso tra C/DA Giraffe e la C/DA Castello.	€ 600.000,00	FIUME VERDURA		IN AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE
PAC III_AG003	SCIACCA	AG	Lavori di pulizia, decespugliamento, rimozione dei detriti e risagomatura dell'alveo nel tratto a monte della S.S.115 fino alla foce.	€ 250.000,00	VALLONE BAIATA- FOCE DI MEZZO	ESECUTIVA	GARA LAVORI IN CORSO
PAC III_AG004	PORTO EMPEDOCLE	AG	Lavori di pulizia del tratto d'alveo del Torrente compreso tra la S.S. 115 e la foce.	€ 80.000,00	TORRENTE RE	ESECUTIVA	GARA LAVORI IN CORSO
PAC III_CL001	GELA	CL	L'intervento ipotizzato consiste nella pulitura e risagomatura dell'alveo ipotizzando la sistemazione del materiale, ove possibile, lungo le sponde. Preliminarmente comunque detto materiale dovrà essere analizzato dall'Arpa per verificarne l'idoneità.	€ 633.479,00	TORRENTE GATTANO		ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
PAC III_CT001	CATANIA MISTERBIANCO PATERNO' PALAGONIA	CT	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	€ 306.823,00	TORRENTE BUTTACETO E RETE SCOLANTE COLLEGATA		REVOCATO
PAC III_CT002	CATANIA	CT	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	€ 78.900,00	CANALE JUNGETTO E SUOI AFFLUENTI		ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
PAC III_CT003	CATANIA	CT	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	€ 27.200,00	CANALE BICOCCA AFFLUENTE IN DX CANALE BICOCCA		REVOCATO
PAC III_CT004	CATANIA	CT	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	€ 31.200,00	CANALE ARCI		REVOCATO

PAC III_CT005	LENTINI - RAMMACCA	EN	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	€	110.000,00	CANALI AFFERENTI LA BASE MILITARE DI SIGONELLA		REVOCATO
PAC III_EN001	REGALBUTO	EN	Rimozione di materiale alluvionale e della vegetazione spontanea e realizzazione di argini e recinzioni.	€	300.000,00	FIUME SALSO		REVOCATO
PAC III_EN002	ENNA	EN	Risagimatura del corso d'acqua al fine di ripristinare la sezione idraulica e garantire la risagomatura del corso d'acqua al fine di ripristinare la sezione idraulica e garantire il libero deflusso delle acque a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.	€	300.000,00	TORRENTE CALDERARI		REVOCATO
PAC III_EN003	ASSORO	EN	Rimozione di materiale, alluvionale e della vegetazione spontanea, realizzazione di argini di terra.	€	200.000,00	FIUME DITAINO		REVOCATO
PAC III_EN004	CENTURIPPE	EN	Rimozione di materiale alluvionale e della vegetazione spontanea, realizzazione di argini.	€	300.000,00	FIUME SIMETO		REVOCATO
PAC III_ME001	S.LUCIA	ME	Messa in sicurezza delle aree adiacenti Torrenti Mela e Floripotema.	€	130.000,00	TORRENTI MELA E FLORIPOTEMA	ESECUTIVA	IN AGGIORNAMENTO
PAC III_ME002	SAVOCA	ME	Ricostruzione di tratti di argini crollati, consolidamento delle opere longitudinali scalzate, svuotamento e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del Torrente Botte.	€	250.000,00	TORRENTE BOTTE	ESECUTIVA	IN AGGIORNAMENTO
PAC III_ME003	FONDACHELLI FANTINA	ME	Ricostruzione di un tratto di muro d'argine crollato in sponda destra del Torrente Patri e la realizzazione di una scogliera a protezione delle infrastrutture comunali nella frazione chiesa.	€	251.930,00	TORRENTE PATRI'	ESECUTIVA	IN AGGIORNAMENTO
PAC III_ME004	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	Ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del Torrente Mela in località Furia nella frazione Femminamorta, a protezione del nucleo abitato della omonima frazione.	€	250.000,00	TORRENTE MELA	ESECUTIVA	IN AGGIORNAMENTO
PAC III_ME005	PACE DEL MELA	ME	Ricostruzione del muro d'argine con inevitabile ricostruzione del muro d'argine in sponda sinistra del Torrente Muto.	€	192.000,00	TORRENTE MUTO	ESECUTIVA	IN AGGIORNAMENTO
PAC III_ME006	SANT'ALESSIO SICULO	ME	Ripristino delle opere di protezione della condotta fognaria sottomarina nel tratto focale del Torrente Salice.	€	288.243,00	TORRENTE SALICE		ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE

PAC III_ME007	CARONIA	ME	Ripristino opere idrauliche danneggiate nel Torrente Caronia in località "Case Giordano" a protezione dell'acquedotto intrecomunale Caronia - Santo Stefano di Camastra.	€	166.000,00	TORRENTE CARONIA		REVOCATO
PAC III_ME008	ALCARA LI FUSI	ME	Ripristino delle sezione idraulica del Torrente Rosmarino nel tratto a valle del ponte a tre Archi.	€	200.000,00	TORRENTE ROSMARINO	ESECUTIVA	IN AGGIORNAMENTO
PAC III_ME009	PAGLIARA	ME	Ripristino opere idrauliche danneggiate nel Torrente Pagliara a protezione dell'acquedotto.	€	150.000,00	TORRENTE PAGLIARA	ESECUTIVA	IN AGGIORNAMENTO
PAC III_ME010	BARCELLONA P..G.	ME	Ripristino di un tratto di argine in sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul Torrente Longano.	€	250.000,00	TORRENTE LONGANO	ESECUTIVA	IN AGGIORNAMENTO
PAC III_PA001	MARINEO	PA	Scavi di sbancamento, demolizione dello scalatore dissestato, rimozione del materiale crollato all'interno dell'alveo, ricostruzione dell'opera idraulica interrata e rifacimento del piazzale ed opere varie per il ripristino dei luoghi.	€	254.225,00	TORRENTE SANT'ANTONIO IN CORRISPONDENZA DELLA VIA MARINAI NEL MONDO	ESECUTIVA	LAVORI IN CORSO
PAC III_RG001	GIARRATANA E RAGUSA	RG	Pulizia di tutta la sezione idraulica partendo a monte della S.S. 194 fino a 100 metri a valle del muro di contenimento, il materiale alluvionale spostato dal fondo alveo verrà perlopiù utilizzato per rinforzare le sponde. Le canne, gli arbusti ed eventuale materiale di risulta verranno conferiti in discarica.	€	65.000,00	FIUME IRMINIO		REVOCATO
PAC III_SR001	NOTO	SR	Rifacimento dell'argine in terra con le medesime caratteristiche. Prelievo del materiale in loco con sistemazione della livelletta che presenta innalzamenti per depositi alluvionali.	€	140.000,00	FIUME TELLARO		IN AGGIORNAMENTO
PAC III_TP001	ALCAMO	TP	Manutenzione straordinaria del corso d'acqua mediante interventi di scavo e diserbo manuale e con mezzi meccanici.	€	150.000,00	TORRENTE CANALOTTO - TRATTO VALLIVO		ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE
PAC III_TP002	TRAPANI	TP	Manutenzione straordinaria del corso d'acqua mediante interventi di scavo e diserbo manuale e con mezzi meccanici e realizzazione di opere di difesa idraulica.	€	45.000,00	FIUME SAN FRANCESCO (MISILISCEMI)		ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE

€ 7.893.803,81

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA




## COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2019

### FONDI POA

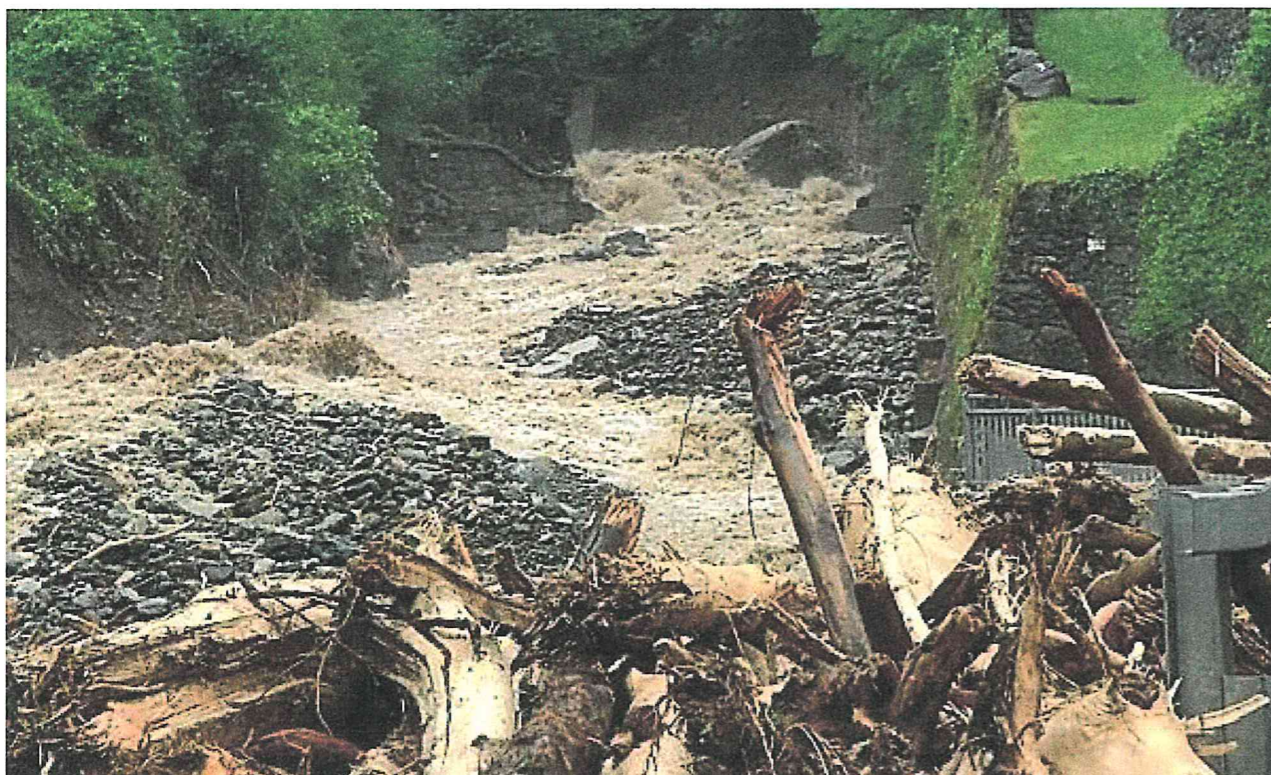


Importo FSC € 20.771.962,98

Numero Interventi : 12

INTERVENTI PIANO STRALCIO\_POA

Comune	Codice Interno	Codice RENDIS	Prov.	CUP	Località	Titolo	Importo	Livello Prog.	Stato dell'Arte Dicembre 2019
CASTROREALE	POA_ME167	19IR167/G1	ME	J87B16000490001	Fraz. Bafia	Completamento del Consolidamento del centro abitato della frazione Bafia	1.300.000,00 €	E	GARA LAVORI IN CORSO
CASTRONOVO DI SICILIA	POA_PA094	19IR094/G1	PA	G66J15002450002	Centro	Consolidamento della zona di costone roccioso sovrastante l'intervento di somma urgenza eseguito nel tratto in corrispondenza della via Piedimonte. Completamento	1.500.000,00 €	E	GARA LAVORI IN CORSO
NICOSIA	POA_PA110	19IR110/G1	EN	G17B09000010006	Monte S.Elena	Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco	3.338.750,00 €	E	GARA LAVORI IN CORSO
SAN FRATELLO	POA_ME222	19IR222/G1	ME	E86E02000000006	Centro	Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, Quartiere Porta Sottana, Lavanche, Buviano e parte sottostante Quartiere San Nicolò	4.100.000,00 €	E	GARA LAVORI IN CORSO
CAMPOFELICE DI ROCCELLA	POA_PA349	19IR349/G1	PA	D77B11000050002	Centro	Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna	1.488.212,98 €	E	IN APPROVAZIONE
ROCCALUMERA	POA_MEC16	19IRC16/G1	ME	I15I10000530005	Torrente Sciglio	Lavori di recupero delle fiamme di Allume e Sciglio- Bonifica dei margini- Completamento Torrente S	3.750.000,00 €	E	GARA LAVORI IN CORSO
SANTA LUCIA DEL MELA	POA_MEA77	19IRA77G1	ME	C61H15000210008	Centro	Lavori di consolidamento ed eliminazione del rischio idrogeologico del perimetro urbano in C/da Curatola a protezione della Via Cesare Battisti	1.520.000,00 €	E	GARA LAVORI IN CORSO
ALCAMO	POA_TPF18	19IRF18/G1	TP	I77H19000720001	SP 10	Lavori di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporeale ricadente nel Comune di Alcamo	900.000,00 €	E	GARA LAVORI IN CORSO
SANTA LUCIA DEL MELA	POA_MEF19	19IRF19/G1	ME	C65B18000600006	Centro	Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico	1.250.000,00 €	E	GARA LAVORI IN CORSO
MESSINA	POA_ME273	19IR273/G1	ME	F44H16000300009	Bordonaro	Opere di consolidamento e protezione del versante meridionale dell'abitato di Bordonaro - R4	850.000,00 €	P	IN APPROVAZIONE
LIBRIZZI	POA_ME429	19IR429/G1	ME	F43B17000040001	Centro	Opere di contenimento centro abitato	150.000,00 €	P	SIA AGGIUDICATI
NASO	POA_ME484	19IR484/G1	ME	PROV0000003135	C.da Maina	Lavori di consolidamento in Contrada Maina	625.000,00 €	E	GARA LAVORI IN CORSO
							<b>20.771.962,98 €</b>		

<i>Piano Stralcio_POA</i>		
<i>N.</i>	<i>STATO DELL'ARTE</i>	<i>IMPORTO</i>
2	IN APPROVAZIONE	2.338.212,98 €
9	GARA LAVORI IN CORSO	18.283.750,00 €
1	SIA AGGIUDICATI	150.000,00 €
		<b>20.771.962,98 €</b>

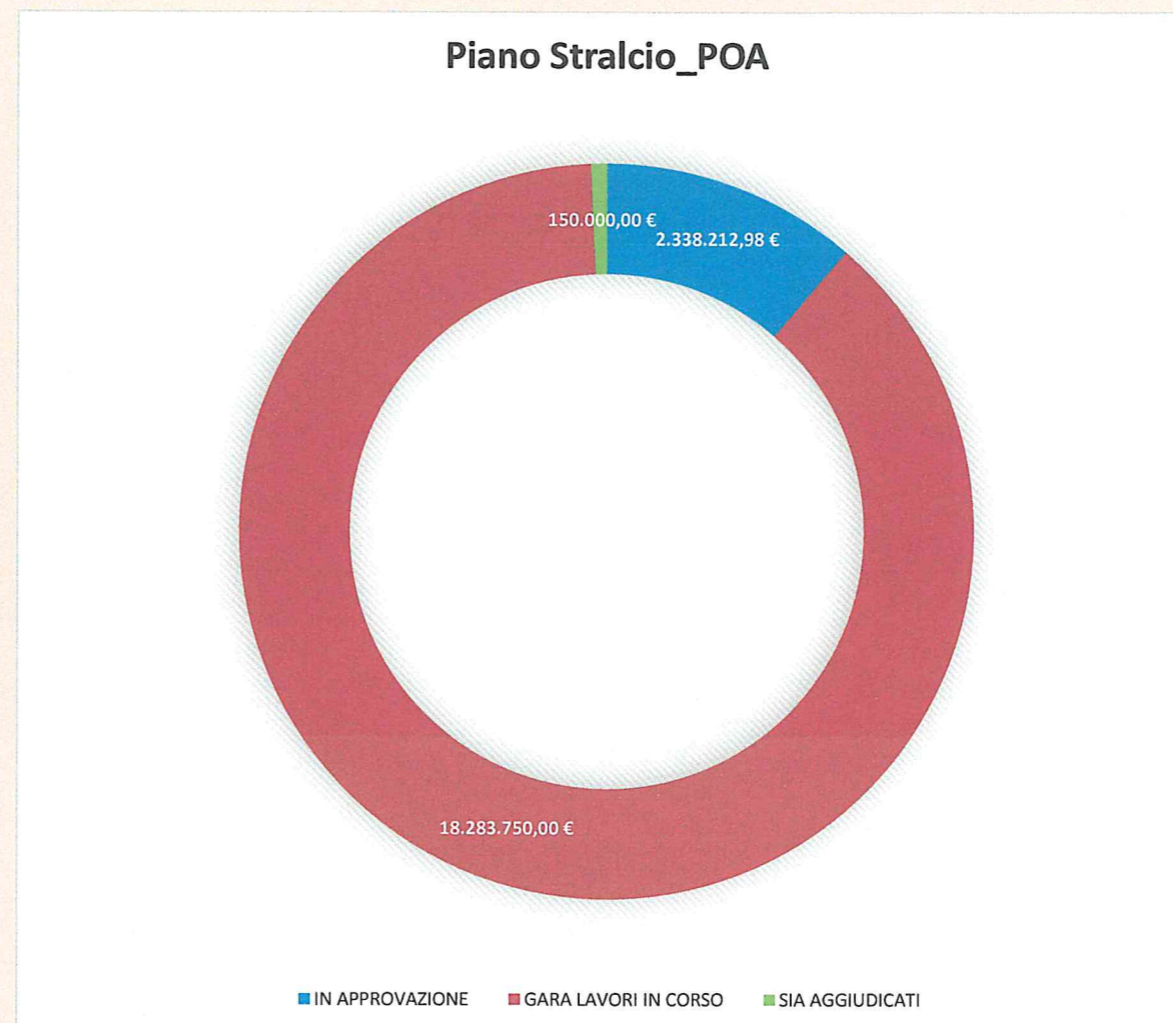



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



## COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2019

### IV ATTO INTEGRATIVO



Importo FSC € 44.378.782,82

Numero Interventi : 20

**IV ATTO INTEGRATIVO**

<b>Codice Intervento</b>	<b>Comune</b>	<b>Codice RENDIS</b>	<b>Prov.</b>	<b>Località</b>	<b>Titolo</b>	<b>Importo Globale</b>	<b>Livello Progettazione</b>	<b>Importo Finanziato</b>	<b>Stato dell'Arte DICEMBRE 2019</b>
EN_402	AGIRA	19IR063/G1	EN	Periferia meridionale del centro abitato	Consolidamento e messa in sicurezza della periferia meridionale del centro abitato	1.315.000,00 €	ESECUTIVO		IN AGGIORNAMENTO
EN_403	AGIRA	19IR064/G1	EN	Versante ovest del Quartiere S. Maria	Consolidamento e messa in sicurezza versante ovest del Quartiere S. Maria	1.061.685,04 €	ESECUTIVO	1.061.685,04 €	GARA LAVORI IN CORSO
PA_415	BAUCINA	19IRB26/G1	PA	Cimitero comunale	Consolidamento del Cimitero comunale - 1° stralcio - Messa in sicurezza per l'incolumità pubblica	398.137,47 €	ESECUTIVO	398.137,47 €	GARA LAVORI IN CORSO
ME_419	CAPRI LEONE	19IRC60/G1	ME	Centro Abitato - Torrente Paliace	Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato "Torrente Paliace"	1.175.000,00 €	ESECUTIVO	1.175.000,00 €	GARA LAVORI IN CORSO
ME_408	CASTELMOLA	19IR420/G1	ME	Cuculunazzo-Sottoporta	Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo - Sottoporta	2.000.000,00 €	ESECUTIVO	2.000.000,00 €	GARA LAVORI IN CORSO
SR_414	FERLA	19IR897/G1	SR	Contrada Macello	Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C.da Macello II° Lotto	1.200.000,00 €	ESECUTIVO	1.200.000,00 €	GARA LAVORI IN CORSO
ME_413	FIUMEDINISI	19IR620/G1	ME	Contrada Fontana	Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana	1.900.000,00 €	DEFINITIVO		IN AGGIORNAMENTO
ME_417	FRAZZANO'	19IRB50/G1	ME	Centro abitato a monte di Via della Libertà	Consolidamento della zona R4 a monte della via Libertà nel centro urbano di Frazzanò II° stralcio	2.700.000,00 €	ESECUTIVO	2.700.000,00 €	GARA LAVORI IN CORSO
ME_418	FRAZZANO'	19IRB51/G1	ME	Centro abitato a monte di Via della Libertà	Consolidamento della zona R4 a monte della via Libertà nel centro urbano di Frazzanò I° stralcio	2.320.000,00 €	ESECUTIVO	2.320.000,00 €	GARA LAVORI IN CORSO
ME_411	ITALA	19IR546/G1	ME	Casaleddu	Lavori di consolidamento e regimentazione idraulica dell'area in frana in località Casaleddu	1.500.000,00 €	ESECUTIVO		IN APPROVAZIONE
CL_412	MARIANOPOLI	19IR592/G1	CL	Zona Case Agricole	Lavori di consolidamento nella zona delle Case Agricole	945.000,00 €	ESECUTIVO	945.000,00 €	GARA LAVORI IN CORSO
ME_409	MESSINA	19IR517/G1	ME	Litorale Tirrenico - tra Torrente Tono e Torrente Gallo	Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti - Litorale Tirrenico	3.000.000,00 €	ESECUTIVO		IN APPROVAZIONE
ME_410	MILITELLO ROSMARINO	19IR529/G1	ME	Contrada Ramisi	Consolidamento all'interno del centro abitato in c.da Ramisi	2.000.000,00 €	ESECUTIVO	2.000.000,00 €	GARA LAVORI IN CORSO
ME_405	MONTALBANO ELICONA	19IR173/G1	ME	Frazione Santa Maria	Consolidamento centro abitato della Frazione Santa Maria	2.415.000,00 €	ESECUTIVO		IN APPROVAZIONE
CT_401	PALAGONIA	19IR055/G1	CT	Centro abitato	Completamento dell'intervento di consolidamento e miglioramento sismico della sede dell'U.T.C.	2.400.000,00 €	DEFINITIVO		IN AGGIORNAMENTO
PA_404	PETRALIA SOPRANA	19IR148/G1	PA	Versante sud-ovest del centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato di Petralia Soprana, versante sud-ovest	1.491.274,01 €	PDFTE	192.274,09 €	ISTRUTTORIA GARA SIA
ME_406	RACCUJA	19IR207/G1	ME	Fossochiodo	Consolidamento dell'abitato S.Nicolò-Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Racuja	1.800.000,00 €	DEFINITIVO		IN AGGIORNAMENTO
AG_420	RAFFADALI	19IRC73/G1	AG	Rione Barca	Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del Rione Barca	8.982.686,30 €	ESECUTIVO		IN APPROVAZIONE

ME_407	SAN TEODORO	19IR403/G1	ME	Zona a valle della Via degli Angeli	Consolidamento della zona a valle della Via degli Angeli del centro abitato	2.275.000,00 €	ESECUTIVO	2.275.000,00 €	GARA LAVORI IN CORSO
AG_416	SANT'ANGELO MUXARO	19IRB36/G1	AG	Versante nord-est del centro abitato	Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento - Versante nord-est	3.500.000,00 €	ESECUTIVO	3.500.000,00 €	GARA LAVORI IN CORSO
<b>Totale</b>						<b>44.378.782,82 €</b>		<b>19.767.096,60 €</b>	

Stato Attuazione IV ATTO INTEGRATIVO			
	STATO DELL'ARTE	N. Interventi	Percentuale
4	In Aggiornamento	8.713.999,92 €	19,64%
4	In Approvazione	15.897.686,30 €	35,82%
12	Gara in Corso	19.767.096,60 €	44,54%
Totale Interventi FP		44.378.782,82 €	100,00%

