

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Relazione Semestrale al 30 giugno 2021

Il Soggetto Attuatore

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n°164/2014*

Maurizio Croce

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Croce', written over the printed name.

1. ISTITUZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO

1.1 – Il Commissario Straordinario Delegato

Le attività dei Commissari regionali straordinari delegati hanno avuto inizio con l'articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale possano essere utilizzate anche tramite accordi di programma sottoscritti dalle Regioni interessate e dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, consentendo alle Regioni di operare con la massima flessibilità operativa e di far confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad una programmazione organica ed unitaria rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico.

Alla luce della disposizione di legge sopra richiamata, in data 30/03/2010 il Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programma finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, elencati nell'Allegato 1 allo stesso Accordo di Programma e volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori sono stati autorizzati ad avvalersi di uno o più Commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, da nominarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1.2 - Il Presidente della Regione nelle funzioni di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24/06/2014 n° 91, pubblicato in pari data sulla GURI, sono subentrati nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati, relativamente ai territori di competenza, i Presidenti delle Regioni i quali, ai sensi dei commi 2ter e 4 dell'art. 10 del DL 91/2014 convertito con legge 11/08/2014 n. 116, sono individuati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

1.3 - Il soggetto Attuatore ex art. 10 L. 116/2014

i Presidenti delle Regioni i quali, ai sensi dei commi 2 ter e 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 91/2014 convertito con legge 11/08//2014 n. 116, possono *"delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le*

attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116 - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana il dott. Maurizio Croce, già Commissario Straordinario Delegato, al quale sono stati altresì delegati i poteri di firma del Commissario di Governo.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 518 del 18/03/2015 è stato successivamente nominato Soggetto Attuatore il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ing. Calogero Foti, riconfermato nell'incarico con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 529 del 03/07/2015.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 570 del 15/09/2017 è stato nominato Soggetto Attuatore il Dott. Maurizio Croce che riveste tale incarico anche alla data odierna.

1.4 - La Normativa vigente

Le attività del Commissario Delegato sono comprese in diverse normative che conferiscono allo stesso competenze e poteri di deroga utili all'attuazione degli interventi, e più precisamente:

- IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO: decreto-legge 24/06/2014 n° 91, pubblicato in pari data sulla GURI, sono subentrati nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati, relativamente ai territori di competenza, i Presidenti delle Regioni i quali, ai sensi dei commi 2ter e 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 91/2014 convertito con legge 11/08/2014 n. 116 al fine di completare le attività di cui agli Accordi di Programma;
- PROGRAMMAZIONI DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO: LEGGE 11 novembre 2014, n. 164 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (G.U. n. 262 dell'11 novembre 2014), che prevede, all'art. 7, comma 2 come a partire dalle programmazioni 2015 in materia di contrasto al dissesto idrogeologico siano assicurate dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

1.5 - La Struttura Commissariale

Secondo quanto disposto dall'art. 1 dell'OPCM 3886 del 09 luglio 2010, come modificato ed integrato dall'art. 21 dell'OPCM 3916 del 30 dicembre del 2012 che ha ulteriormente dettagliato i compiti e i poteri del Commissario Straordinario Delegato-Soggetto Attuatore, ai fini del sollecito espletamento delle attività tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario Straordinario Delegato può avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Il Commissario pro-tempore ne ha pertanto istituito con Disposizioni Commissariali nn. 3, 5 e 6 del 2010 un gruppo di lavoro.

Con DPCM del 20/07/2011 sono state impartite ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati di dare attuazione agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, prevedendo tra l'altro la possibilità di dotarsi di una struttura di supporto per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi.

A tal fine il gruppo di lavoro è stato incrementato avvalendosi di altro personale proveniente da Dipartimenti Regionali, dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, dal Ministero Pubblica Istruzione, dalla Regione che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 21 della OPCM 3916/10, è stato posto in posizione di comando sia a tempo pieno che parziale, nel numero massimo di 10 unità, oltre che il personale utilizzato ai sensi del C. 4 dell'Art. 1 della OPCM 3886/10.

Con l'art.7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 2011, il numero dei componenti è stato elevato a 20 unità.

Con provvedimento prot. 3845 del 07/08/2015 è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 529 del 03/07/2015.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13/12/2016 sono state assegnate all'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo dei fondi previsti per la realizzazione degli interventi prioritari e strategici per il territorio come individuati – per aree di intervento- nel Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana ex D. CIPE n. 26/2016.

In considerazione delle risorse assegnate e delle specifiche competenze attribuite all'ufficio del Commissario di Governo, con relazione prot. 5465 del 21/12/2016 il Soggetto attuatore pro tempore, ing. Calogero Foti, ha sottoposto all'attenzione del Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo la necessità di incrementare il gruppo di lavoro dell'ufficio, risultante ormai sottodimensionato, sia in termini numerici che in termini di professionalità, proponendo uno schema di dotazione organica costituita da non oltre 50 unità di personale al fine di completare tutte le attività previste nell'Accordo di programma siglato il 30 marzo 2010 e nei successivi atti integrativi e al fine di avviare ogni utile iniziativa per la completa attuazione degli interventi a valere della delibera CIPE 26/2016.

Con decreto commissariale n. 573 del 22 dicembre 2016 – in attuazione della citata delibera di giunta regionale n.411/2016 – è stata approvata una nuova dotazione organica, funzionale alle nuove competenze attribuite all'ufficio, costituita da non oltre 50 unità di personale, tra funzionari direttivi, istruttori ed eventuali collaboratori esterni, da selezionare mediante atto di interpello per il personale organico della pubblica amministrazione e tramite avviso

pubblico di manifestazione di interesse per i collaboratori esterni.

Con deliberazione n.169 del 21 aprile 2017 la Giunta regionale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, ha modificato la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SIGECO, in luogo Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, e individuando quest'ultimo quale organismo intermedio nell'ambito Patto per il Sud , area tematica "Ambiente", obiettivo strategico " Dissesto idrogeologico".

Con decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi così come implementati dalle ulteriori competenze affidate al Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, nonché per ridurre i tempi per il raggiungimento degli obiettivi, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016 prevedendo una struttura commissariale costituita da non oltre 51 unità di personale.

Con Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12/09/2017 è stato approvato il primo piano di rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 298/2018 è stato approvato il Secondo Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana implementando di l'ufficio del commissario con le figure necessario all'espletamento delle attività di relativa competenza;

Con Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019 "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.", si è individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico.

2. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

2.1 - Premessa – Piani e programmi affidati alla struttura commissariale

Con l'entrata in vigore del decreto legge 12/09/2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014 n. 164, così detto "Sblocca Italia", all'art. 7 comma 2, al Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo è stata affidata l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge 20/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116.

Al 30/06/2021 risulta affidata al Commissario di Governo l'attuazione degli interventi previsti dai provvedimenti o programmi di seguito specificati:


- A.** Accordo di Programma del 30/03/2010 - Il Atto Integrativo;
- B.** Patto per il SUD (Fondi POC);
- C.** Patto per il SUD (Fondi FSC);
- D.** Patto per lo sviluppo della città metropolitane di Palermo, Messina e Catania;
- E.** Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- F.** Piano Stralcio (2019);
- G.** Piano Operativo Ambiente (POA - Accordo di Programma del 30/03/2010 – IV atto Integrativo);
- H.** Addendum al POA;
- I.** Piano Stralcio (2020) - Accordo di Programma del 30/03/2010 – V atto Integrativo.

In sintesi:

n°	Tipologia Dissesto	Importo progetti
11	APQ* II_Atto Integrativo	€ 10.000.000,00
6	PATTO PER IL SUD (FONDI POC)	€ 40.030.000,00
282	PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)	€ 512.046.317,20
13	PATTO CITTA' METROPOLITANE	€ 77.664.545,48
66	FONDO PROGETTAZIONE	€ 15.925.200,00
12	PIANO STRALCIO (2019)	€ 20.771.962,98
20	PIANO OPERATIVO AMBIENTE – IV ATTO	€ 44.378.782,82
3	ADDENDUM AL POA	€ 56.867.587,52
7	PIANO STRALCIO 2020 - V ATTO	€ 18.531.476,00

420


€ 796.215.872,00

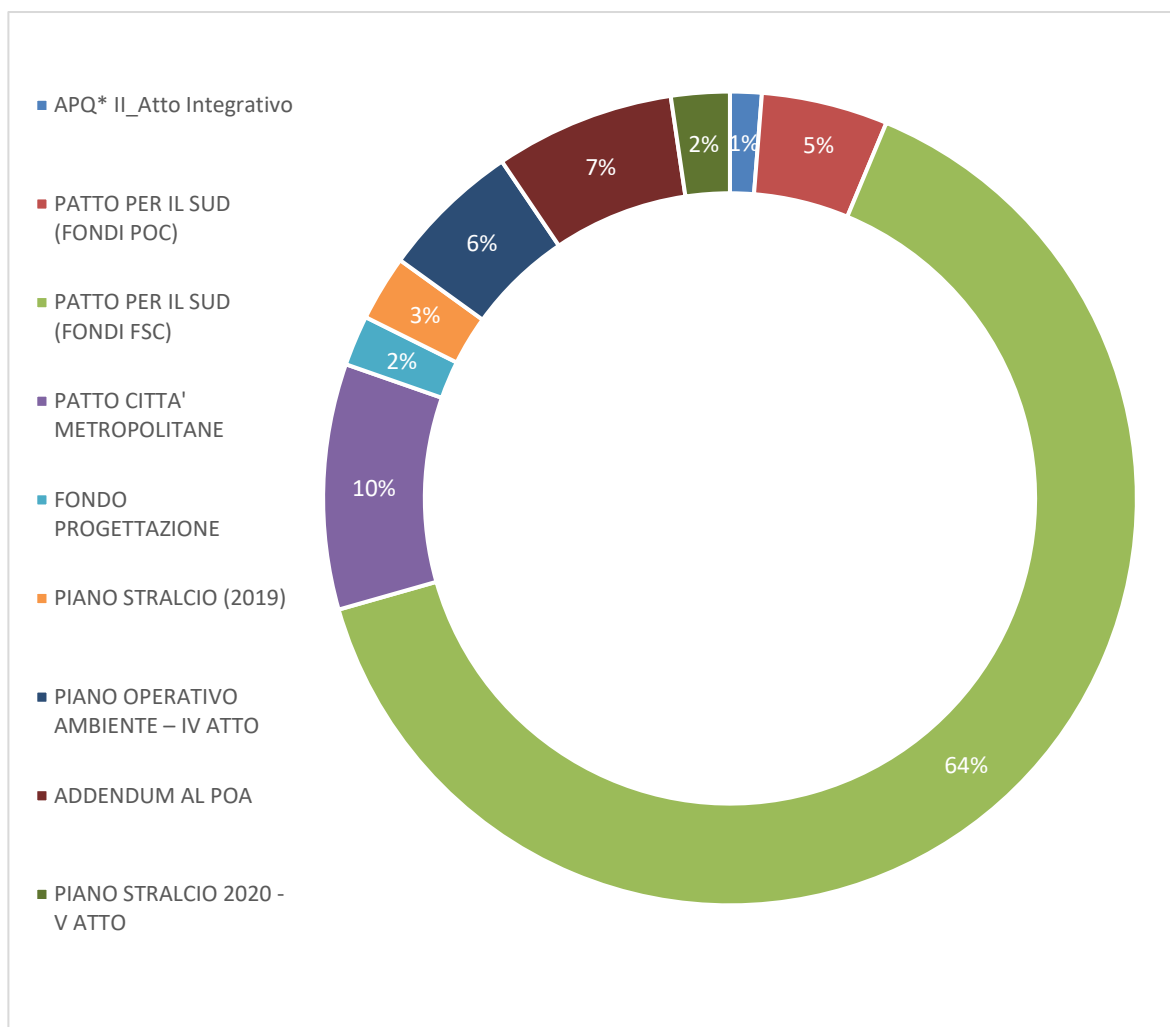

Viene qui di seguito riportata una tabella riassuntiva relativa alle risorse finanziate, impegnate ed erogate, distinte per tipologia di fondi:


<i>Programmazione Interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico Regione Siciliana</i>						
	Risorse Programmate		Risorse Finanziate		OGV	Somme Erogate
	n.	Importo	n.	Importo	Importo	Importo
APQ* II_Atto Integrativo	11	10.000.000,00 €	11	7.235.883,80 €	7.235.883,80 €	4.790.330,05 €
PATTO PER IL SUD (FONDI POC)	6	40.030.000,00 €	4	14.246.192,27 €	873.969,41 €	78.668,00 €
PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)	282	512.046.317,20 €	248	376.307.177,87 €	362.903.981,56 €	97.020.189,01 €
PATTO CITTA' METROPOLITANE	13	77.664.545,48 €	11	4.503.610,71 €	4.498.150,71 €	732.076,75 €
FONDO PROGETTAZIONE	66	15.925.200,00 €	48	13.986.103,32 €	12.749.842,54 €	1.345.983,08 €
PIANO STRALCIO (2019)	12	20.771.962,98 €	11	18.492.630,31 €	18.492.630,31 €	4.249.929,03 €
PIANO OPERATIVO AMBIENTE – IV ATTO	20	44.378.782,82 €	19	37.832.215,75 €	25.606.063,65 €	6.088.813,66 €
ADDENDUM AL POA	3	56.867.587,52 €	1	123.196,82 €	123.196,82 €	0,00 €
PIANO STRALCIO 2020 - V ATTO	7	18.531.476,00 €	1	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Complessivo</u>	420	796.215.872,00 €	354	474.377.010,85 €	432.483.718,80 €	114.305.989,58 €

Il grafico successivo riporta la distribuzione territoriale, per singole province, delle suddette somme:

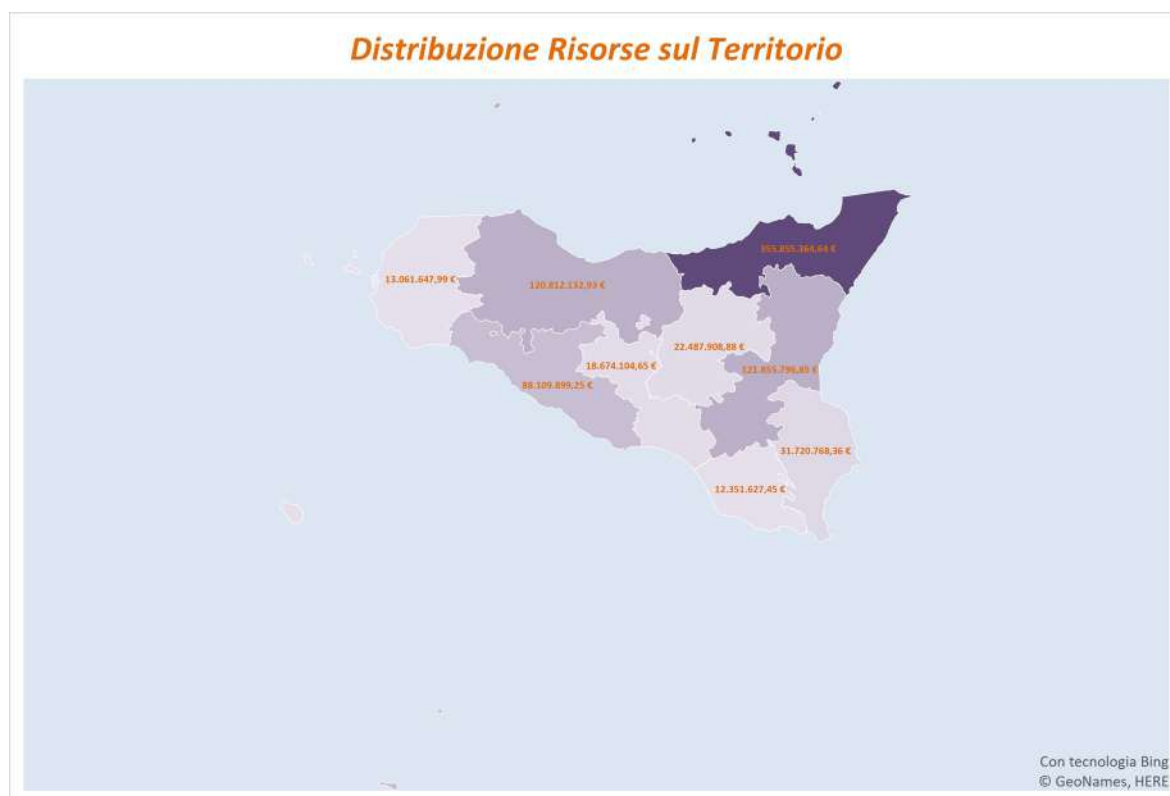

Programmazione Interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico Regione Siciliana						
	Risorse Programmate		Risorse Finanziate		OGV	Somme Erogate
AGRIGENTO	34	88.109.899,25 €	29	79.887.692,98 €	70.124.771,08 €	18.773.242,75 €
CALTANISSETTA	22	18.674.104,65 €	17	13.853.371,32 €	11.009.106,40 €	3.667.838,78 €
CATANIA	37	121.855.796,85 €	27	24.524.429,04 €	24.281.794,61 €	3.248.589,03 €
ENNA	16	22.487.908,88 €	14	18.024.438,63 €	18.022.908,88 €	3.800.111,31 €
MESSINA	221	355.855.364,64 €	188	252.171.406,43 €	226.638.755,26 €	72.132.986,93 €
PALERMO	62	120.812.132,93 €	54	47.666.972,25 €	46.193.900,24 €	7.797.910,62 €
RAGUSA	3	12.351.627,45 €	2	12.203.000,00 €	12.203.000,00 €	74.829,44 €
SIRACUSA	11	31.720.768,36 €	10	14.329.641,62 €	14.329.641,62 €	2.594.348,76 €
TRAPANI	14	13.061.647,99 €	13	11.716.058,58 €	9.679.840,71 €	2.201.952,70 €
PRA	*	11.286.621,00 €				
Complessivo	420	796.215.872,00 €	354	474.377.010,85 €	432.483.718,80 €	114.305.989,58 €


* le somme erogate tengono conto del relativo ribasso d'asta.

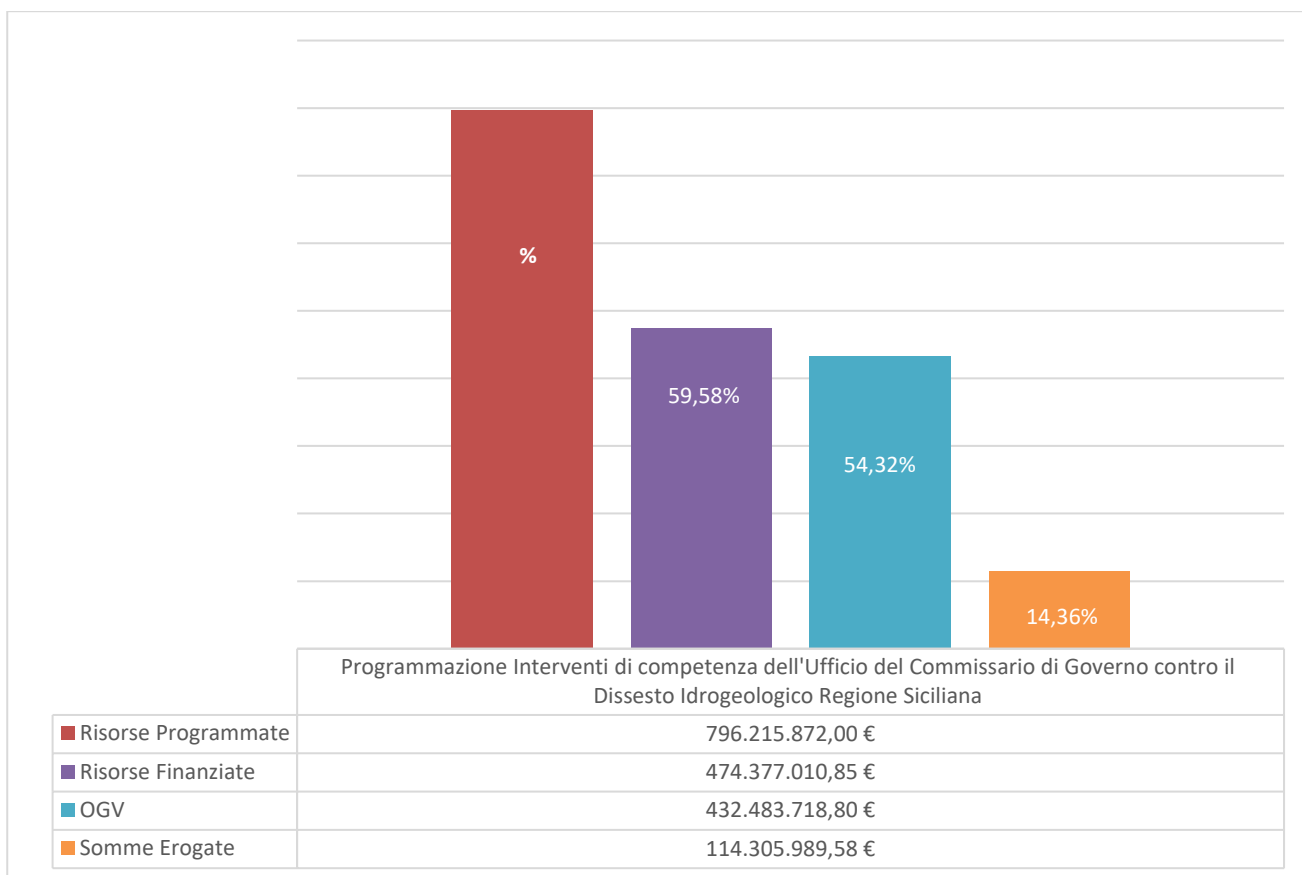

Si rimanda ai capitoli successivi l'analisi dettagliata dello stato d'avanzamento degli interventi di competenza del Commissario distinta per singole fonti di finanziamento così come elencate

precedentemente. Per una visione d'insieme si riporta qui di seguito la tabella ed il relativo grafico relativi a tutti i cantieri ad oggi aperti nell'intero territorio regionale distinti per ambito provinciale:

<i>Distribuzione Cantieri sul Territorio</i>		
AGRIGENTO	17	68.549.740,43 €
CALTANISSETTA	9	10.485.573,53 €
CATANIA	9	15.863.728,15 €
ENNA	9	17.176.235,04 €
MESSINA	79	191.785.597,58 €
PALERMO	16	28.820.539,22 €
RAGUSA	1	12.150.000,00 €
SIRACUSA	3	12.801.968,49 €
TRAPANI	6	9.484.988,39 €
<i>Complessivo</i>	<i>149</i>	<i>367.118.370,83 €</i>

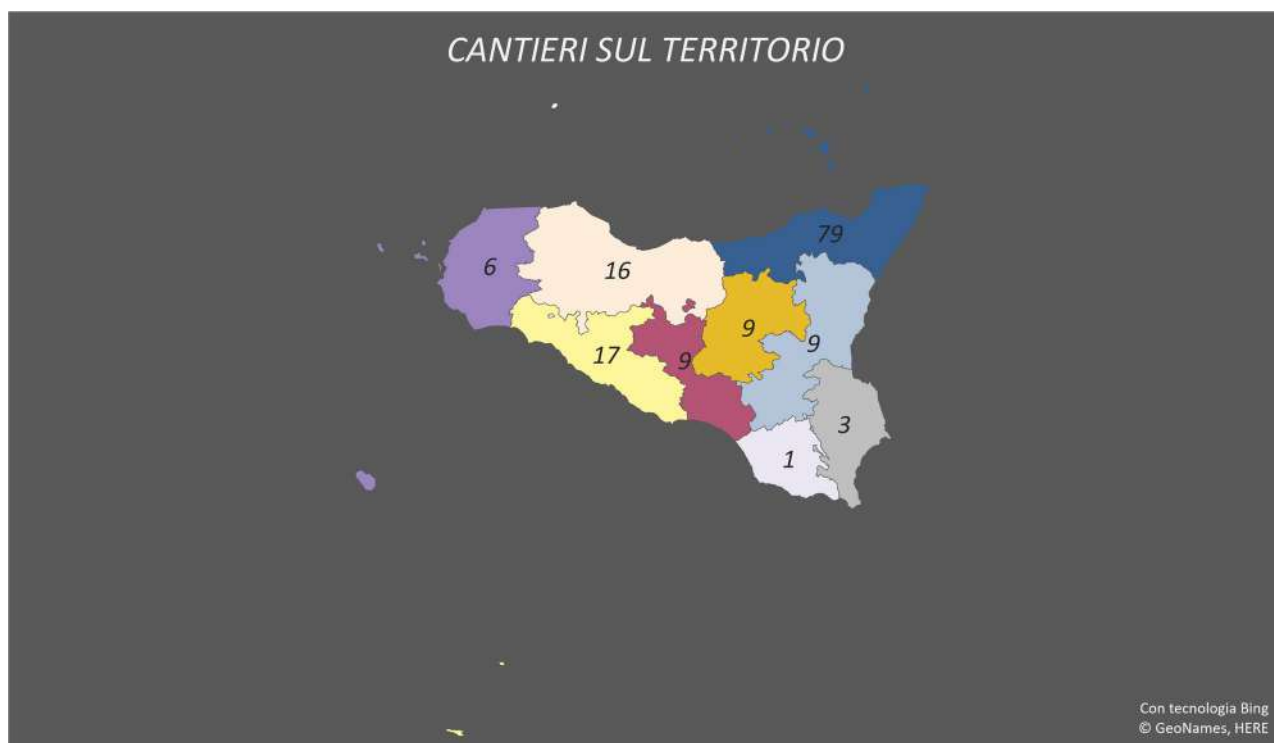

2.2 – Accordo di Programma 2010 – Il Atto Integrativo

Relativamente all'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, la relazione si occuperà esclusivamente del monitoraggio fisico e finanziario degli interventi del II Atto Integrativo, **in quanto quelli relativi all'Accordo originario nonché quelli del I e III Atto integrativo risultano conclusi ed, in pochi casi, in fase di conclusione.**

In particolare al Commissario è attribuita la competenza dell'attuazione di n. 11 interventi per un importo complessivo di **€ 10.000.000,00**, il cui stato di attuazione viene riportato nel paragrafo successivo.

2.2.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 30/06/2021

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli interventi previsti, suddivisi in base al relativo stato di attuazione:

<i>AdP_II ATTO INTEGRATIVO</i>		
2	SIA IN CORSO	3.100.000,00 €
3	LAVORI IN CORSO	2.200.000,00 €
6	LAVORI CONCLUSI	4.700.000,00 €
11	Complessivo	10.000.000,00 €



2.3 - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana (FONDI POC ed FSC)

In data 10/09/2016 è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” con il quale le Parti si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione Siciliana, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio.

A tale fine, le Parti, tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Regione Siciliana ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell’Allegato A al Patto (Masterplan), per la cui attuazione è stata ritenuta necessaria un’azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nonché la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, e ricorrendo altresì ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc.;

L’importo complessivo degli interventi, e le risorse finanziarie previste per la loro attuazione sono indicati in dettaglio negli Allegati A (Masterplan) e B (Elenco degli interventi) al Patto e sono sinteticamente descritte, per macro-categorie, nella seguente tabella, suddivise in 5 aree di intervento:

Area di intervento	Costo totale interventi	Risorse già assegnate	Risorse FSC 2014-2020	Altre risorse disponibili
Infrastrutture	1.873.194.701,18	1.188.000.552,63	607.900.000,00	77.000.000,00
Ambiente	2.521.303.916,36	972.332.984,03	1.174.000.000,00	375.149.000,00
Sviluppo economico ed attività produttive	965.495.822,37	265.000.000,00	208.500.000,00	492.258.077,37
Turismo e cultura	267.275.503,60	0,00	216.500.000,00	50.489.821,66
Sicurezza, legalità e vivibilità del territorio	118.654.548,16	5.694.055,98	113.100.000,00	0,00
Totale costi e risorse	5.745.924.491,67	2.431.027.592,64	2.320.000.000,00	994.896.899,03

In particolare, l’Area d’intervento “Ambiente” risulta suddivisa in 3 Ambiti d’Intervento denominati: “Acque e Rifiuti”, “Dissesto Idrogeologico” e “Territorio”.

Con Deliberazione n° 411 del 13 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha attribuito al Presidente della Regione Siciliana in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 7, comma 2, ultima parte, del decreto legge 12/09/2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 la competenza alla gestione, al monitoraggio ed al controllo degli interventi strategici da realizzare per un fabbisogno finanziario complessivo di euro 596.599.400,00, corrispondenti agli interventi di cui al Settore Prioritario “**4.Ambiente**”, Ambito di intervento “**Dissesto idrogeologico**”, finalizzati alla mitigazione dell’erosione costiera, la messa in sicurezza di infrastrutture, la mitigazione del rischio alluvioni e del rischio frane, finanziati a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

In particolare, per quanto concerne il dissesto idrogeologico, il Patto prescrive che:

- gli interventi contro il rischio di dissesto idrogeologico da finanziare con risorse pubbliche devono essere coerenti con le mappe della pericolosità e rischio e con gli obiettivi e le priorità correlate individuati nei Piani di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi della direttiva 2007/60/CE, approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei Comitati Istituzionali Integrati delle Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs. N. 219/2010 e per quanto riguarda la pericolosità da alluvione fluviale e costiera e nelle pianificazioni di assetto idrogeologico (PAI) per quanto attiene alla pericolosità geomorfologica, in applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione individuati nel DPCM 28 maggio 2015;
- i progetti per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, come risultanti dal sistema telematico Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo–ReNDIS e validati dalla Regione, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, siano ammessi a finanziamento utilizzando i criteri di scelta e di attribuzione delle risorse che, ai sensi dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono stati approvati con DPCM 28 maggio 2015 recante "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.


Elenco degli interventi

L'elenco degli interventi previsti nel Patto per il Sud approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 301 del 10/09/2016 e contenuto nell'Allegato B al Patto sottoscritto in pari data, ha subito diverse rimodulazioni dovute ad una verifica continua e costante degli effettivi livelli di cantierabilità degli interventi.

L'ultima rimodulazione risalente al 14 gennaio 2021 (D.D.G. n. 13) ha ridistribuito in modo significativo l'Allegato B degli interventi contro il dissesto idrogeologico che ad oggi risultano complessivamente essere **288** per un importo complessivo di **€ 552.076.317,20** ivi compreso il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) dell'ufficio del Commissario che ammonta ad **€ 11.286.621,00**.

Gli interventi sono stati ripartiti in cinque sotto ambiti distinti sia in termini di numero di interventi che in termini di dotazione finanziaria secondo il grafico seguente, ad eccezione del Piano Rafforzamento Amministrativo (PRA):

TIPOLOGIA DISSESTO

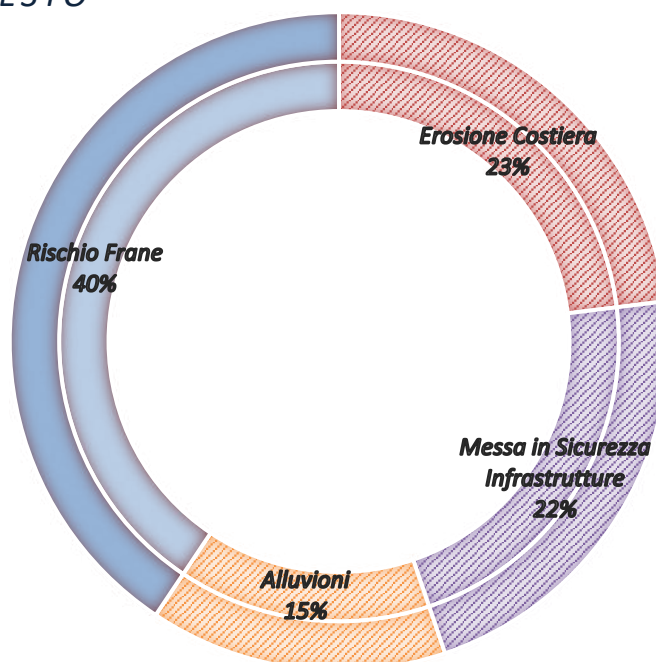

In particolare la suddivisione finanziaria tra i vari ambiti di intervento viene riportata nelle tabelle successive, anche alla luce dell'inserimento della voce Piano di rafforzamento pubblica amministrazione le cui risorse economiche sono state stanziare attraverso la rimodulazione degli interventi.


<i>IMPORTO FSC E POC PER TIPOLOGIA DISSESTO</i>			
<i>N.</i>	<i>Tipo Dissesto</i>	<i>Importo Progetti</i>	<i>%</i>
41	Alluvioni	€ 79.024.039,35	14,31%
32	Costiero	€ 124.645.170,89	22,58%
143	Frane	€ 219.568.962,70	39,77%
72	Messa in Sicurezza Infrastrutture	€ 117.551.523,26	21,29%
1	Piano Rafforzamento Amministrativo	€ 11.286.621,00	2,04%
288		€ 552.076.317,20	

2.3.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 30/06/2021

In particolare, il dettaglio dell'attuazione di singoli interventi è il seguente:

<i>N.</i>	<i>Stato di Attuazione</i>	<i>%</i>
34	Istruttoria	11,81%
26	Aggiornamento Progettuale	9,03%
1	Predisposizione atti di Gara	0,35%
7	Gara SIA in Corso	2,43%
42	SIA In corso	14,58%
5	Gara in corso	1,74%
39	Stipula Contratto in corso	13,54%
85	Lavori in corso	29,51%
31	Lavori Conclusi	10,76%
5	Risoluzione Contratto	1,74%
13	Nuova Programmazione	4,51%
288		100,00%

STATO ATTUAZIONE

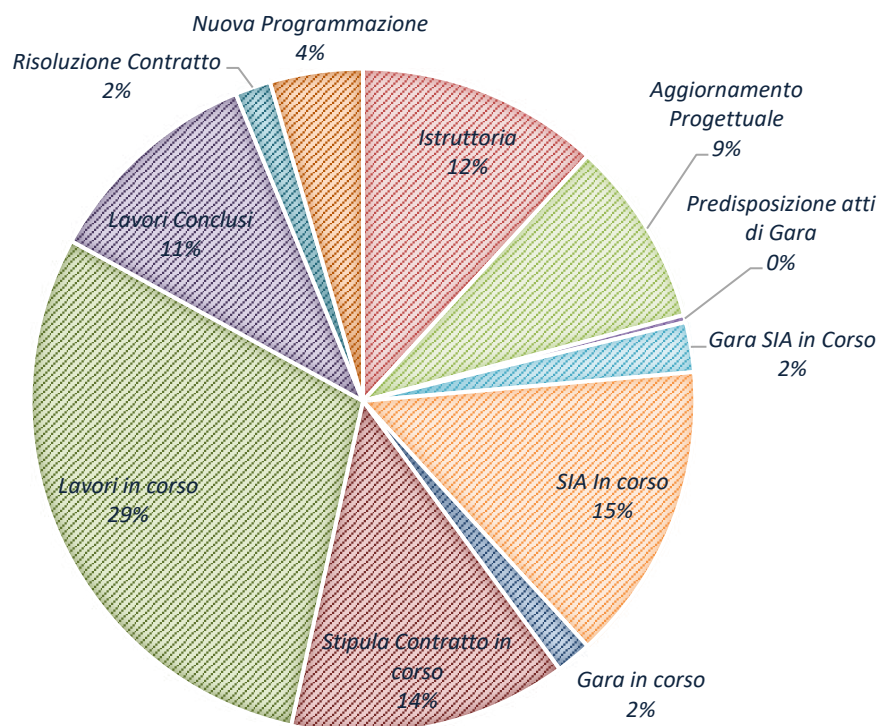

Per il dettaglio dello stato di attuazione degli interventi del Patto per il Sud si rimanda agli allegati alla presente relazione.

2.4 - Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Palermo

Con Delibera n. 26 del 10/08/2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha assegnato al Comune di Palermo la somma di euro 332.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020 e ha approvato le regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 di cui al Patto.

In data 30/04/2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della città Palermo in qualità di Autorità Urbana, hanno sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Palermo", con il quale le Parti:

- si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Città e dell'Area Metropolitana di Palermo, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
- tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Città di Palermo ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell'Allegato A al Patto, suddivisi per macro-categorie e per aree di intervento per la cui attuazione è ritenuta necessaria un'azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- si sono impegnano a dare attuazione ai contenuti del Patto mediante la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, nonché ricorrendo ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc. per un importo complessivo degli interventi pari a € 770.890.807,57 di cui:
 - € 432.059.988,83 di risorse già assegnate con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc.
 - € 332.000.000,00 di risorse FSC 2014-2020 (di cui € 61.000.000,00 Risorse finanziarie FSC al 2017);
 - € 6.830.800,00 di altre risorse (Risorse regionali (da apposito protocollo d'intesa); Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti Nazionali)

Tra gli interventi previsti nel Patto per lo sviluppo della Città di Palermo sono contemplati gli "Interventi volti alla mitigazione del rischio di frana, crollo e smottamento dei rilievi montuosi che circondano la città" come di seguito elencati:

N°	Codice RENDIS	Titolo	Importo
1	19IRB84/G1	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo sovrastante l'area urbana di Mondello. Completamento	1.764.958,00 €
2	19IRB85/G1	Interventi di protezione dell'area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino	913.287,48 €
3	19IRB86/G1	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura	30.545.000,00 €
4	19IRB87/G1	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose sovrastanti l'abitato di Boccadifalco	3.700.000,00 €
5	19IR146/G1	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose di Monte Pellegrino Capo Gallo, Boccadifalco e area della colonia estiva comunale. Il fase - completamento	20.579.000,00 €
			57.502.245,48 €

- Con nota prot. 1951468 del 09/12/2016 il Comune di Palermo, stante le indicazioni riportate nel Patto per lo Sviluppo della città di Palermo e dall'art. 7 comma 2 della L.133/2014, ha richiesto al Commissario di Governo la concreta attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sotto elencati ed inseriti all'interno del predetto Patto per la Città di Palermo:


N°	Codice RENDIS	Titolo	Importo
1	19IRB84/G1	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo sovrastante l'area urbana di Mondello. Completamento	1.764.958,00 €
2	19IRB85/G1	Interventi di protezione dell'area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino	913.287,48 €
3	19IRB86/G1	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura	30.545.000,00 €
4	19IRB87/G1	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose sovrastanti l'abitato di Boccadifalco	3.700.000,00 €
			36.923.245,48 €

-
- Con nota di riscontro prot. n.132 del 11 gennaio 2017 il Commissario Straordinario delegato, stante la documentazione pervenuta dal comune di Palermo, ha rappresentato la propria disponibilità a quanto richiesto in merito all'attuazione degli interventi di difesa del suolo compresi nel " Patto per lo sviluppo della città di Palermo", richiedendo l'accreditamento dei RUP dei vari interventi presso la piattaforma ANAC, e la trasmissione della stima della spesa utile e necessaria alla cantierabilità dei progetti nonché, ove possibile, la disponibilità alla progettazione mediante personale dipendente dell'amministrazione comunale.
 - Con deliberazione n. 91 del 27/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione afferente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, inclusi nella linea di intervento "Riqualificazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per lo sviluppo della Città di Palermo";
 - Con determinazione Dirigenziale n° 64 del 03/05/2017 il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana ha approvato lo schema di convenzione;
 - In data 05/05/2017 tra il Commissario di Governo Dott. Maurizio Croce, il Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando ed il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana Arch. Mario Li Castri è stata stipulata apposita Convenzione per l'attuazione degli interventi inclusi nella linea di intervento "Riqualificazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per lo sviluppo della Città di Palermo" sottoscritto il 30/04/2016.
 - La predetta Convenzione disciplina i rapporti tra la Città di Palermo, Beneficiario dei finanziamenti ed il Commissario di Governo, individuato quale Ente Attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge 116/2014 con i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
 - In veste di Ente Attuatore il Commissario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, emana gli atti e i provvedimenti, cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, ed è responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa degli interventi e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

2.4.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 30/06/2021

In particolare, il dettaglio dell'attuazione di singoli interventi è il seguente:

Città Metropolitana di Palermo		
n.	Stato di Attuazione	Importo
1	ISTRUTTORIA	1.764.958,00 €
6	SIA IN CORSO	34.245.000,00 €
7	Completivo	36.009.958,00 €

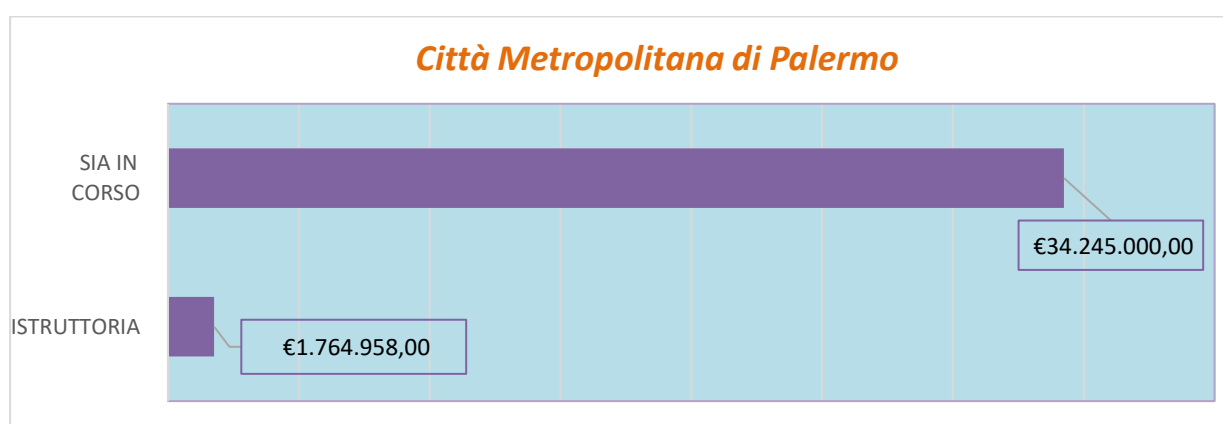

2.5 - Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina

Con Delibera n. 26 del 10/08/2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha assegnato al Comune di Messina la somma di euro 332.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020 e ha approvato le regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 di cui al Patto.

In data 22/10/2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della città metropolitana di Messina in qualità di Autorità Urbana, hanno sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina", con il quale le Parti:

- si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio dell'Area Metropolitana di Messina, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
- tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Città Metropolitana di Messina ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell'Allegato A al Patto, suddivisi per macro-

categorie e per aree di intervento per la cui attuazione è necessaria un'azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

- si sono impegnano a dare attuazione ai contenuti del Patto mediante la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, nonché ricorrendo ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc. per un importo complessivo degli interventi pari a € 777.889.686,80 di cui:
 - € 253.915.737,21 di risorse già assegnate con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc.
 - € 332.000.000,00 di risorse FSC 2014-2020 (di cui € 61.000.000,00 Risorse finanziarie FSC al 2017);
 - € 191.973.949,59 di altre risorse (Risorse regionali (da apposito protocollo d'intesa); Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti Nazionali)

Con nota prot. 15346 del 19.01.2017 il Comune di Messina, stante le indicazioni riportate nel Patto per lo Sviluppo della città di Messina e dall'art. 7 comma 2 della L.133/2014, ha richiesto al Commissario di Governo la concreta attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sotto elencati ed inseriti all'interno del predetto Patto per la Città di Messina:

N°	Titolo	Importo
1	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel centro abitato di Pezzolo – Messina	121.500,00 €
2	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana lenta posta nel villaggio di Altolia – Messina	269.800,00 €
3	Lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del torrente Portella Arena in corrispondenza della cooperativa Futura	650.000,00 €
4	Mitigazione del rischio Alluvione con opere di sistemazione in alveo e dei sistemi arginali dei torrenti Larderìa, Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo a salvaguardia della popolazione e del tessuto economico	7.900.000,00 €
5	Lavori per la mitigazione del rischio idraulico mediante l'eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi con la realizzazione di manufatti preferibilmente prefabbricati a tutela della sicurezza pubblica	3.000.000,00 €
		11.941.300,00 €

Con nota di riscontro prot. n.947 del 31 gennaio 2017 il Commissario Straordinario delegato, stante la documentazione pervenuta dal comune di Messina, ha rappresentato la propria disponibilità a quanto richiesto in merito all'attuazione degli interventi di difesa del suolo compresi nel " Patto per lo sviluppo della città di Messina", richiedendo l'accreditamento dei RUP dei vari interventi presso la piattaforma ANAC, e la trasmissione della stima della pesa utile e necessaria alla cantierabilità dei progetti nonché, dove possibile, la disponibilità alla progettazione mediante personale dipendente dell'amministrazione comunale.

Con deliberazione n. 367 del 06/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione afferente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, inclusi nella linea di intervento "Riqualificazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per lo sviluppo della Città di Messina";

In data 16/06/2017 tra il Soggetto Attuatore ed il Dirigente del Dipartimento di Protezione Civile e Difesa del Suolo del Comune di Messina è stata stipulata apposita Convenzione per l'attuazione degli interventi inclusi nella linea di intervento "Riqualificazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per la Città Metropolitana di Messina" sottoscritto il 22/10/2016.


La predetta Convenzione disciplina i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina, Beneficiario dei finanziamenti ed il Commissario di Governo, individuato quale Ente Attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge 116/2014 con i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

In veste di Ente Attuatore il Commissario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, emana gli atti e i provvedimenti, cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, ed è responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa degli interventi e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

2.5.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 30/06/2021

In particolare, il dettaglio dell'attuazione di singoli interventi è il seguente:

Città Metropolitana di Messina		
n.	Stato di Attuazione	Importo
2	ISTRUTTORIA	3.650.000,00 €
2	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE	391.300,00 €
1	SIA IN CORSO	7.900.000,00 €
5	Comlessivo	11.941.300,00 €

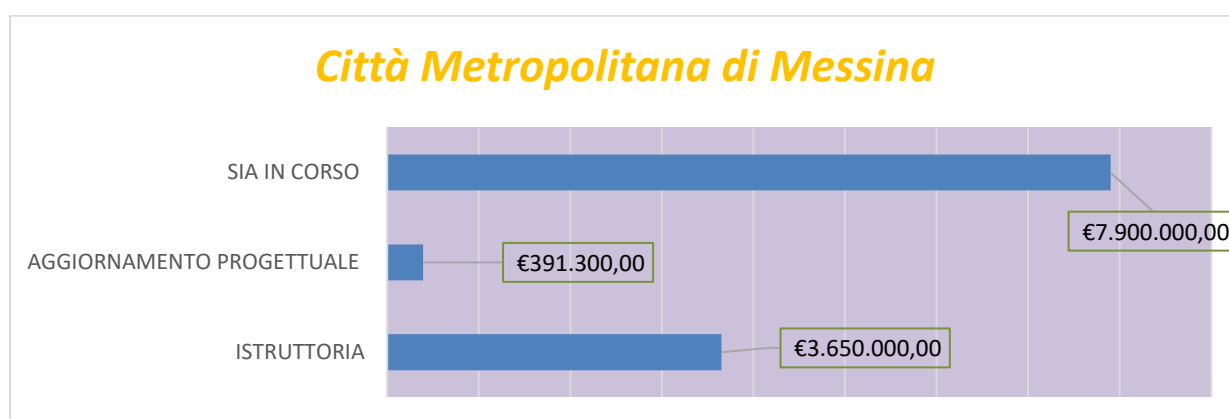

2.6 - Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Catania

Con Delibera n. 26 del 10/08/2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha assegnato al Comune di Catania la somma di euro 332.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020 e ha approvato le regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 di cui al Patto.

In data 30/04/2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della città metropolitana di Catania, in qualità di Autorità Urbana, hanno sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina", con il quale le Parti:

- si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio dell'Area Metropolitana di Catania, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
- tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Città Metropolitana di Catania ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell'Allegato A al Patto, suddivisi per macro-categorie e per aree di intervento per la cui attuazione è necessaria un'azione coordinata, con il

coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

Con la nota prot. 119474 del 21/04/2020 con la quale il Comune di Catania, stante le indicazioni riportate nel "Patto per lo sviluppo della Città di Catania" (di seguito "Patto per Catania") e nell'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 133/2014, ha chiesto alla Struttura commissariale di gestire la concreta attuazione dell'intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, inserito all'interno del predetto Patto per Catania, ed in particolare:

N°	Codice RENDIS	Titolo	Importo
1	-----	Riqualificazione e sistemazione Torrente Forcile e suoi affluenti	28.800.000,00 €
			28.800.000,00 €

Con nota di riscontro prot. prot. 4085 del 07/05/2020 con cui l'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ha offerto disponibilità ad accogliere quanto richiesto dal Sindaco di Catania con la soprarichiamata nota, in merito all'attuazione dell'intervento di difesa del suolo ricompreso nel Patto per Catania denominato "**Riqualificazione e sistemazione Torrente Forcile e suoi affluenti**", e chiesto che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ad accreditarsi presso la piattaforma ANAC associandosi alla stazione appaltante del Commissario di Governo per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana e che produca, per detto intervento, le necessarie quantificazioni di ogni spesa utile e necessaria alla sua realizzazione

In data 12/05/2020 tra il Commissario di Governo ed il Sindaco della Città metropolitana di Catania è stata stipulata apposita Convenzione per l'attuazione dell'intervento denominato "**Riqualificazione e sistemazione Torrente Forcile e suoi affluenti**" previsto nel "Patto per la Città Metropolitana di Catania" sottoscritto il 30/04/2016.


La predetta Convenzione disciplina i rapporti tra la Città Metropolitana di Catania, Beneficiario dei finanziamenti ed il Commissario di Governo, individuato quale Ente Attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge 116/2014 con i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

In veste di Ente Attuatore il Commissario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, emana gli atti e i provvedimenti, cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, ed è responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa degli interventi e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

2.6.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 30/06/2021

In particolare, il dettaglio dell'attuazione di singoli interventi è il seguente:

Città Metropolitana di Catania		
n.	Stato di Attuazione	Importo
1	ISTRUTTORIA	28.800.000,00 €
1	<i>Complessivo</i>	<i>28.800.000,00 €</i>

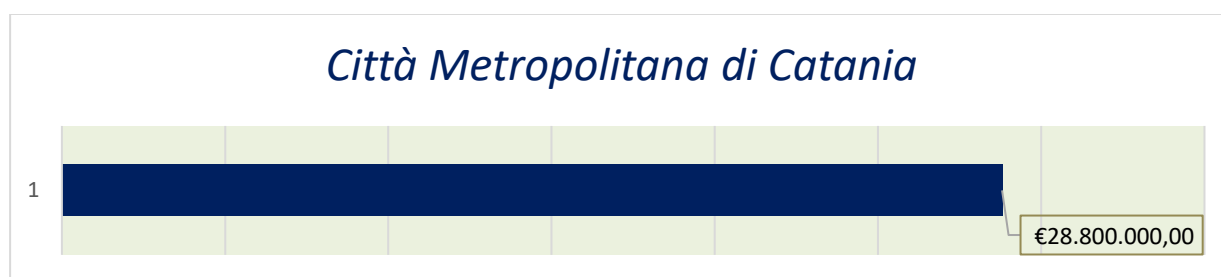

2.7 - Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

Per promuovere ed agevolare la realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, l'art. 55 della legge 28/12/2015 n. 221 ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" nel quale affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con Delibera CIPE n° 32 del 20/02/2015 nonché le risorse le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo.

Il Fondo è ripartito tra le Regioni e ciascuna quota è versata nella contabilità speciale del Presidente di ciascuna regione nella qualità di Commissario di Governo, al quale, fermi restando i poteri speciali e di deroga attribuiti dalla vigente normativa, è affidata la responsabilità diretta della creazione di un parco progetti sui quali far convergere le risorse di volta in volta disponibili per la realizzazione degli interventi.

Con Decreti MATTM STA.DEC.STA. n° 571 del **21/12/2017**, Decreto MATTM STA.DEC.STA. n° 419 del **09/08/2018** ed infine con decreto MATTM STA.DEC.STA. n° 487 del **13/12/2019** sono stati individuati **n. 66** interventi contro il dissesto idrogeologico per un importo di euro **15.925.200,00** a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione.

2.7.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 30/06/2021

La rappresentazione dell'avanzamento delle attività, nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti nel fondo progettazione deve necessariamente tenere conto del fatto che la riprogrammazione dei fondi è avvenuta alla fine del 2019 a due anni di distanza dall'emissione del primo decreto di finanziamento del fondo e ad un anno di distanza dal secondo.

La riprogrammazione si è resa necessaria in virtù del fatto che **n. 13** interventi previsti nei suddetti decreti per un importo pari ad **€ 3.340.937,07** sono stati interamente finanziati nell'ambito di altre programmazioni e sono stati sostituiti da **n. 8** interventi nuovi per un importo complessivo pari ad **€ 3.297.838,55**.


E' opportuno far rilevare che, per **n. 3** interventi ricadenti nei Comuni di Taormina (Rendis 19IRC50/G1), Catania (Rendis 19IR039/G3) e Ragusa (Rendis 19IRB98/G1) è stata già richiesta la revoca del finanziamento e, pertanto, non saranno monitorati all'interno della relazione.

Il decreto MATTM STA.DEC.STA n° 487 del **13/12/2019** finanzia complessivamente n. **66** interventi il cui stato attuale è il seguente:

In particolare lo stato dell'arte complessivo, tenendo conto di quanto detto in premessa, è il seguente:

<i>n°</i>	<i>Stato di Attuazione</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
18	Istruttoria	2.174.089,98 €	13,65%
4	Gara SIA in corso	1.413.899,74 €	8,88%
18	Stipula Contratto in corso	5.769.029,52 €	36,23%
19	SIA in corso	3.720.455,79 €	23,36%
1	SIA conclusi	54.488,70 €	0,34%
3	Risoluzione contratto	2.123.898,76 €	13,34%
3	Richiesta Revoca	669.337,51 €	4,20%
66	<i>Complessivo</i>	<i>15.925.200,00 €</i>	<i>100,00%</i>

Stato Attuazione Fondo Progettazione

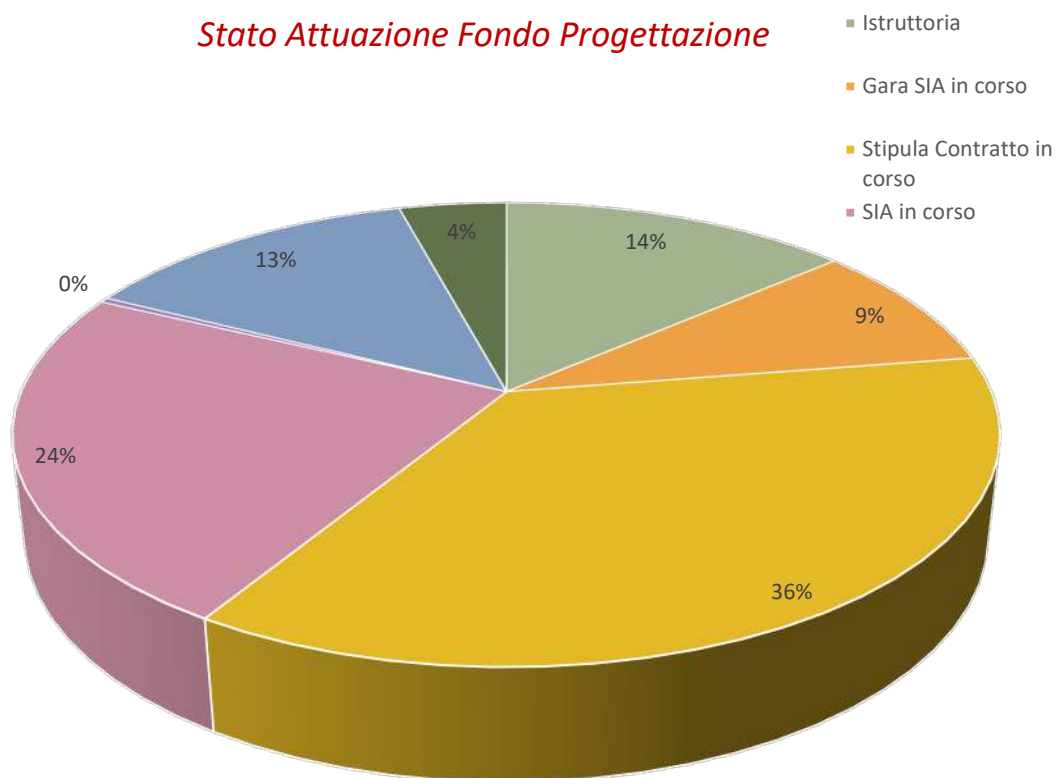

2.8 – Piano Stralcio (2019) – DPCM 20 febbraio 2019

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro.


Con successiva Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di € 315.119.117,19.

Infine il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 ha definito ed individuato, ai sensi della Delibera Cipe n. 35/2019, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di € 315.119.117,19 euro di cui **€ 20.776.438,01** euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana.

2.8.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 30/06/2021

In particolare, il dettaglio dell'attuazione di singoli interventi è il seguente:

Piano Stralcio 2019		
n.	Stato di Attuazione	Importo
1	ISTRUTTORIA	850.000,00 €
1	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE	1.488.212,98 €
10	LAVORI IN CORSO	18.433.750,00 €
12	<i>Complessivo</i>	20.771.962,98 €

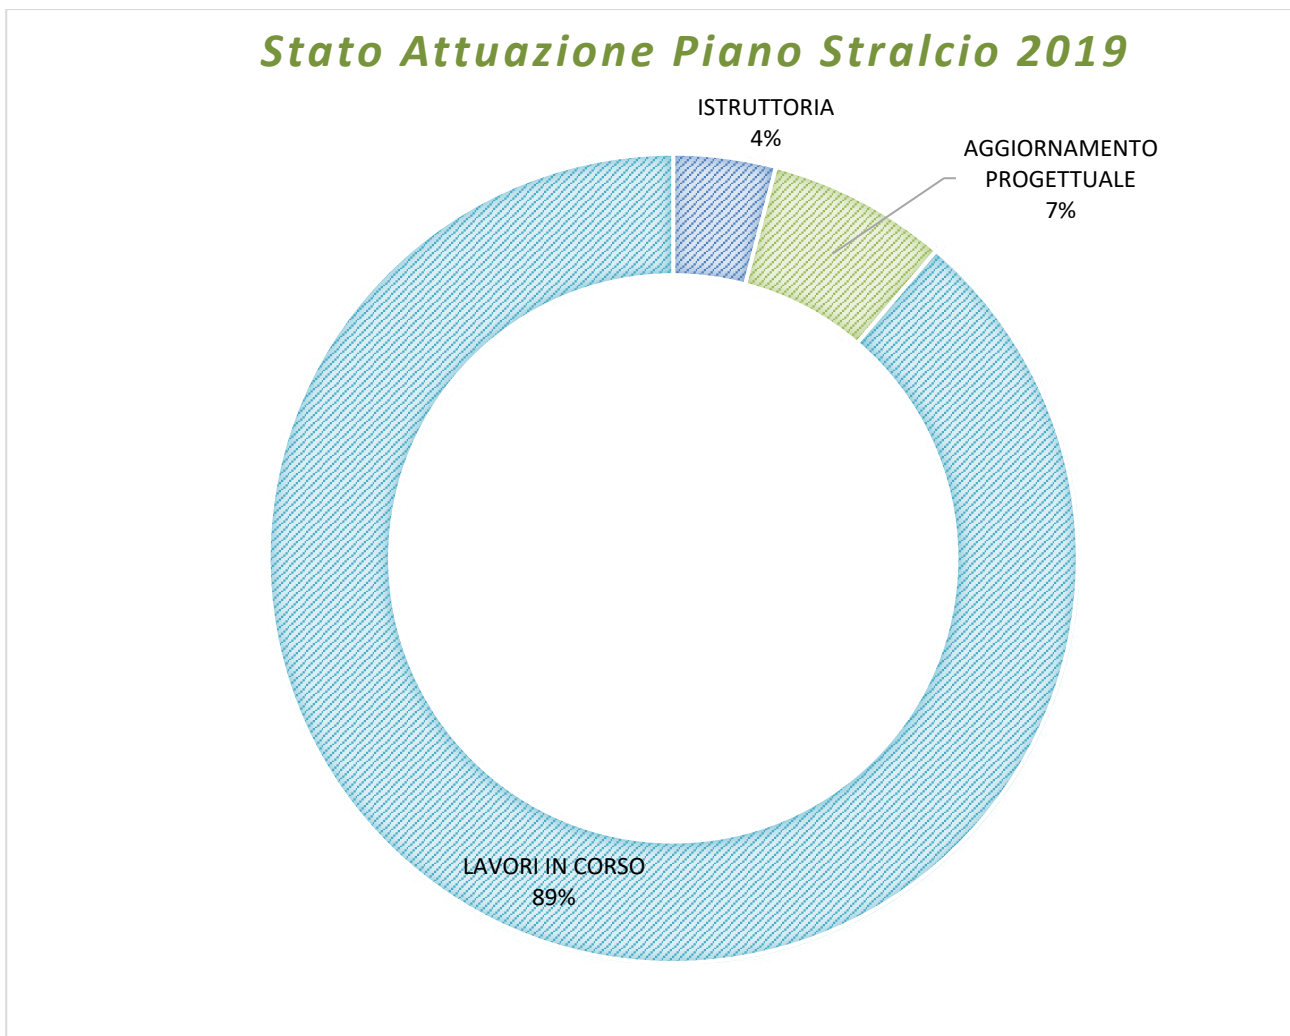

2.9 – Piano Operativo Ambiente (POA) - Accordo di Programma 2010 - IV atto integrativo

Nel gennaio 2019 è stato sottoscritto il IV atto integrativo dell'Accordo in parola per un totale di circa 44 milioni di euro. Lo stesso è stato registrato alla Corte dei Conti nel mese di giugno 2019 e si sono già attivate le interlocuzioni con le Amministrazioni al fine di acquisire le progettualità esistenti. Gli interventi previsti hanno un importo complessivo pari ad **€ 44.378.782,82**.

Nell'ambito delle risorse FSC 2014/2020 (Piano Operativo Ambiente) , in data 14 gennaio 2020, è stato pubblicato sulla GURI n. 14 il DPCM del 2 dicembre 2019 con il quale sono state finanziate ulteriori somme confluite nel **II Addendum** al POA.

In particolare le risorse destinate alla Regione Siciliana con i relativi interventi sono riportati nella tabella seguente:


INTERVENTI Piano Operativo Ambiente (POA_ADDENDUM)				
Rendis	Provincia	Comune	Titolo	Importo
19IR043/G3	CT	SAN GIOVANNI LA PUNTA	Completamento del I Lotto della rete fognante del centro abitato – Stralcio rete acque bianche	1.265.277,03 €
19IR044/G3	CT	TRECASTAGNI	Progetto dei lavori per la rete fognante - I° Stralcio rete acque bianche.	2.300.000,00 €
19IR039/G3	CT	CATANIA	Completamento Collettore pluviale B	53.302.310,49 €
				56.867.587,52 €

Per una facilità di lettura lo stato d'avanzamento ed il monitoraggio di tali interventi vengono riportati congiuntamente agli interventi del IV atto integrativo nel paragrafo successivo.

2.9.1 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 30/06/2021

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli interventi previsti, suddivisi in relazione allo stato di attuazione:

<i>Stato Attuazione Piano Operativo Ambiente (IV ATTO_ADDENDUM)</i>			
<i>n.</i>	<i>Stato Attuazione</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
4	Istruttoria	59.902.310,49 €	50,01%
1	Predisposizione Atti di Gara	1.400.000,00 €	1,17%
1	Gara SIA in corso	1.800.000,00 €	1,50%
1	SIA in corso	1.491.274,01 €	1,25%
2	Gara in corso	11.397.686,30 €	9,52%
1	Stipula Contratto in corso	1.265.277,03 €	1,06%
14	Lavori in corso	25.389.822,51 €	21,20%
6	Nuova Programmazione	17.131.476,00 €	14,30%
30	Complessivo	119.777.846,34 €	100,00%

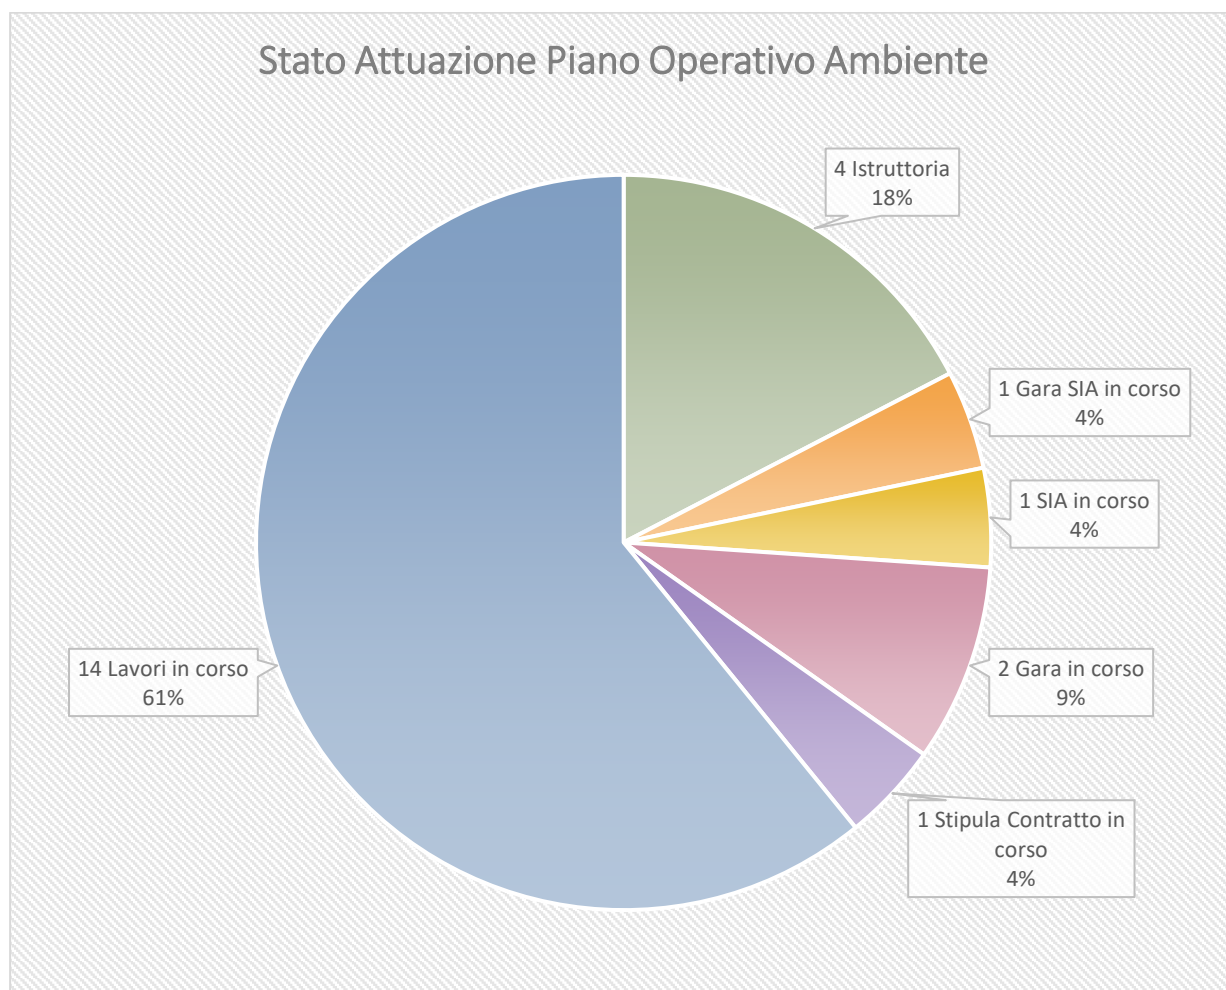

2.10 – Piano Stralcio (2020) – DPCM 20 febbraio 2019

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 è stato adottato il **Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico**, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. All'interno di tale Piano, in data 30/10/2020, il Commissario di Governo ha sottoscritto il V Atto integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010 interamente finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica a valere su propri fondi di bilancio.

L'elenco degli interventi finanziati, riportati nella tabella seguente ammontano ad € **18.531.476,00**, e sono stati individuati, in via prioritaria, tra quelli inseriti nel Fondo di progettazione che avessero un livello di progettazione avanzato.

RENDIS	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA
19IR156/G1	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera	1.400.000,00 €
19IR235/G1	ME	CASTELMOLA	Progetto per il consolidamento dell'abitato di Castelmola nei tratti del "Castello lato sud e sottoporta"	2.000.000,00 €
19IR886/G1	SR	FRANCOFONTE	Lavori di consolidamento per la mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	2.380.000,00 €
19IRB97/G1	ME	NASO	Consolidamento e Messa in Sicurezza Per La Mitigazione del rischio idrogeologico in località San Giuliano	1.026.476,00 €
19IRA36/G1	ME	NOVARA DI SICILIA	Mitigazione Rischio Idrogeologico a protezione del centro abitato in Novara di Sicilia- Via Benedetto Croce e C.da Roccazza Fraz. San Basilio	1.950.000,00 €
19IRB90/G1	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli abitati di Sferracavallo e Barcarello	8.925.000,00 €
19IRC31/G1	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su via Falconara	850.000,00 €
				18.531.476,00 €

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi, stante le esigue informazioni ancora in possesso allo scrivente Ufficio, verrà monitorato a partire dalla prossima relazione semestrale.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2021

Accordo di Programma II Atto Integrativo




Importo € 10.000.000,00

Numero Interventi: 11

MONITORAGGIO INTERVENTI AdP_II ATTO INTEGRATIVO

RENDIS	CODICE	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	SOMME EROGATE A *GIUGNO 2021	
AdP_II ATTO	AG196A/10	AG196	Lavori conclusi	M	AG	ARAGONA	Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del P. PEB Naselli	700.000,00 €	F	L	168 del 04/04/2017	700.000,00 €	SI	SI	COMED SRL	SI	548.645,19 €
AdP_II ATTO	AG195A/10	AG195	Lavori conclusi	M	AG	CASTELTERMINI	Centro abitato - Cappuccini	800.000,00 €	F	L	534 del 30/09/2016	800.000,00 €	SI	SI	I.B.R.S. SRL	SI	497.768,68 €
AdP_II ATTO	PA203A/10	PA203	Lavori conclusi	M	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua	800.000,00 €	F	L	040_03/02/2016	800.000,00 €	SI	SI	DI PIAZZA SRL	SI	704.672,05 €
AdP_II ATTO	ME201A/10	ME201	SIA in corso	M	ME	LIPARI	Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del P. PEB Naselli	2.400.000,00 €	F	S	818_21/11/2017 074_26/01/2018 248_05/02/2020	248.720,91 €	SI	SI	DINAMICA S.R.L.	SI	91.312,38 €
AdP_II ATTO	CL198A/10	CL198	Lavori in corso	M	CL	MUSSOMELI	Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della via Acquaviva	700.000,00 €	F	L	189 del 27/02/2018	689.500,00 €	SI	SI	CO.MA.C. S.R.L.	SI	303.228,22 €
AdP_II ATTO	AG197A/10	AG197	SIA in corso	M	AG	PALMA DI MONTECHIARO	Messa in sicurezza e ripristino del versante in frana c/da Ciotte - Facciomare	700.000,00 €	F	S	1209_06/09/2019	110.377,32 €	SI	SI	RTP: Studio Colleselli & Partners - Ingegneria geotecnica - Studio di Ingegneria e Architettura dell'Ing. F. cacioppo & C S.n.c.	SI	24.293,50 €
AdP_II ATTO	PA204B/10	PA204	Lavori conclusi	M	PA	PETRALIA SOTTANA	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò – III stralcio	460.000,00 €	F	L	075_19/02/2016	460.000,00 €	SI	SI	EMMECCI SRL	SI	377.649,17 €
AdP_II ATTO	CT199A/10	CT199	Lavori conclusi	M	CT	RANDAZZO	Consolidamento del costone roccioso e bonifica dell'argine del torrente Annunziata posto a valle del centro abitato	700.000,00 €	F	L	655_27/09/2017	700.000,00 €	SI	SI	EDILSUN S.R.L.	SI	452.967,77 €
AdP_II ATTO	ME202A/10	ME202	Lavori in corso	M	ME	SANTA MARINA SALINA Vallone Nero	Lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza dell'aera a rischio idrogeologico ricadente in località Vallone Nero	700.000,00 €	C	L	512_02/08/2018	689.500,00 €	SI	SI	TECNIPERFORAZIONI S.R.L.	SI	386.587,26 €
AdP_II ATTO	EN200A/10	EN200	Lavori conclusi	M	EN	TROINA	Consolidamento di monte Mugana - completamento	1.240.000,00 €	A	L	448_10/10/2016	1.240.000,00 €	SI	SI	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	SI	1.056.066,68 €
AdP_II ATTO	PA205A/10	PA205	Lavori in corso	M	PA	VALLEDOLMO	Lavori di consolidamento della via Gen.le Di Maria e zone limitrofe	800.000,00 €	F	L	738_02/08/2018 423_02/04/2019 900_01/07/2019 1246_17/07/2020	797.785,57 €	SI	SI	IMPRESA DI COSTRUZIONI DI ANZALONE LUIGI & c. s.r.l.	SI	347.139,15 €
							10.000.000,00 €				7.235.883,80 €				4.790.330,05 €		

AdP_II ATTO INTEGRATIVO		
2	SIA IN CORSO	3.100.000,00 €
3	LAVORI IN CORSO	2.200.000,00 €
6	LAVORI CONCLUSI	4.700.000,00 €
11	<i>Complessivo</i>	<i>10.000.000,00 €</i>

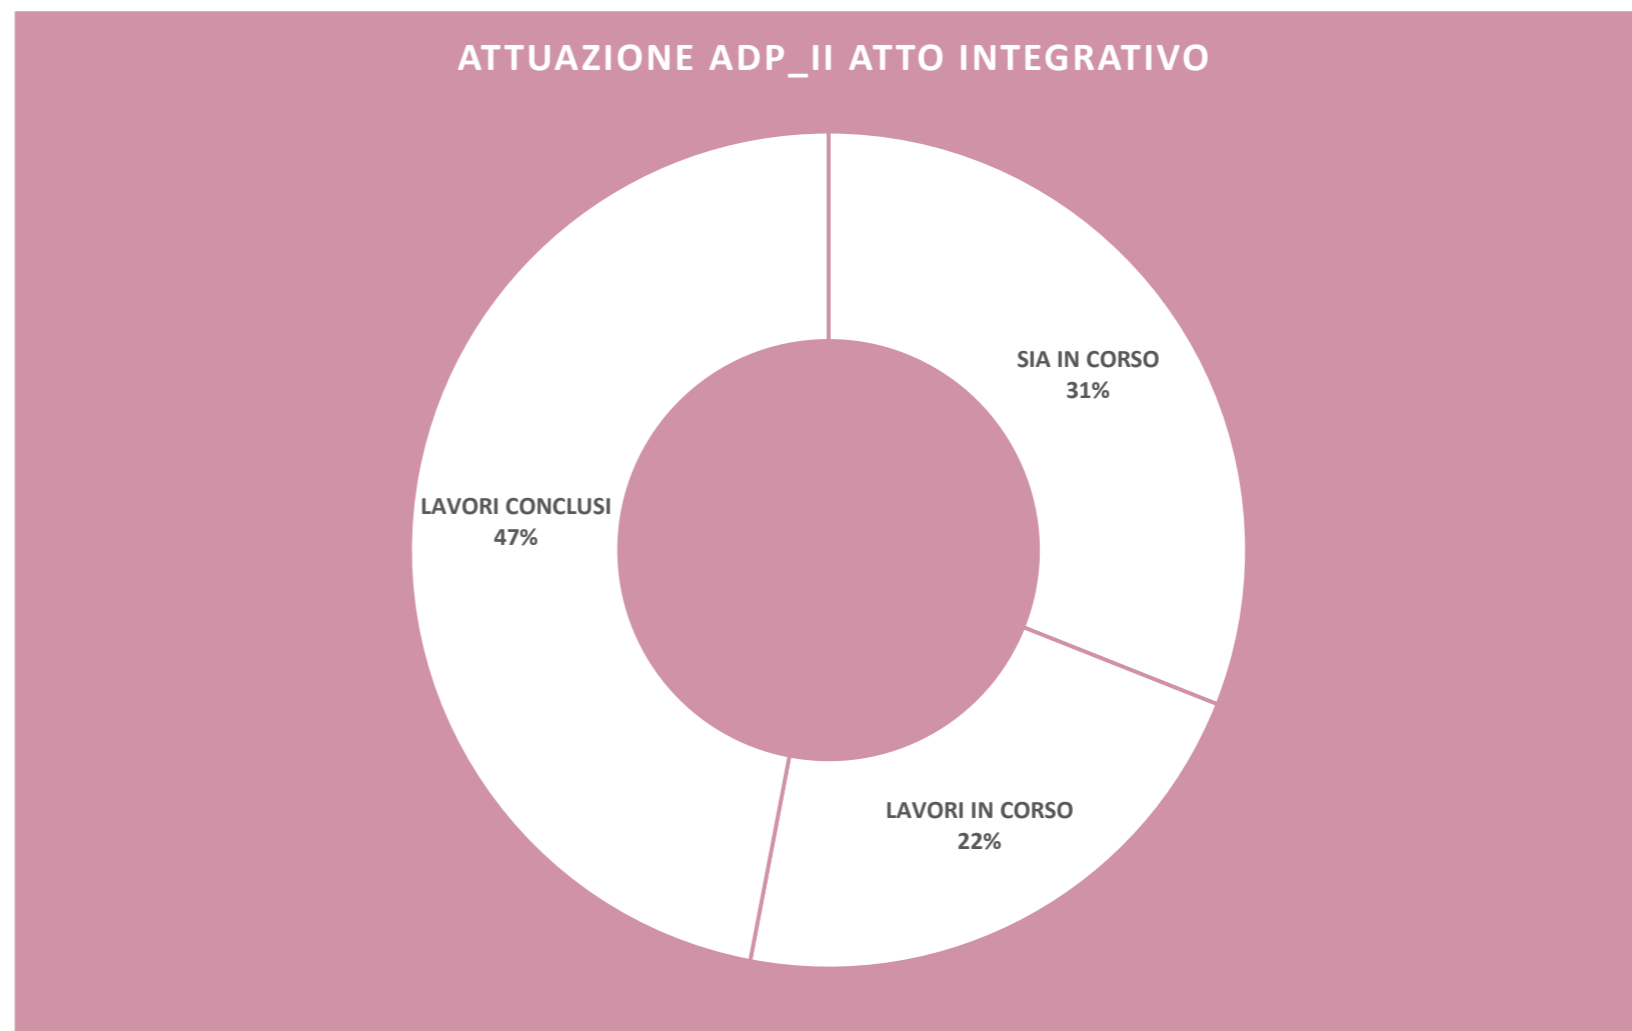

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2021

“PATTO PER IL SUD”

Fondi POC e FSC

PATTO PER IL SUD
REGIONE SICILIANA



**REGIONE
SICILIANA**

Importo POC e FSC € 552.076.317,20

Numero Interventi: 288

MONITORAGGIO INTERVENTI PATTO PER IL SUD_FONDI FSC E POC

	RENDIS	CODICE	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	SOMME EROGATE A * GIUGNO 2021
PATTO	19IR032/G3	SI_1_17613	Lavori in corso	FSC	CT	ACI CASTELLO	Regimentazione delle acque piovane in via Trieste nella Fraz. di Ficarazzi	399.888,16 €	A	L	395_27/03/2019	399.888,16 €	SI	SI	MATINA GEOM. GIOVANNI	SI	1.962,62 €
PATTO	19IR601/G1	SI_1_17614	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	ACIREALE	Interventi di sistemazione idraulica dell'area del territorio comunale zona Wagner	180.000,00 €	A	S	1025_24/07/2019	157.979,53 €	SI	SI	GEOSURVEY SRL	SI	30,00 €
PATTO	19IR026/G1	SI_1_17615	Stipula Contratto in corso	FSC	CT	ACIREALE	Consolidamento e sistemazione idraulica del Torrente Lavinaio Platani	300.000,00 €	A	S	1029_24/07/2019	283.841,90 €	SI	SI	RTP: Studio Ingeo - Cascone Engineering - AB2 SRL - Ing. Belpasso Geol. D'Urso - AM SRL - S.G.M. - M.T.R. Meccanica Terre e Rocce	NO	30.915,24 €
PATTO	19IR603/G1	SI_1_17616	Stipula Contratto in corso	FSC	CT	ACIREALE	Sistemazione idraulica dell'area del territorio comunale tra S.Giovanni e Aci Platani	350.000,00 €	A	S	1047_27/07/2019	263.100,42 €	SI	SI	RTP: Studio Ingeo - Cascone Engineering - AB2 SRL - Ing. Belpasso Geol. D'Urso - AM SRL	NO	16.938,72 €
PATTO	19IR989/G1	SI_1_17618	Lavori in corso	FSC	CL	ACQUAVIVA PLATANI	Consolidamento e sistemazione del tratto di strada viale Trieste e Aree adiacenti.	1.400.000,00 €	I	L	496_05/06/2018	1.400.000,00 €	SI	SI	CO.GEN.AP. SRL	SI	691.397,38 €
PATTO	19IR346/G1	SI_1_22493	Lavori in corso	FSC	AG	AGRIGENTO	Interventi di mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorgono il duomo e l'intera area diocesana di Agrigento	27.000.000,00 €	F	L	716_27/04/2020	26.836.415,42 €	SI	SI	COSTITUENDO ATI: COSPIN SRL - EDILAP SOC.COOP. ARL - SGROMO COSTRUZIONI SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL	SI	4.998.658,95 €
PATTO	19IR334/G1	SI_1_17621	Lavori conclusi	FSC	EN	AIDONE	Completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica_zona Castello	1.350.000,00 €	F	L	667_03/10/2017	1.350.000,00 €	SI	SI	C.F.C. SOC. COOP.	SI	901.534,01 €
PATTO	19IRA39/G1	SI_1_17622	Lavori in corso	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Recupero funzionale e sistemazione del torrente Bongiorno	400.000,00 €	A	L	736_01/08/2018	400.000,00 €	SI	SI	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	SI	1.525,90 €
PATTO	19IR770/G1	SI_1_17623	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato - zona circonvallazione nord	232.000,00 €	F	S	243_22/02/2019 1076_01/08/2019	60.609,64 €	SS	SS	NOVATEK SRL	SI	38.608,57 €
PATTO	19IR767/G1	SI_1_17624	Lavori in corso	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato _zona Baratta	3.450.000,00 €	F	L	498_05/06/2018	3.450.000,00 €	SI	SI	ATI GHELLER SRL	SI	1.237.996,42 €
PATTO	19IR772/G1	SI_1_22494	Lavori in corso	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Interventi di consolidamento della Zona Villicano	1.920.000,00 €	F	L	1876_13/12/2019	1.920.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOP	SI	6.034,61 €
PATTO	19IRA30/G1	SI_1_17625	Istruttoria	FSC	ME	ALI'	Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale	217.387,04 €	F	S	138_14/02/2018	164.439,04 €	SI	NO	Revoca Gara	NO	30,00 €

PATTO	19IR080/G1	SI_1_17626	Stipula Contratto in corso	FSC	PA	ALIMENA	Consolidamento della zona a valle del centro abitato "Pasciovalli-Fontanazza" e conseguente riassetto ambientale	82.706,52 €	F	S	509_06/06/2018	82.706,52 €	SI	SI	RTP: MADA ENGINEERING SRL - IEA ASSOCIATI SRLS	NO	26.593,20 €
PATTO	19IRA27/G1	SI_1_17628	Lavori conclusi	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19	1.250.000,00 €	I	L	758_02/11/2017	1.250.000,00 €	SI	SI	COSPIN SRL UNIPERSONALE	SI	806.696,34 €
PATTO	19IRA57/G1	SI_1_17631	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento e salvaguardia dell'abitato di canigliari zona ovest e della zona chiesa Sacra Famiglia	360.000,00 €	F	S	803_08/05/2020	41.557,00 €	SS	SS	PSAILA AMBIENTE SRL	NO	23.217,45 €
PATTO	19IR617/G1	SI_1_17632	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato	480.000,00 €	F	S	805_08/05/2020	43.745,00 €	SS	SS	I.M.G.A. sas	SI	25.223,45 €
PATTO	19IR313/G1	SI_1_17633	Lavori in corso	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento a valle del centro urbano in località giorgina - piano calcare	2.500.000,00 €	F	L	833_14/06/2019	2.500.000,00 €	SI	SI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	736.700,30 €
PATTO	19IR163/G1	SI_1_17635	Lavori in corso	FSC	SR	AVOLA	Progetto di realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa- Avola (SR)	10.801.968,49 €	C	S+L	224_07/03/2018	10.801.968,49 €	SI	SI	ATI PACOS SRL - MESSINA COSTRUZIONI SRL - URANIA SRL	SI	1.564.974,33 €
PATTO	19IR082/G1	SI_1_17636	SIA in corso	FSC	PA	BALESTRATE	Progetto generale esecutivo per il consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia Croce, Completamento	1.800.000,00 €	F	S	564_13/06/2018 1126_15/11/2018 1366_04/08/2020	130.136,73 €	SI	SI	RTP Mediterranea Engineering SRL - PRO GEO PRG - GEOTEKNIC Ass. di professionisti Martinello Chiara	SI	57.424,45 €
PATTO	19IRA09/G1	SI_1_24408	Istruttoria	POC	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Sistemazione del piano viabile, regimentazione delle acque e sistemazione versanti della strada di collegamento maletto-ficarella-castroreale	2.800.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRA48/G1	SI_1_17638	SIA in corso	FSC	EN	BARRAFRANCA	Mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di collettori e sistemi di captazione per la regimazione delle acque piovane	443.015,29 €	A	S	794_23/08/2018 093_28/01/2019 242_27/02/2019	443.015,29 €	SI	SI	RTP: C&C Engineering srl - Studio Iadanza - Ing. Giovanni Giusti Ing. Morena Giusti Geol. Barbagallo - Geol. Laurelli	SI	47.495,12 €
PATTO	19IR824/G1	SI_1_26486	Istruttoria	FSC	EN	BARRAFRANCA	"Consolidamento delle pendici di via Catania"	2.345.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR182/G1	SI_1_17639	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	BASICO'	Lavori di consolidamento della porzione del centro abitato a protezione degli alloggi popolari delle zone di espansione residenziali.	320.000,00 €	F	S	1115_06/08/2019	206.932,21 €	SI	SI	RTP: ORION PROGETTI SRL . ING. CARDACI - ING. RADICI - GEODRILL	NO	17.477,67 €
PATTO	19IRB06/G1	SI_1_17640	Lavori in corso	FSC	PA	BISACQUINO	Interventi urgenti di ripristino delle funzionalità della "via Quaranta" ed eliminazione del rischio idraulico residuo sul "Burrone monte Peloso"	3.663.628,79 €	I	L	856_19/06/2019	3.663.498,18 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	SI	20.083,30 €
PATTO	19IRD58/G1	SI_1_17641	Lavori in corso	FSC	AG	BIVONA	Lavori di messa in sicurezza Strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano.	2.430.000,00 €	I	L	1329_27/09/2019	2.430.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A.R.L.	SI	362.704,02 €

PATTO		SI_1_25764	Istruttoria	FSC	AG	BIVONA	Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di contenimento e di raccolta acque della strada esterna di collegamento Bivona-Santo Stefano di Quisquina	720.000,00 €	F	L			- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR895/G1	SI_1_17642	Risoluzione Contratto	FSC	PA	BORGETTO	Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto	1.500.000,00 €	A	L	697_13/10/2017		1.500.000,00 €	SI	SI	AND COSTRUZIONI SRL	NO	697.482,55 €
PATTO	19IRA84/G1	SI_1_17643	Risoluzione Contratto	FSC	ME	BROLO	Recupero e riqualificazione del borgo murato - versante nord del centro storico	418.697,15 €	F	S	676_11/07/2018 1202_30/11/2018		418.697,15 €	SI	SI	RTP: ARTEC ASSOCIATI SRL - HYPRO SRL - GEOL. GIACCHETTI - EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI SAS - GHEA SRL	NO	102.415,89 €
PATTO	19IRA42/G1	SI_1_17644	SIA in corso	FSC	ME	BROLO	Progetto per il consolidamento della Fraz. Jannello Inferiore	351.374,38 €	F	S	704_28/05/2019		351.374,38 €	SI	SI	RTP: CIVIL PROJECTS ENGINEERING & CONTRACTING SRLS - ING. CARDACI - ING. BUCOLO - GEOL. PONTILLO - ING. MICALI	SI	74.365,50 €
PATTO	19IRB70/G1	SI_1_17645	Aggiornamento Progettuale	FSC	SR	BUCCHERI	Mitigazione del rischio Idrogeologico lungo la strada di ingresso C.U. ex strada SS124 del Comune di Buccheri.	95.000,00 €	I	S	805_12/06/2019		50.000,00 €	SS	SS	GEO DRILLING SRL	SI	38.362,36 €
PATTO	19IR071/G1	SI_1_26018	Lavori in corso	FSC	EN	CALASCIBETTA	Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S.Pietro e S.Matteo. III Stralcio completamento	2.850.000,00 €	F	L	2140_19/11/2020		2.850.000,00 €	SI	SI	SIOSS SOCIETA' ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL	SI	10.093,68 €
PATTO		SI_1_23298	Lavori in corso	FSC	TP	CALATAFIMI SEGESTA	Lavori di consolidamento del piazzale Belvedere Francesco Vivona nel Comune di Calatafimi - Segesta	750.000,00 €	I	L	1112_29/06/2020		750.000,00 €	SI	SI	ALBERTI COSTRUZIONI SRL	SI	147.801,78 €
PATTO	19IR010/G1	SI_1_17647	Lavori in corso	FSC	AG	CALTABELLOTTA	Completamento del consolidamento del costone roccioso San Pellegrino ed a salvaguardia del centro abitato.	3.072.778,03 €	F	L	594_09/05/2019		3.072.778,03 €	SI	SI	PELEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	SI	564.157,40 €
PATTO	19IR029/G1	SI_1_24409	Stipula Contratto in corso	POC	CT	CALTAGIRONE	Progetto di consolidamento del Centro storico quartiere Santo Stefano	3.350.000,00 €	I	S	475_12/03/2020		377.829,24 €	SI	SI	RTP: TECNHNITAL SPA - Costa Associati - Studio di Ingegneria e Architettura - GEORAS SRL	NO	- €
PATTO		ND	Nuova Programmazione	FSC	CT	CALTAGIRONE	"Lavori di somma urgenza per il ripristino del transito veicolare lungo la via Cristoforo Colombo a seguito di cedimento della sede stradale per garantire la pubblica incolumità"	126.286,36 €	F	L			- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR013/G1	SI_1_17649	Lavori in corso	FSC	AG	CAMMARATA	Consolidamento zona Sant'Agostino - Terra Rossa_1° Stralcio Esecutivo	3.600.000,00 €	F	L	630_18/09/2017 1035_31/10/2018		3.600.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE EOS	SI	46.447,25 €
PATTO	19IRA81/G1	SI_1_17650	aggiornamento Progettuale	FSC	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	Lavori di consolidamento del versante roccioso ovest di Torretta Granitola	300.000,00 €	F	S	1116_30/06/2020		58.565,00 €	SS	SS	FAREL IMPIANTI SRL	SI	129,68 €
PATTO	19IRD64/G1	SI_1_17651	Lavori in corso	FSC	AG	CANICATTI'	Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia Dama - Dammuso - Capo D'Acqua" con la SS. 640	2.500.000,00 €	I	L	684_11/07/2018		2.500.000,00 €	SI	SI	ATI: EUROINFRASTRUTTURE SRL - MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE	SI	1.983.433,90 €

PATTO	19IR951/G1	SI_1_17652	Lavori in corso	FSC	PA	CAPACI	Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci	4.998.000,00 €	F	L	1192_08/07/2020	4.998.000,00 €	SI	SI	M.S. COSTRUZIONI SRL	SI	555.447,33 €
PATTO	19IR940/G1	SI_1_17653	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	CAPIZZI	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere Fortina	78.920,45 €	F	S	833_079/09/2018 387_25/03/2019	78.920,45 €	SS	SS	GEOSURVEY SRL	SI	20.835,48 €
PATTO	19IR953/G1	SI_1_17654	Istruttoria	FSC	ME	CAPO D'ORLANDO	Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale	950.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRB22/G1	SI_1_17655	Lavori in corso	FSC	ME	CAPO D'ORLANDO	Mitigazione rischio idrogeologico a sud del promontorio Capo	2.430.000,00 €	F	L	818_11/05/2020	2.430.000,00 €	SI	SI	MEDI APPALTI SRL	SI	362.347,67 €
PATTO	19IR976/G1	SI_1_17656	SIA in corso	FSC	PA	CARINI	Intervento di protezione da caduta massi finalizzata al riuso del nucleo abitativo sottostante il costone in C/da Giagaffe.	420.351,58 €	F	S	208_02/03/2018 1077_08/11/2018	77.084,17 €	SI	SI	RTP BRUCCHERI MARTINELLO	SI	41.562,51 €
PATTO	19IRA72/G1	SI_1_17658	SIA in corso	FSC	SR	CARLENTINI	Consolidamento del muro e del versante adiacente a via G. da Procida	1.872.000,00 €	F	S	051_16/01/2018 996_09/06/2020	236.891,85 €	SI	SI	EIDOS CONSULTING SRL - Ing. Rizzo - Arch. Fera - Geol. Cappotto	SI	56.402,59 €
PATTO	19IR479/G1	SI_1_17659	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	CARONIA	Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro.	477.400,00 €	F	L	230_02/02/2021	50.878,83 €	SS	SS	Geosearch di Abbate Giuseppe & SAS	SI	- €
PATTO	19IR381/G1	SI_1_17602	Lavori conclusi	FSC	ME	CASALVECCHIO SICULO	Mitigazione delle cause di rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto	495.000,00 €	A	L	733_23/10/2017	495.000,00 €	SI	SI	CICCONE COSTRUZIONI SRL	SI	226.442,22 €
PATTO	19IR805/G1	SI_1_17603	Lavori conclusi	FSC	ME	CASALVECCHIO SICULO	Consolidamento della zona ovest dell'abitato.	985.000,00 €	F	L	724_20/10/2017	985.000,00 €	SI	SI	GALLONE ANTONIO	SI	620.788,39 €
PATTO	19IR242/G1	SI_1_17662	Lavori in corso	FSC	ME	CASALVECCHIO SICULO	Lavori di consolidamento a difesa dell'abitato dell'area a valle della Scuola Media	2.585.049,29 €	F	L	490_30/05/2018	2.585.049,29 €	SI	SI	MEDI APPALTI SRL	SI	888.400,38 €
PATTO	19IRF16/G1	SI_1_22496	Lavori in corso	FSC	CT	CASTEL DI IUDICA	Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato di Serro Calderato - I Stralcio	1.112.000,00 €	F	L	049_13/01/2020	1.112.000,00 €	SI	SI	COSTRUZIONE GREEN SRL	SI	3.824,66 €
PATTO	19IR474/G1	SI_1_17663	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	CASTEL DI LUCIO	Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato.	224.761,38 €	F	S	036_12/01/2021	224.761,38 €	SI	SI	RTP:S.T.I.@ - AB2 Engineering Progettazione e Costruzione SRL - Geol. Savoca	NO	32.363,00 €
PATTO	19IRA22/G1	SI_1_17664	SIA in corso	FSC	ME	CASTEL DI LUCIO	Consolidamento della zona Castello - sotto rocca a salvaguardia e protezione de C.A.	179.870,23 €	F	S	179_12/02/2019	179.870,23 €	SI	SI	LITOS PROGETTI SRL	SI	56.578,63 €

PATTO	19RA21/G1	SI_1_17837	SIA in corso	FSC	ME	CASTEL DI LUCIO	Consolidamento via Durante e via Santa Lucia	321.028,53 €	I	S	457_09/04/2019 1441_15/10/2019	344.604,21 €	SI	SI	RTP: PH3 Engineering Srl - C&C Engineering Srl -LAND Engineering Scarl - Ing. Giusti - Geol. Barbagallo	SI	60.381,12 €
PATTO	19IR149/G1	SI_1_17665	Lavori in corso	FSC	PA	CASTELDACCIA	Intervento di sistemazione idraulica del vallone Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del rischio	7.450.000,00 €	A	L	1766_04/12/2019	7.450.000,00 €	SI	SI	ATI: GORRASI COST. SRL - MI.CO. SRL - G.C. COSTRUZIONI SRL	SI	19.467,04 €
PATTO	19IRB10/G1	SI_1_17667	Aggiornamento Progettuale	FSC	TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	Interventi necessari a ridurre le condizioni di rischio di caduta massi in corrispondenza del molo	650.000,00 €	F	S	456_10/03/2020	50.502,17 €	SS	SS	Ing. Fabio Cafiso	SI	- €
PATTO	19IR312/G1	SI_1_17668	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	CASTELL'UMBERTO	Lavori di consolidamento del versante tratto Piazzale Case Calà Lesina e Manera-Favara nel centro abitato di Sfaranda.	400.000,00 €	F	S	1931_18/12/2019 1733_02/10/2020	68.334,06 €	SS	SS	GLOBALGEO SRL - GEOL. ARNELI	SI	- €
PATTO	19IR247/G1	SI_1_17669	Lavori in corso	FSC	ME	CASTELL'UMBERTO	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a Rischio R4 in Contrada Sfaranda	2.200.000,00 €	F	L	756_03/08/2018 1769_04/12/2019	2.200.000,00 €	SI	SI	ATI: CMC. SRL - SAVATTERI COSTRUZIONI SRL	SI	446.131,59 €
PATTO	19IRD83/G1	SI_1_17670	Lavori conclusi	FSC	AG	CASTELTERMINI	Opere di sistemazione della SP 22 Stazione Campofranco-Cozzo Disi-Casteltermini nel tratto interessato da caduta massi	850.000,00 €	I	L	441_14/05/2018	850.000,00 €	SI	SI	VULLO ANTONIO SRL	SI	528.890,87 €
PATTO	19IRB12/G1	SI_1_17671	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	CASTIGLIONE DI SICILIA	Lavori di salvaguardia del versante sottostante Via Arciprete Cai del centro abitato di Castiglione	66.310,54 €	F	S	1053_29/07/2019 1681_24/09/2020	66.310,54 €	SS	SS	Studio tecnico Associato di Ingegneria ed architettura + Geol. Cartillone	SI	- €
PATTO	19IR035/G1	SI_1_17672	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	CASTIGLIONE DI SICILIA	Lavori di consolidamento del Torrente S.Giacomo a valle del centro abitato	70.000,00 €	F	S	1054_29/07/2019 1683_24/09/2020	68.310,90 €	SS	SS	Geol. Siragusa+Ing. Aiello+TRIVEL SICILIA DI CASTELLI DOMENICO SRL	SI	- €
PATTO	19IR098/G1	SI_1_17673	Gara in corso	FSC	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua II ° stralcio di completamento	612.000,00 €	F	L	878_04/05/2021	612.000,00 €	SI	NO		NO	- €
PATTO	19IR097/G1	SI_1_17674	Lavori in corso	FSC	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Intervento di consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato del comune di Castronovo	1.002.000,00 €	F	L	1316_26/09/2019 1144_01/07/2020	1.002.000,00 €	SI	SI	APPALTI E SERVIZI SRL	SI	162.982,01 €
PATTO	19IR471/G1	SI_1_18830	Lavori in corso	FSC	AG	CATTOLICA ERACLEA	Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa	4.095.507,44 €	C	L	904_27/09/2018 011_09/01/2019	4.095.507,44 €	SI	SI	THETIS COSTRUZIONI SRL	SI	981.307,47 €
PATTO		SI_1_18831	SIA in corso	FSC	SR	CAVAGRANDE DR dello Sviluppo Rurale e Territoriale	Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità della Riserva RNO di Cavagrande	2.000.000,00 €	I	L	1436_14/10/2019	96.500,05 €	SI	SI	RTP: Gabriele Correnti - T&P Tecnologia e Progetti - Geol. Angelo Leotta - Ing. Filadelfo La Rosa - Ing. Stefano Russo	SI	69.767,98 €
PATTO_CDC		SI_1_22495	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC CAPO D'ORLANDO	Interventi urgenti, ed integrati, per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Capo 'Orlando - Lungomare A. Doria nel centro Urbano e San Gregorio	450.000,00 €	C	L	725_31/05/2019	450.000,00 €	SI	SI	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	SI	394.115,36 €

PATTO_CDC		SI_1_24856	Lavori in corso	FSC	ME	CDC_CARONIA SOMMA URGENZA	Lavori urgenti per la difesa e salvaguardia di tratti di litorale ricadenti nel territorio comunale di Caronia fortemente danneggiati a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22-23-24 dicembre 2019 da attuare nell'ambito del Contratto "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1, sottoscritto tra il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana ed i comuni di Acquedolci, Brolo, Capo D'Orlando, Capri Leone, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D'Affermo, Nasso, Patti	500.000,00 €	C	L	1271_21/07/2020	500.000,00 €	SI	SI	ANGELICO COSTRUZIONI SRL	SI	324.468,01 €
PATTO_CDC		SI_1_22521		FSC	ME	CDC_CONTRATTO DI COSTA TIRRENO		8.366.398,00 €	C	S	727_01/08/2018 1136_19/11/2018 169_28/01/2020	3.850.290,81 €	SI	SI			198.647,54 €
PATTO_CDC		SI_1_22521 LOTTO I	Risoluzione Contratto	FSC	ME	CDC_LOTTO I	"CONTRATTO DI COSTA" TIRRENO 1, LOTTO I	- €	C	S		- €	SI	SI	RTP: ARTEC ASSOCIATI SRL - HYPRO SRL - EIKON SBC SAS DI CAROLA SALVAGGIO & C - FABIO NICITA - GAETANO CURRO' - ANDREA NICASTRO	NO	- €
PATTO_CDC		SI_1_22521 LOTTO II	SIA in corso	FSC	ME	CDC_LOTTO II	"CONTRATTO DI COSTA" TIRRENO 1, LOTTO II	- €	C	S		- €	SI	SI	RTP: DINAMICA SRL - GEONAUTICS SRL - HS MARINE - DHI - DOTT. GEOL. CUCINOTTA - STUDIUM - ING. DEL CLARIO n.q. di consulente della SOCIETA' DINAMICA SRL	SI	- €
PATTO_CDC		SI_1_22521 LOTTO III	SIA in corso	FSC	ME	CDC_LOTTO III	"CONTRATTO DI COSTA" TIRRENO 1, LOTTO III	- €	C	S		- €	SI	SI	RTP: TECHNITAL SPA - CASCONI ENGINEERING SRL - ORION PROGETTI SRLS - TE.MA. SNC DI CASTELLI E. C - DOTT.SSA SURIANO - DOTT. ING. BRUNO	SI	- €
PATTO_CDC		SI_1_22499	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_GIOIOSA MAREA	Intervento di stabilizzazione della linea di costa di un tratto di arenile della frazione S. Giorgio fortemente erosa dalle mareggiate del febbraio-marzo 2019 nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno 1	275.000,00 €	C	L	1307_25/09/2019	275.000,00 €	SI	SI	COSMAK SRL	SI	251.732,37 €
PATTO_CDC	19IRA46/G1	SI_1_22507	Lavori in corso	FSC	ME	CDC_PIRAINO I STRALCIO	Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella	200.000,00 €	C	L	1126_07/08/2018	200.000,00 €	SI	SI	AVENI SRL	SI	167.492,33 €
PATTO_CDC		SI_1_24855	Lavori in corso	FSC	ME	CDC_PIRAINO II STRALCIO	Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella fortemente erosa a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22-23-24 dicembre 2019 da attuare nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno 1	185.412,00 €	C	L	734_30/04/2020	185.412,00 €	SI	SI	NUROVI SRL	SI	170.590,34 €
PATTO_CDC		SI_1_26881 LOTTO I	Nuova Programmazione	FSC	ME	CDC_UCOM LOTTO I	Interventi di salvaguardia e riqualificazione della fascia costiera compresa tra i comuni di Patti e Capo d'Orlando - LOTTO 1	5.076.500,00 €	C	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO_CDC		SI_1_26882 LOTTO II	Nuova Programmazione	FSC	ME	CDC_UCOM LOTTO II	Interventi di salvaguardia e riqualificazione della fascia costiera compresa tra i comuni di Capo d'Orlando e Sant'Agata di Militello - LOTTO 2	6.769.750,00 €	C	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO_CDC		SI_1_26883 LOTTO III	Nuova Programmazione	FSC	ME	CDC_UCOM LOTTO III	Interventi di salvaguardia e riqualificazione della fascia costiera compresa tra i comuni di Acquedolci e Tusa - LOTTO 3	6.032.000,00 €	C	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO_CDC		SI_1_24947 LOTTO I	Lavori in corso	FSC	ME	CDC_UCOM	"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - "LOTTO 1"	938.000,00 €	C	L	794_07/05/2020	938.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	SI	245.717,58 €
PATTO_CDC		SI_1_24948 LOTTO II	Lavori in corso	FSC	ME	CDC_UCOM	"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - "LOTTO 2"	2.251.000,00 €	C	L	795_07/05/2020	2.251.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE EOS SRL	SI	956.741,80 €

PATTO_CDC		SI_1_24949 LOTTO III	Lavori in corso	FSC	ME	CDC_UCOM	"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - "LOTTO 3"	3.492.000,00 €	C	L	796_07/05/2020	3.492.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL	SI	1.378.262,76 €
PATTO	19IRD65/G1	SI_1_17675	Lavori in corso	FSC	PA	CEFALU'	Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù	277.747,87 €	I	S	1514_02/09/2020	277.747,87 €	SI	SI	I.CO.GE.I. SRL	SI	- €
PATTO	19IR101/G1	SI_1_17676	Lavori in corso	FSC	PA	CEFALU'	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù	1.827.000,00 €	F	L	781_09/08/2018	1.827.000,00 €	SI	SI	ATI GHELLER SRL - FOX SRLS	SI	960.108,31 €
PATTO		SI_1_27344	Istruttoria	FSC	EN	CERAMI	"Lavori Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del versante in zona Lavina a salvaguardia delle infrastrutture pubbliche e private sottostanti - completamento"	850.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR338/G1	SI_1_17677	Istruttoria	FSC	AG	CIANCIANA	Fenomeno franoso in via Don Luigi Sturzo e Strada Statale 118 "Corleonese-Agrigentina"	150.000,00 €	I	L	419_02/04/2019	150.000,00 €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR105/G1	SI_1_22497	Aggiornamento Progettuale	FSC	PA	CIMINNA	Consolidamento dell'area dissestata del vecchio centro urbano a valle della Matrice - 3° Stralcio	2.000.000,00 €	F	S	1744_28/11/2019	6.935,71 €	SS	SS	SA&GI Engineering srl	SI	- €
PATTO	19IR295/G1	SI_1_17678	SIA in corso	FSC	PA	CINISI	Lavori di messa in sicurezza della scogliera di Magaggiari	190.000,00 €	F	S	975_11/07/2019	189.217,87 €	SI	SI	RTP: Ing. Vella, Ing. Giglio, Ing. Cairone, Ing. Arnone, Dott. Bonanno Conti	SI	30.189,00 €
PATTO	19IR108/G1	SI_1_17679	Lavori in corso	FSC	PA	COLLESANO	Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce	1.268.000,00 €	F	L	949_04/10/2018	1.248.600,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE AURORA SCARLS	SI	612.212,46 €
PATTO	19IR960/G1	SI_1_17680	Stipula Contratto in corso	FSC	PA	COLLESANO	Consolidamento del costone roccioso e sistemazione dei ruderi del castello.	450.000,00 €	F	S	082_16/01/2020	368.113,70 €	SI	SI	RTP: SWS SPA - PRION PROGETTI SRL - INCLINE SRL	NO	23.034,13 €
PATTO		SI_1_25765	Lavori in corso	FSC	TP	CUSTOMACI	Interventi di mitigazione del rischio di caduta massi della riserva naturale orientata "Monte Cofano"	1.490.000,00 €	F	L	2006_04/11/2020	1.490.000,00 €	SI	SI	CO.GE.M.srl	SI	6.380,42 €
PATTO		ND	Nuova Programmazione	FSC	PA	DRPC	Ricostrazione di un tratto di strada SP24 Scillato - Caltauturo	1.500.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO		ND	Nuova Programmazione	FSC	PA	DRT	"Interventi di consolidamento di alcuni tratti dell S.P. 54 per il ripristino della viabilità in sicurezza dei tratti interessati da movimenti franosi alle progressive Km18+000,19+000,20+000,20+500,21+000,21+900 e 23+000 "	4.160.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO		ND	Nuova Programmazione	FSC	PA	DRT	"Interventi di consolidamento di alcuni tratti dell S.P. 54 per il ripristino della viabilità in sicurezza dei tratti interessati da movimenti franosi e da caduta massi alle progressive Km1+900,12+000,13+000"	1.400.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €

PATTO		SI_1_26917	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	DRT	Lavori urgenti per il presidio e la messa in sicurezza del versante in frana a tutela della pubblica incolumità, sulla strada di collegamento Scordia - Militello in val di Catania.	500.000,00 €	F	L	692_09/04/2021	66.590,14 €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR175/G1	SI_1_17827	Istruttoria	FSC	TP	FAVIGNANA	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di un'area del centro abitato di Marettimo	546.370,20 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR266/G1	SI_1_17726	Istruttoria	FSC	ME	FIUMEDINISI	Consolidamento a completamento degli interventi eseguiti dalla Prov. di ME del costone a monte della SP 27	4.010.000,00 €	I	L	221_20/02/2019	242.248,33 €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRA02/G1	SI_1_17817	Istruttoria	FSC	ME	FIUMEDINISI	Ripristino delle difese spondali del Torrente Fiumedinisi - Completamento	900.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR299/G1	SI_1_17752	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	FONDACHELLI-FANTINA	Lavori di completamento del consolidamento della Fraz. Rubino	182.362,30 €	F	S	785_11/06/2019 1731_02/10/2020	182.362,30 €	SI	SI	RTP: Arch. Marotta, Ing. Allegra Filosico, Ing. Nocifera, Ing. Palmeri, Geol. Collovà	NO	- €
PATTO	19IRD84/G1	SI_1_17792	Lavori conclusi	FSC	ME	FORZA D'AGRO'	Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco Parrino	1.100.000,00 €	I	L	221_06/03/2018	1.100.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO CAMPALE STABILE	SI	878.779,37 €
PATTO	19IRA66/G1	SI_1_17753	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	FRANCAVILLA DI SICILIA	Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda idraulica destra del torrente San Paolo a protezione dell'abitato.	252.000,00 €	F	S	1346_03/08/2020	175.965,57 €	SI	SI	RTP: ING. FRENI - ING. TROVATO - ING. LOMBARDO - GEOL. CARUSO - ING. PENNISI	NO	- €
PATTO	19IR248/G1	SI_1_17600	Lavori conclusi	FSC	ME	FRAZZANO'	Lavori di consolidamento dell'abitato est del comune di Frazzanò	2.649.938,67 €	F	L	698_16/10/17	2.649.938,67 €	SI	SI	ATI BE.I.CO. SRL - COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	SI	1.819.995,27 €
PATTO	19IR483/G1	SI_1_17604	Lavori conclusi	FSC	ME	FURCI SICULO	Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento delle Frazioni Grotte e Calcare e centro urbano alla strada statale SS114 ME - CT.	2.230.000,00 €	I	L	755_02/11/2017	2.230.000,00 €	SI	SI	ARES S.R.L.	SI	1.338.442,73 €
PATTO	19IRD68/G1	SI_1_17737	SIA in corso	FSC	ME	FURCI SICULO	Intervento di sistemazione idraulica Torrete Pagliara	157.821,21 €	A	S	1267_06/12/2018	157.821,21 €	SI	SI	RTP: Ing. Pio D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Gasparo - Ing. Lo Presti - Geol. Scurria	SI	26.555,96 €
PATTO	19IR939/G1	SI_1_25578	Lavori in corso	FSC	ME	FURCI SICULO	Interventi integrati per la progettazione dei litorali in erosione completamento struttura in difesa dai marosi per la protezione del litorale e dell'abitato	1.297.021,83 €	C	L	2171_23/11/2020	1.297.021,83 €	SI	SI	PACOS SRL	SI	248.093,45 €
PATTO	19IRD68/G2	EX 17737 SI_1_22498	Lavori conclusi	FSC	ME	FURCI SICULO SOMMA URGENZA	Lavori somma urgenza relativi alla "Risagomatura della sezione idraulica dell'alveo nel tratto che va dalla passerella provvisoria esistente di collegamento dei centri abitanti fino a monte degli attraversamenti viario e ferroviario, per ripristino dell'efficienza e della funzionalità idraulica - Comuni di Furci Siculo e Roccalumera (Me)"	150.000,00 €	A	L	585_08/05/2019	150.000,00 €	SI	SI	S.C.A. UNIPERSONALE SRL	SI	73.126,21 €

PATTO	19IR412/G1	SI_1_17738	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	FURNARI	Messa in sicurezza idraulica tratti vallivi delle aste torrentizie e delle saie nelle Contrade Feliciotto, Siena e Bazia	279.000,00 €	A	S	1344_03/08/2020	173.666,42 €	SI	SI	RTP: LITOS PROGETTI SRL - ING. LANZA - ING- GUAGENTI	NO	- €
PATTO	19IR328/G1	SI_1_17739	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	FURNARI	Sistemazione e protezione delle aree costiere in erosione nel territorio comunale	318.000,00 €	A	S	1345_03/08/2020	144.362,38 €	SI	SI	RTP: Ing. D'Arrigo, Ing. Baratta, Ing. Mangano, Ing. La Rosa, Ing. Gasparo, Ing. Lo Presti, Geol. Scurria , Geol. Merk	NO	- €
PATTO	19IR987/G1	SI_1_17754	Lavori conclusi	FSC	ME	GALATI MAMERTINO	Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato	1.840.000,00 €	F	L	195_28/02/2018	1.840.000,00 €	SI	SI	MI.CO. SRL	SI	191.391,74 €
PATTO	19IR567/G1	SI_1_17755	SIA in corso	FSC	ME	GALLODORO	Consolidamento e riqualificazione ambientale del costone c.da Landro a difesa del centro abitato	94.971,83 €	F	S	854_01/12/2017	94.971,83 €	SI	SI	RTP Studio Floramo Engineering&Architecture Srl - Ing. Floramo - Ing. Cutrona - Ing. Formica	SI	30,00 €
PATTO	19IR640/G1	SI_1_17801	Lavori in corso	FSC	ME	GALLODORO	Messa in sicurezza del tratto a monte della strada SP 13 dal KM 1600 al KM 1900	1.700.000,00 €	F	L	066_25/01/2018	1.700.000,00 €	SI	SI	ITTEMO SRL	SI	871.131,51 €
PATTO	19IR540/G1	SI_1_17740	Lavori in corso	FSC	ME	GIARDINI NAXOS	Intervento di sistemazione idraulica Torrente S. Giovanni	1.200.000,00 €	A	L	329_11/04/2018 1191_28/11/2018 1228_10/09/2019 € 2.000.000,00 in capo a O.C.D.P.C. n. 340/2016	1.200.000,00 €	SI	SI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	290.281,83 €
PATTO	19IR571/G1	SI_1_17756	Lavori in corso	FSC	ME	GIOIOSA MAREA	Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi	2.928.175,00 €	F	L	1665_23/09/2020	2.928.175,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE VISTRUVIO SCARL	SI	516.025,78 €
PATTO	19IR549/G1	ND	Nuova Programmazione	FSC	PA	GODRANO	Messa in sicurezza di un tratto di strada comunale - C.da Cannitello	1.500.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR314/G1	SI_1_25579	Lavori in corso	FSC	ME	GRANITI	Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato - Il stralcio esecutivo	2.976.000,00 €	F	L	2059_11/11/2020	2.976.000,00 €	SI	SI	ATI: CO.GEN.AP SRL - LA PLACA ANGELO SRL	SI	339.067,43 €
PATTO	19IR973/G1	SI_1_17727	Lavori conclusi	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri - unica via di fuga dell'abitato	610.000,00 €	I	L	909_14/12/2017 1283_11/12/2018	610.000,00 €	SI	SI	VULLO CALOGERO	SI	345.340,07 €
PATTO	19IR548/G1	SI_1_17728	Lavori conclusi	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria	650.000,00 €	I	L	535_07/06/2018	650.000,00 €	SI	SI	SUD PALI SRL	SI	391.066,36 €
PATTO	19IR971/G1	SI_1_17729	Lavori in corso	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Ampliamento ammodernamento e messa in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri	2.690.000,00 €	I	L	068_21/01/2019	2.690.000,00 €	SI	SI	PULLARA CALOGERO	SI	1.078.070,59 €
PATTO	19IR972/G1	SI_1_22500	Lavori in corso	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada comuale collegante il centro di Gualtieri con la frazione di Sicamino'	5.000.000,00 €	I	L	1911_17/12/2019	5.000.000,00 €	SI	SI	C.G.C. SRL	SI	2.039.965,99 €

PATTO	19IR535/G1	SI_1_17813	Lavori in corso	FSC	RG	ISPICA	Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del Focallo - Ispica (RG)	12.150.000,00 €	C	S+L	235_08/03/2018	12.150.000,00 €	SI	SI	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.	SI	41.355,07 €
PATTO	19IR615/G1	SI_1_17741	Risoluzione Contratto	FSC	ME	ITALA	Completamento delle opere di consolidamento e regimentazione idraulica del quartiere del medico C.da Quartarello	201.157,34 €	F	S	895_12/12/2017 211_19/02/2019	201.157,34 €	SI	SI	RTP: Artec Associati SRL- Hypro Srl - Geol. Fabio Nicita	NO	39.963,00 €
PATTO	19IR963/G1	SI_1_17757	SIA in corso	FSC	ME	ITALA	Consolidamento e regimentazione idraulica del versante a monte del centro abitato	215.804,80 €	F	S	894_12/12/2017 165_11/02/2019	215.804,80 €	SI	SI	RTP: Ing. Pio Diarrigo - Ing. D'Alia - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Barbagiovanni Gasparo - Ing. Lo Presti - Geol. Scurria	SI	46.792,53 €
PATTO		SI_1_26483	Stipula Contratto in corso	FSC	PA	LASCARI	"Consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in loc. "Macello Vecchio" a valle della via SS. Crocifisso"	1.750.000,00 €	F	L	135_21/01/2021	1.750.000,00 €	SI	SI	ACHENZA SRL	NO	630,00 €
PATTO		SI_1_26053	Istruttoria	FSC	AG	LCC Agrigento	Lavori di sistemazione delle frane e ripristino della transitabilità lungo la S.P. 14 "Racalmuto-Montedoro"-SS 640	4.150.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRD67/G1	SI_1_17697	Gara SIA in corso	FSC	CL	LCC Caltanissetta	Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189	1.147.083,27 €	I	S	1577_09/09/2020	1.147.083,27 €	SI	NO		NO	- €
PATTO	19IRD74/G1	SI_1_17751	Lavori conclusi	FSC	ME	LCC Messina	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla	645.000,00 €	A	L	934_22/12/2017	645.000,00 €	SI	SI	SOC. CEDIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO	SI	355.123,00 €
PATTO	19IR948/G1	SI_1_17608	Lavori in corso	FSC	ME	LENI	Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella_Completamento	3.650.000,00 €	C	L	276_20/03/2018	3.650.000,00 €	SI	SI	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa	SI	2.275.100,72 €
PATTO	19IR582/G1	SI_1_17715	SIA in corso	FSC	EN	LEONFORTE	Sistemazione pendici sud di Leonforte-zona sovrastante scuola media G.Verga	112.369,89 €	F	S	714_25/07/2018 071_21/01/2019	112.369,89 €	SI	SI	RTP: ING. LICATA - GEOL. VACCALLUZZO - GEOL. MARTINELLO	SI	34.944,16 €
PATTO	19IR777/G1	SI_1_17808	Stipula Contratto in corso	FSC	PA	LERCARA FRIDDI	Consolidamento Costone roccioso Colle madre	200.000,00 €	F	S	1169_07/07/2020	150.544,95 €	SI	SI	RTP: MADA ENGINEERING SRL - GEOL. LOMBARDO	NO	- €
PATTO	19IRE49/G1	SI_1_24615	Lavori in corso	FSC	ME	LETOJANNI	Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada A/18 Messina - Catania	16.311.717,13 €	I	L	500_19/03/2020	16.311.717,13 €	SI	SI	RTI: SGROMO COSTRUZIONI SRL - COSPIN SRL	SI	5.628.202,59 €
PATTO	19IR464/G1	SI_1_17758	Lavori in corso	FSC	ME	LIBRIZZI	Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato	3.935.000,00 €	F	L	908_28/09/2018	3.935.000,00 €	SI	SI	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa	SI	1.529.029,74 €
PATTO	19IR588/G1	SI_1_25750	Lavori in corso	FSC	AG	LICATA	Messa in sicurezza di un tratto della via Garibaldi e di una parte della sottostante scarpata fino alla Via Marconi	6.250.000,00 €	F	L	2328_11/12/2020	6.250.000,00 €	SI	SI	FRESTA ROSARIO ANTONIO - GRUPPO VENERE SRL	SI	765.364,63 €

PATTO		SI_1_26681	Stipula Contratto in corso	FSC	CT	LICODIA EUDEA	Completamento dei Lavori di Consolidamento del versante occidentale a valle di via Duca degli Abruzzi"	785.000,00 €	F	L	415_25/02/2021	785.000,00 €	SI	SI	ATI: BRAFER SEGNALETICA SRL - NEW VERDE SRL	NO	- €
PATTO	19IRA80/G1	SI_1_17730	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	"Progetto di consolidamento della strada provinciale 12 nei pressi della chiesa delle Preci a protezione del centro.	182.506,94 €	I	S	778_09/08/2018 031_14/01/2018	182.506,94 €	SI	SI	RTP: STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture Srl - Dott. Ing. Floramo - Ing. Cutrona - Geol. Cappotto	SI	40.515,92 €
PATTO	19IRA79/G1	SI_1_17731	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	Progetto di consolidamento sulla provinciale SP12 in prossimità della Via Martiri di Bologna a monte	207.812,33 €	I	S	056_17/01/2019	207.812,33 €	SI	SI	RTP: STUDIO COLONNA SRL - PH3 ENGINEERING SRL - ING. MARCO CALOGERO - GEOL. NICITA	SI	41.975,88 €
PATTO	19IR243/G1	SI_1_17759	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	Progetto di consolidamento c./da Fornace a monte del centro abitato in zona R4.	57.638,14 €	F	S	212_06/03/2018	57.638,14 €	SI	SI	RTP: COSTA ASSOCIATI - ING. COSTA - ING. BUSCEMA	SI	19.586,71 €
PATTO	19IR258/G1	SI_1_17760	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	Lavori di consolidamento a valle dell'abitato a nord di Limina e la messa in sicurezza della Chiesa di San Filippo.	103.717,66 €	F	S	222_07/03/2018 953_09/07/2019	103.717,66 €	SI	SI	RTP: Ing. Giannetto - Ing. Faranna - Arch.Faranna Adele - Geol. Ucchino	SI	29.015,88 €
PATTO	19IR431/G1	SI_1_17718	Lavori in corso	FSC	ME	LIPARI	Riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di protezione spiaggia in località Canneto (Unci) - Lipari (ME)	2.585.000,00 €	C	L	1149_20/11/2018	2.585.000,00 €	SI	SI	S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE	SI	1.189.643,88 €
PATTO	19IR975/G1	SI_1_24410	Istruttoria	POC	ME	LIPARI	Interventi di riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in loc. Canneto.	8.260.000,00 €	C	S	2457_28/12/2020	372.222,86 €	NO	NO		NO	38.314,41 €
PATTO	19IRD85/G1	SI_1_17821	SIA in corso	FSC	ME	LIPARI	Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della strada di collegamento centro abitato - frazione Pecorini a mare - Filicudi	137.690,05 €	I	S	398_28/03/2019 1592_05/11/2019	137.690,05 €	SI	SI	RTP IENCON S.C.A.R.L. - ORION PROGETTI SRLS	SI	28.000,54 €
PATTO	19IRB25/G1	SI_1_17685	Stipula Contratto in corso	FSC	AG	LUCCA SICULA	Realizzazione del canale di gronda nella zona a monte a difesa del centro abitato_Lucca Sicula.	149.608,09 €	A	S	757_03/08/2018 402_28/03/2019 1658_22/09/2020	149.608,09 €	SI	SI	ENGEO ASSOCIATI ENGINEERING & GEOLOGY	NO	- €
PATTO	19IR995/G1	SI_1_17610	Lavori in corso	FSC	CT	MALETTO	Consolidamento a protezione dell'abitato stralcio completamento relativo alla zona R4 Rocca del Castello	1.350.000,00 €	F	L	186_27/02/2018	1.350.000,00 €	SI	SI	CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE	SI	537.845,31 €
PATTO	19IR968/G1	SI_1_17743	SIA in corso	FSC	CT	MALETTO	Consolidamento di un tratto di pendio in C.da Spirini	905.955,00 €	A	S	120_04/02/2019	86.404,80 €	SI	SI	Ing. Lo Presti - Studio Colonna SRL - Geol. Cappotto	SI	30,00 €
PATTO	19IR937/G1	SI_1_25766	Lavori in corso	FSC	ME	MALFA	Lavori di consolidamento del costone roccioso compreso tra Punta scarico e Pollara - Il lotto	1.180.000,00 €	F	L	2141_19/11/2020	1.180.000,00 €	SI	SI	GHELLER SRL - FOX SRL	SI	5.067,82 €
PATTO	19IR944/G1	SI_1_17762	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MALVAGNA	Lavori urgenti di consolidamento del centro abitato della zona a valle della via nuova	89.315,70 €	F	S	838_10/09/2018	29.315,70 €	SS	SS	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea srl	SI	- €

PATTO	19IR579/G1	SI_1_17763	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MANDANICI	Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato quartiere Rocca- Carasà e della circonvallazione a monte.	1.580.000,00 €	F	S	290_05/04/2018	34.543,47 €	SS	SS	Ditta Ionica Sondagi	SI	25.928,55 €
PATTO	19IR979/G1	SI_1_17609	Lavori in corso	FSC	CT	MANIACE	Opere di difesa idraulica finalizzata alla protezione idrogeologica del centro abitato_Contrada Cavallaro_Impluvio Secondario.	590.786,84 €	A	L	110_30/01/2019	590.786,84 €	SI	SI	Consorzio Stabile Vitruvio SCARL	SI	225,00 €
PATTO	19IR982/G1	SI_1_17707	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	MANIACE	Messa in sicurezza, adeguamento e ammodernamento della strada di collegamento della C/da Petrosino.	128.026,60 €	I	S	233_08/03/2018 1301_24/09/2019	98.338,81 €	SI	SI	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl	SI	30,00 €
PATTO	19IRD86/G1	SI_1_17795	Aggiornamento Progettuale	FSC	PA	MARINEO	Consolidamento versante della Rocca di Marineo	780.209,89 €	F	S	876_20/05/2020 85_18/01/2021 1431_14/07/2021	403.113,72 €	SS	SS	SI.AR. TRIVELLAZIONI DI ROSARIO SIMONETTI	SI	5.681,99 €
PATTO	19IRA87/G1	SI_1_17710	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	MASCALI	Mitigazione del rischio idrogeologico della frazione Nunziata	410.000,00 €	A	S	1680_24/09/2020	37.362,42 €	SS	SS	GIOSA SRL	SI	- €
PATTO	19IRA62/G1	SI_1_17708	Lavori in corso	FSC	CT	MASCALUCIA	Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga.	3.075.053,15 €	I	L	437_04/04/2019	3.075.053,15 €	SI	SI	EVER GREEN SRL	SI	572.858,56 €
PATTO	19IR596/G1	SI_1_17693	SIA in corso	FSC	CL	MAZZARINO	Intervento per la mitigazione del rischio nella Via S. Francesco di Paola.	866.958,70 €	I	S	1101_09/11/2018	149.633,99 €	SI	SI	LITOS PROGETTI SRL	SI	50.022,91 €
PATTO		SI_1_26048	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MESSINA	Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio compresi tra gli abitati di Acqualadrone, Mezzana, Tono, Mulinello e Casabianca e a Rodia marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate - I stralcio funzionale sito Casabianca	1.412.006,84 €	C	S	2284_09/12/2020 691_09/04/2021	68.100,07 €	SS	SS	Dott. Capone e Dott. Merk	SI	6.656,00 €
PATTO	19IR684/G1	SI_1_17732	SIA in corso	FSC	ME	MESSINA	Riqualficazione e sistemazione idraulica, risagomatura e profilatura alveo, Ricostruzione muri d'argine ed attraversamento stradale - Collegamento Villaggi - Eventi Alluvionali. - (Sistemaz. idraulica e realizzazione strada di collegamento tra i villaggi di Bordonario sup e inf)	3.470.000,00 €	I	S	525_06/06/2018 776_06/05/2020 363_17/02/2021	354.858,59 €	SI	SI	RTP TECHNITAL S.P.A. - PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE - ARCH. BENEDETTO VERSACI	SI	86.218,14 €
PATTO	19IR011/G3	SI_1_17816	Lavori in corso	FSC	ME	MESSINA	Riqualficazione ambientale e risanamento igienico-sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte	30.000.000,00 €	A	L	805_15/11/2017 848_01/12/2017	30.000.000,00 €	SI	SI	ATI CONSORZIO STABILE P.C. - CIESSECI SRL	SI	19.123.986,64 €
PATTO	19IRF20/G1	SI_1_22503	Gara SIA in corso	FSC	ME	MESSINA	Lavori occorrenti per la realizzazione di una strada "Via di Fuga" complementae alla viabilità esistente di collegamento tra la S.S. 114 ed il villaggio Santo Stefano Briga del Comune di Messina	5.521.965,00 €	I	S	1404_07/08/2020 Supp. RUP 1964_28/10/2020 Indagini	160.438,25 €	SI	NO		NO	26.624,00 €

PATTO		SI_1_25737	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA	Lavri di rifioritura e manutenzione straordinaria delle barriere radenti in Galati Marina e S.Margherita	207.519,74 €	C	L	2047_09/11/2020	207.519,74 €	SI	SI	COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA	SI	- €
PATTO		SI_1_17721	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA I STRALCIO SOMMA URGENZA	Interventi urgenti per il prolungamento della barriera radente esistente collocata a protezione del tratto di litorale compreso tra il complesso edilizio "Case Raciti" ed il campo di calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel comune di Messina	200.000,00 €	C	L	177_26/02/2018 277_29/03/2018 408_08/05/2018	202.295,19 €	SI	SI	GANGI IMPIANTI SRL	SI	129.311,13 €
PATTO		SI_1_22502	Lavori in corso	FSC	ME	MESSINA III STRALCIO	Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) - Completamento	3.562.036,52 €	C	S+L	621_08/04/2020 820_11/05/2020	3.503.421,81 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	SI	595.227,71 €
PATTO		SI_1_22501	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA II STRALCIO	Interventi urgenti per il prolungamento della barriera radente esistente collocata a protezione del tratto di litorale compreso tra il complesso edilizio "Case Raciti" ed il campo di calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel comune di Messina	737.963,48 €	C	L	909_28/09/2018	737.963,48 €	SI	SI	Consorzio Stabile SQM Società Consortile R.L.	SI	496.464,99 €
PATTO		SI_1_24853	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA BADIAZZA	Interventi di pulitura Torrente Badiazza	105.000,00 €	A	L	1574_09/09/2020	105.000,00 €	SI	SI	LUPO COSTRUZIONI SRL	SI	68.201,39 €
PATTO	19IRF30/G1	ND	Nuova Programmazione	FSC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso	2.000.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRF31/G1	ND	Nuova Programmazione	FSC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Annunziata escluso ed il Torrente S. Filippo incluso	2.000.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRF32/G1	ND	Nuova Programmazione	FSC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente S. Filippo escluso ed il Torrente Giampileri	2.000.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRF33/G1	ND	Nuova Programmazione	FSC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio alluvioni mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti tominati e delle vasche di calma, ricadenti nel territorio comunale (stralcio esecutivo)	949.332,59 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR317/G1	SI_1_17601	Lavori conclusi	FSC	PA	MEZZOJUSO	Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci	1.000.000,00 €	F	L	174_20/08/2018	1.000.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE TELEGARE	SI	565.774,54 €

PATTO	19IRF12/G1	SI_1_19278	Lavori conclusi	FSC	CT	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambelia	995.000,00 €	F	L	027_09/01/2019	995.000,00 €	SI	SI	CIASULLO COSTRUZIONI SRL	SI	904.052,36 €
PATTO	19IRA61/G1	SI_1_17714	Gara SIA in corso	FSC	CT	MIRABELLA IMBACCARI	Lavori di completamento per il consolidamento e la sistemazione delle aree a rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	174.768,27 €	F	S	440_14/05/2018 1307_12/12/2018	174.768,27 €	SI	SI		NO	30,00 €
PATTO	19IRA88/G1	SI_1_17766	SIA in corso	FSC	ME	MIRTO	Consolidamento del versante a valle della S.P. 157 lato nord zona adiacente la caserma dei carabinieri e strutture parco.	2.632.000,00 €	F	S	896_12/12/2017 151_07/02/2019	299.917,42 €	SI	SI	RTP : Pro Geo Progettazione Geotecnica Orion Progetti s.r.l. - Engineering Tecno Project srl - Ing. Elisa Giannone Codigione	SI	121.268,33 €
PATTO	19IR138/G1	SI_1_17809	Istruttoria	FSC	PA	MISILMERI	Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del Quartiere San giusto - 3° stralcio	600.000,00 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR224/G1	SI_1_17599	Lavori in corso	FSC	ME	MISTRETTA	Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato	1.400.000,00 €	F	L	076_08/02/2017	1.400.000,00 €	SI	SI	ALPI SRL	SI	416.427,61 €
PATTO	19IR559/G1	SI_1_17767	Gara SIA in corso	FSC	ME	MISTRETTA	Consolidamento in zona Palo, nei pressi del distributore Agip e della Caserma Carabinieri	450.000,00 €	F	S	1117_06/08/2019	317.270,39 €	SI	NO		NO	- €
PATTO	19IR992/G1	SI_1_17768	Lavori in corso	FSC	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° STRALCIO	1.548.000,00 €	F	L	592_09/05/2019	1.548.000,00 €	SI	SI	COSTITUENDO A.T.I. CO.GE.ZAF. SRL E CONSOTEC SRL	SI	272.290,26 €
PATTO	19IRF22/G1	SI_1_22504	Istruttoria	FSC	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Realizzazione di una via di fuga a servizio del centro abitato di Monforte San Giorgio	2.997.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRE96/G1	SI_1_25739	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato - completamento	2.050.000,00 €	F	S	229_02/02/2021	2.050.000,00 €	SI	SI	SIBAR SRL	NO	9.674,37 €
PATTO		SI_1_26019	Gara SIA in corso	FSC	PA	MONREALE	Lavori di messa in sicurezza delle aree in località Laghivecchi e delle aree percorse dal fuoco nelle località Caputo e Caputello	4.000.000,00 €	F	S	2276_04/12/2020	416.761,14 €	SI	NO		NO	- €
PATTO		SI_1_26052	Aggiornamento Progettuale	FSC	PA	MONREALE	Lavori consolidamento e messa in sicurezza del muro di sostegno della villa comunale	2.994.000,00 €	F	S	1983_02/11/2020	36.236,66 €	SS	SS	GLOBALGEO SRL	SI	- €
PATTO	19IR170/G1	SI_1_17597	Istruttoria	FSC	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S.Antonio ed al Cimitero del centro urbano.	1.569.000,00 €	I	L	822_23/11/2017	1.569.000,00 €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR936/G1	SI_1_17770	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento tra la Via Giardino e la Via Palermo a salvaguardia delle abitazioni	133.523,32 €	F	S	176_23/02/2018 291_05/04/2018	53.523,32 €	SI	SI	TEKNIK SRL	SI	22.444,22 €

PATTO	19IR178/G1	SI_1_17771	Lavori conclusi	FSC	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria	1.300.000,00 €	F	L	308_06/04/2018	1.300.000,00 €	SI	SI	ZEUS COSTRUZIONI SRL	SI	660.035,59 €
PATTO	19IR288/G1	SI_1_17686	Stipula Contratto in corso	FSC	AG	MONTALLEGRO	Interventi urgenti di messa in sicurezza del costone roccioso zone ovest centro abitato denominata contrada Bonifacio.	112.157,97 €	F	S	1166_22/11/2018	112.157,97 €	SI	SI	EDILING SRL	NO	- €
PATTO	19IRD87/G1	SI_1_17796	SIA in corso	FSC	PA	MONTELEPRE	Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre	211.634,40 €	I	S	684_22/05/2019 756_05/06/2019	211.634,40 €	SI	SI	RTP: Studio Associato Protea Ingegneria - Sud Progetto srl - EG4 Risk srl	SI	28.004,92 €
PATTO	19IR929/G1	SI_1_17822	Istruttoria	FSC	CT	MOTTA SANT'ANASTASIA	Consolidamento zona Neck	1.306.714,97 €	F	L	041_13/01/2020 VIARCH	1.276,02 €	NO	NO		NO	806,55 €
PATTO	19IR889/G1	SI_1_17694	Istruttoria	FSC	CL	MUSSOMELI	"Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su infrastruttura in c.da Cordoverse".	354.000,00 €	I	S		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRD66/G1	SI_1_17695	SIA in corso	FSC	CL	MUSSOMELI	"Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli - Caltanissetta"	936.886,54 €	I	S	746_04/06/2019	936.886,54 €	SI	SI	RTP : Sintagna Srl - Inge.ca Srl - Dott. Geol. Angelo Alfano	SI	167.724,09 €
PATTO	19IR524/G1	SI_1_17704	SIA in corso	FSC	CL	MUSSOMELI	Dissesto presso il castello Manfredonico.	1.997.227,50 €	F	S	689_11/07/2018	196.450,90 €	SI	SI	RTP Ing. D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Gasparo - Ing. Lo Presti - Geol. Scurria	SI	39.875,00 €
PATTO	19IRC69/G1	SI_1_22505	Lavori in corso	FSC	CL	MUSSOMELI	Realizzazione di opere di urbanizzazione e collegamento tra via Fuori le Mura e la Via Palermo	890.000,00 €	I	L	2016_05/11/2020	890.000,00 €	SI	SI	C.S. COSTRUZIONI SRL	SI	- €
PATTO	19IRA03/G1	SI_1_17687	Lavori in corso	FSC	AG	NARO	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana.	2.440.039,53 €	F	L	209_02/03/2018	2.440.039,54 €	SI	SI	COSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	1.411.716,77 €
PATTO	19IR947/G1	SI_1_17772	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato in C/da Malò - 1 LOTTO	240.000,00 €	F	S	1796_09/10/2020	173.314,31 €	SI	SI	RTP: S.T.I. Geol. Savoca - Ing. Caminiti	NO	- €
PATTO	19IRB16/G1	SI_1_17773	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato in contrada Malò completamente	308.800,00 €	F	S	1795_09/10/2020	194.627,67 €	SI	SI	RTP: Ing. F. Crinò - Ing. M. Crinò - Ing. Iraci - Geol. Sciascia - Ing. S. Crinò	NO	- €
PATTO	19IRF14/G1	SI_1_22506	Istruttoria	FSC	CL	NISCEMI	Stabilizzazione del versante ovest del centro abitato - Zona S.P. 12 - Sbocco Calanco - Canale	1.200.000,00 €	I	L			NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRA01/G1	SI_1_24411	Stipula Contratto in corso	POC	SR	NOTO	Lavori di ricostruzione, protezione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale del litorale in località Lido di Noto	12.000.000,00 €	C	S	FP_491_31/05/2018	496.140,17 €	SI	SI	RTP: Ing. D'arrigo - Netec - Barbagiovanni - Baratta - Lo Presti - Rustica - Merk - Mangano - La Rosa	SI	- €

PATTO	19IRA37/G1	SI_1_17775	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	NOVARA DI SICILIA	Completamento consolidamento costone rocca castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia	310.806,10 €	F	S	595_21/06/2018 334_14/03/2019 1834_10/12/2019	310.806,10 €	SS	SS	GEOSTUDI S.R. L.	SI	23.937,77 €
PATTO	19IR126/G1	SI_1_17612	Istruttoria	FSC	ME	PACE DEL MELA	Consolidamento del versante est del centro abitato	980.000,00 €	F	L	811_16/11/2017	980.000,00 €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRD71/G1	SI_1_17746	Lavori in corso	FSC	ME	PACE DEL MELA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Mela	5.870.000,00 €	A	L	1132_15/11/2018	5.870.000,00 €	SI	SI	ATI - URANIA COSTRUZIONI SRL - LANZA SANTO	SI	830.423,95 €
PATTO	19IR025/G1	SI_1_18842	Stipula Contratto in corso	FSC	PA	PALERMO_FERRO DI CAVALLO	Intervento di bonifica e messa in sicurezza del canale denominato "Ferro di Cavallo" di Mondello nel Comune di Palermo	5.500.000,00 €	I	L	1924_23/10/202 caratterizzazione 1925_23/10/2020 rimozione materiali	306.900,00 €	SI	SI	COST. ATI Tecnologia&Ambiente Srl - TRIVELSONDA SRL	NO	- €
PATTO	19IR409/G1	SI_1_17820	Lavori in corso	FSC	TP	PANTELLERIA	Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree p4: Lago di Venere, Gadir.	3.290.472,59 €	C	L	1317_14/12/2018	3.290.472,59 €	SI	SI	ATI GHELLER SRL - FOX SRL - SOFIA COSTRUZIONI	SI	1.481.867,19 €
PATTO	19IR413/G1	SI_1_17830	Aggiornamento Progettuale	FSC	TP	PANTELLERIA	Consolidamento del fronte ex cava Rodittis, C.da Mursia Pantelleria, Cala dell'Alca	190.812,91 €	F	S	1110_29/06/2020	53.526,00 €	SS	SS	FRA.E.MA srl	SI	195,23 €
PATTO	19IR835/G1	SI_1_17776	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	PATTI	Mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana sita a sud di piazza Gramsci del centro abitato di Patti	102.203,98 €	F	S	784_11/06/2019	128.947,22 €	SI	SI	RTP: ORION PROGETTI SRL - ING. CARDACI - ING. RADICI - GEODRILL	NO	- €
PATTO	19IR962/G1	SI_1_17777	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	PATTI	Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la mitigazione del rischio Geomorfologico	168.036,06 €	F	S	428_03/04/2019	168.036,06 €	SI	SI	RTP: Ing. D'arrigo - Ing. D'alia - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Barbagiovanni - Ing. Lo Presti - Geol. Merk	NO	36.355,80 €
PATTO	19IR147/G1	SI_1_17596	Lavori conclusi	FSC	PA	PETRALIA SOPRANA	Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - Gulini - Fasanò	1.450.000,00 €	F	L	1015_26/10/2018	1.450.000,00 €	SI	SI	EREDI GERACI SALVATORE SRL	SI	771.048,07 €
PATTO		SI_1_26884	Stipula Contratto in corso	FSC	PA	PETRALIA SOTTANA	"Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli accessi al pianerolo di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana"	2.440.359,87 €	F	L	569_22/03/2021	2.440.359,88 €	SI	SI	MAMMANA MICHELANGELO	SI	600,00 €
PATTO	19IR228/G1	SI_1_17778	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	PETTINEO	Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina- Comune di Pettineo (ME)	182.902,43 €	F	S	952_09/07/2019 1199_04/09/2019	182.902,43 €	SI	SI	RTP: S.T.I. - ENGEO - Ing. Curcuruto - Ing. Greco - IDROTER di Lo presti - Dott. Archeologo Donato	NO	30,00 €
PATTO	19IR361/G1	SI_1_22491	Lavori in corso	FSC	CT	PIEDIMONTE ETNEO	Opere di regimentazione acque all'interno del centro abitato (Via Cassisi-Via Notara-Via Roma-Via Bellini-Via Nuova del Convento e Via Cimitero)	6.141.000,00 €	A	L	1208_06/09/2019 059_15/01/2020	6.141.000,00 €	SI	SI	FENIX CONSIRZIO STABILE SCARL	SI	21.855,30 €
PATTO	19IR188/G1	SI_1_17779	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	PIRAINO	Consolidamento del centro abitato di Gliaca versante sud-est del Comune di Piraino	521.000,00 €	F	S	1434_14/10/2019	268.832,89 €	SI	SI	LITOS PROGETTI SRL	NO	- €

PATTO	19IR950/G1	SI_1_17810	SIA in corso	FSC	PA	POLIZZI GENEROSA	Lavori di consolidamento della zona sud est del C.U.	200.828,92 €	F	S	121_04/02/2019	200.828,92 €	SI	SI	RTP: ING. ZAFONTI - ING. DOMINA - ITALSIGIS ENGINEERING SRL - GEOL.ABBATE	SI	38.064,44 €
PATTO	19IR949/G1	SI_1_17814	Stipula Contratto in corso	FSC	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa.	133.878,96 €	C	S	280_11/02/2020	99.673,07 €	SI	SI	RTP: LITOS PROGETTI SRL - ING. LANZA - ING. GUAGENTI	NO	18.250,68 €
PATTO	19IR945/G1	SI_1_17815	Lavori conclusi	FSC	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Lavori urgenti di stabilizzazione scarpate ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona c.da Casuzze Scalo Mandrie.	800.000,00 €	C	L	184_27/02/2018	800.000,00 €	SI	SI	CIPAR SRL	SI	457.112,33 €
PATTO	19IR039/G1	SI_1_24412	Istruttoria	POC	AG	RACALMUTO	Consolidamento costone roccioso a tutela del centro abitato in via Gen. Macaluso	620.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR933/G1	SI_1_17683	Aggiornamento Progettuale	FSC	AG	RAFFADALI	Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza idrogeologica ed idraulica della strada di collegamento Raffadali_loppolo_Giancaxio.	1.942.427,17 €	I	S	380_02/05/2018 022_09/01/2020 1023_21/05/2021	33.235,95 €	SS	SS	INGE.CA. s.r.l.	SI	7.879,07 €
PATTO	19IRA71/G1	SI_1_17688	Stipula Contratto in corso	FSC	AG	RAFFADALI	Lavori di consolidamento attraverso alla demolizione e messa in sicurezza di edifici siti in via Don Castrenze.	155.013,64 €	F	S	737_01/08/2018 063_17/01/2019	155.013,64 €	SI	SI	RTP: SA&GI ENGINEERING SRL - PRO GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - GEOL F. NICITA - ARCH. TRIOLO IVAN	NO	30,00 €
PATTO	19IRC73/G1	SI_1_17835	Istruttoria	FSC	AG	RAFFADALI	Opere per l'eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del rione Barca - completamento	630.235,60 €	F	S		- €	NO	NO		NO	6.179,26 €
PATTO	19IRB02/G1	SI_1_17711	Stipula Contratto in corso	FSC	CT	RAGALNA	Interventi sul territorio di messa in sicurezza per il rischio idraulico e di esondazione del vallone Rosario_1° stralcio	528.000,00 €	A	S	105_30/01/2019 682_09/04/2021	202.534,32 €	SI	SI	RTP: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL - DOTT. ADRIANO BARBAGALLO	NO	- €
PATTO	19IR362/G1	SI_1_17712	SIA in corso	FSC	CT	RANDAZZO	Consolidamento e messa in sicurezza dell'area sottostante l'insediamento abitativo_Torrente Annunziata	200.000,00 €	A	S	086_16/01/2020	137.331,20 €	SI	SI	RPT: Progettazione-Geotecnica - SA&GI - Studio Geol. Gian Vito Graziano e Monica Masi - Geol. Riccardo Ferraro	SI	28.597,36 €
PATTO	19IR584/G1	SI_1_17689	Lavori in corso	FSC	AG	RAVANUSA	Lavori di completamento del consolidamento della zona est dell'abitato II° Stralcio.	7.000.000,00 €	F	L	334_13/04/2018	7.000.000,00 €	SI	SI	ATI S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL - CIESSECI SRL	SI	3.081.481,41 €
PATTO	19IRA04/G1	SI_1_17611	Lavori conclusi	FSC	AG	REALMONTE	Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale	1.250.000,00 €	F	L	197_01/03/2018	1.250.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO ARTEK SA.CO. REST SRL (Esecutrice)	SI	762.826,54 €
PATTO	19IRA47/G1	SI_1_17690	Stipula Contratto in corso	FSC	AG	REALMONTE	Lavori di consolidamento della zona sud-ovest c.a in prossimità della scuola elementare posto a valle di via Palermo.	148.787,90 €	F	S	454_17/05/2018 072_21/01/2019	148.787,90 €	SI	SI	STI @ STUDIO TECNICO ASSOCIATO - AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL GEOL. ANTONINO SAVOCA	NO	3.040,72 €
PATTO	19IRA41/G1	SI_1_17691	SIA in corso	FSC	AG	REALMONTE	Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido.	188.423,00 €	F	S	455_17/05/2018 1264_06/12/2018	188.423,40 €	SI	SI	RTP: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE & COSTRUZIONE S.R.L. - ING. CICCIA GEOL. BARBAGALLO	SI	39.768,00 €

PATTO	19IRF03/G1	SI_1_18832	Lavori conclusi	FSC	AG	REALMONTE	Intervento di messa in sicurezza di una porzione di versante in località Scala dei Turchi nel Comune di Realmonte	417.000,00 €	F	L	1034_30/10/2018	417.000,00 €	SI	SI	SILES SRL	SI	297.171,24 €
PATTO	19IR813/G1	SI_1_17605	Lavori in corso	FSC	ME	REITANO	Stralcio dei lavori di completamento della via Archimede e Piazza San Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato	2.013.885,40 €	I	L	016_12/01/2017	2.013.885,40 €	SI	SI	ATI BE.I.CO. COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.	SI	1.325.088,96 €
PATTO	19IR067/G1	SI_1_17593	Lavori conclusi	FSC	CL	RESUTTANO	Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo.	1.270.000,00 €	I	L	190_12/04/2017 1664_19/11/2019	1.371.007,35 €	SI	SI	AMATO COSTRUZIONI SRL	SI	880.204,08 €
PATTO	19IR459/G1	SI_1_17745	Istruttoria	FSC	ME	ROCCAVALDINA	Mitigazione rischio idrogeologico e messa in sicurezza centro abitato di San Salvatore	990.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRB20/G1	SI_1_17780	Istruttoria	FSC	ME	ROCCAVALDINA	Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina	1.000.000,00 €	F	L	1163_09/06/2021	91.060,16 €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR123/G1	SI_1_17781	Lavori in corso	FSC	ME	ROCCAVALDINA	Consolidamento del centro abitato zona Sottoforno - a monte dell'abitato ed a valle delle Pendici	1.150.000,00 €	F	L	618_08/04/2020	998.000,00 €	SI	SI	CAMEDIL COSTRUZIONI SRL	SI	- €
PATTO	19IR118/G1	SI_1_17782	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	ROMETTA	Consolidamento del versante est del centro abitato	229.608,84 €	F	S	454_09/04/2019	79.608,84 €	SI	SI	LITOS PROGETTO SRL	NO	21.889,78 €
PATTO	19IRB81/G1	SI_1_17825	Lavori in corso	FSC	TP	SALEMI	Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti_(TP)	1.500.000,00 €	I	L	1052_29/07/2019	1.500.000,00 €	SI	SI	CO.GE.MA.LA.SRL	SI	5.447,64 €
PATTO	19IR177/G1	SI_1_17832	Lavori in corso	FSC	TP	SALEMI	Mitigazione del Rischio idrogeologico del costone roccioso di Monte delle Rose	1.554.515,80 €	F	L	042_16/01/2019	1.554.515,80 €	SI	SI	ATI COST. CAVE SPADEA & C. S.R.L. - SAFAN S.R.L.	SI	5.888,96 €
PATTO	19IR028/G1	SI_1_17595	Istruttoria	FSC	CL	SAN CATALDO	Consolidamento del centro storico (ex zona franosa) con interventi nelle vie Quatra e tratto di via Casale.	38.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR311/G1	SI_1_17811	Lavori in corso	FSC	PA	SAN GIUSEPPE JATO	Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina)	1.650.000,00 €	F	L	1051_29/07/2019	1.650.000,00 €	SI	SI	CICAS SRL	SI	233.092,25 €
PATTO		SI_1_22508	Istruttoria	FSC	CT	SAN GREGORIO DI CATANIA	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della collina - Monte Catira - ed opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei.	1.092.572,92 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR246/G1	SI_1_17783	Lavori in corso	FSC	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento centro abitato Catorelli SS. Annunziata - Completamento	2.138.836,63 €	F	L	1304_12/12/2018	2.138.836,63 €	SI	SI	TECNOSYSTEM SRL	SI	634.271,17 €

PATTO	19IR245/G1	SI_1_17784	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento centro urbano zona Scresci	350.000,00 €	F	S	085_16/01/2020	246.476,71 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO - ORION PROGETTI SRL - ING. RADICI	NO	225,00 €
PATTO	19IR244/G1	SI_1_19280	Lavori in corso	FSC	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - Completamento	3.940.000,00 €	F	L	294_08/03/2019	3.940.000,00 €	SI	SI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	601.706,96 €
PATTO	19IR703/G1	SI_1_17812	SIA in corso	FSC	PA	SAN MAURO CASTELVERDE	Consolidamento della Fraz. Borrello limitatamente al centro storico	763.448,80 €	F	S	954_09/07/2019	763.448,80 €	SI	SI	RTP: ANATOMAR ENGINEERING SRL - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PRO GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ING. PIRRERA	SI	126.970,96 €
PATTO	19IRA20/G1	SI_1_17785	SIA in corso	FSC	ME	SAN PIER NICETO	Lavori di completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico centro abitato e/da Ringa	356.267,01 €	F	S	922_04/07/2019	356.267,01 €	SI	SI	RTP: CIVIL PROJECTS ENGINEERING & CONTRACTING SRLS - ING. CARDACI - ING. BUSCOLO - GEOL. PONTILLO - ING. MICALI - ARCH. PINTAUDI	SI	67.183,98 €
PATTO	19IR184/G1	SI_1_17786	Lavori in corso	FSC	ME	SAN PIERO PATTI	Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi	7.723.716,59 €	F	L	1127_15/11/2018	7.723.716,09 €	SI	SI	ATI MONDELLO COSTRUZIONI SRL - COSMAK SRL	SI	1.026.242,46 €
PATTO	19IR183/G1	SI_1_17800	Lavori in corso	FSC	ME	SAN PIERO PATTI	Lavori di consolidamento a protezione del versante nord del centro abitato	1.529.000,00 €	F	L	682_22/05/2019	1.529.000,00 €	SI	SI	GEOS SRL	SI	5.634,84 €
PATTO	19IR970/G1	SI_1_17787	SIA in corso	FSC	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	Consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso soprastante la C/da Scrisera	172.462,87 €	F	S	758_05/06/2019	172.462,87 €	SI	SI	ATI RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ORION PROGETTI SRLS - ING. CODIGLIONE	NO	48.587,86 €
PATTO	19IRB04/G1	SI_1_17788	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	Lavori di ripristino dell'assetto ambientale idrogeologico del versante in Loc. Chiamonte	276.600,00 €	F	S	2053_10/11/2020	194.506,31 €	SI	SI	RTP: Ing. Saitta - Arch. Testagrossa - Ing. Ridolfo - Arch. Liuzzo - Geol. Stimolo - Ing. Di Franco	NO	- €
PATTO		SI_1_26306	Predisposizione Atti di Gara	FSC	TP	SAN VITO LO CAPO	Interventi di mitigazione del rischio connessi al dissesto di una porzione del costone roccioso soprastante la strada di accesso alla Riserva dello Zingaro SP 63 - Località Torre dell'Impiso	315.174,39 €	F	L	1226_16/06/2021	315.174,39 €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR025/G1	SI_1_17594	Lavori in corso	FSC	CL	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fenomeno franoso.	1.298.000,00 €	F	L	738_24/10/2017	1.298.000,00 €	SI	NO	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA - EMMA LAVORI COOP SCARL	SI	145.329,39 €
PATTO	19IR454/G1	SI_1_17734	SIA in corso	FSC	ME	SANTA DOMENICA VITTORIA	Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S.Antonio-Vico Quasimodo.	1.062.300,00 €	I	S	1203_30/11/2018	137.245,24 €	SI	SI	RTP: GaiaTech S.r.l. - Studio di geologia dott. Geol. C. Filice - Ing. L. Ravenda - Si.Ar. Trivellazioni di Simonetti R. - Ing. A. Aulicino	SI	35.356,34 €
PATTO	19IR160/G1	SI_1_17789	Gara in corso	FSC	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini.	1.570.000,00 €	F	L	1211_15/06/2021	1.570.000,00 €	SI	NO		NO	- €
PATTO	19IRF23/G1	SI_1_22509	Istruttoria	FSC	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Completamento intervento di sistemazione idraulica del Torrente Mela	3.000.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €

PATTO		SI_1_27340	Gara in corso	FSC	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Completamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la via Palombello (vico seminario) nel centro storico	1.300.000,00 €	F	L	1327_01/07/2021	1.300.000,00 €	SI	NO		NO	- €
PATTO	19IR628/G1	SI_1_17748	Istruttoria	FSC	ME	SANTA TERESA DI RIVA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Savoca	194.003,55 €	A	S	623_28/06/2018 047_16/01/2019	197.003,55 €	SI	NO	Revoca Gara	NO	28.352,38 €
PATTO	19IR528/G1	SI_1_17833	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	SANTA TERESA DI RIVA	Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Santa Teresa di Riva	10.621.735,00 €	C	S+L	1706_26/11/2019	10.621.735,00 €	SI	SI	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA	NO	50.203,66 €
PATTO	19IRA74/G1	SI_1_17713	Istruttoria	FSC	CT	SANTA VENERINA	Opere di bonifica e rinaturalizzazione del Torrente Fago e riqualificazione del contesto ambientale	1.325.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRD77/G1	SI_1_17592	Lavori conclusi	FSC	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	Lavori urgenti per la ricostruzione di un muro di sostegno diruto sulla S.P. 162 del lungomare di S. Agata di Militello, tratto compreso tra la Via Campidoglio e Vallone Posta	2.079.300,58 €	I	L	199_18/04/2017	2.079.300,58 €	SI	SI	RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL	SI	1.871.161,12 €
PATTO	19IR809/G1	SI_1_17747	Istruttoria	FSC	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	Lavori urgenti di sistemazione idraulica del torrente Pidocchio a difesa del C.da Torrecandele - Completamento	703.739,51 €	A	S		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRD99/G1	SI_1_17591	Lavori conclusi	FSC	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO SOMMA URGENZA	"Lavori urgenti a protezione di tratto del lungomare SP162 antistante la Caserma dei Carabinieri nel Comune di S. Agata di Militello"	120.699,42 €	I	L	053_31/01/2017 (€ 200.000,00) succ. definizione 197_14/04/2017	120.699,42 €	SI	SI	BRUNO TEODORO SPA	SI	116.822,32 €
PATTO	19IR932/G1	SI_1_24413	Gara in corso	POC	ME	SANT'ALESSIO SICULO	Opera a salvaguardia della costa e dell'abitato(ME)	13.000.000,00 €	C	L	1699_28/09/2020	13.000.000,00 €	SI	NO		NO	40.353,59 €
PATTO	19IRD89/G1	SI_1_17829	Lavori in corso	FSC	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	"Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo"	1.635.000,00 €	I	L	325_11/04/2018	1.635.000,00 €	SI	SI	ATI VICA SRL - FOX SRL	SI	770.671,83 €
PATTO	19IRG14/G1	SI_1_22510	Lavori in corso	FSC	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento dle tratto della S.P. 140 all'ingresso nord del centro urbano - Via di Fuga	2.950.000,00 €	I	L	1681_20/11/2019	2.950.000,00 €	SI	SI	A.I.C.O. Società Consortile ARL	SI	378.279,84 €
PATTO	19IR048/G1	SI_1_17692	Risoluzione Contratto	FSC	AG	SANT'ANGELO MUXARO	Interventi di consolidamento del versante meridionale a salvaguardia del centro abitato e della zona archeologica.	161.534,52 €	F	S	902_27/09/2018 1402_14/10/2019	159.550,22 €	SI	SI	RTP: ARTEC ASSOCIATI SRL - HYPRO SRL - EIKON - GEOL. NICITA - GEOL. BARBAGALLO - ING. ALBA	NO	27.456,49 €
PATTO	19IR355/G1	SI_1_17834	Lavori conclusi	FSC	AG	SANT'ANGELO MUXARO	Consolidamento del costone roccioso	1.508.000,00 €	F	L	1200_29/11/2018	1.508.000,00 €	SI	SI	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	SI	483.961,49 €
PATTO	19IR996/G1	SI_1_17790	SIA in corso	FSC	ME	SAPONARA	Progetto per la messa in sicurezza centro abitato della frazione di Scarcelli, Saponara (ME)	4.200.000,00 €	F	S	636_03/07/2018	486.948,52 €	SI	SI	RTP: GENERAL ENGINEERIG S.R.L. - CIVIL PROJECT ENGINEERING AND CONTRACTING S.R.L.S. - Geol. Savoca - Ing. Micali	SI	145.764,04 €

PATTO	19IR537/G1	SI_1_17684	SIA in corso	FSC	AG	SCIACCA	Intervento di stabilità del viadotto Cansalamone.	395.887,17 €	I	S	806_29/08/2018 1008_22/07/2019	395.887,16 €	SI	SI	RTP: D'ARRIGO - ING. RUSTICA - ING. MANGANO - ING. LA ROSA ING. GASPARO - ING. LO PRESTI - GEOL. MERK	SI	42.744,28 €
PATTO	19IRD90/G1	SI_1_17799	Aggiornamento Progettuale	FSC	RG	SCICLI	Via di Fuga Circonvallazione ovest di Scicli Corpo B	98.000,00 €	I	S	536_07/06/2018	53.000,00 €	SI	SI	ATI - GEOTER CONSULTIG SAS - DISMAT SRL	SI	33.474,37 €
PATTO	19IR061/G1	SI_1_25808	Stipula Contratto in corso	FSC	CT	SCORDIA	Interventi di mitigazione dle rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia - quartiere Cittadino	4.330.000,00 €	F	L	341_16/02/2021	4.330.000,00 €	SI	SI	ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI - C&L - COSTRUZIONI INFRASTRUTTIRE GENERALI	NO	- €
PATTO	19IRD82/G1	SI_1_17648	Istruttoria	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Opere di sistemazione della sede viaria della DSP 231 R.T. Villalba Marianopoli (da Villalba alla SS 121) dal km 2 al km 3	120.000,00 €	I	L			NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRD91/G1	SI_1_17791	Stipula Contratto in corso	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 132 Sutera - Casalicchio	134.970,96 €	I	S	776_07/06/2019	134.970,96 €	SI	SI	RTP: Studio Cangemi dei F.lli Cangemi, Vamirgeind Ambiente Geologia e Geofisica	NO	- €
PATTO	19IRD92/G1	SI_1_17793	Lavori conclusi	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena	652.728,00 €	I	L	497_05/06/2018	652.728,00 €	SI	SI	Nocifora Tiranno Vincenzo	SI	439.372,84 €
PATTO	19IRD93/G1	SI_1_17794	SIA in corso	FSC	PA	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP40 tra Carini Montelepre e Giardinello	129.178,89 €	I	S	399_28/03/2019	129.178,89 €	SI	SI	RTP: Studio Floramo Engineering & Architecture s.r.l. - Ing. Floramo - Geol. Puglisi - Arch.Giordano	SI	30,00 €
PATTO	19IRD94/G1	SI_1_17824	Istruttoria	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 23 Serradifalco - Montedoro	528.000,00 €	I	S		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IRD95/G1	SI_1_17826	Gara SIA in corso	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 41 tratto dalla SP 38 alla SP 16	400.000,00 €	I	S	1952_28/10/2020 2154_20/11/2020 definaziamento	399.181,65 €	SI	NO		NO	- €
PATTO	19IR850/G1	SI_1_17749	Istruttoria	FSC	ME	SPADAFORA	Intervento per la messa in sicurezza del torrente Tonnarazza dal rischio esondazioni a protezione della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte Ferroviario	314.000,00 €	A	S	248_27/02/2019 VIA	2.628,00 €	NO	NO		NO	2.628,00 €
PATTO	19IRD96/G1	SI_1_17823	Lavori in corso	FSC	CL	SUTERA	Lavori di costruzione della strada esterna comunale Donna Spusa-Piano Superiore - stralcio di completamento	2.300.000,00 €	I	L	574_18/06/2018	2.300.000,00 €	SI	SI	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	SI	606.748,61 €
PATTO	19IRC36/G1	SI_1_17750	SIA in corso	FSC	ME	TAORMINA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Sirina	2.450.000,00 €	A	S	167_21/02/2018 567_14/06/2018	126.966,46 €	SI	SI	RTP: EIDOS CONSULTING SRL - Ing. Rizzo - Ing. Fera - Geol. Cappotto	SI	57.307,49 €
PATTO		SI_1_25738	Lavori in corso	FSC	ME	TAORMINA	Messa in sicurezza della scalinata di accesso al castello di monte Tauro	300.000,00 €	I	L	1982_02/11/2020 231_02/02/2021	299.960,00 €	SI	SI	FOX S.R.L.	SI	225,00 €

PATTO	19IR890/G1	SI_1_17724	Istruttoria	FSC	ME	TERME VIGLIATORE	Lavori di difesa e riqualificazione del litorale costiero - Terme Vigliatore (ME)	390.000,00 €	C	L	373_22/03/2019 VIA	2.780,00 €	NO	NO		NO	2.828,20 €
PATTO	19IRD97/G1	SI_1_17797	SIA in corso	FSC	PA	TERRASINI	Sistemazione e messa in sicurezza del sottopasso di Terrasini	1.800.000,00 €	I	S	012_04/01/2018	161.185,66 €	SI	SI	RTP: VOLO-NET ENGINEERING SPA - SOCIETA' COOPERATIVA TS ENGINEERIG SOC. COOP. ARL	SI	43.656,04 €
PATTO	19IR481/G1	SI_1_17725	Istruttoria	FSC	ME	TORREGROTTA	Opere di difesa della fascia costiera a salvaguardia delle Infrastrutture Litoranee	914.000,00 €	C	S		- €	NO	NO		NO	- €
PATTO	19IR783/G1	SI_1_17807	SIA in corso	FSC	PA	TORRETTA	Sistemazione idraulica del Torrente Torretta	371.889,11 €	A	S	358_20/04/2018 092_28/01/2019	381.889,11 €	SI	SI	RTP: Beta Studio srl - Orion Progetti srls - Vamirgeind srl	SI	225,00 €
PATTO	19IR203/G1	SI_1_17598	Lavori in corso	FSC	EN	TROINA	Consolidamento del versante nord della Rocca S.Pantheon a monte della Via Madonna del Soccorso	1.320.000,00 €	F	L	198_14/02/2019	1.320.000,00 €	SI	SI	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	SI	257.166,74 €
PATTO	19IRB34/G1	SI_1_19279	Lavori in corso	FSC	EN	TROINA	Mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di un ponte di seconda categoria nell'attuale attraversamento a guado nel fiume Troina, lungo la trazzera Troina-Cesarò	1.703.000,00 €	I	L	1635_13/11/2019	1.703.000,00 €	SI	SI	COGE SRL	SI	335.752,45 €
PATTO	19IR204/G1	SI_1_22511	Istruttoria	FSC	EN	TROINA	Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel Monte Muganà - Troina - Completamento	1.270.000,00 €	F	L	2462_29/12/2020 VIARCH	1.529,75 €	NO	NO		NO	- €
PATTO		SI_1_26250	Lavori in corso	FSC	EN	TROINA	Consolidamento del versante sud ovest del quartiere "Borgo" e di contrada "Candela" e ripristino degli assi viari in frana.	2.997.800,00 €	F	L	339_15/02/2021	2.997.800,00 €	SI	SI	MAMMANA MICHELANGELO	SI	15.598,80 €
PATTO	19IRB19/G1	SI_1_17804	Gara SIA in corso	FSC	ME	TUSA	Lavori di consolidamento del versante a valle della via Sant'Agostino dell'abitato di Tusa	234.000,00 €	F	S	353_20/02/2020	148.732,23 €	SI	NO		NO	- €
PATTO	19IRB18/G1	SI_1_17805	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	TUSA	Lavori di consolidamento relativi al costone roccioso Castello lato est e Castello lato ovest	260.000,00 €	F	S	1269_18/09/2019 057_15/01/2020	223.105,70 €	SI	SI	RTP: Ing. Ceraolo - Geol. Pintaudi - Ing. Cappotto - Ing. Di Maggio - Arch. Ceraolo -	NO	30,00 €
PATTO		SI_1_27156	Gara in corso	FSC	ME	UCRIA	"Consolidamento e messa in sicurezza della zona S. Caterina"	2.250.000,00 €	F	L	894_05/05/2021	2.250.000,00 €	SI	NO		NO	- €
PATTO	19IR991/G1	SI_1_17806	Lavori in corso	FSC	ME	VALDINA	Consolidamento centro abitato frazione Tracocchia versante ovest	980.000,00 €	F	L	619_08/04/2020	980.000,00 €	SI	SI	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	SI	302.413,03 €
PATTO	19IRD75/G1	SI_1_17706	Lavori in corso	FSC	PA	VALLEDOLMO	Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità della strada Valledolmo-Vallelunga pratameno in corrispondenza del ponte in c.da Celso	280.000,00 €	I	L	707_20/07/2018 712_24/07/2018 499_16/04/2019 367_25/02/2020_L	297.770,13 €	SI	SI	C.A.E.C. SOC. COOP.	SI	22.509,43 €

PATTO	19IR552/G1	SI_1_17703	Stipula Contratto in corso	FSC	CL	VALLELUNGA PRATAMENO	Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente "Salacio" (San Giovanni - Margiazzo) a valle del centro abitato.	408.000,00 €	A	S	1442_15/10/2019 712_24/04/2020	178.221,40 €	SI	SI	COST RTP :ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI SRL - ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL - STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - GEORETTI	NO	30,00 €
PATTO	19IR556/G1	SI_1_17705	SIA in corso	FSC	CL	VALLELUNGA PRATAMENO	Lavori di sistemazione e consolidamento parete soggetta a fenomeni franosi crollo nord c.a.	147.335,68 €	F	S	930_21/12/2017 1257_06/12/2018	147.335,68 €	SI	SI	RTP: Sintagma Srl - Inge.ca Srl - Geol. Angelo Alfano	SI	26.013,63 €
PATTO	19IRD98/G1	SI_1_17819		FSC	ME	VENETICO	Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico	230.673,06 €	I	S	931_21/12/2017 1783_05/12/2019	230.673,06 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ING. BAUDO - ARCH. VERSACI - STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL.MARTINELLO	SI	106.887,68 €
PATTO	19IRD98/G1	SI_1_17819	Stipula Contratto in corso	FSC	ME		Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico	2.168.290,16 €	I	L	780_21/04/2021	2.168.290,16 €	SI	SI	ATI: MAMMANA MICHELANGELO - ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	NO	- €
PATTO	19IRC32/G1	SI_1_22512	Lavori in corso	FSC	ME	VENETICO	Lavori di consolidamento del versante sud-est del centro abitato di Venetico superiore	7.109.095,23 €	F	L	788_07/05/2020	7.109.095,23 €	SI	SI	ATI EL.DA. COSTRUZIONI SRL - ALBERTI COSTRUZIONI SRL - LSV COSTRUZIONI SRL	SI	1.358.807,50 €
PATTO	19IR896/G1	SI_1_17607	Lavori in corso	FSC	AG	VILLAFRANCA SICULA	Lavori di regimentazione delle acque a monte del c.a. in c.da San Rocco.	1.300.000,00 €	A	L	273_16/03/2018	1.300.000,00 €	SI	SI	EDILCAP SRL	SI	707.355,55 €
PATTO	19IR841/G1	SI_1_17735	Lavori in corso	FSC	ME	VILLAFRANCA TIRRENA	Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle Acque Meteoriche lungo la via Regione Siciliana.	753.514,41 €	I	L	891_21/09/2018 1666_23/09/2020	753.514,31 €	SI	SI	CMCI SCRL - SICILIANA COSTRUZIONI SRL	SI	- €
PATTO	19IRA91/G1	SI_1_17736	Lavori in corso	FSC	ME	VILLAFRANCA TIRRENA	Lavori di riqualificazione del lungomare Cristoforo Colombo con annessa manutenzione delle opere di protezione dell'arenile.	417.518,16 €	I	S	490_12/04/2019	417.518,16 €	SI	SI	RTP: DINAMICA SRL - DHI SRL - GEONAUTICS - Geol. Pinizzotto	SI	225,00 €
PATTO	19IR092/G1	SI_1_17696		FSC	CL	VILLALBA	Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a monte della via G. Garibaldi.	939.914,00 €	I	S	154_16/02/2018	78.033,40 €	SI	SI	RTP: EIDOS CONSULTING S.R.L. - RIZZO - MARSALA - CAPPOTTO - VILLALBA	SI	44.392,95 €
PATTO	19IR092/G1	SI_1_17696	Lavori in corso	FSC	CL		Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a monte della via G. Garibaldi.	- €	I	L	1616_15/09/2020	939.338,18 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI - SICIL TECNO PLUS SRL	SI	- €
PATTO	19IRD76/G1	SI_1_17716	SIA in corso	FSC	EN	VILLAROSA	Realizzazione muro di contenimento al km 7+500 della Strada provinciale n. 6 (via di fuga) in territorio di Villarosa con ripristino del manto stradale.	100.923,66 €	I	S	992_09/06/2020	100.923,66 €	SI	SI	RTP: PH3 SRL - GEOL. FEMINO'	SI	- €
PATTO	19IRA67/G1	SI_1_18833	Lavori in corso	FSC	CT	VIZZINI	Consolidamento Zona Piazza De Gasperi	1.500.000,00 €	F	L	1094_09/11/2018	1.500.000,00 €	SI	SI	AVENI SRL	SI	675.619,58 €
PATTO PRA				FSC	PRA	PRA	RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE (UCOM)	11.286.621,00 €	P R A	P R A							- €


552.076.317,20 €

390.553.370,14 €


97.098.857,01 €

%	Stato di Attuazione	N.
11,81%	Istruttoria	34
9,03%	Aggiornamento Progettuale	26
0,35%	Predisposizione atti di Gara	1
2,43%	Gara SIA in Corso	7
14,58%	SIA In corso	42
1,74%	Gara in corso	5
13,54%	Stipula Contratto in corso	39
29,51%	Lavori in corso	85
10,76%	Lavori Conclusi	31
1,74%	Risoluzione Contratto	5
4,51%	Nuova Programmazione	13
100,00%		288

STATO ATTUAZIONE

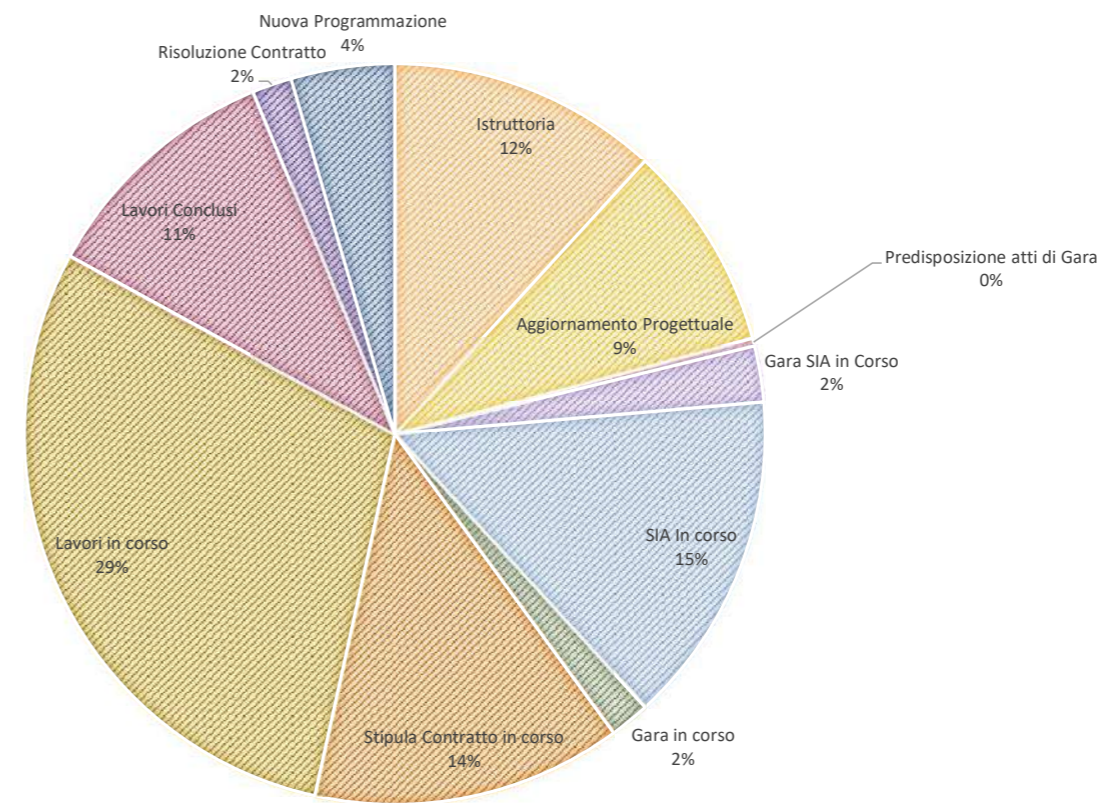

TIPOLOGIA DISSESTO

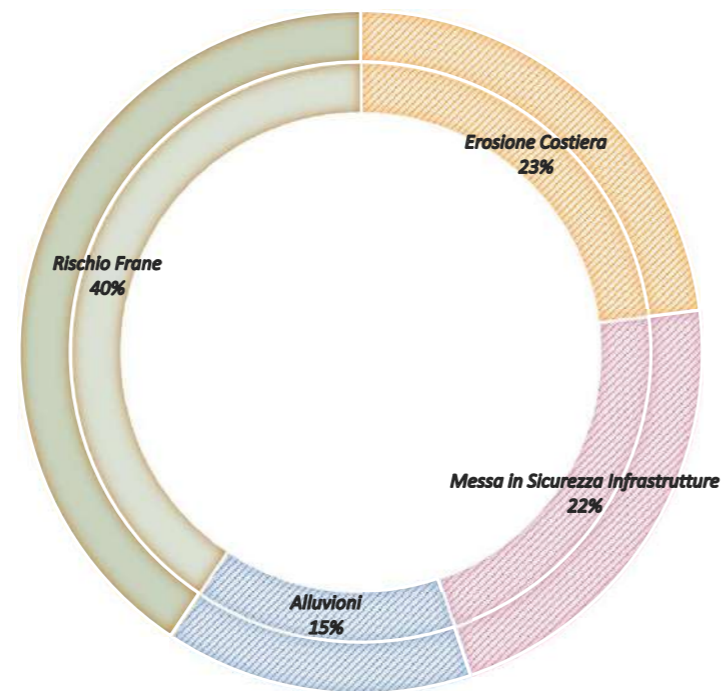

IMPORTO FSC E POC PER TIPOLOGIA DISSESTO

N.	Tipo Dissesto	Importo Progetti	%
41	Alluvioni	€ 79.024.039,35	14,31%
32	Costiero	€ 124.645.170,89	22,58%
143	Frane	€ 219.568.962,70	39,77%
72	Messa in Sicurezza Infrastrutture	€ 117.551.523,26	21,29%
1	Piano Rafforzamento Amministrativo	€ 11.286.621,00	2,04%
288		€ 552.076.317,20	

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2021

Città Metropolitane Palermo, Messina e Catania



Importo € 77.664.545,48


Numero Interventi : 13

MONITORAGGIO INTERVENTI PATTO PER LO SVILUPPO DELLE CITTA' METROPOLITANE PALERMO, MESSINA E CATANIA


RENDIS	CODICE	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	SOMME EROGATE A *GIUGNO 2021	
PSPA	19IRB84	PSPA_84	Istruttoria	FSC	PA	PALERMO	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo sovrastante l'area urbana di Mondello. Completamento	1.764.958,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
PSPA	19IRB85	PSPA_85	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO MONTEPELLEGRINO	Interventi di protezione dell'area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino.	913.287,48 €	F	L		80.644,74 €	SI	SI		SI	26.362,10 €
PSPA	19IRB86	PSPA_86	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO ADDAURA_LOTTO A	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura.	30.545.000,00 €	F	S	590_20/06/2018	855.731,35 €	SI	SI	RTP: RPA srl - Technital Spa - RHM srl - Ing. Castaldini Roberto - Geologia Applicata S.A.	SI	395.437,75 €
PSPA	19IRB86	PSPA_86	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO ADDAURA_LOTTO B	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura.	- €	F	S		510.631,49 €	SI	SI	RTP: SERING INGEGNERIA SRL - ROCKSOIL SPA	SI	- €
PSPA	19IRB86	PSPA_86	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO ADDAURA_LOTTO C	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura.	- €	F	S		314.640,09 €	SI	SI	RTP: SERING Ingegneria S.R.L - ROCKSOIOL S.p.a.	SI	- €
PSPA	19IRB86	PSPA_86	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO ADDAURA_LOTTO D	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura.	- €	F	S		1.225.005,38 €	SI	SI	RTP: RPA srl - Technital Spa- RGM srl - Ing. Castaldini R. - geologia Applicata S.A.	SI	- €
PSPA	19IRB87	PSPA_87	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO BOCCADIFALCO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti sovrastanti l'abitato di boccadifalco - completamento	3.700.000,00 €	F	L	728_01/08/2018 760_07/08/2018	477.592,62 €	SI	SI	RTP: Artec Associati S.r.l. - Hypro srl - Ing. A. Moschella - Geol. A. Alba - Geol. G. Giacchetti Geol. A. Leotta - Dott. G. Currò - Dott. F. D'Angelo	SI	108.810,95 €
PSME	19IRC78/G1	PSME_78	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MESSINA PEZZOLO	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel centro abitato di Pezzolo - Messina	121.500,00 €	A	L	251_12/03/2018	121.500,00 €	SI	SI	CENTRO IDRO GEO TECNICO S.R.L.	SI	44.772,20 €
PSME	19IRC79	PSME_79	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MESSINA ALTOLIA	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana lenta posta nel villaggio di Altolia - Messina	269.800,00 €	A	L	250_12/03/2018	269.800,00 €	SI	SI	Impresa Aglieri Francesco	SI	100.819,46 €
PSME	19IR668	PSME_668	Istruttoria	FSC	ME	MESSINA PORTELLA ARENA	Lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del torrente Portella Arena in corrispondenza della cooperativa Futura	650.000,00 €	A	L	724_30/07/2018 VIA	2.260,00 €	NO	NO		NO	2.260,00 €

PSME	19IRC75/G1	PSME_75	SIA in corso	FSC	ME	MESSINA PAPARDO	Opere di sistemazione in alveo e dei sistemi arginali dei Torrenti Larderìa, Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo a salvaguardia della popolazione e del tessuto economico – 1° stralcio funzionale relativo al torrente Papardo	7.900.000,00 €	A	L	185_27/02/2018	642.605,04 €	SI	SI	RTP: Technital Spa, Studio Colonna Srl, PH3 Engineering Srl, Arch. Versaci, Geol. Cannavò, Geol. Natoli	SI	50.414,29 €
PSME	19IRC74/G1	PSME_74	Istruttoria	FSC	ME	MESSINA	Lavori per la mitigazione del rischio idraulico mediante l'eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi con la realizzazione di manufatti preferibilmente prefabbricati a tutela della sicurezza pubblica.	3.000.000,00 €	A	L	723_30/07/2018 VIA	3.200,00 €	NO	NO		NO	3.200,00 €
PSCT		PSCT_01	Istruttoria	FSC	CT	CATANIA	Riqualficazione e sistemazione Torrente Forcile e i suoi affluenti	28.800.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
								77.664.545,48 €				4.503.610,71 €				732.076,75 €	


Città Metropolitana di Palermo		
<i>n.</i>	<i>Stato di Attuazione</i>	<i>Importo</i>
1	ISTRUTTORIA	1.764.958,00 €
6	SIA IN CORSO	34.245.000,00 €
7	<i>Complessivo</i>	36.009.958,00 €

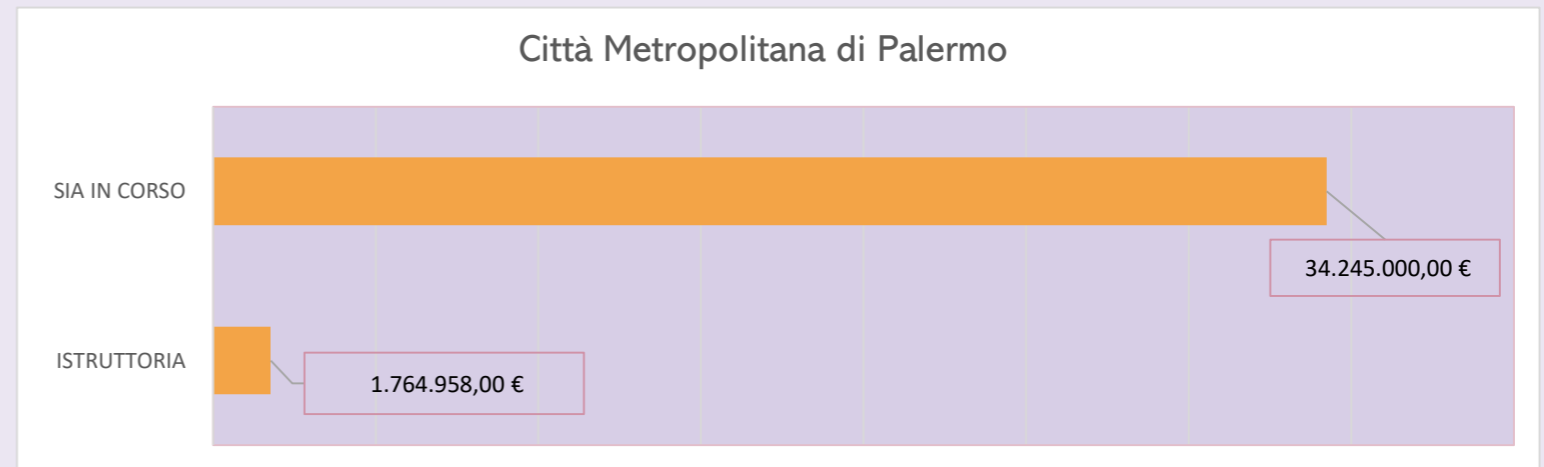

Città Metropolitana di Messina		
<i>n.</i>	<i>Stato di Attuazione</i>	<i>Importo</i>
2	ISTRUTTORIA	3.650.000,00 €
2	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE	391.300,00 €
1	SIA IN CORSO	7.900.000,00 €
5	<i>Complessivo</i>	11.941.300,00 €

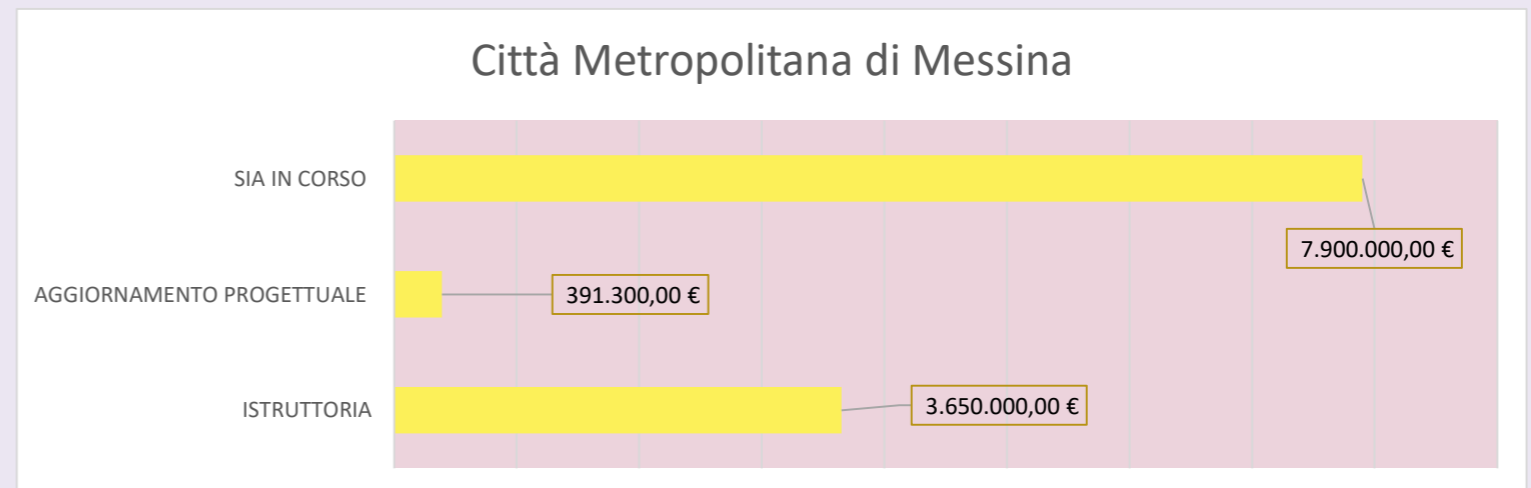

Città Metropolitana di Catania		
<i>n.</i>	<i>Stato di Attuazione</i>	<i>Importo</i>
1	ISTRUTTORIA	28.800.000,00 €
1	<i>Complessivo</i>	28.800.000,00 €

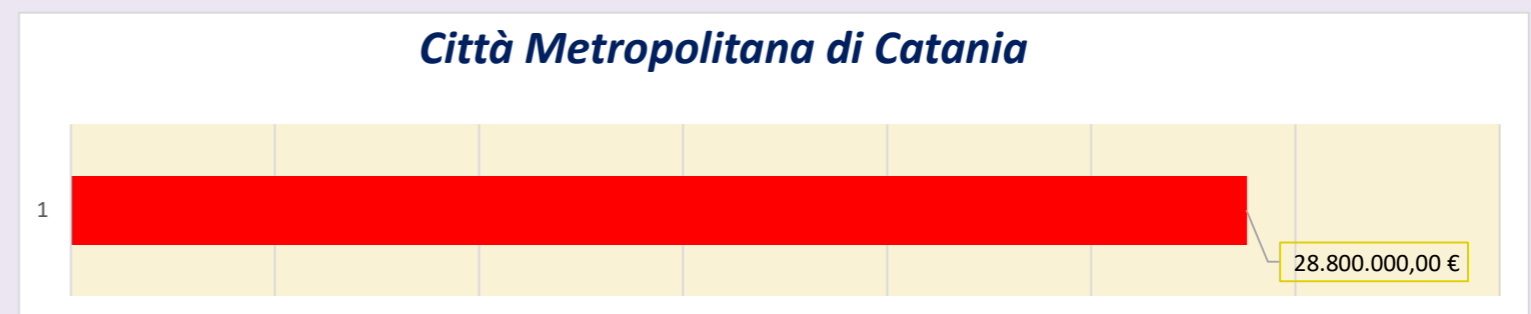

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA




COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2021

Fondo Progettazione



Importo € 15.925.200,00 €

Numero Interventi: 66

MONITORAGGIO INTERVENTI FONDO PROGETTAZIONE

	RENDIS	CODICE	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	SOMME EROGATE A *GIUGNO 2021
FP	19IR904/G1	FP_AG904	SIA in corso	M	AG	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	Consolidamento della Via Santuario	121.989,00 €	F	S	851_19/06/2019	121.989,00 €	SI	SI	RTP: SA & GI Engineering srl - geol. Nicita - Ing. Sciortino	SI	32.541,97 €
FP	19IRB63/G1	FP_MEB63	Istruttoria	M	ME	ANTILLO	Lavori di regimentazione Alveo Torrente acqua vena, completamento del consolidamento dei versanti, sponda sx e dx, ripristino degli attraversamenti idraulici esistenti	136.817,10 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IRA12/G1	FP_MEA12	Stipula contratto in corso	M	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Progetto per i lavori urgenti di sistemazione delle Saie Riti, Bizzarro, Acquacalda e Cappuccini	228.290,00 €	A	S	1336_03/08/2020	228.290,00 €	SI	SI	RTP: Studio Colleselli & Partners - Ingegneria geotecnica - Studio di Ingegneria e Architettura dell'Ing. F. cacioppo & C S.n.c. - Geol. Cangelosi	NO	- €
FP	19IRA10/G1	FP_MEA10	Gara SIA in corso	M	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Lavori per la difesa del litorale di Barcellona P.G. nel tratto tra il torrente Termini e il Torrente Longano	342.357,30 €	C	S	1625_13/11/2019	342.357,30 €	SI	NO		NO	34.894,03 €
FP	19IRA49/G1	FP_MEA49	Istruttoria	M	ME	BROLO	Recupero ambientale a salvaguardia del torrente Pozzo	89.613,00 €	A	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IR156/G1	FP_TP156	SIA conclusi	M	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera	54.488,70 €	F	S	131_21/01/2020	32.259,15 €	SS	SS	Art. 36 Ing. Tommaso Campo	SI	21.153,54 €
FP	19IRB59/G1	FP_PAB59	Gara SIA in corso	M	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	Interventi di ripascimento artificiale della spiaggia compresa tra la foce del fiume Imera e la foce	511.940,25 €	C	S	951_14/05/2021 1049_26/05/2021 1448_14/07/2021	444.310,87 €	SI	NO		NO	- €
FP	19IRB64/G1	FP_MEB64	Istruttoria	M	ME	CAPO D'ORLANDO CDC	Intervento urgente per la difesa e salvaguardia di tratti dell'arenile di Capo d'Orlando	253.586,16 €	C	S	995_19/10/2018 1023_29/10/2018 1300_24/09/2019	268.311,93 €	NO	NO	GARA REVOCATA	NO	- €
FP	19IR235/G1	FP_ME235	SIA in corso	M	ME	CASTELMOLA	Progetto per il consolidamento dell'abitato di Castelmola nei tratti	69.457,50 €	F	S	510_06/06/2018	69.457,50 €	SS	SS	Ing. Pietro Agnello	SI	- €
FP	19IR919/G1	FP_ME919	SIA in corso	M	ME	CONDRO'	Mitigazione rischio idrogeologico a protezione del centro abitato mediante sistemazione e risagomatura	159.595,80 €	F	S	1210_03/12/2018	159.595,80 €	SI	SI	RTP: Ing. Barbagiovanni Gasparo - Ing. Pio D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Lo Presti - Geol. Merk	SI	26.160,76 €
FP	19IRB31/G1	FP_MEB31	Stipula contratto in corso	M	ME	FLORESTA	La vori di messa in sicurezza del versante a monte del centro abitato di Floresta	102.984,18 €	F	S	457_10/03/2020	70.525,82 €	SI	SI	RTP: STUDIO ASSOCIATO T & P - ING. LA ROSA - GEOL. LEOTTA - GEOL. SALERNO	NO	- €
FP	19IR886/G1	FP_SR886	SIA in corso	M	SR	FRANCOFONTE	lavori di consolidamento per la mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	216.347,88 €	F	S	1209_03/12/2018	216.347,88 €	SI	SI	RTP: SUD PROGETTI SRL - Ing. A. Accardo - Ing. R. Lo Bue	SI	53.019,49 €
FP	19IR988/G1	FP_ME988	Stipula contratto in corso	M	ME	GALATI MAMERTINO	Consolidamento centro abitato zona S. Antonio	96.969,60 €	F	S	612_13/05/2019	96.969,60 €	SI	SI	AC2 SRL	NO	20.045,62 €
FP	19IR422/G1	FP_ME422	istruttoria	M	ME	GALATI MAMERTINO	Consolidamento e messa in sicurezza del versante località Pilieri	135.664,20 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IRC57/G1	FP_MEC57	Istruttoria	M	ME	GALATI MAMERTINO	Lavori di disaggio massi a protezione dell'abitato di C.da Galini- Lotto di completamento	22.396,50 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €

FP	19IR470/G1	FP_ME470	SIA in corso	M	ME	LENI	Lavori di consolidamento del fronte roccioso e delle grotte antistanti la spiaggia Rinella	92.074,50 €	F	S	543_30/04/2019	75.727,24 €	SI	SI	RTP Dinamica SRL - Hypro SRL	SI	30.405,18 €
FP	19IR983/G1	FP_ME983	Gara SIA in corso	M	ME	LETOJANNI	Consolidamento mediante opere strutturali e di ingegneria naturalistica di protezione passiva e attiva con canalizzazione delle acque e riforestazione	507.381,00 €	F	S	1123_14/11/2018	439.370,79 €	SI	SI	RTP: Costituendo Artec Associati srl - Hypro srl - Ing. Giampaolo Grasso - Geol. Fabio Nicita - Geol. Giorgio Giacchetti - Ghea srl	NO	57.308,94 €
FP	19IRC59/G1	FP_MEC59	SIA in corso	M	ME	LETOJANNI	Mitigazione dell'erosione cost. tratto di litorale compreso tra via Catania e torrente Letojanni	308.191,50 €	C	S	614_14/05/2019	308.191,50 €	SI	SI	RTP: Duomi Srl - Hysomar Sooc. Coop. - Ing. Antonio Moschella	SI	30.549,49 €
FP	19IR966/G1	FP_ME966	SIA in corso	M	ME	LIBRIZZI	Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasi	192.074,40 €	F	S	615_14/05/2019	192.074,40 €	SI	SI	RTP: Ing. Francesco Crinò - Ing. Mariagrazia Crinò - Ing. Serena Carmela Crinò - Dott. Geol. Emerico Sciascia - Geoservice SRL	SI	31.581,69 €
FP	19IR903/G1	FP_ME903	Stipula contratto in corso	M	ME	LIBRIZZI	Consolidamento della periferia sud-est abitato di Librizzi centro lungo la SP 126	192.074,40 €	F	S	1303_27/07/2020	192.074,40 €	SI	SI	GIGATECK ASSOCIATI	NO	- €
FP	19IR561/G1	FP_ME561	Stipula contratto in corso	M	ME	MALVAGNA	Consolidamento a protezione del c.a. versante sud - completamente	132.245,40 €	F	S	1804_12/10/2020	132.245,40 €	SI	SI	RTP: ING. CRINO' - ING. MG CRINO' - ING. IRACI - DOTT. GEOL. ANDRONACO - ING. SERENA CRINO'	NO	- €
FP	19IR980/G1	FP_CT980	istruttoria	M	CT	MANIACE	Opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del centro abitato contrada Gala	56.597,40 €	A	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IR676/G1	FP_ME676	Istruttoria	M	ME	MESSINA	Messa in sicurezza idraulica del torrente galati tra c/da Baracce e c/da Pozzo	108.558,00 €	A	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IR494/G1	FP_ME494	Stipula contratto in corso	M	ME	MESSINA	Progetto della strada di collegamento tra la SS 113 ed il Villaggio di Rodia	84.138,00 €	A	S	267_10/02/2020	158.584,19 €	SI	SI	RTP: Ing. D'arrigo - Ing. D'alia - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - InG. Barbagioanni - Ing. Lo Presti - Geol. Merk	NO	25.914,20 €
FP	19IRC82/G1	FP_MEC82	SIA in corso	M	ME	MESSINA	"Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio	365.733,90 €	C	S	481_29/05/2018	425.012,09 €	SI	SI	RTP: Dinamica Srl - HS Marine Srl - DHI Srl - Geonautics Srl - Geol. Caterina Cuccinotta - Studium Sas	SI	88.373,86 €
FP	19IRC80/G1	FP_MEC80	SIA in corso	M	ME	MESSINA	"Sistemazione dell'area in frana compresa tra via Noviziato Casazza - Via Sciva e Viale Italia"	340.410,00 €	F	S	279_07/03/2019	340.410,00 €	SI	SI	RTP: SUD PROGETTI SRL - Ing. A. Accardo - Ing. R. Lo Bue	SI	41.253,96 €
FP	19IR450/G1	FP_ME450	Istruttoria	M	ME	MOTTA CAMASTRA	Consolidamento e risanamento ambientale dell'area prospiciente la casa comunale sita in P.zza Croce a nor di Rocca Mancusa	53.490,78 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IRB97/G1	FP_MEB97	Stipula contratto in corso	M	ME	NASO	Consolidamento e Messa in Sicurezza Per La Mitigazione del rischio idrogeologico in località San Giuliano a Monte Della SS. 116 Randazzo-Capo D'Orlodo	123.799,32 €	F	S	1309_12/12/2018	123.799,32 €	SI	SI	R.T.P. Ing. Natale - Ing. Celi - Dott. Geol. Costa - Ing. Mavilla - Ing. Maio	NO	30,00 €
FP	19IRA36/G1	FP_MEA36	SIA in corso	M	ME	NOVARA DI SICILIA	Mitigazione rischio idrogeologico a protezione abitato in Novara centro Via Benedetto Croce e c/da Roccazza Fraz. San Basilio	186.946,20 €	F	S	1141_20/11/2018	131.743,31 €	SI	SI	LITOS PROGETTI	SI	36.026,84 €
FP	19IR021/G3	FP_PA021	Stipula contratto in corso	M	PA	PALERMO	Interventi di manutenzione canali di Maltempo e sistemazione degli argini canale	272.500,00 €	A	S	217_04/02/2020	319.059,05 €	SI	SI	RTP: IENCON SCARL - DR GEOL. ORESTE ADELFIGIO ING. FABIO MARINEO - C.D.G. INGEGNERIA SRL - STUDIO SCIBILIA	NO	- €
FP	19IRB94/G1	FP_PAB94	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi di completamento degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti e scarpate di M. Pellegrino sovrastanti il tratto centrale di Via Monte Ercta	248.010,00 €	F	S	1121_14/11/2018	208.277,83 €	SI	SI	RTP: STUDIO ASSOCIATO PROTEA INGEGNERIA - SUD PROGETTI S.R.L.	SI	34.561,00 €

FP	19IRB90/G1	FP_PAB90	Risoluzione Contratto	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gsallo sovrastanti gli abitati di Sferracavallo e Barcarello	831.180,00 €	F	S	1045_06/11/2018	821.933,42 €	SI	SI	ARTEC ASSOCIATI S.R.L. - HYPRO S.R.L. - ING. MOSCHELLA - GEOL. GIACCHETTI - GHEA SRL	NO	155.971,06 €
FP	19IRB91/G1	FP_PAB91	Risoluzione Contratto	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti gli abitati di Addaura e Mondello	1.088.675,70 €	F	S	1082_08/11/2018	1.088.548,03 €	SI	SI	ARTEC ASSOCIATI S.R.L. - HYPRO S.R.L. - ING. MOSCHELLA	NO	176.596,31 €
FP	19IRB92/G1	FP_PAB92	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo N/E	534.450,00 €	F	S	1345_21/12/2018	534.450,00 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO - Studio Geologico Graziano e Masi - Arch. D'Amico - Agr. Di Leonardo - Ing. Giannone Codiglione - Urbana Srl	SI	34.559,73 €
FP	19IRC31/G1	FP_PAC31	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da Crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su Via Falconara	142.800,00 €	F	S	1120_14/11/2018	106.512,15 €	SI	SI	RTP ING. VELLA - ING. GIGLIO - ING. ARCH. VELLA - ING. ARNONE - DOTT. CONTI	SI	31.891,16 €
FP	19IRB89/G1	FP_PAB89	Stipula contratto in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di monte Pellegrino sovrastanti il parco urbano della Favorita, il Viale Margherita di Savoia e il Viale Diana	873.818,40 €	F	S	69_21/01/2019	873.818,40 €	SI	SI	RTP: SERING SRL - COOPROGETTISOC.COOP. - IDROGEO SRL - Metro Test.SRL	NO	62.307,60 €
FP	19IRB88/G1	FP_PAB88	Stipula contratto in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di monte gallo sovrastanti gli abitati di Partanna e Tommaso Natale	449.904,00 €	F	S	955_09/07/2019	449.904,00 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO - SA&GI Engineering srl - Studio Geologico Graziano e Masi - Dott. Ing. Pirrera - Dott. Geol. Ferraro - Dott. Ing. DiGesaro	SI	34.944,61 €
FP	19IR961/G1	FP_ME961	Stipula contratto in corso	M	ME	PATTI	Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la mitigazione del rischio geomorfologico - dissesto Cuturi, case nuove Russo	188.997,48 €	F	S	1264_17/09/2019	188.997,48 €	SI	SI	TPC Progetti snc	NO	- €
FP	19IRC64/G1	FP_ENC64	SIA in corso	M	EN	PIAZZA ARMERINA	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti Via Mazzini	190.365,00 €	F	S	1177_27/11/2018	190.365,00 €	SI	SI	RTP: GaiaTech S.r.l. - Studio di geologia dott. Geol. C. Filice - Ing. L. ravenda - Si.Ar. Trivellazioni di Simonetti R. - Dott.ssa Geol. O. Albace - Ing. A. Aulicino	SI	36.466,83 €
FP	19IRC06/G1	FP_MEC06	Risoluzione Contratto	M	ME	RACCUJA	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico degli agglomerati urbani della frazione Zappa	204.043,06 €	F	S	975_15/10/2018 1025_29/10/2018	204.043,06 €	SI	SI	ARTEC ASSOCIATI S.R.L. ICPA SRL - HYPRO S.R.L.	NO	43.612,07 €
FP	19IR928/G1	FP_AG928	Istruttoria	M	AG	RAVANUSA	Completamento del consolidamento delle aree a valle del centro abitato	67.823,89 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IR935/G1	FP_ME935	Istruttoria	M	ME	ROMETTA	Realizzazione delle opere di protezione delle aree costiere e delle spiagge del territorio comunale	183.234,15 €	C	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IRB62/G1	FP_TPB62	Istruttoria	M	TP	SALAPARUTA	Progetto per il consolidamento mediante opere di: risagomatura e rinforzo opere di sostegno; Opere di regimentazione della acque e riforestazione; Opere strutturali di stabilizzazione del versante	119.813,40 €	F	S	1372_07/07/2021	71.043,48 €	NO	NO		NO	- €
FP	19IR533/G1	FP_ME533	SIA in corso	M	ME	SAN PIERO PATTI	Opere di consolidamento zona centro abitato compresa tra la via Leonardo Da Vinci e la Via Catania	69.706,98 €	F	S	1256_06/12/2018	69.706,98 €	SI	SI	Ing. Oliveri Fabrizio - SUD Progetti srl	SI	- €
FP	19IRA78/G1	FP_MEA78	Istruttoria	M	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	Consolidamento e messa in sicurezza dell'area Ovest del C.A. in prossimità della Piazza S. Antonio	56.983,50 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €

FP	19IR938/G1	FP_ME938	Istruttoria	M	ME	SCALETTA ZANCLEA	Messa in sicurezza di C. Scaletta e ricostruzione della spiaggia a tutela delle strutture viarie	87.151,95 €	C	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IR911/G1	FP_ME911	Istruttoria	M	ME	SCALETTA ZANCLEA	Completamento dei lavori di protezione dell'abitato della Fraz. Divieto cod. PAI 102-5SZ-020	58.016,01 €	F	S	479_29/05/2018	58.016,01 €	NO	NO		NO	- €
FP	19IRC39/G1	FP_MEC39	Istruttoria	M	ME	SCALETTA ZANCLEA	Consolidamento centro abitato di Giudomandri Superiore - rimboscimento prog. Completamento	142.501,80 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IR828/G1	FP_ME828	SIA in corso	M	ME	SINAGRA	Realizzazione di una via di Fuga del centro storico del paese, mediante l'adeguamento del percorso esistente	44.509,50 €	F	S	1281_11/12/2018	44.509,50 €	SI	SI	Ing. Vittorio Cacioppo	SI	21.300,71 €
FP	19IRC04/G1	FP_SRC04	SIA in corso	M	SR	SIRACUSA	Progetto mitigazione del rischio idrogeologico dell'ara denominata Pantanelli	221.573,03 €	A	S	783_11/06/2019	332.120,11 €	SI	SI	RTP: Beta Studio Srl - Orion Progetti Srls - Vamirgeoind Srl - Ing. Juan Esteban Lucca	SI	42.904,45 €
FP	19IR612/G1	FP_ME612	Stipula contratto in corso	M	ME	TAORMINA	Consolidamento in C/DA Costa Don Lappio - Completamento	100.233,00 €	F	S	1170_07/07/2020	100.233,00 €	SI	SI	RTP STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO E CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO	NO	- €
FP	19IR239/G1	FP_ME239	Istruttoria	M	ME	TAORMINA	Progetto relativo al consolidamento del costone roccioso di C.da Villagonia	74.447,10 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IR162/G1	FP_ME162	SIA in corso	M	ME	TRIPI	Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della S.P. n. 115 Tripiciana	142.501,80 €	F	S	262_06/03/2019	142.501,00 €	SI	SI	RTO: ing. Faranna - Ing. Giannetto - Arch.Moschella - Arch. Faranna - Geol. Ucchino	SI	27.020,56 €
FP	19IR887/G1	FP_ME887	Stipula contratto in corso	M	ME	TRIPI	Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Baracca- Piazza Drago	177.212,12 €	F	S	613_13/05/2019	177.212,12 €	SI	SI	RTP: Ing. Faranna - Ing. Giannetto - Studio Moschella - Arch. A. Faranna - Geol. Ucchino	SI	26.659,22 €
FP	19IR217/G1	FP_ME217	Stipula contratto in corso	M	ME	TRIPI	Mitigazione rischio idrogeologico area centro abitato cod. 010-5TR-133	101.360,10 €	F	S	716_30/05/2019	101.360,10 €	SI	SI	RTP: Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati Srl - Geol. Ferrarotti	NO	- €
FP	19IRC81/G1	FP_MEC81	Stipula contratto in corso	M	ME	MESSINA	3° Stralcio di completamento Siti: Marmora, Rodia Puccino, Acqualadrone, Capo Rasocolmo	381.198,42 €	C	S	674_21/04/2020	378.886,50 €	SI	SI	RTP: ING D'ARRIGO - NETEC SRL - ING. BARATTA - ING. RUSTICA - ING. MANGANO - ING. LA ROSA - ING. BARBAGIOVANNI GASPARO - ING. LO PRESTI - GEOL. MERK	NO	- €
FP	19IR557/G1	FP_ME557	Istruttoria	M	ME	VILLAFRANCA TIRRENA	Lavori di ristrutturazione del ponte sul torrente Calvaruso	26.933,04 €	A	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP	19IRF02/G1	FP_CTF02	Stipula contratto in corso	M	CT	CATANIA	Opere di mitigazione del rischio idraulico lungo l'asta del Canale Buttaceto a valle dell'immissione	834.812,04 €	A	S	1286_2/07/2020	1.400.525,56 €	SI	SI	RTP: ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL + VIA INGEGNERIA SRL - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI SRL - ENGeo ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY - DOTT. ING. SAITTA	NO	- €
FP	19IR516/G1	FP_ME516	Gara SIA in corso	M	ME	MESSINA	Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti - Litorale Ionico	52.221,19 €	C	S	2142_19/11/2020	52.221,19 €	SS	NO		NO	- €
FP	19IRE71/G1	FP_MEE71	SIA in corso	M	ME	TORREGROTTA	Canalizzazione e Regolarizzazione deflusso Acque piovane (SA PAI 003- E05)	73.718,80 €	A	S	1049_16/06/2020	73.718,80 €	SI	SI	RTP: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL - DOTT. ADRIANO BARBAGALLO	SI	- €
FP	19IRF04/G1	FP_CTF04	Istruttoria	M	CT	MISTERBIANCO	Opere di regimentazione delle acque meteoriche nell'area prodttiva commerciale di C.da Mezzocampo	500.462,00 €	A	S		- €	NO	NO		NO	- €


FP	19IRD39/G1	FP_MED39	Stipula contratto in corso	M	ME	MESSINA	Mitigazione rischio alluvione T.ti San Filippo, Zafferia, Mili e Marmora, Il stralcio T. San filippo	720.374,78 €	A	S	745_04/05/2020	720.374,78 €	SI	SI	RTP: TECHNICAL SPA - PH3 ENGINEERING SRL - NETEC SRL - ORION PROGETTI SRL - SIGEO DRILLING SRL	NO	61.767,44 €
FP	19IRE91/G1	FP_MEE91	Stipula contratto in corso	M	ME	MESSINA	I Stralcio Funzionale Torrente Larderìa	708.118,28 €	A	S	1109_29/06/2020	708.118,28 €	SI	SI	RTP: Ing. D'ARRIGO - C&C ENGINEERING - ESSE INGEGNERIA SRL - ING. SCALISE - ING. RUSTICA - ING. MANGANO - ING. LA ROSA - ING. NICOTERA - ING. GASPARO - ING. LO PRESTI - GEOL. MERK	NO	26.160,76 €
FP	19IR039/G3	FP_CT039	Richiesta Revoca Finanziamento	M	CT	CATANIA	Completamento collettore pluviale B	403.975,08 €		S		- €	NO	NO		NO	
FP	19IRC50/G1	FP_MEC50	Richiesta Revoca Finanziamento	M	ME	TAORMINA	Opere di salvaguardia e restauro geoambientale della spiaggia di "Isola Bella"	161.734,98 €		S		- €	NO	NO		NO	
FP	19IRB98/G1	FP_RGB98	Richiesta Revoca Finanziamento	M	RG	RAGUSA	Risanamento versanete Sud e Sud-Est di Ragusa Ibla sovrastante la via Ottaviano - mitigazione rischio	103.627,45 €		S		- €	NO	NO		NO	- €

15.925.200,00 €

13.986.103,32 €

1.345.983,08 €

<i>n°</i>	<i>STATO ATTUAZIONE</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
18	Istruttoria	2.174.089,98 €	13,65%
4	Gara SIA in corso	1.413.899,74 €	8,88%
18	Stipula Contratto in corso	5.769.029,52 €	36,23%
19	SIA in corso	3.720.455,79 €	23,36%
1	SIA conclusi	54.488,70 €	0,34%
3	Risoluzione contratto	2.123.898,76 €	13,34%
3	Richiesta Revoca	669.337,51 €	4,20%
66	<i>Complessivo</i>	<i>15.925.200,00 €</i>	<i>100,00%</i>

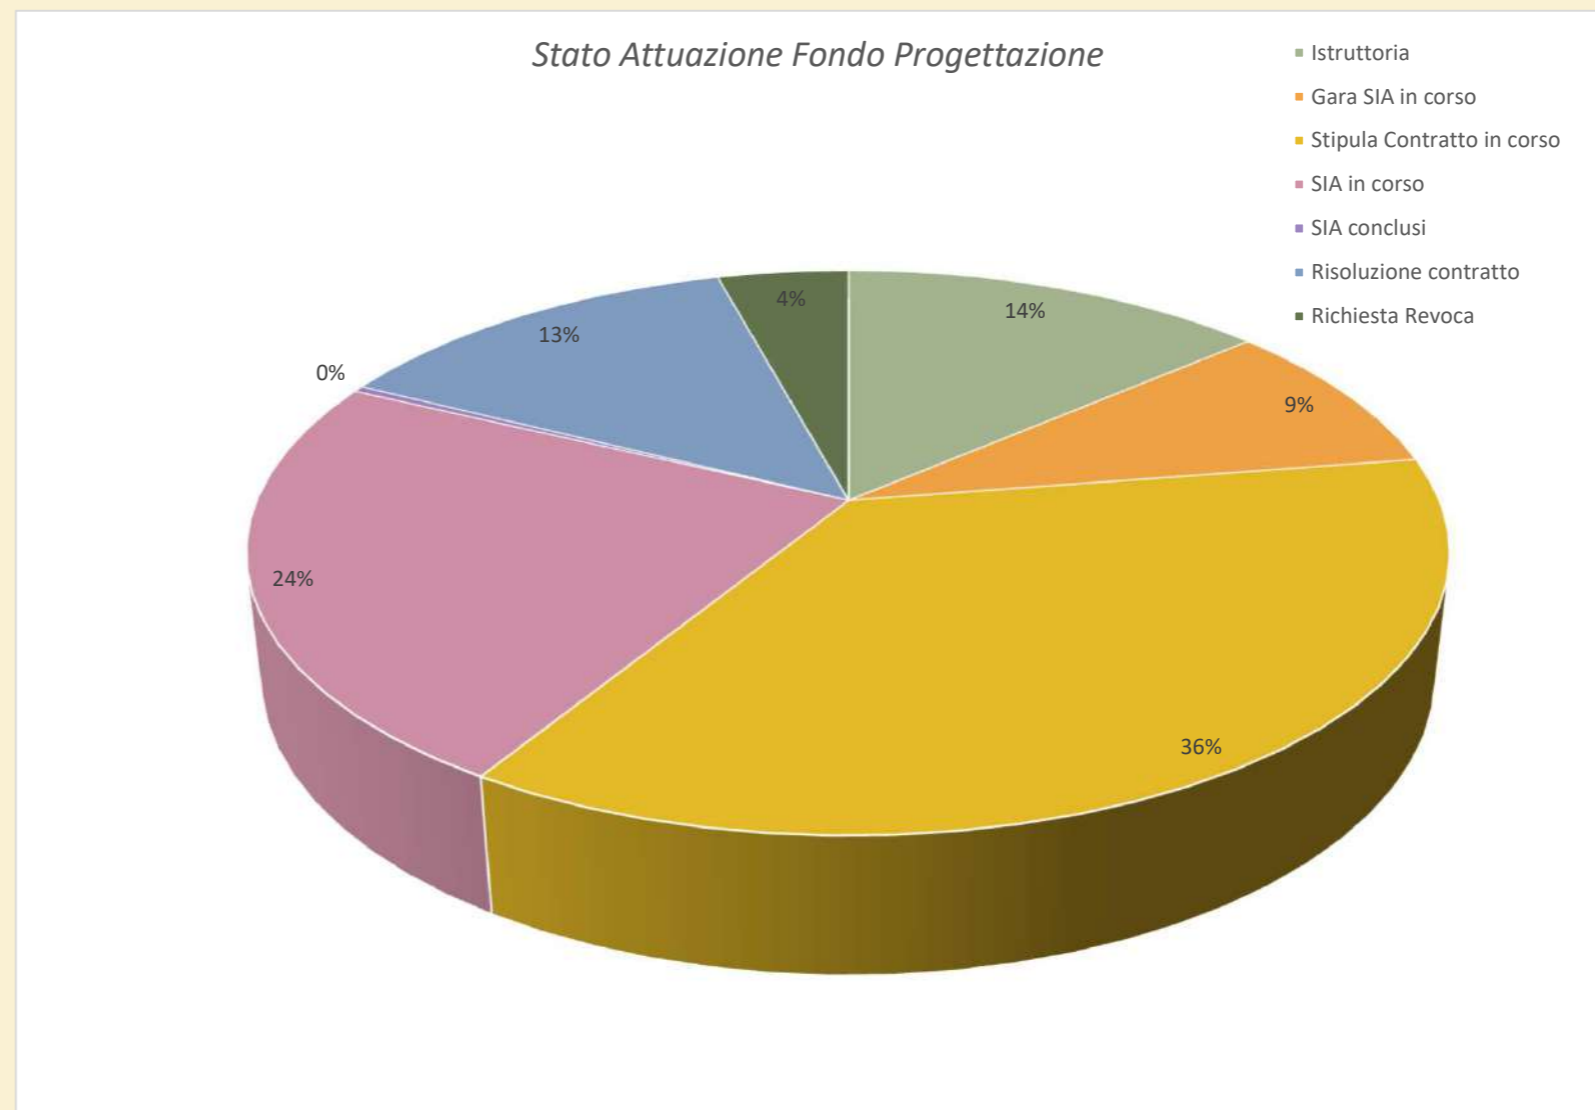

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2021

Piano Stralcio 2019



Importo € 20.771.962,98

Numero Interventi: 12

MONITORAGGIO INTERVENTI PIANO STRALCIO 2019

	RENDIS	CODICE	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	SOMME EROGATE A *GIUGNO 2021
Piano Stralcio 2019	19IR167/G1	ME167	Lavori in corso	M	ME	CASTROREALE	Completamento del Consolidamento del centro abitato della frazione Bafia	1.300.000,00 €	F	L	1720_27/11/2019	1.300.000,00 €	SI	SI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	180.266,26 €
Piano Stralcio 2019	19IR094/G1	PA094	Lavori in corso	M	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Consolidamento della zona di costone roccioso sovrastante l'intervento di somma urgenza eseguito nel tratto in corrispondenza della via Piedimonte. Completamento	1.500.000,00 €	F	L	1804_05/12/2019	1.500.000,00 €	SI	SI	MI.CO. SRL	SI	250.464,60 €
Piano Stralcio 2019	19IR110/G1	EN110	Lavori in corso	M	EN	NICOSIA	Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco	3.338.750,00 €	F	L	1875_13/12/2019	3.338.750,00 €	SI	SI	ATI: ALTA QUORA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL	SI	563.636,29 €
Piano Stralcio 2019	19IR222/G1	ME222	Lavori in corso	M	ME	SAN FRATELLO	Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, Quartiere Porta Sottana, Lavanche, Buviano e parte sottostante Quartiere San Nicolo'	4.100.000,00 €	F	L	1882_13/12/2019	4.100.000,00 €	SI	SI	DEMETRA LAVORI SRL	SI	1.103.071,26 €
Piano Stralcio 2019	19IR349/G1	PA349	Aggiornamento Progettuale	M	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna	1.488.212,98 €	F	S	1667_23/09/2020	24.822,69 €	SS	SS	Ing. Buttice - Geol. Militello	SI	13.219,45 €
Piano Stralcio 2019	19IRC16/G1	MEC16	Lavori in corso	M	ME	ROCCALUMERA	Lavori di recupero delle fumarie di Allume e Sciglio- Bonifica dei margini- Completamento Torrente S	3.750.000,00 €	F	L	1880_13/12/2019	3.750.000,00 €	SI	SI	COSPIN SRL	SI	651.432,19 €
Piano Stralcio 2019	19IRA77G1	MEA77	Lavori in corso	M	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Lavori di consolidamento ed eliminazione del rischio idrogeologico del perimetro urbano in C/da Curatola a protezione della Via Cesare Battisti	1.520.000,00 €	F	L	1857_11/12/2019	1.520.000,00 €	SI	SI	ATI. I.M.G.A. SAS - dott. Caramazza - ICPA S.R.L.	SI	178.586,51 €
Piano Stralcio 2019	19IRF18/G1	TPF18	Lavori in corso	M	TP	ALCAMO	Lavori di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporeale ricadente nel Comune di Alcamo	900.000,00 €	F	L	1547_30/10/2019	900.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	SI	533.088,26 €
Piano Stralcio 2019	19IRF19/G1	MEF19	Lavori in corso	M	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico	1.250.000,00 €	F	L	1858_11/12/2019	1.250.000,00 €	SI	SI	MONDELLO COSTRUZIONI SRL (RICORSO) - PI.SA.NI. SRL (NUOVA AGGIUDICATARIA)	SI	261.793,92 €
Piano Stralcio 2019	19IR429/G1	ME429	Lavori in corso	M	ME	LIBRIZZI	Opere di contenimento centro abitato	150.000,00 €	F	L	1472_18/10/2019 1716_01/10/2020	184.057,62 €	SI	SI	MORETTI QUINTILIO SRL	SI	244.576,37 €
Piano Stralcio 2019	19IR484/G1	ME484	Lavori in corso	M	ME	NASO	Lavori di consolidamento in Contrada Maina	625.000,00 €	F	L	1788_05/12/2019 1832_10/12/2019	625.000,00 €	SI	SI	COGE SRL	SI	261.793,92 €
Piano Stralcio 2019	19IR273/G1	ME273	Istruttoria	M	ME	MESSINA	Opere di consolidamento e protezione del versante meridionale dell'abitato di Bordonaro - R4	850.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €


20.771.962,98 €

18.492.630,31 €

4.241.929,03 €

Piano Stralcio 2019		
N.	STATO DELL'ARTE	IMPORTO
1	ISTRUTTORIA	850.000,00 €
1	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE	1.488.212,98 €
10	LAVORI IN CORSO	18.433.750,00 €
12	<i>Complessivo</i>	<i>20.771.962,98 €</i>

ATTUAZIONE PIANO STRALCIO 2019

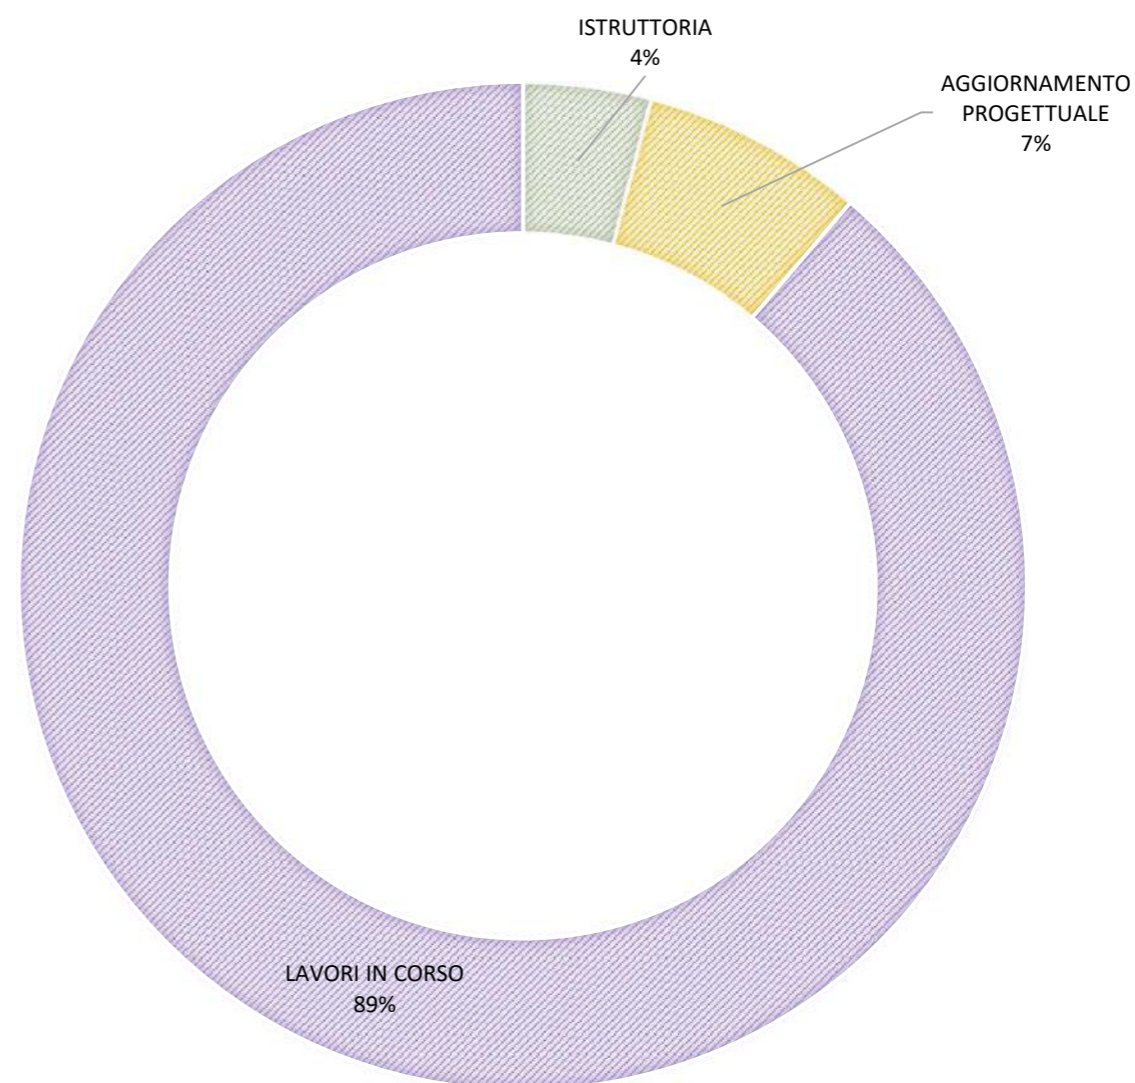

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2021

PIANO OPERATIVO AMBIENTE E II ADDENDUM



Importo € 101.246.370,34

Numero Interventi: 23

MONITORAGGIO INTERVENTI PIANO OPERATIVO AMBIENTE e II ADDENDUM

RENDIS	CODICE	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	SOMME EROGATE A *GIUGNO 2021	
POA	19IR055/G1	CT_401	Istruttoria	FSC	CT	PALAGONIA	Completamento dell'intervento di consolidamento e miglioramento sismico della sede dell'U.T.C.	2.400.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
POA	19IR063/G1	EN_402	Lavori in corso	FSC	EN	AGIRA	Consolidamento e messa in sicurezza della periferia meridionale del centro abitato	1.315.000,00 €	F	L	259_10/02/2020	1.315.000,00 €	SI	SI	ATI S.M. S.R.L. - COS. IT S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C.SAS	SI	4.056,03 €
POA	19IR064/G1	EN_403	Lavori in corso	FSC	EN	AGIRA	Consolidamento e messa in sicurezza versante ovest del Quartiere S. Maria	1.061.685,04 €	F	L	1045_26/07/2019	1.061.685,04 €	SI	SI	ILSET SRL	SI	537.300,52 €
POA	19IR148/G1	PA_404	SIA in corso	FSC	PA	PETRALIA SOPRANA	Lavori di consolidamento del centro abitato di Petralia Soprana, versante sud-ovest	1.491.274,01 €	F	S	1473_18/10/2019	192.274,09 €	SI	SI	RTP: Ing. Zafonti - Ing. C. Zafonti - Ing. Domina - Italiasigis Engineering Srl - Geol. D'Anna	SI	225,00 €
POA	19IR173/G1	ME_405	Gara in corso	FSC	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento centro abitato della frazione Santa Maria	2.415.000,00 €	F	L	868_30/04/2021	2.415.000,00 €	SI	NO		NO	- €
POA	19IR207/G1	ME_406	Gara SIA in corso	FSC	ME	RACCUJA	Consolidamento dell'abitato S.Nicolò-Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja	1.800.000,00 €	F	S	2093_13/11/2020	198.230,20 €	SI	NO		NO	- €
POA	19IR403/G1	ME_407	Lavori in corso	FSC	ME	SAN TEODORO	Consolidamento della zona a valle della Via degli Angeli del centro abitato	2.275.000,00 €	F	L	1323_26/09/2019	2.275.000,00 €	SI	SI	ITALCOSTRUZIONI SRL	SI	1.124.862,69 €
POA	19IR420/G1	ME_408	Lavori in corso	FSC	ME	CASTELMOLA	Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo - Sottoporta	2.000.000,00 €	F	L	1756_03/12/2019	2.000.000,00 €	SI	SI	ATI - COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL -EUROSTRADE SRL	SI	431.511,71 €
POA	19IR517/G1	ME_409	Lavori in corso	FSC	ME	MESSINA	Messina_Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti - Litorale Tirrenico	3.000.000,00 €	F	L	130_21/01/2020	3.000.000,00 €	SI	SI	AMEC SRL	SI	872.079,10 €
POA	19IR529/G1	ME_410	Lavori in corso	FSC	ME	MILITELLO ROSMARINO	Consolidamento all'interno del centro abitato in c.da Ramisi	2.000.000,00 €	F	L	1672_20/11/2019	2.000.000,00 €	SI	SI	ATI CONSORES SRL - GANGI IMPIANTI SLR	SI	848.982,69 €
POA	19IR546/G1	ME_411	Lavori in corso	FSC	ME	ITALA	Lavori di consolidamento e regimentazione idraulica dell'area in frana in località Casaleddu	1.500.000,00 €	F	L	1337_03/08/2020	1.500.000,00 €	SI	SI	SA.CO.REST SRL	SI	4.427,51 €
POA	19IR592/G1	CL_412	Lavori in corso	FSC	CL	MARIANOPOLI	Lavori di consolidamento nella zona delle Case Agricole	945.000,00 €	F	L	1578_05/11/2019	945.000,00 €	SI	SI	EDILSUN SRL	SI	273.499,68 €
POA	19IR620/G1	ME_413	Istruttoria	FSC	ME	FIUMEDINISI	Consolidamento a monte del centro abitato C.da Fontana	1.900.000,00 €	F	L	1554_30/10/2019 Supp. RUP	23.967,05 €	SS	SS	Ing. Scaglione	SI	18.200,00 €
POA	19IR897/G1	SR_414	Lavori in corso	FSC	SR	FERLA	Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C.da Macello II° Lotto	1.200.000,00 €	F	L	1757_03/12/2019	1.200.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. a.r.l.	SI	293.554,55 €
POA	19IRB26/G1	PA_415	Lavori in corso	FSC	PA	BAUCINA	Consolidamento del cimitero comunale - 1° stralcio - messa in sicurezza per l'incolumità pubblica	398.137,47 €	F	L	1874_13/12/2019	398.137,47 €	SI	SI	GANGI IMPIANTI	SI	225,00 €

POA	19IRB36/G1	AG_416	Lavori in corso	FSC	AG	SANT'ANGELO MUXARO	Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento - versante nord-est	3.500.000,00 €	F	L	1908_17/12/2019	3.500.000,00 €	SI	SI	ATI C.E.S.I. SRL	SI	549.588,54 €
POA	19IRB50/G1	ME_417	Lavori in corso	FSC	ME	FRAZZANO'	Consolidamento della zona R4 a monte della via Libertà nel centro urbano di Frazzanò II° stralcio	2.700.000,00 €	F	L	1927_18/12/2019	2.700.000,00 €	SI	SI	MACOS SOC. COOP. (RICORSO) DI NICA COSTRUZIONI SRL	SI	253.387,46 €
POA	19IRB51/G1	ME_418	Lavori in corso	FSC	ME	FRAZZANO'	_Consolidamento della zona R4 a monte della via Libertà nel centro urbano di Frazzanò I° stralcio	2.320.000,00 €	F	L	1083_01/08/2019	2.320.000,00 €	SI	SI	MAMMANA MICHELANGELO	SI	847.309,54 €
POA	19IRC60/G1	ME_419	Lavori in corso	FSC	ME	CAPRI LEONE	Capri Leone_Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato "Torrente Paliace"	1.175.000,00 €	F	L	1890_16/12/2019	1.175.000,00 €	SI	SI	MODESIL SRL - ARLEN SRL	SI	5.594,82 €
POA	19IRC73/G1	AG_420	Gara in corso	FSC	AG	RAFFADALI	Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del Rione Barca	8.982.686,30 €	F	L	232_10/12/2020	9.612.921,90 €	SI	NO		NO	24.008,82 €
ADDENDUM	19IR043/G3	IIA_CT043	Stipula contratto in corso	FSC	CT	SAN GIOVANNI LA PUNTA	Completamento del I Lotto della rete fognante del centro abitato – Stralcio rete acque bianche	1.265.277,03 €	ND	S	1660_22/09/2020	123.196,82 €	SI	SI	RTP: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO, STRAFER INGEGNERIA	NO	- €
ADDENDUM	19IR044/G3	IIA_CT044	Istruttoria	FSC	CT	TRECASTAGNI	Progetto dei lavori per la rete fognante - I° Stralcio rete acque bianche.	2.300.000,00 €	ND	L		- €	NO	NO		NO	- €
ADDENDUM	19IR039/G3	IIA_CT039	Istruttoria	FSC	CT	CATANIA	Completamento Collettore pluviale B	53.302.310,49 €	ND	L		- €	NO	NO		NO	- €

101.246.370,34 €


37.955.412,57 €

6.088.813,66 €

Stato Attuazione Piano Operativo Ambiente (IV ATTO E ADDENDUM)

<i>n.</i>	<i>Stato Attuazione</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
4	Istruttoria	59.902.310,49 €	17,39%
1	Gara SIA in corso	1.800.000,00 €	4,35%
1	SIA in corso	1.491.274,01 €	4,35%
2	Gara in corso	11.397.686,30 €	8,70%
1	Stipula Contratto in corso	1.265.277,03 €	4,35%
14	Lavori in corso	25.389.822,51 €	60,87%
23	<i>Complessivo</i>	<i>101.246.370,34 €</i>	<i>100,00%</i>

Stato Attuazione Piano Operativo Ambiente

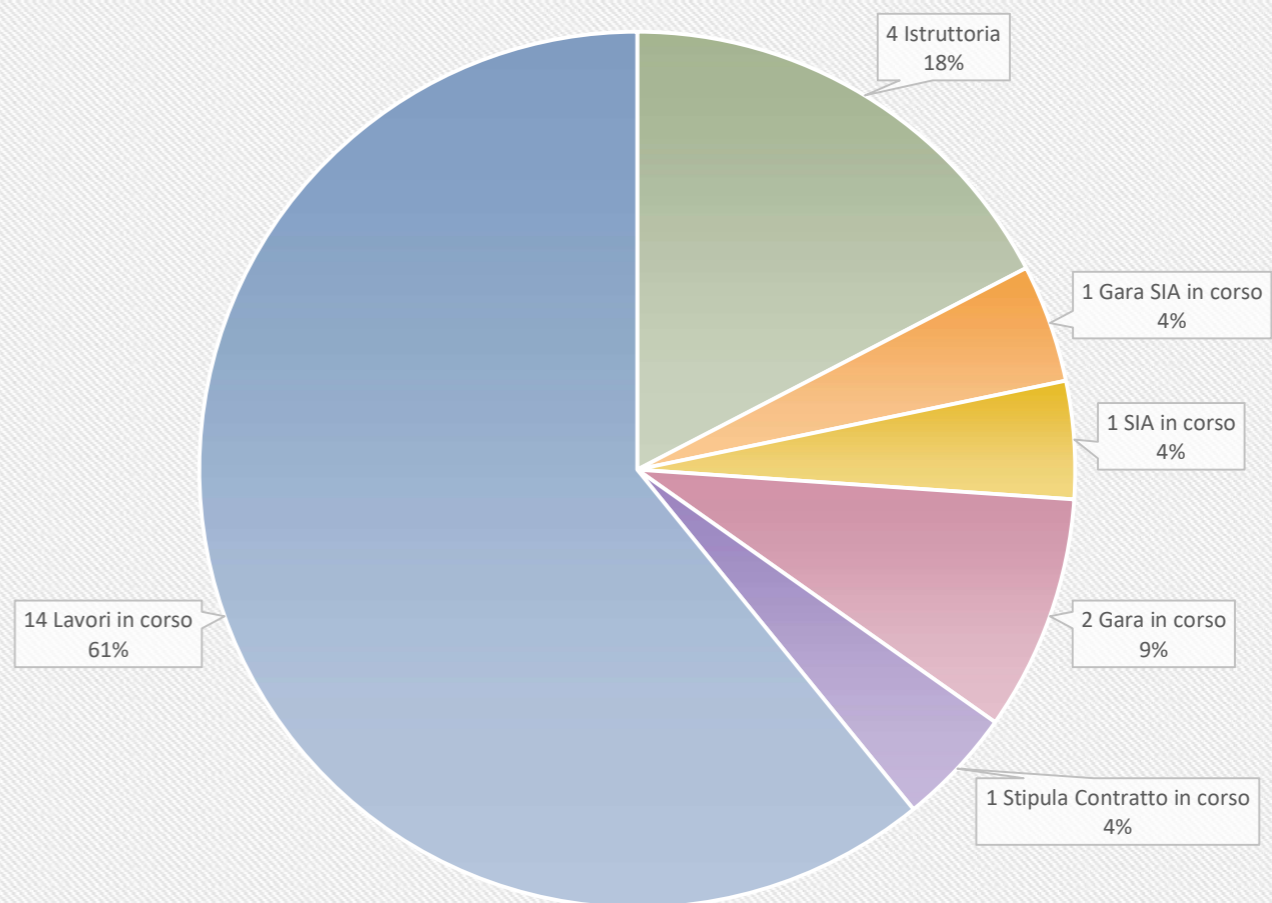

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA




COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2021

Piano Stralcio 2020

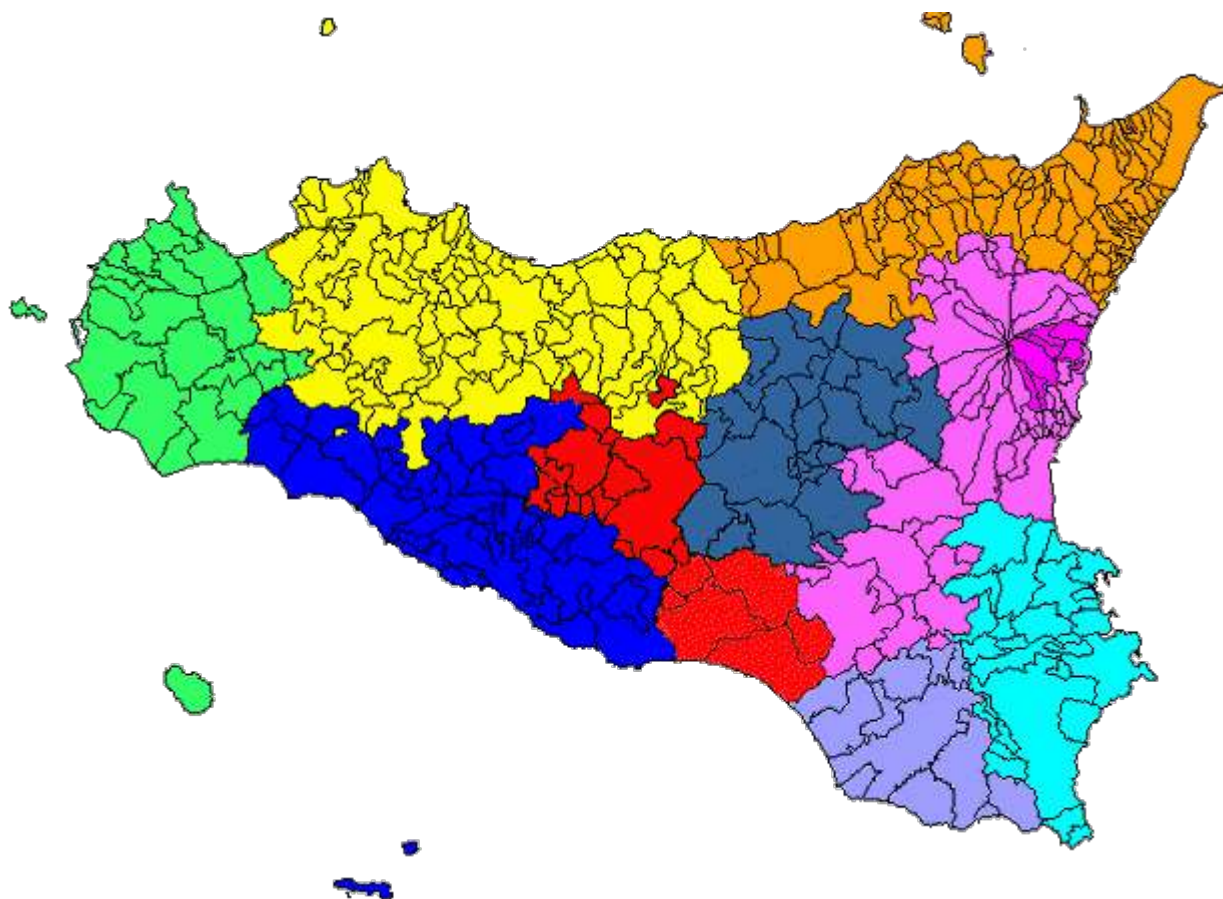

Importo € 18.531.476,00

Numero Interventi: 7

MONITORAGGIO INTERVENTI PIANO STRALCIO 2020

RENDIS	CODICE	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GARA	OGV	ESECUTORE	REP	SOMME EROGATE A *GIUGNO 2021	
Piano Stralcio 2020	19IR156/G1	TP_501	Predisposizione Atti di Gara	FSC	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera	1.400.000,00 €	F	L	1024_21/05/2021	1.650.000,00 €	NO	NO		NO	- €
Piano Stralcio 2020	19IR235/G1	EN_502	Nuova Programmazione	FSC	ME	CASTELMOLA	Progetto per il consolidamento dell'abitato di Castelmola nei tratti del "Castello lato sud e sottoporta"	2.000.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
Piano Stralcio 2020	19IR886/G1	EN_503	Nuova Programmazione	FSC	SR	FRANCOFONTE	Lavori di consolidamento per la mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	2.380.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
Piano Stralcio 2020	19IRB97/G1	ME_504	Nuova Programmazione	FSC	ME	NASO	Consolidamento e Messa in Sicurezza Per La Mitigazione del rischio idrogeologico in località San Giuliano	1.026.476,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
Piano Stralcio 2020	19IRA36/G1	ME_505	Nuova Programmazione	FSC	ME	NOVARA DI SICILIA	Mitigazione Rischio Idrogeologico a protezione del centro abitato in Novara di Sicilia- Via Bnedetto Croce e C.da Roccazza Fraz. San Basilio	1.950.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
Piano Stralcio 2020	19IRB90/G1	PA_506	Nuova Programmazione	FSC	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli abitati si Sferracavallo e Barcarello	8.925.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
Piano Stralcio 2020	19IRC31/G1	PA_507	Nuova Programmazione	FSC	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su via Falconara	850.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €

18.531.476,00 €

1.650.000,00 €

- €
