



MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
Piani e programmi affidati alla struttura commissariale




N°	Tipologia Fondo	Importo progetti
28	POC	€ 69.490.138,00
269	PATTO PER IL SUD	€ 499.421.361,97
13	PATTO CITTA' METROPOLITANE	€ 77.664.545,48
65	FONDO PROGETTAZIONE	€ 15.925.200,00
12	PIANO STRALCIO	€ 20.771.962,98
20	POA	€ 44.378.782,82
3	ADDENDUM	€ 56.867.587,52
7	AP_V Atto Integrativo	€ 18.531.476,00
6	AP_VI_Atto Integrativo	€ 19.234.331,76

423 € 822.285.386,53

PRA	€ 11.286.621,00
Residuo POC da Programmare	€ 457.434,73

€ 834.029.442,26

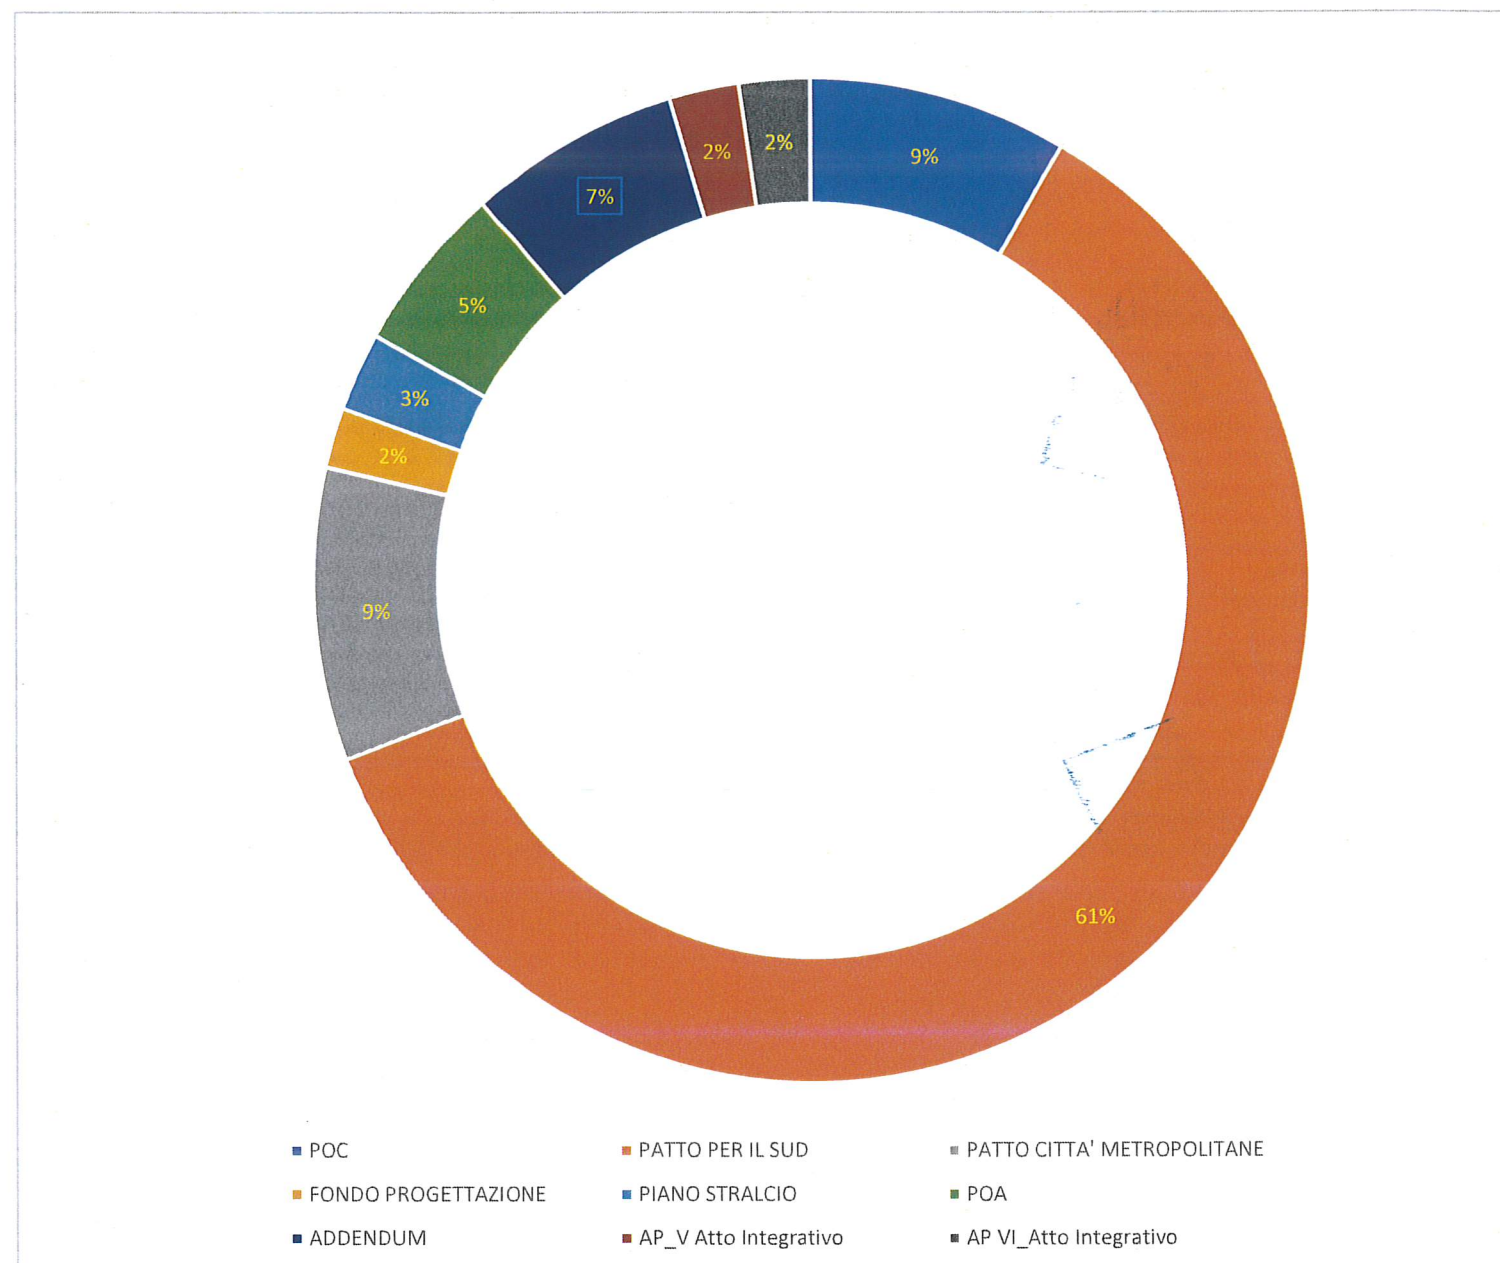

MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

Programmazione Interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico Regione Siciliana						
	Risorse Programmate		Risorse Finanziate		OGV	Somme Erogate
	n.	Importo	n.	Importo	Importo	Importo
FONDI POC	28	69.490.138,00 €	9	18.193.955,01 €	14.462.565,14 €	2.525.013,77 €
PATTO PER IL SUD (FONDI FSC)	269	499.421.361,97 €	272	393.675.035,71 €	391.489.303,24 €	148.267.494,78 €
PATTO CITTA' METROPOLITANE	13	77.664.545,48 €	11	4.503.610,71 €	4.498.150,71 €	894.628,32 €
FONDO PROGETTAZIONE	65	15.925.200,00 €	44	13.542.347,62 €	13.015.124,74 €	1.806.731,69 €
PIANO STRALCIO (2019)	12	20.771.962,98 €	12	20.058.652,76 €	20.058.652,76 €	15.268.455,26 €
PIANO OPERATIVO AMBIENTE AP_IV Atto Integrativo	20	44.378.782,82 €	19	39.131.215,67 €	39.131.215,67 €	20.490.665,17 €
ADDENDUM AL POA	3	56.867.587,52 €	2	53.425.507,31 €	123.196,82 €	23.538,56 €
PIANO STRALCIO 2020 AP_V Atto Integrativo	7	18.531.476,00 €	1	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AP VI_Atto Integrativo	6	19.234.331,76 €	1	92.145,20 €	0,00 €	0,00 €
PRA	*	11.286.621,00 €				
Residuo POC da Programmare	*	457.434,73 €				
Complessivo	423	834.029.442,26 €	354	544.272.469,99 €	482.778.209,08 €	189.276.527,55 €

Distribuzione Risorse sul Territorio



MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

Interventi di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico Regione Siciliana						
	Risorse Programmate		Risorse Finanziate		OGV	Somme Erogate
AGRIGENTO	32	86.909.899,25 €	28	83.147.315,66 €	82.997.315,66 €	27.970.018,28 €
CALTANISSETTA	21	17.974.104,65 €	17	13.339.070,69 €	15.734.104,65 €	4.847.454,09 €
CATANIA	42	133.370.234,24 €	27	78.433.454,50 €	23.756.562,88 €	5.660.412,39 €
ENNA	16	23.247.908,88 €	14	18.902.908,88 €	18.902.908,88 €	6.345.500,62 €
MESSINA	222	370.633.975,34 €	187	260.911.836,31 €	255.231.395,74 €	110.923.421,28 €
PALERMO	64	119.545.628,67 €	51	50.356.641,18 €	50.356.641,18 €	11.394.927,06 €
RAGUSA	2	12.248.000,00 €	2	12.203.000,00 €	12.203.000,00 €	74.829,44 €
SIRACUSA	10	31.504.420,48 €	9	14.113.293,74 €	14.113.293,74 €	3.045.578,34 €
TRAPANI	14	15.107.159,29 €	13	12.864.949,03 €	12.793.905,55 €	4.333.735,49 €
PRA	*	11.286.621,00 €				
Residuo da Programmare	*	457.434,73 €				
Complessivo	423	822.285.386,53 €	348	544.272.469,99 €	486.089.128,28 €	174.595.876,99 €

REPUBBLICA ITALIANA


REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

MONITORAGGIO INTERVENTI POC





MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE SICILIANA



Fonte	Piano	RENDIS	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GA RA	OGV	ESECUTORE	REP	SPESO AL 30/06/2022
dl 442/2021	POC	ND	Istruttoria	POC	AG	AGRIGENTO	Interventi di mitigazione "Scala dei Turchi"	1.000.000,00 €				- €	NO	NO		NO	
dl 442/2021	POC	19IRA30/G1	Stipula Contratto in corso	POC	ME	ALI'	Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale	217.387,04 €	F	S	138_14/02/2018 128_20/01/2021	216.372,87 €	SI	SI	RTP: ARTEC ASSOCIATI SRL - GEOL. NICITA - ING. SPINA	NO	30,00 €
dl 306/2016	POC	19IRA09/G1	Istruttoria	POC	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Sistemazione del piano viabile, regimentazione delle acque e sistemazione versanti della strada di collegamento maletto- ficarella-castroreale	2.800.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 306/2016	POC	19IR029/G1	SIA in corso	POC	CT	CALTAGIRONE	Progetto di consolidamento del Centro storico quartiere Santo Stefano	3.350.000,00 €	I	S	475_12/03/2020	377.829,24 €	SI	SI	RTP TECNHNITAL SPA - Costa Associati - Studio di Ingegneria e Architettura - GEO RAS SRL	SI	44.299,35 €
dl 214/2022	POC	ND	Istruttoria	POC	CT	CATANIA	Lavori urgenti per il presidio della messa in sicurezza dei versanti in frana, mitigazione del rischio Idrogeologico a tutela della pubblica incolumità di un tratto di strada della S.P 47	750.202,47 €				- €	NO	NO		NO	- €
dl 214/2022	POC	ND	Istruttoria	POC	PA	ISNELLO	Interventi di messa in sicurezza della Stazione Osservativa del Parco Astronomico in località Monte Mufara	76.550,00 €				- €	NO	NO			- €
dl 306/2016	POC	19IR975/G1	Istruttoria	POC	ME	LIPARI	Interventi di riequilibrio litoraneo ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in loc. Canneto.	8.260.000,00 €	C	S	2457_28/12/2020	372.222,86 €	SI	SI	HYPRO SRL - ARCH. PIGNATELLO - DOTT. BERTOLINO - ING. SPINA	SI	38.361,24 €
dl 442/2021	POC	19IRF30/G1	Istruttoria	POC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell' alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso	2.000.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	
dl 442/2021	POC	19IRF31/G1	Istruttoria	POC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell' alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Annunziata escluso ed il Torrente S. Filippo incluso	2.000.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	
dl 442/2021	POC	19IRF32/G1	Istruttoria	POC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell' alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente S. Filippo escluso ed il Torrente Giampileri	2.000.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	
dl 442/2021	POC	19IRF33/G1	Istruttoria	POC	ME	MESSINA	Interventi di riduzione del rischio alluvioni mediante sistemazione dell' alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti tominati e delle vasche di calma, ricadenti nel territorio comunale (stralcio esecutivo)	949.332,59 €	A	L		- €	NO	NO		NO	

dl 442/2021	POC	19IR138/G1	Istruttoria	POC	PA	MISILMERI	Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del Quartiere San giusto - 3° stralcio	600.000,00 €	F	S			- €	NO	NO		NO	- €
dl 214/2022	POC	ND	Istruttoria	POC	PA	MONREALE	Lavori consolidamento e messa in sicurezza del muro del sagrato del Santuario Maria SS Addolorata al calvario delle Croci	701.598,00 €					- €	NO	NO		NO	
dl 442/2021	POC	19IR170/G1	Istruttoria	POC	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio ed al Cimitero del centro urbano.	1.569.000,00 €	I	L	822_23/11/2017 164_02/02/2022	1.603.000,00 €	NO	NO			NO	- €
dl 442/2021	POC	19IR889/G1	Gara SIA in corso	POC	CL	MUSSOMELI	"Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su infrastruttura in c.da Cordoverse".	354.000,00 €	I	S	042_14/01/2022	353.664,30 €	SI	NO			NO	- €
dl 306/2016	POC	19IRA01/G1	Stipula Contratto in corso	POC	SR	NOTO	Lavori di ricostruzione, protezione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale del litorale in località Lido di Noto	12.000.000,00 €	C	S	491_31/05/2018	496.140,17 €	SI	SI	RTP: Ing. D'arrigo - Netec - Barbagiovanni - Baratta - Lo Presti - Rustica - Merk - Mangano - La Rosa		SI	39.930,00 €
dl 13/2021	POC	19IR228/G1	Istruttoria	POC	ME	PETTINEO	Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina- Comune di Pettineo (ME)	1.772.097,57 €			830_10/05/2022	1.772.097,57 €	NO	NO			NO	- €
dl 306/2016	POC	19IR039/G1	Istruttoria	POC	AG	RACALMUTO	Consolidamento costone roccioso a tutela del centro abitato in via Gen. Macaluso	620.000,00 €	F	L			- €	NO	NO		NO	
dl 442/2021	POC	19IRC73/G1	Istruttoria	POC	AG	RAFFADALI	Opere per l'eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del rione Barca - completamento	630.235,60 €	F	S			- €	NO	NO		NO	6.179,26 €
dl 442/2021	POC	19IRA74/G1	Istruttoria	POC	CT	SANTA VENERINA	Opere di bonifica e rinaturalizzazione del Torrente Fago e riqualificazione del contesto ambientale	1.325.000,00 €	A	L			- €	NO	NO		NO	- €
dl 306/2016	POC	19IR932/G1	Lavori in corso	POC	ME	SANT'ALESSIO SICULO	Opera a salvaguardia della costa e dell'abitato (ME)	13.000.000,00 €	C	L	1699_28/09/2020	13.000.000,00 €	SI	SI	ATI EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA - CA.TI.FRA. SRL - C.G.F. SRL		NO	2.393.585,92 €
dl 214/2022	POC	ND	Istruttoria	POC	CT	SCORDIA	Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Archi in territorio di Scordia	3.465.000,00 €					- €	NO	NO			- €
dl 214/2022	POC	ND	Istruttoria	POC	CT	SCORDIA	Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Cava	1.635.000,00 €					- €	NO	NO			- €
dl 214/2022	POC	ND	Istruttoria	POC	CT	SCORDIA	Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Loddiero in territorio Scordia	845.000,00 €					- €	NO	NO			- €


dl 214/2022	POC	ND	Istruttoria	POC	CT	SCORDIA	Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo in C.da Rossitto in corrispondenza della S.P. n. 29	1.650.000,00 €				- €	NO	NO		- €
dl 214/2022	POC	ND	Istruttoria	POC	CT	SCORDIA	Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Serravalle	4.150.000,00 €				- €	NO	NO		- €
dl 214/2022	POC	19IR850/G1	Istruttoria	POC	ME	SPADAFORA	Intervento per la messa in sicurezza del torrente Tonnarazza dal rischio esondazioni a protezione della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte Ferroviario	1.256.000,00 €	A	S	248_27/02/2019_VIA	2.628,00 €	NO	NO	NO	2.628,00 €
dl 214/2022	POC	ND	Istruttoria	POC	PA	VALLEDOLMO	Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità della strada Valledomo-Vallelunga Pratameno in corrispondenza del ponte in C.da Celso	56.300,00 €				- €	NO	NO		- €
dl 214/2022	POC			POC	DRT	DRT	RESIDUO	457.434,73 €				- €	- €			- €

69.490.138,00 €

18.193.955,01 €

2.525.013,77 €

STATO DELL'ARTE	N.	%
Istruttoria	16	57,14%
Gara SIA in Corso	1	3,57%
SIA_Indagini In corso	1	3,57%
Stipula Contratto in corso	2	7,14%
Lavori in corso	1	3,57%
Nuova Programmazione	7	25,00%
	28	100,00%

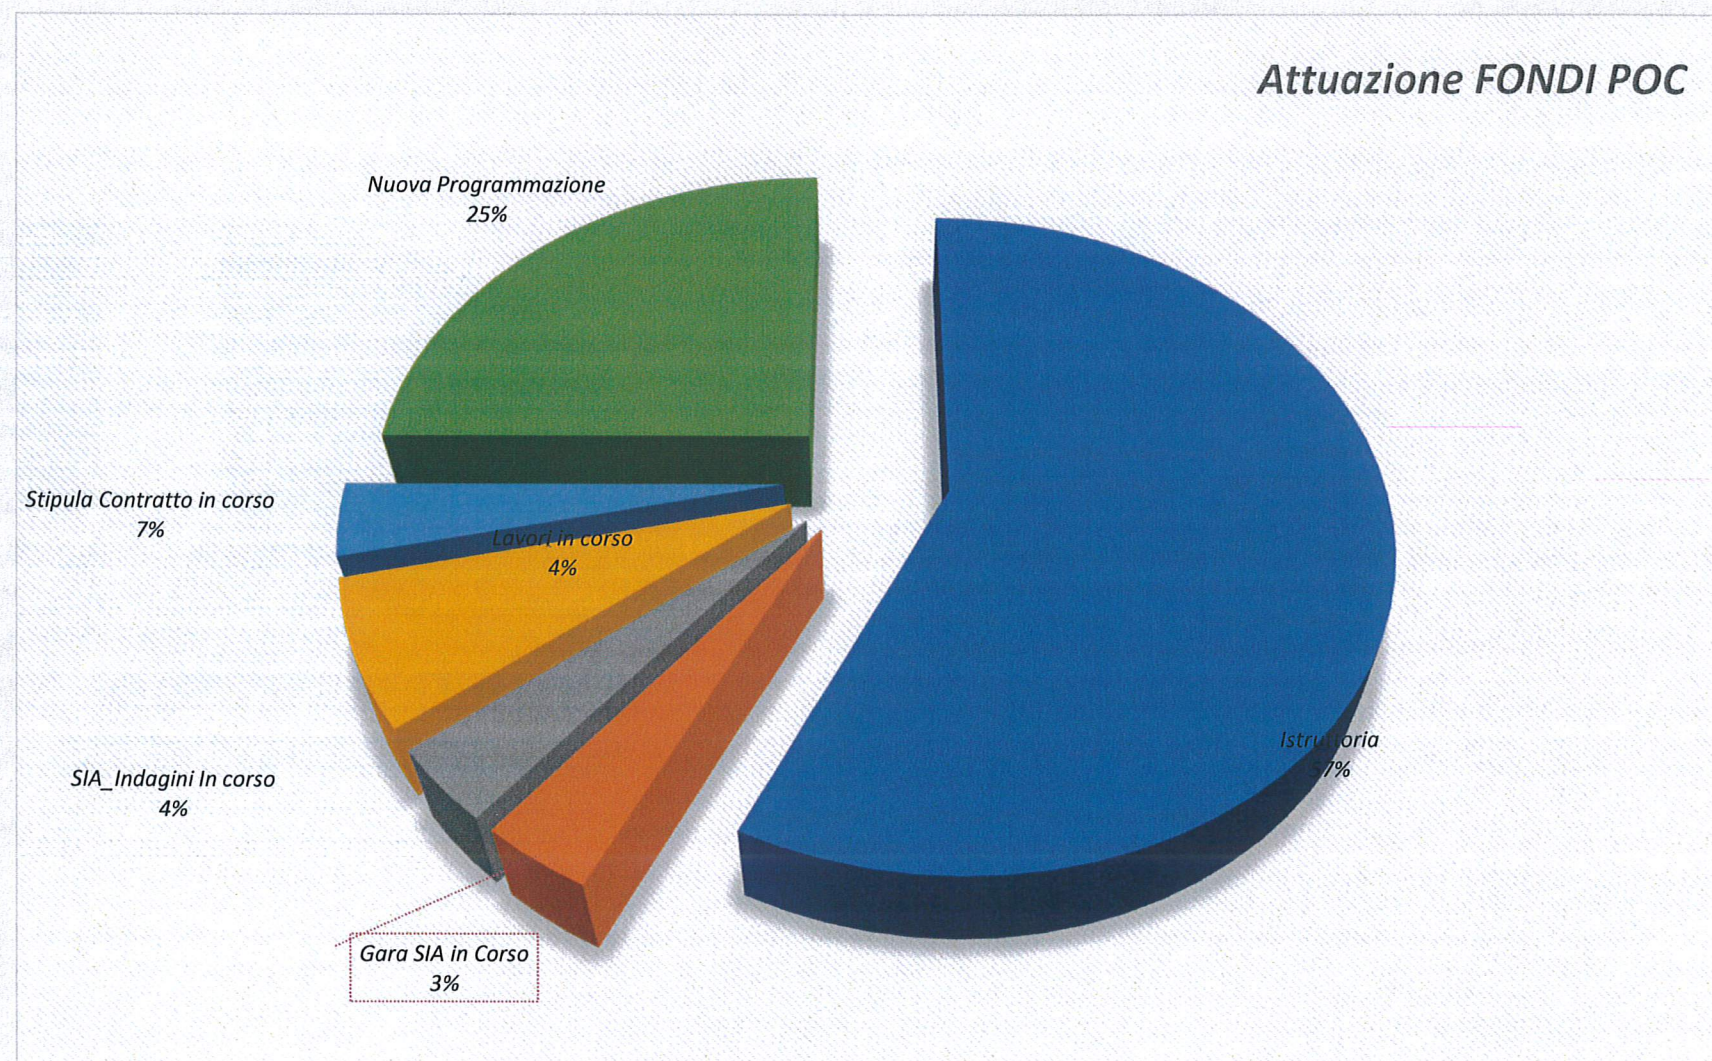

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

MONITORAGGIO FONDI FSC


PATTO PER IL SUD

A graphic element consisting of a thick, wavy orange line that curves from the bottom left towards the top right, framing the text.

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

IMPORTO FONDI FSC			
N.	Tipo Dissesto	Importo Progetti	%
36	Alluvioni	70.749.706,76 €	14,2%
32	Costiero	91.385.170,89 €	18,3%
138	Frane	216.521.340,06 €	43,4%
66	Messa in Sicurezza Infrastrutture	109.478.523,26 €	21,9%
1	Piano Rafforzamento Amministrativo	€ 11.286.621,00	2,3%
269		€ 499.421.361,97	

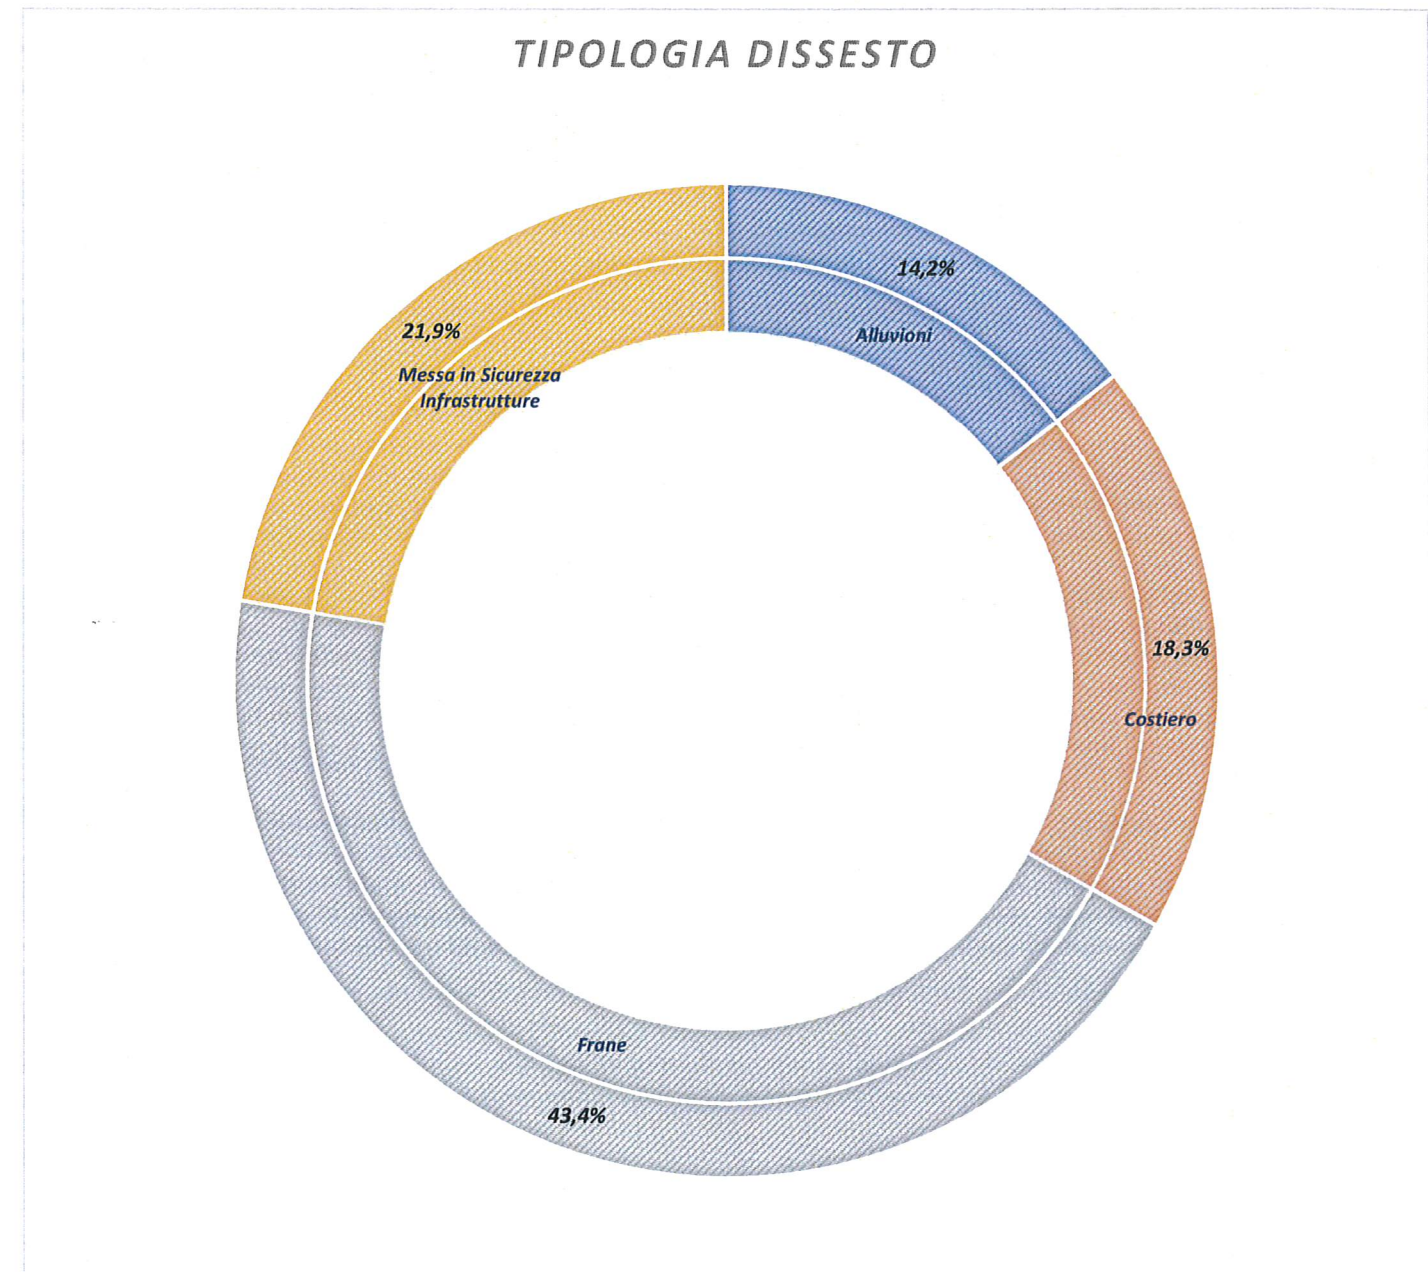



MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE SICILIANA



Fonte	Piano	RENDIS	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GA RA	OGV	ESECUTORE	REP	SPESE AL 30/06/2022
dl 13/2021	PATTO	19IR032/G3	Lavori conclusi	FSC	CT	ACI CASTELLO	Regimentazione delle acque piovane in via Trieste nella Fraz. di Ficarazzi	399.888,16 €	A	L	345_18/04/2018_P 395_27/03/2019_L	399.888,16 €	SI	SI	MATINA GEOM. GIOVANNI	SI	145.879,70 €
dl 13/2021	PATTO	19IR601/G1	SIA in corso	FSC	CT	ACIREALE	Interventi di sistemazione idraulica dell'area del territorio comunale zona Wagner	180.000,00 €	A	S	1025_24/07/2019	157.979,53 €	SI	SI	GEOSURVEY	SI	30,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IR026/G1	SIA IN CORSO	FSC	CT	ACIREALE	Consolidamento e sistemazione idraulica del Torrente Lavinaio Platani	300.000,00 €	A	S	1029_24/07/2019	283.841,90 €	SI	SI	RTP STUDIO INGEO, CASCONI ENGINEERING, AB2 ENGINEERING SRL, ING. BELPASSO, GEOL. D'URSO, AM ENGINEERING SRL, S.G.M., MTR MECCANICA TERRE E ROCCE	SI	30.937,09 €
dl 13/2021	PATTO	19IR603/G1	SIA IN CORSO	FSC	CT	ACIREALE	Sistemazione idraulica dell'area del territorio comunale tra S.Giovanni e Aci Platani	350.000,00 €	A	S	1047_27/07/2019	263.100,42 €	SI	SI	RTP Studio Ingeo - Cascone Engineering - AB2 SRL - Ing. Belpasso Geol. D'Urso - AM SRL	SI	16.938,72 €
dl 13/2021	PATTO	19IR989/G1	Lavori conclusi	FSC	CL	ACQUAVIVA PLATANI	Consolidamento e sistemazione del tratto di strada viale Trieste e Aree adiacenti.	1.400.000,00 €	I	L	496_05/06/2018	1.400.000,00 €	SI	SI	CO.GEN.AP. SRL	SI	804.231,63 €
dl 13/2021	PATTO	19IR346/G1	Lavori in corso	FSC	AG	AGRIGENTO	Interventi di mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorgono il duomo e l'intera area diocesana di Agrigento	27.000.000,00 €	F	L	716_27/04/2020	26.836.415,42 €	SI	SI	ATI COSPIN SRL - EDILAP SOC.COOP. ARL - SGROMO COSTRUZIONI SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL	SI	9.250.611,38 €
dl 13/2021	PATTO	19IR334/G1	Lavori conclusi	FSC	EN	AIDONE	Completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica_zona Castello	1.350.000,00 €	F	L	667_03/10/2017	1.350.000,00 €	SI	SI	C.F.C. SOC. COOP.	SI	929.514,28 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA39/G1	Lavori in corso*	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Recupero funzionale e sistemazione del torrente Bongiorno	400.000,00 €	A	L	736_01/08/2018	400.000,00 €	SI	SI	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	SI	1.525,90 €
dl 13/2021	PATTO	19IR770/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato - zona circonvallazione nord	232.000,00 €	F	S	243_22/02/2019 1076_01/08/2019	60.609,64 €	SS	SS	NOVATEK SRL	SI	38.608,57 €
dl 13/2021	PATTO	19IR767/G1	Lavori in corso	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato - zona Baratta	3.450.000,00 €	F	L	498_05/06/2018	3.450.000,00 €	SI	SI	ATI GHELLER SRL	SI	2.281.510,50 €
dl 13/2021	PATTO	19IR772/G1	Lavori in corso	FSC	ME	ALCARA LI FUSI	Interventi di consolidamento della Zona Villicano	1.920.000,00 €	F	L	1876_13/12/2019	1.920.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOP	SI	6.034,61 €
dl 13/2021	PATTO	19IR080/G1	SIA in corso*	FSC	PA	ALIMENA	Consolidamento della zona a valle del centro abitato "Pasciovalli-Fontanazza" e conseguente riassetto ambientale	82.706,52 €	F	S	509_06/06/2018	82.706,52 €	SI	SI	RTP: MADA ENGINEERING SRL - IEA ASSOCIATI SRLS	SI	26.593,20 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA27/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento a protezione del centro abitato della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 19	1.250.000,00 €	I	L	758_02/11/2017	1.250.000,00 €	SI	SI	COSPIN SRL UNIPERSONALE	SI	812.868,47 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA57/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento e salvaguardia dell'abitato di canigliari zona ovest e della zona chiesa Sacra Famiglia	360.000,00 €	F	S	803_08/05/2020_I 388_07/03/2022_P	83.850,02 €	SS	SS	PSAILA AMBIENTE SRL	SI	23.699,51 €
dl 13/2021	PATTO	19IR617/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato	480.000,00 €	F	S	805_08/05/2020 387_07/03/2022	85.263,52 €	SS	SS	I.M.G.A. sas	SI	27.707,43 €

dl 13/2021	PATTO	19IR313/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	ANTILLO	Consolidamento a valle del centro urbano in località giorgina - piano calcare	2.500.000,00 €	F	L	833_14/06/2019	2.500.000,00 €	SI	SI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	1.380.814,76 €
dl 13/2021	PATTO	19IR163/G1	Lavori in corso	FSC	SR	AVOLA	Progetto di realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa- Avola (SR)	10.801.968,49 €	C	S+L	224_07/03/2018	10.801.968,49 €	SI	SI	ATI PACOS SRL - MESSINA COSTRUZIONI SRL - URANIA SRL	SI	1.564.974,33 €
dl 13/2021	PATTO	19IR082/G1	SIA in corso	FSC	PA	BALESTRATE	Progetto generale esecutivo per il consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia Croce, Completamento	1.800.000,00 €	F	S	564_13/06/2018 1126_15/11/2018 1366_04/08/2020	130.136,73 €	SI	SI	RTP Mediterranea Engineering SRL - PRO GEO PRG - GEOTEKNIC Ass. di professionisti Martinello Chiara	SI	57.424,45 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA48/G1	SIA in corso	FSC	EN	BARRAFRANCA	Mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di collettori e sistemi di captazione per la regimazione delle acque piovane	443.015,29 €	A	S	794_23/08/2018 093_28/01/2019 242_27/02/2019	443.015,29 €	SI	SI	RTP: C&C Engineering srl - Studio Iadanza - Ing. Giovanni Giusti Ing. Morena Giusti Geol. Barbagallo - Geol. Laurelli	SI	81.935,55 €
dl 13/2021 NEW	PATTO	19IR824/G1	Istruttoria	FSC	EN	BARRAFRANCA	Consolidamento delle pendici di via Catania	2.345.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR182/G1	SIA in corso	FSC	ME	BASICO'	Lavori di consolidamento della porzione del centro abitato a protezione degli alloggi popolari delle zone di espansione residenziali.	320.000,00 €	F	S	1115_06/08/2019	206.932,21 €	SI	SI	RTP: ORION PROGETTI SRL - ING. CARDACI - ING. RADICI - GEODRILL	SI	72.795,25 €
dl 13/2021	PATTO	19IRB06/G1	Lavori in corso	FSC	PA	BISACQUINO	Interventi urgenti di ripristino delle funzionalità della "via Quaranta" ed eliminazione del rischio idraulico residuo sul "Burrone monte Peloso"	3.663.628,79 €	I	L	856_19/06/2019	3.663.498,18 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	SI	813.504,48 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD58/G1	Lavori in corso	FSC	AG	BIVONA	Lavori di messa in sicurezza Strada di collegamento tra Bivona e Palazzo Adriano.	2.430.000,00 €	I	L	1329_27/09/2019	2.430.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A.R.L.	SI	758.178,72 €
dl 13/2021	PATTO	ND	Lavori in corso	FSC	AG	BIVONA	Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di contenimento e di raccolta acque della strada esterna di collegamento Bivona-Santo Stefano di Quisquina	720.000,00 €	F	L	1868_21/09/2021	720.000,00 €	SI	SI	I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO e C.S.A.S.	SI	3.921,82 €
dl 13/2021	PATTO	19IR895/G1	Lavori in corso	FSC	PA	BORGETTO	Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto	1.500.000,00 €	A	L	697_13/10/2017	1.500.000,00 €	SI	SI	AND COSTRUZIONI SRL	NO	716.360,77 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA84/G1	SIA in corso	FSC	ME	BROLO	Recupero e riqualificazione del borgo murato - versante nord del centro storico	418.697,15 €	F	S	676_11/07/2018 1202_30/11/2018	418.697,15 €	SI	SI	RTP: HYPRO SRL - GEOL. GIACCHETTI - EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI SAS - GHEA SRL	NO	102.415,89 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA42/G1	SIA in corso	FSC	ME	BROLO	Progetto per il consolidamento della Fraz. Jannello Inferiore	351.374,38 €	F	S	704_28/05/2019	351.374,38 €	SI	SI	RTP: CIVIL PROJECTS ENGINEERING & CONTRACTING SRLS - ING. CARDACI - ING. BUCOLO - GEOL. PONTILLO - ING. MICALI	SI	74.365,50 €
dl 13/2021	PATTO	19IRB70/G1	Lavori conclusi	FSC	SR	BUCCHERI	Mitigazione del rischio Idrogeologico lungo la strada di ingresso C.U. ex strada SS124 del Comune di Buccheri.	95.000,00 €	I	S	805_12/06/2019	50.000,00 €	SS	SS	GEO DRILLING SRL	SI	38.362,36 €
dl 13/2021	PATTO	19IR071/G1	Lavori in corso	FSC	EN	CALASCIBETTA	Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S.Pietro e S.Matteo. III Stralcio completamente	2.850.000,00 €	F	L	2140_19/11/2020	2.850.000,00 €	SI	SI	SIOSS SOCIETA' ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL	SI	854.425,68 €
dl 13/2021	PATTO	ND	Lavori in corso	FSC	TP	CALATAFIMI SEGESTA	Lavori di consolidamento del piazzale Belvedere Francesco Vivona nel Comune di Calatafimi - Segesta	750.000,00 €	I	L	1112_29/06/2020	750.000,00 €	SI	SI	ALBERTI COSTRUZIONI SRL	SI	454.265,78 €
dl 13/2021	PATTO	19IR010/G1	Lavori in corso	FSC	AG	CALTABELLOTTA	Completamento del consolidamento del costone roccioso San Pellegrino ed a salvaguardia del centro abitato.	3.072.778,03 €	F	L	594_09/05/2019	3.072.778,03 €	SI	SI	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	SI	1.389.538,40 €
dl 13/2021 NEW	PATTO	ND	Nuova Programmazione	FSC	CT	CALTAGIRONE	Lavori di somma urgenza per il ripristino del transito veicolare lungo la via Cristoforo Colombo a seguito di cedimento della sede stradale per garantire la pubblica incolumità	126.286,36 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €

dl 13/2021	PATTO	19IR013/G1	Lavori in corso	FSC	AG	CAMMARATA	Consolidamento zona Sant'Agostino - Terra Rossa_1° Stralcio Esecutivo	3.600.000,00 €	F	L	630_18/09/2017_I 1035_31/10/2018_L	3.600.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE EOS	SI	178.712,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA81/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	Lavori di consolidamento del versante roccioso ovest di Torretta Granitola	300.000,00 €	F	S	1116_30/06/2020 512_23/03/2022	93.651,34 €	SS	SS	FAREL IMPIANTI SRL	SI	38.154,09 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD64/G1	Lavori conclusi	FSC	AG	CANICATTI'	Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega la SS. 123 con le contrade "Vecchia Dama - Dammuso - Capo D'Acqua" con la SS. 640	2.500.000,00 €	I	L	684_11/07/2018	2.500.000,00 €	SI	SI	ATI: EUROINFRASTRUTTURE SRL - MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE	SI	2.123.113,05 €
dl 13/2021	PATTO	19IR951/G1	Lavori in corso	FSC	PA	CAPACI	Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci	4.998.000,00 €	F	L	597_09/05/2019 1192_08/07/2020	5.000.000,00 €	SI	SI	M.S. COSTRUZIONI SRL	SI	1.014.226,47 €
dl 13/2021	PATTO	19IR940/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	CAPIZZI	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere Fortina	78.920,45 €	F	S	833_079/09/2018 387_25/03/2019	78.920,45 €	SS	SS	GEOSURVEY SRL	SI	20.835,48 €
dl 13/2021	PATTO	19IR953/G1	Istruttoria	FSC	ME	CAPO D'ORLANDO	Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale	950.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IRB22/G1	Lavori in corso	FSC	ME	CAPO D'ORLANDO	Mitigazione rischio idrogeologico a sud del promontorio Capo	2.430.000,00 €	F	L	818_11/05/2020	2.430.000,00 €	SI	SI	MEDI APPALTI SRL	SI	806.694,58 €
dl 13/2021	PATTO	19IR976/G1	SIA in corso	FSC	PA	CARINI	Intervento di protezione da caduta massi finalizzata al riuso del nucleo abitativo sottostante il costone in C/da Giagaffe.	420.351,58 €	F	S	208_02/03/2018 1077_08/11/2018	77.084,17 €	SI	SI	RTP BRUCCHERI MARTINELLO	SI	61.281,33 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA72/G1	SIA in corso	FSC	SR	CARLENTINI	Consolidamento del muro e del versante adiacente a via G. da Procida	1.872.000,00 €	F	S	051_16/01/2018 996_09/06/2020	236.891,85 €	SI	SI	EIDOS CONSULTING SRL - Ing. Rizzo + GEOSERVIZI SRL Arch. Fera - Geol. Cappotto	SI	94.605,83 €
dl 13/2021	PATTO	19IR479/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	CARONIA	Lavori di consolidamento del Centro abitato nel tratto di costone lato Ovest a valle delle vie Impero e Tasso e della zona a monte della scuola elementare di Caronia centro.	477.400,00 €	F	L	230_02/02/2021	50.878,83 €	SS	SS	Geosearch di Abbate Giuseppe & SAS	SI	33.699,12 €
dl 13/2021	PATTO	19IR381/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	CASALVECCHIO SICULO	Mitigazione delle cause di rischio idrogeologico del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto	495.000,00 €	A	L	733_23/10/2017	495.000,00 €	SI	SI	CICCONE COSTRUZIONI SRL	SI	274.230,46 €
dl 13/2021	PATTO	19IR805/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	CASALVECCHIO SICULO	Consolidamento della zona ovest dell'abitato.	985.000,00 €	F	L	724_20/10/2017	985.000,00 €	SI	SI	GALLONE ANTONIO	SI	620.788,39 €
dl 13/2021	PATTO	19IR242/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	CASALVECCHIO SICULO	Lavori di consolidamento a difesa dell'abitato dell'area a valle della Scuola Media	2.585.049,29 €	F	L	490_30/05/2018	2.585.049,29 €	SI	SI	MEDI APPALTI SRL	SI	1.303.649,67 €
dl 13/2021	PATTO	19IRF16/G1	Lavori in corso	FSC	CT	CASTEL DI IUDICA	Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato di Serro Calderato - I Stralcio	1.112.000,00 €	F	L	049_13/01/2020	1.112.000,00 €	SI	SI	COSTRUZIONE GREEN SRL	SI	432.936,78 €
dl 13/2021	PATTO	19IR474/G1	SIA in corso	FSC	ME	CASTEL DI LUCIO	Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D'Acquisto a protezione del centro abitato.	224.761,38 €	F	S	036_12/01/2021	224.761,38 €	SI	SI	RTP:S.T.I.@ - AB2 Engineering Progettazione e Costruzione SRL - Geol. Savoca	SI	32.363,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA22/G1	SIA in corso	FSC	ME	CASTEL DI LUCIO	Consolidamento della zona Castello - sotto rocca a salvaguardia e protezione de C.A.	179.870,23 €	F	S	179_12/02/2019	179.870,23 €	SI	SI	LITOS PROGETTI SRL	SI	56.578,63 €
dl 13/2021	PATTO	19RA21/G1	SIA in corso	FSC	ME	CASTEL DI LUCIO	Consolidamento via Durante e via Santa Lucia	321.028,53 €	I	S	457_09/04/2019 1441_15/10/2019	344.604,21 €	SI	SI	RTP: PH3 Engineering Srl - C&C Engineering Srl -LAND Engineering Scarl - Ing. Giusti - Geol. Barbagallo	SI	137.788,80 €

dl 13/2021	PATTO	19IR149/G1	Lavori in corso	FSC	PA	CASTELDACCIA	Intervento di sistemazione idraulica del vallone Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del rischio	7.450.000,00 €	A	L	1766_04/12/2019	7.450.000,00 €	SI	SI	ATI: GORRASI COST. SRL - MI.CO. SRL - G.C. COSTRUZIONI SRL	SI	30.517,72 €
dl 13/2021	PATTO	19IRB10/G1	Stipula contratto in corso	FSC	TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	Interventi necessari a ridurre le condizioni di rischio di caduta massi in corrispondenza del molo	650.000,00 €	F	S	456_10/03/2020_P 2064_20/10/2021_L	650.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE ARL - N.C.N. CRL (Consoziata Esecutrice)	NO	17.454,63 €
dl 13/2021	PATTO	19IR312/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	CASTELL'UMBERTO	Lavori di consolidamento del versante tratto Piazzale Case Calà Lesina e Manera-Favara nel centro abitato di Sfaranda.	400.000,00 €	F	S	1931_18/12/2019 1733_02/10/2020 1218_16/06/2021	110.891,54 €	SS	SS	GLOBALGEO SRL - GEOL. ARNELI	SI	38.224,02 €
dl 13/2021	PATTO	19IR247/G1	Lavori in corso	FSC	ME	CASTELL'UMBERTO	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della Zona a Rischio R4 in Contrada Sfaranda	2.200.000,00 €	F	L	756_03/08/2018 1769_04/12/2019	2.200.000,00 €	SI	SI	ATI: CMC. SRL - SAVATTERI COSTRUZIONI SRL	SI	1.057.085,28 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD83/G1	Lavori conclusi	FSC	AG	CASTELTERMINI	Opere di sistemazione della SP 22 Stazione Campofranco-Cozzo Disi-Casteltermini nel tratto interessato da caduta massi	850.000,00 €	I	L	441_14/05/2018	850.000,00 €	SI	SI	VULLO ANTONIO SRL	SI	537.718,28 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IRB12/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	CASTIGLIONE DI SICILIA	Lavori di salvaguardia del versante sottostante Via Arciprete Cai del centro abitato di Castiglione	66.310,54 €	F	S	1053_29/07/2019 1681_24/09/2020	66.310,54 €	SS	SS	Studio tecnico Associato di Ingegneria ed architettura + Geol. Cartillone	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR035/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	CASTIGLIONE DI SICILIA	Lavori di consolidamento del Torrente S.Giacomo a valle del centro abitato	70.000,00 €	F	S	1054_29/07/2019 1683_24/09/2020	68.310,90 €	SS	SS	Geol. Siragusano+Ing. Aiello+TRIVELISICILIA DI CASTELLI DOMENICO SRL	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR098/G1	Lavori in corso*	FSC	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua II ° stralcio di completamento	612.000,00 €	F	L	878_04/05/2021	612.000,00 €	SI	SI	GEO DRILLING SRL	SI	2.565,81 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IR097/G1	Lavori in corso	FSC	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Intervento di consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato del comune di Castronovo	1.002.000,00 €	F	L	1316_26/09/2019 1144_01/07/2020	1.002.000,00 €	SI	SI	APPALTI E SERVIZI SRL	SI	481.412,14 €
dl 13/2021	PATTO	19IR471/G1	Lavori in corso	FSC	AG	CATTOLICA ERACLEA	Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa	4.095.507,44 €	C	L	904_27/09/2018 011_09/01/2019 035_14/01/2019 1435_14/10/2019	4.095.507,44 €	SI	SI	THETIS COSTRUZIONI SRL + SOCIETA' SIGMA INGEGNERIA SRL	SI	981.377,47 €
dl 13/2021	PATTO	ND	SIA in corso	FSC	SR	CAVAGRANDE DR dello Sviluppo Rurale e Territoriale	Messa in sicurezza dei sentieri di accesso e fruibilità della Riserva RNO di Cavagrande	2.000.000,00 €	I	L	1436_14/10/2019	96.500,05 €	SI	SI	RTP: Gabriele Correnti - T&P Tecnologia e Progetti - Geol. Angelo Leotta - Ing. Filadelfo La Rosa - Ing. Stefano Russo	SI	74.468,38 €
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC CAPO D'ORLANDO	Interventi urgenti, ed integrati, per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Capo 'Orlando - Lungomare A. Doria nel centro Urbano e San Gregorio	450.000,00 €	C	L	725_31/05/2019	450.000,00 €	SI	SI	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	SI	394.115,36 €
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	Lavori in corso	FSC	ME	CDC_CARONIA SOMMA URGENZA	Lavori urgenti per la difesa e salvaguardia di tratti di litorale ricadenti nel territorio comunale di Caronia fortemente danneggiati a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22-23-24 dicembre 2019 da attuare nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno 1	500.000,00 €	C	L	1271_21/07/2020	500.000,00 €	SI	SI	ANGELICO COSTRUZIONI SRL	SI	348.802,77 €
dl 13/2021	PATTO CDC	ND		FSC	ME	CDC_CONTRATTO DI COSTA TIRRENO	"CONTRATTO DI COSTA" TIRRENO 1, sottoscritto tra il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana ed i comuni di Acquadolci, Brolo, Capo D'Orlando, Capri Leone, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D'Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova e Tusa	8.366.398,00 €	C	S	727_01/08/2018 1136_19/11/2018 169_28/01/2020 874_26/05/2022 Definanziamento	3.869.618,39 €	SI	SI			398.764,19 €
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	SIA in corso	FSC	ME	CDC_LOTTO I	"CONTRATTO DI COSTA" TIRRENO 1, LOTTO I	- €	C	S		- €	SI	SI	RTP: HYPRO SRL - EIKON SBC SAS DI CAROLA SALVAGGIO & C - FABIO NICITA - GAETANO CURRO' - ANDREA NICASTRO	SI	
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	SIA in corso	FSC	ME	CDC_LOTTO II	"CONTRATTO DI COSTA" TIRRENO 1, LOTTO II	- €	C	S		- €	SI	SI	RTP: DINAMICA SRL - GEONAUTICS SRL - HS MARINE - DHI - DOTT. GEOL. CUCINOTTA - STUDIUM - ING. DEL CLARIO n.q. di consulente della SOCIETA' DINAMICA SRI	SI	

dl 13/2021	PATTO CDC	ND	SIA in corso	FSC	ME	CDC_LOTTO III	"CONTRATTO DI COSTA" TIRRENO 1, LOTTO III	- €	C	S			- €	SI	SI	RTP:TECHNITAL SPA - CASCONI ENGINEERING SRL - ORION PROGETTI SRLS - TE.MA. SNC DI CASTELLI E. C - DOTT.SSA SURIANO - DOTT. ING. BRUNO	SI	
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	Nuova Programmazione	FSC	ME	CDC_UCOM_LOTTO I	Interventi di salvaguardia e riqualificazione della fascia costiera compresa tra i comuni di Patti e Capo d'Orlando - LOTTO 1	5.076.500,00 €	C	L			- €	NO	NO		NO	
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	Nuova Programmazione	FSC	ME	CDC_UCOM_LOTTO II	Interventi di salvaguardia e riqualificazione della fascia costiera compresa tra i comuni di Capo d'Orlando e Sant'Agata di Militello - LOTTO 2	6.769.750,00 €	C	L			- €	NO	NO		NO	
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	Nuova Programmazione	FSC	ME	CDC_UCOM_LOTTO III	Interventi di salvaguardia e riqualificazione della fascia costiera compresa tra i comuni di Acquedolci e Tusa - LOTTO 3	6.032.000,00 €	C	L			- €	NO	NO		NO	
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_GIOIOSA MAREA	Intervento di stabilizzazione della linea di costa di un tratto di arenile della frazione S. Giorgio fortemente erosa dalle mareggiate del febbraio-marzo 2019 nell' ambito del Contratto di Costa - Tirreno 1	275.000,00 €	C	L	1307_25/09/2019		275.000,00 €	SI	SI	COSMAK SRL	SI	256.935,19 €
dl 13/2021	PATTO CDC	19IRA46/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_PIRAINO I STRALCIO	Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella	200.000,00 €	C	L	1126_07/08/2018		200.000,00 €	SI	SI	AVENI SRL	SI	179.767,09 €
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_PIRAINO II STRALCIO	Lavori urgenti per la difesa e la riqualificazione del litorale in località Calanovella fortemente erosa a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22-23-24 dicembre 2019 da attuare nell'ambito del Contratto di Costa - Tirreno 1	185.412,00 €	C	L	734_30/04/2020		185.412,00 €	SI	SI	NUROVI SRL	SI	183.207,68 €
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_UCOM	"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - "LOTTO 1"	938.000,00 €	C	L	794_07/05/2020		938.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	SI	660.045,59 €
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	Lavori conclusi	FSC	ME	CDC_UCOM	"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - "LOTTO 2"	2.251.000,00 €	C	L	795_07/05/2020		2.251.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE EOS SRL	SI	2.060.843,97 €
dl 13/2021	PATTO CDC	ND	Lavori in corso	FSC	ME	CDC_UCOM	"CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" Primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - "LOTTO 3"	3.492.000,00 €	C	L	796_07/05/2020		3.492.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL	SI	2.916.349,68 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD65/G1	Lavori in corso	FSC	PA	CEFALU'	Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù	277.747,87 €	I	L	1514_02/09/2020		277.747,87 €	SI	SI	I.CO.GE.I. SRL	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR101/G1	Lavori conclusi	FSC	PA	CEFALU'	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù	1.827.000,00 €	F	L	781_09/08/2018		1.827.000,00 €	SI	SI	ATI GHELLER SRL - FOX SRLS	SI	1.131.665,93 €
dl 13/2021 NEW	PATTO	ND	Lavori in corso	FSC	EN	CERAMI	Lavori Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del versante in zona Lavina a salvaguardia delle infrastrutture pubbliche e private sottostanti - completamento	850.000,00 €	F	L	1728_06/09/2021		850.000,00 €	SI	SI	TISS INGEGNERIA SRL	SI	4.016,19 €
dl 13/2021	PATTO	19IR338/G1	Istruttoria	FSC	AG	CIANCIANA	Fenomeno franoso in via Don Luigi Sturzo e Strada Statale 118 "Corleonese-Agrigentina"	150.000,00 €	I	L	419_02/04/2019		150.000,00 €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR105/G1	Lavori in corso	FSC	PA	CIMINNA	Consolidamento dell'area dissestata del vecchio centro urbano a valle della Matrice - 3° Stralcio	2.000.000,00 €	F	S	1744_28/11/2019 2003_11/10/2021 875_26/05/2022_D		2.000.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.	SI	17.874,99 €
dl 13/2021	PATTO	19IR295/G1	SIA in corso	FSC	PA	CINISI	Lavori di messa in sicurezza della scogliera di Magaggiari	190.000,00 €	F	S	975_11/07/2019		189.217,87 €	SI	SI	RTP: Ing. Vella, Ing. Giglio, Ing. Cairone, Ing. Arnone, Dott. Bonanno Conti	SI	30.189,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IR108/G1	Lavori conclusi	FSC	PA	COLLESANO	Consolidamento del costone roccioso di contrada S.Croce	1.268.000,00 €	F	L	949_04/10/2018		1.248.600,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE AURORA SCARLS	SI	661.599,34 €

dl 13/2021	PATTO	19IR960/G1	SIA in corso	FSC	PA	COLLESANO	Consolidamento del costone roccioso e sistemazione dei ruderi del castello.	450.000,00 €	F	S	082_16/01/2020	368.113,70 €	SI	SI	RTP: SWS SPA - PRION PROGETTI SRL - INCLINE SRL	SI	37.550,10 €
dl 13/2021	PATTO	ND	Lavori in corso	FSC	TP	CUSTOMACI	Interventi di mitigazione del rischio di caduta massi della riserva naturale orientata "Monte Cofano"	1.490.000,00 €	F	L	2006_04/11/2020	1.490.000,00 €	SI	SI	CO.GE.M.srl	SI	634.600,51 €
dl 13/2021 NEW	PATTO	ND	Nuova Programmazione	FSC	PA	DRPC	Ricostrazione di un tratto di strada SP24 Scillato - Caltauturo	1.500.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	ND	Nuova Programmazione	FSC	PA	DRT	"Interventi di consolidamento di alcuni tratti dell S.P. 54 per il ripristino della viabilità in sicurezza dei tratti interessati da movimenti franosi alle progressive Km18+000,19+000,20+000,20+500,21+000,21+900 e 23+000"	4.160.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	ND	Nuova Programmazione	FSC	PA	DRT	"Interventi di consolidamento di alcuni tratti dell S.P. 54 per il ripristino della viabilità in sicurezza dei tratti interessati da movimenti franosi e da caduta massi alle progressive Km1+900,12+000,13+000"	1.400.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021 NEW	PATTO	ND	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	DRT	Lavori urgenti per il presidio e la messa in sicurezza del versante in frana a tutela della pubblica incolumità, sulla strada di collegamento Scordia - Militello in val di Catania.	500.000,00 €	F	L	692_09/04/2021	66.590,14 €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR175/G1	Lavori in corso*	FSC	TP	FAVIGNANA	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di un'area del centro abitato di Marettimo	546.370,20 €	F	S	1931_01/10/2021	546.370,20 €	SI	SI	CO.S.P.E.F. S.R.L.	SI	225,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IR266/G1	Istruttoria	FSC	ME	FIUMEDINISI	Consolidamento a completamento degli interventi eseguiti dalla Prov. di ME del costone a monte della SP 27	4.010.000,00 €	I	L	221_20/02/2019	242.248,33 €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IRA02/G1	Lavori in corso*	FSC	ME	FIUMEDINISI	Ripristino delle difese spondali del Torrente Fiumedinisi - Completamento	900.000,00 €	A	L	1961_06/10/2021	900.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	SI	4.618,50 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IR299/G1	SIA in corso	FSC	ME	FONDACHELLI-FANTINA	Lavori di completamento del consolidamento della Fraz. Rubino	182.362,30 €	F	S	785_11/06/2019 1731_02/10/2020_D	182.362,30 €	SI	SI	RTP: Arch. Marotta, Ing. Filosico, Ing. Nocifera, Ing. Palmeri, Geol. Collovà	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IRD84/G1	Lavori conclusi*	FSC	ME	FORZA D'AGRO'	Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco Parrino	1.100.000,00 €	I	L	221_06/03/2018	1.100.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO CAMPALE STABILE	SI	878.779,37 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA66/G1	SIA in corso	FSC	ME	FRANCAVILLA DI SICILIA	Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda idraulica destra del torrente San Paolo a protezione dell'abitato.	252.000,00 €	F	S	1346_03/08/2020	175.965,57 €	SI	SI	RTP: ING. FRENI - ING. TROVATO - ING. LOMBARDO - GEOL. CARUSO - ING. PENNISI	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR248/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	FRAZZANO'	Lavori di consolidamento dell'abitato est del comune di Frazzanò	2.649.938,67 €	F	L	698_16/10/17	2.649.938,67 €	SI	SI	ATI BE.I.CO. SRL - COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	SI	1.932.491,60 €
dl 13/2021	PATTO	19IR483/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	FURCI SICULO	Completamento del consolidamento e sistemazione idraulica strada di collegamento delle Frazioni Grotte e Calcare e centro urbano alla strada statale SS114 ME - CT.	2.230.000,00 €	I	L	755_02/11/2017	2.230.000,00 €	SI	SI	ARES S.R.L.	SI	1.342.227,77 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD68/G1	SIA in corso	FSC	ME	FURCI SICULO	Intervento di sistemazione idraulica Torrette Pagliara	157.821,21 €	A	S	1267_06/12/2018	157.821,21 €	SI	SI	RTP: Ing. Pio D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Gasparo - Ing. Lo Presti - Geol. Scurria	SI	26.555,96 €
dl 13/2021	PATTO	19IR939/G1	Lavori in corso	FSC	ME	FURCI SICULO	Interventi integrati per la progettazione dei litorali in erosione completamento struttura in difesa dai marosi per la protezione del litorale e dell'abitato	1.297.021,83 €	C	L	2171_23/11/2020	1.297.021,83 €	SI	SI	PACOS SRL	SI	910.430,30 €

dl 13/2021	PATTO	19IRD68/G2	Lavori conclusi	FSC	ME	FURCI SICULO SOMMA URGENZA	Lavori somma urgenza relativi alla "Risagomatura della sezione idraulica dell' alveo nel tratto che va dalla passerella provvisoria esistente di collegamento dei centri abitanti fino a monte degli attraversamenti viario e ferroviario, per ripristino dell' efficienza e della funzionalità idraulica - Comuni di Furci Siculo e Roccalumera (Me)"	150.000,00 €	A	L	585_08/05/2019	150.000,00 €	SI	SI	S.C.A. UNIPERSONALE SRL	SI	73.126,21 €
dl 13/2021	PATTO	19IR412/G1	SIA in corso	FSC	ME	FURNARI	Messa in sicurezza idraulica tratti vallivi delle aste torrentizie e delle saie nelle Contrade Feliciotto, Siena e Bazia	279.000,00 €	A	S	1344_03/08/2020	173.666,42 €	SI	SI	RTP: LITOS PROGETTI SRL - ING. LANZA - ING- GUAGENTI	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR328/G1	SIA in corso	FSC	ME	FURNARI	Sistemazione e protezione delle aree costiere in erosione nel territorio comunale	318.000,00 €	A	S	1345_03/08/2020	144.362,38 €	SI	SI	RTP: Ing. D'Arrigo, Ing. Baratta, Ing. Mangano, Ing. La Rosa, Ing. Gasparo, Ing. Lo Presti, Geol. Scurria, Geol. Merk	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR987/G1	Lavori in corso	FSC	ME	GALATI MAMERTINO	Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a salvaguardia del centro abitato	1.840.000,00 €	F	L	195_28/02/2018	1.840.000,00 €	SI	SI	MI.CO. SRL	SI	440.144,19 €
dl 13/2021	PATTO	19IR567/G1	SIA in corso	FSC	ME	GALLODORO	Consolidamento e riqualificazione ambientale del costone c.da Landro a difesa del centro abitato	94.971,83 €	F	S	854_01/12/2017	94.971,83 €	SI	SI	RTP Studio Floramo Engineering&Architecture Srl - Ing. Floramo - Ing. Cutrona - Ing. Formica	SI	30,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IR640/G1	Lavori in corso	FSC	ME	GALLODORO	Messa in sicurezza del tratto a monte della strada SP 13 dal KM 1600 al KM 1900	1.700.000,00 €	F	L	066_25/01/2018	1.700.000,00 €	SI	SI	ITTEMO SRL	SI	827.817,26 €
dl 13/2021	PATTO	19IR540/G1	Lavori in corso	FSC	ME	GIARDINI NAXOS	Intervento di sistemazione idraulica Torrente S. Giovanni	1.200.000,00 €	A	L	329_11/04/2018 1191_28/11/2018 1228_10/09/2019 € 2.000.000,00 in capo a O.C.D.P.C. n. 340/2016	1.200.000,00 €	SI	SI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	334.354,26 €
dl 13/2021	PATTO	19IR571/G1	Lavori in corso	FSC	ME	GIOIOSA MAREA	Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi	2.928.175,00 €	F	L	1665_23/09/2020	2.928.175,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE VISTRUVIO SCARL	SI	516.025,78 €
dl 13/2021 NEW	PATTO	19IR549/G1	Nuova Programmazione	FSC	PA	GODRANO	Messa in sicurezza di un tratto di strada comunale - C.da Cannitello	1.500.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR314/G1	Lavori in corso	FSC	ME	GRANITI	Lavori di completamento del consolidamento da effettuarsi a valle del centro abitato - Il stralcio esecutivo	2.976.000,00 €	F	L	2059_11/11/2020	2.976.000,00 €	SI	SI	ATI: CO.GEN.AP SRL - LA PLACA ANGELO SRL	SI	792.190,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IR973/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione Misericordia di Gualtieri - unica via di fuga dell'abitato	610.000,00 €	I	L	909_14/12/2017 1283_11/12/2018	610.000,00 €	SI	SI	VULLO CALOGERO	SI	366.307,01 €
dl 13/2021	PATTO	19IR548/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria	650.000,00 €	I	L	535_07/06/2018	650.000,00 €	SI	SI	SUD PALI SRL	SI	399.286,14 €
dl 13/2021	PATTO	19IR971/G1	Lavori in corso	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Ampliamento ammodernamento e messa in sicurezza della strada di collegamento con il centro di Gualtieri	2.690.000,00 €	I	L	068_21/01/2019	2.690.000,00 €	SI	SI	PULLARA CALOGERO	SI	1.567.984,03 €
dl 13/2021	PATTO	19IR972/G1	Lavori in corso	FSC	ME	GUALTIERI SICAMINO'	Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada comunale collegante il centro di Gualtieri con la frazione di Sicamino'	5.000.000,00 €	I	L	1911_17/12/2019	5.000.000,00 €	SI	SI	C.G.C. SRL	SI	3.197.937,93 €
dl 13/2021	PATTO	19IR535/G1	Lavori in corso	FSC	RG	ISPICA	Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del Focallo - Ispica (RG)	12.150.000,00 €	C	S+L	235_08/03/2018	12.150.000,00 €	SI	SI	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.	SI	41.355,07 €
dl 13/2021	PATTO	19IR615/G1	SIA in corso	FSC	ME	ITALA	Completamento delle opere di consolidamento e regimentazione idraulica del quartiere del medico C.da Quartarello	201.157,34 €	F	S	895_12/12/2017 211_19/02/2019	201.157,34 €	SI	SI	RTP: Artec Associati SRL- Hypro Srl - Geol. Fabio Nicita	SI	39.963,00 €

dl 13/2021	PATTO	19IR963/G1	SIA in corso	FSC	ME	ITALA	Consolidamento e regimentazione idraulica del versante a monte del centro abitato	215.804,80 €	F	S	894_12/12/2017 165_11/02/2019	215.804,80 €	SI	SI	RTP: Ing. Pio Diarrigo - Ing. D'Alia - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Barbagiovanni Gasparo - Ing. Lo Presti - Geol. Scurria	SI	72.868,42 €
dl 13/2021 NEW	PATTO	ND	Lavori in corso	FSC	PA	LASCARI	"Consolidamento e riqualificazione ambientale dei fronti rocciosi in loc. "Macello Vecchio" a valle della via SS. Crocifisso"	1.750.000,00 €	F	L	135_21/01/2021	1.750.000,00 €	SI	SI	ACHENZA SRL	SI	298.805,56 €
dl 13/2021	PATTO		Lavori in corso*	FSC	AG	LCC Agrigento	Lavori di sistemazione delle frane e ripristino della transitabilità lungo la S.P. 14 "Racalmuto-Montedoro"- SS 640	4.150.000,00 €	F	L	2321_29112021	4.150.000,00 €	SI	SI	ISOR COSTRUZIONI SRL	NO	863.511,45 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IRD67/G1	Stipula Contratto in corso	FSC	CL	LCC Caltanissetta	Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189	1.147.083,27 €	I	S	1577_09/09/2020	1.147.083,27 €	SI	SI	RTP: 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SRP - STUDIO FARAONE SRLS - DGD TECNOSERVICE SRL - ING. D'ANNA - ING. VELLA - DOTT. BUTTICE'	NO	79.044,10 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD74/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	LCC Messina	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Fitalia/Zappulla	645.000,00 €	A	L	934_22/12/2017	645.000,00 €	SI	SI	SOC. CEDIM. S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO	SI	392.828,15 €
dl 13/2021	PATTO	19IR948/G1	Lavori in corso	FSC	ME	LENI	Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella_Completamento	3.650.000,00 €	C	L	276_20/03/2018	3.650.000,00 €	SI	SI	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa	SI	2.446.485,24 €
dl 13/2021	PATTO	19IR582/G1	SIA in corso	FSC	EN	LEONFORTE	Sistemazione pendici sud di Leonforte-zona sovrastante scuola media G.Verga	112.369,89 €	F	S	714_25/07/2018 071_21/01/2019	112.369,89 €	SI	SI	RTP: ING. LICATA - GEOL. VACCALLUZZO - GEOL. MARTINELLO	SI	73.840,83 €
dl 13/2021	PATTO	19IR777/G1	SIA in corso	FSC	PA	LERCARA FRIDDI	Consolidamento Costone roccioso Colle madore	200.000,00 €	F	S	1169_07/07/2020	150.544,95 €	SI	SI	RTP: MADA ENGINEERING SRL - GEOL. LOMBARDO	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IRE49/G1	Lavori in corso	FSC	ME	LETOJANNI	Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada A/18 Messina - Catania	16.311.717,13 €	I	L	500_19/03/2020	16.311.717,13 €	SI	SI	RTI: SGROMO COSTRUZIONI SRL - COSPIN SRL	SI	7.994.802,05 €
dl 13/2021	PATTO	19IR464/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	LIBRIZZI	Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato	3.935.000,00 €	F	L	908_28/09/2018	3.935.000,00 €	SI	SI	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO Spa	SI	2.584.988,66 €
dl 13/2021	PATTO	19IR588/G1	Lavori in corso	FSC	AG	LICATA	Messa in sicurezza di un tratto della via Garibaldi e di una parte della sottostante scarpata fino alla Via Marconi	6.250.000,00 €	F	L	2328_11/12/2020	6.250.000,00 €	SI	SI	FRESTA ROSARIO ANTONIO - GRUPPO VENERE SRL	SI	2.600.705,29 €
dl 13/2021 NEW	PATTO	ND	Lavori in corso	FSC	CT	LICODIA EUDEA	Completamento dei Lavori di Consolidamento del versante occidentale a valle di via Duca degli Abruzzi"	785.000,00 €	F	L	415_25/02/2021	785.000,00 €	SI	SI	ATI: BRAFER SEGNALETICA SRL - NEW VERDE SRL	SI	215.392,66 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IRA80/G1	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	"Progetto di consolidamento della strada provinciale 12 nei pressi della chiesa delle Preci a protezione del centro.	182.506,94 €	I	S	778_09/08/2018 031_14/01/2018	182.506,94 €	SI	SI	RTP: STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture Srl - Dott. Ing. Floramo - Ing. Cutrona - Geol. Cappotto	SI	40.515,92 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA79/G1	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	Progetto di consolidamento sulla provinciale SP12 in prossimità della Via Martiri di Bologna a monte	207.812,33 €	I	S	056_17/01/2019	207.812,33 €	SI	SI	RTP: STUDIO COLONNA SRL - PH3 ENGINEERING SRL - ING. MARCO CALOGERO - GEOL. NICITA	SI	42.063,28 €
dl 13/2021	PATTO	19IR243/G1	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	Progetto di consolidamento c./da Fornace a monte del centro abitato in zona R4.	57.638,14 €	F	S	212_06/03/2018	57.638,14 €	SI	SI	RTP: COSTA ASSOCIATI - ING. COSTA - ING. BUSCEMA	SI	31.679,99 €
dl 13/2021	PATTO	19IR258/G1	SIA in corso	FSC	ME	LIMINA	Lavori di consolidamento a valle dell'abitato a nord di Limina e la messa in sicurezza della Chiesa di San Filippo.	103.717,66 €	F	S	222_07/03/2018 953_09/07/2019	103.717,66 €	SI	SI	RTP: Ing. Giannetto - Ing. Faranna - Arch.Faranna Adele - Geol. Uchino	SI	29.015,88 €
dl 13/2021	PATTO	19IR431/G1	Lavori in corso	FSC	ME	LIPARI	Riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di protezione spiaggia in località Canneto (Unci) - Lipari (ME)	2.585.000,00 €	C	L	1149_20/11/2018	2.585.000,00 €	SI	SI	S.I.L.E.M. SRL UNIPERSONALE	SI	2.083.379,80 €

dl 13/2021 Mod	PATTO	19IRD85/G1	SIA in corso	FSC	ME	LIPARI	Messa in sicurezza e rifunionalizzazione della strada di collegamento centro abitato - frazione Pecorini a mare - Filicudi	137.690,05 €	I	S	398_28/03/2019 1592_05/11/2019	137.690,05 €	SI	SI	RTP IENCON S.C.A.R.L. - ORION PROGETTI SRLS	SI	54.383,77 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IRB25/G1	SIA in corso	FSC	AG	LUCCA SICULA	Realizzazione del canale di gronda nella zona a monte a difesa del centro abitato_Lucca Sicula.	149.608,09 €	A	S	757_03/08/2018 402_28/03/2019 1658_22/09/2020	149.608,09 €	SI	SI	ENGEO ASSOCIATI ENGINEERING & GEOLOGY	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR995/G1	Lavori conclusi	FSC	CT	MALETTO	Consolidamento a protezione dell'abitato stralcio completamente relativo alla zona R4 Rocca del Castello	1.350.000,00 €	F	L	186_27/02/2018	1.350.000,00 €	SI	SI	CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE	SI	695.363,23 €
dl 13/2021	PATTO	19IR968/G1	SIA in corso	FSC	CT	MALETTO	Consolidamento di un tratto di pendio in C.da Spirini	905.955,00 €	A	S	120_04/02/2019	86.404,80 €	SI	SI	(Ing. Lo Presti) - Studio Colonna SRL - Geol. Cappotto	SI	30,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IR937/G1	Lavori in corso	FSC	ME	MALFA	Lavori di consolidamento del costone roccioso compreso tra Punta scarico e Pollara - Il lotto	1.180.000,00 €	F	L	2141_19/11/2020	1.180.000,00 €	SI	SI	GHELLER SRL - FOX SRL	SI	418.576,72 €
dl 13/2021	PATTO	19IR944/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MALVAGNA	Lavori urgenti di consolidamento del centro abitato della zona a valle della via nuova	89.315,70 €	F	S	838_10/09/2018	29.315,70 €	SS	SS	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea srl	SI	20.391,10 €
dl 13/2021	PATTO	19IR579/G1	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	MANDANICI	Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato quartiere Rocca- Carasà e della circovallazione a monte.	1.580.000,00 €	F	S	290_05/04/2018 2120_29/10/2021_L	1.580.000,00 €	SI	SI	DAMAR COSTRUZIONI SRL	NO	32.687,27 €
dl 13/2021	PATTO	19IR979/G1	Lavori in corso*	FSC	CT	MANIACE	Opere di difesa idraulica finalizzata alla protezione idrogeologica del centro abitato_Contrada Cavallaro_Impluvio Secondario.	590.786,84 €	A	L	110_30/01/2019	590.786,84 €	SI	SI	Consorzio Stabile Vitruvio SCARL	SI	3.017,52 €
dl 13/2021	PATTO	19IR982/G1	Indagini in corso	FSC	CT	MANIACE	Messa in sicurezza, adeguamento e ammodernamento della strada di collegamento della C/da Petrosino.	128.026,60 €	I	S	233_08/03/2018 1301_24/09/2019	98.338,81 €	SI	SI	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl	SI	41.972,37 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD86/G1	SIA in corso	FSC	PA	MARINEO	Consolidamento versante della Rocca di Marineo	780.209,89 €	F	S	876_20/05/2020 85_18/01/2021 1431_14/07/2021	403.113,72 €	SS	SS	SLAR. TRIVELLAZIONI DI ROSARIO SIMONETTI	SI	101.217,50 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA87/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	CT	MASCALI	Mitigazione del rischio idrogeologico della frazione Nunziata	410.000,00 €	A	S	1680_24/09/2020	37.362,42 €	SS	SS	GIOSA SRL	SI	28.309,58 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA62/G1	Lavori in corso	FSC	CT	MASCALUCIA	Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga.	3.075.053,15 €	I	L	437_04/04/2019	3.075.053,15 €	SI	SI	EVER GREEN SRL	SI	1.300.765,80 €
dl 13/2021	PATTO	19IR596/G1	SIA in corso	FSC	CL	MAZZARINO	Intervento per la mitigazione del rischio nella Via S. Francesco di Paola.	866.958,70 €	I	S	1101_09/11/2018	149.633,99 €	SI	SI	LITOS PROGETTI SRL	SI	50.022,91 €
dl 13/2021	PATTO	ND	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MESSINA	Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio compresi tra gli abitati di Acqualadrona, Mezzana, Tono, Mulinello e Casabianca e a Rodia marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate - I stralcio funzionale sito Casabianca	1.412.006,84 €	C	S	2284_09/12/2020 691_09/04/2021	68.100,07 €	SS	SS	Dott. Capone e Dott. Merk	SI	35.818,37 €
dl 13/2021	PATTO	19IR684/G1	SIA in corso	FSC	ME	MESSINA	Riqualficazione e sistemazione idraulica, risagomatura e profilatura alveo, Ricostruzione muri d'argine ed attraversamento stradale - Collegamento Villaggi - Eventi Alluvionali. - (Sistemaz. idraulica e realizzazione strada di collegamento tra i villaggi di Bordonario sup e inf)	3.470.000,00 €	I	S	525_06/06/2018 776_06/05/2020 363_17/02/2021	354.858,59 €	SI	SI	RTP TECHNITAL S.P.A. - PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE - ARCH. BENEDETTO VERSACI	SI	134.475,84 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IR011/G3	Lavori in corso	FSC	ME	MESSINA	Riqualficazione ambientale e risanamento igenico-sanitario dell'Alveo del Torrente Cataratti-Bisconte	30.000.000,00 €	A	L	805_15/11/2017 848_01/12/2017	30.000.000,00 €	SI	SI	ATI CONSORZIO STABILE P.C. - CIESSECI SRL	SI	25.168.645,61 €

dl 13/2021	PATTO	19IRF20/G1	SIA in corso	FSC	ME	MESSINA	Lavori occorrenti per la realizzazione di una strada "Via di Fuga" complementare alla viabilità esistente di collegamento tra la S.S. 114 ed il villaggio Santo Stefano Briga del Comune di Messina	5.521.965,00 €	I	S	1404_07/08/2020 Supp. RUP 1964_28/10/2020 Indagini	160.438,25 €	SI	SI	GHEA SRL	SI	93.955,08 €
dl 13/2021	PATTO	ND	Lavori conclusi*	FSC	ME	MESSINA	Lavori di rifioritura e manutenzione straordinaria delle barriere radenti in Galati Marina e S.Margherita	207.519,74 €	C	L	2047_09/11/2020	207.519,74 €	SI	SI	COSTRUBO SOCIETA' COOPERATIVA	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	ND	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA I STRALCIO SOMMA URGENZA	Interventi urgenti per il prolungamento della barriera radente esistente collocata a protezione del tratto di litorale compreso tra il complesso edilizio "Case Raciti" ed il campo di calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel comune di Messina	200.000,00 €	C	L	177_26/02/2018 277_29/03/2018 408_08/05/2018	202.295,19 €	SI	SI	GANGI IMPIANTI SRL	SI	129.311,13 €
dl 13/2021	PATTO	ND	Lavori in corso	FSC	ME	MESSINA III STRALCIO	Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) - Completamento	3.562.036,52 €	C	S+L	621_08/04/2020 820_11/05/2020	3.503.421,81 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	SI	2.021.370,47 €
dl 13/2021	PATTO	ND	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA II STRALCIO	Interventi urgenti per il prolungamento della barriera radente esistente collocata a protezione del tratto di litorale compreso tra il complesso edilizio "Case Raciti" ed il campo di calcio tra i Villaggi S.Margherita e Galati Marina nel comune di Messina	737.963,48 €	C	L	909_28/09/2018	737.963,48 €	SI	SI	Consorzio Stabile SQM Società Consortile R.L.	SI	496.464,99 €
dl 13/2021	PATTO	ND	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA BADIAZZA	Interventi di pulitura Torrente Badiazza	105.000,00 €	A	L	1574_09/09/2020	105.000,00 €	SI	SI	LUPO COSTRUZIONI SRL	SI	69.242,99 €
dl 13/2021	PATTO	19IR317/G1	Lavori conclusi	FSC	PA	MEZZOJUSO	Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusci	1.000.000,00 €	F	L	174_20/08/2018	1.000.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE TELEGARE	SI	565.774,54 €
dl 13/2021	PATTO	19IRF12/G1	Lavori conclusi	FSC	CT	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Tenuta Ambelia	995.000,00 €	F	L	027_09/01/2019	995.000,00 €	SI	SI	CIASULLO COSTRUZIONI SRL	SI	904.052,36 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IRA61/G1	SIA in corso	FSC	CT	MIRABELLA IMBACCARI	Lavori di completamento per il consolidamento e la sistemazione delle aree a rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	174.768,27 €	F	S	440_14/05/2018 1307_12/12/2018	174.768,27 €	SI	SI	LITOS PROGETTI SRL	SI	30.144,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA88/G1	Stipula contratto in corso	FSC	ME	MIRTO	Consolidamento del versante a valle della S.P. 157 lato nord zona adiacente la caserma dei carabinieri e strutture parco.	2.632.000,00 €	F	S	896_12/12/2017 151_07/02/2019 2390_02/12/2021_L	2.632.000,00 €	SI	SI	SICEF SRL + RTP : Pro Geo Progettazione Geotecnica - Orion Progetti s.r.l. - Engineering Tecno Project srl - Ing. Codiglione	NO	221.890,34 €
dl 13/2021	PATTO	19IR224/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	MISTRETTA	Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato	1.400.000,00 €	F	L	076_08/02/2017	1.400.000,00 €	SI	SI	ALPI SRL	SI	908.487,51 €
dl 13/2021	PATTO	19IR559/G1	SIA in corso	FSC	ME	MISTRETTA	Consolidamento in zona Palo, nei pressi del distributore Agip e della Caserma Carabinieri	450.000,00 €	F	S	1117_06/08/2019	317.270,39 €	SI	SI	RTP: C&C Engineering srl - Ing. D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. Gasparo - Gel. Barbagallo - Ing. Lo prestì	SI	34.150,61 €
dl 13/2021	PATTO	19IR992/G1	Lavori in corso	FSC	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° STRALCIO	1.548.000,00 €	F	L	592_09/05/2019	1.548.000,00 €	SI	SI	COSTITUENDO A.T.I. CO.GE.ZAF. SRL E CONSOTEC SRL	SI	512.778,48 €
dl 13/2021	PATTO	19IRF22/G1	Istruttoria	FSC	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Realizzazione di una via di fuga a servizio del centro abitato di Monforte San Giorgio	2.997.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IRE96/G1	Lavori in corso	FSC	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato - completamento	2.050.000,00 €	F	S	229_02/02/2021	2.050.000,00 €	SI	SI	SIBAR SRL	SI	9.684,21 €
dl 13/2021	PATTO	19IR140/G1	SIA in corso	FSC	PA	MONREALE	Lavori di messa in sicurezza delle aree in località Laghivecchi e delle aree percorse dal fuoco nelle località Caputo e Caputello	4.000.000,00 €	F	S	2276_04/12/2020	416.761,14 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ING. DI GESARO - GEOL. FERRARO	SI	35.448,93 €

dl 13/2021	PATTO	ND	Aggiornamento Progettuale	FSC	PA	MONREALE	Lavori consolidamento e messa in sicurezza del muro di sostegno della villa comunale	2.994.000,00 €	F	S	1983_02/11/2020	36.236,66 €	SS	SS	GLOBALGEO SRL	SI	16.633,96 €
dl 13/2021	PATTO	19IR936/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento tra la Via Giardino e la Via Palermo a salvaguardia delle abitazioni	133.523,32 €	F	S	176_23/02/2018 291_05/04/2018	53.523,32 €	SI	SI	TEKNIK SRL	SI	22.444,22 €
dl 13/2021	PATTO	19IR178/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento del versante posto a monte della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria	1.300.000,00 €	F	L	308_06/04/2018	1.300.000,00 €	SI	SI	ZEUS COSTRUZIONI SRL	SI	712.384,06 €
dl 13/2021	PATTO	19IR288/G1	SIA in corso	FSC	AG	MONTALLEGRO	Interventi urgenti di messa in sicurezza del costone roccioso zone ovest centro abitato denominata contrada Bonifacio.	112.157,97 €	F	S	1166_22/11/2018	112.157,97 €	SI	SI	EDILING SRL	NO	- €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IRD87/G1	SIA in corso	FSC	PA	MONTELEPRE	Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre	211.634,40 €	I	S	684_22/05/2019 756_05/06/2019	211.634,40 €	SI	SI	RTP: Studio Associato Protea Ingegneria - Sud Progetto srl - EG4 Risk srl	SI	28.044,52 €
dl 13/2021	PATTO	19IR929/G1	Istruttoria	FSC	CT	MOTTA SANT'ANASTASIA	Consolidamento zona Neck	1.306.714,97 €	F	L	041_13/01/2020 VIARCH 829_10/05/2022_L	1.307.990,99 €	NO	NO		NO	806,55 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD66/G1	SIA in corso	FSC	CL	MUSSOMELI	"Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli - Caltanissetta"	936.886,54 €	I	S	746_04/06/2019	936.886,54 €	SI	SI	RTP : Sintagna Srl - Inge.ca Srl - Dott. Geol. Angelo Alfano	SI	167.724,09 €
dl 13/2021	PATTO	19IR524/G1	SIA in corso	FSC	CL	MUSSOMELI	Dissesto presso il castello Manfredonico.	1.997.227,50 €	F	S	689_11/07/2018	196.450,90 €	SI	SI	RTP Ing. D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Gasparo - Ing. Lo Presti - Geol. Merk	SI	39.875,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IRC69/G1	Lavori in corso	FSC	CL	MUSSOMELI	Realizzazione di opere di urbanizzazione e collegamento tra via Fuori le Mura e la Via Palermo	890.000,00 €	I	L	2016_05/11/2020	890.000,00 €	SI	SI	C.S. COSTRUZIONI SRL	SI	275.285,35 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA03/G1	Lavori conclusi	FSC	AG	NARO	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana.	2.440.039,53 €	F	L	209_02/03/2018	2.440.039,54 €	SI	SI	COSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	1.746.278,48 €
dl 13/2021	PATTO	19IR947/G1	SIA in corso	FSC	ME	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato in C/da Malò - 1 LOTTO	240.000,00 €	F	S	1796_09/10/2020	173.314,31 €	SI	SI	RTP: S.T.I. Geol. Savoca - Ing. Caminiti	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IRB16/G1	SIA in corso	FSC	ME	NASO	Opere di consolidamento del centro abitato in contrada Malò completamente	308.800,00 €	F	S	1795_09/10/2020	194.627,67 €	SI	SI	RTP: Ing. F. Crinò - Ing. M. Crinò - Ing. Iraci - Geol. Sciascia - Ing. S. Crinò	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IRF14/G1	Istruttoria	FSC	CL	NISCEMI	Stabilizzazione del versante ovest del centro abitato - Zona S.P. 12 - Sbocco Calanco - Canale	1.200.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IRA37/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	ME	NOVARA DI SICILIA	Completamento consolidamento costone rocca castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia	310.806,10 €	F	S	595_21/06/2018 334_14/03/2019 1834_10/12/2019	310.806,10 €	SS	SS	GEOSTUDI S.R. L.	SI	25.323,39 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD71/G1	Lavori in corso	FSC	ME	PACE DEL MELA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Mela	5.870.000,00 €	A	L	1132_15/11/2018	5.870.000,00 €	SI	SI	ATI - URANIA COSTRUZIONI SRL - LANZA SANTO	SI	1.117.656,65 €
dl 13/2021	PATTO	19IR025/G1	Lavori in corso	FSC	PA	PALERMO_FERRO DI CAVALLO	Intervento di bonifica e messa in sicurezza del canale denominato "Ferro di Cavallo" di Mondello nel Comune di Palermo	5.500.000,00 €	I	L	1924_23/10/2020 1925_23/10/2020	306.900,00 €	SI	SI	COST. ATI Tecnologia&Ambiente Srl - TRIVELSONDA SRL	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR409/G1	Lavori in corso	FSC	TP	PANTELLERIA	Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree p4: Lago di Venere, Gadir.	3.290.472,59 €	C	L	1317_14/12/2018	3.290.472,59 €	SI	SI	ATI GHELLER SRL - FOX SRL - SOFIA COSTRUZIONI	SI	2.111.389,63 €

dl 13/2021	PATTO	19IR413/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	TP	PANTELLERIA	Consolidamento del fronte ex cava Rodittis, C.da Mursia Pantelleria, Cala dell'Alca	190.812,91 €	F	S	1110_29/06/2020	53.721,23 €	SS	SS	FRA.E.MA srl	SI	195,23 €
dl 13/2021	PATTO	19IR835/G1	SIA in corso	FSC	ME	PATTI	Mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana sita a sud di piazza Gramsci del centro abitato di Patti	102.203,98 €	F	S	784_11/06/2019	128.947,22 €	SI	SI	RTP: ORION PROGETTI SRL - ING. CARDACI - ING. RADICI - GEODRILL	SI	31.151,43 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IR962/G1	SIA in corso	FSC	ME	PATTI	Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la mitigazione del rischio Geomorfologico	168.036,06 €	F	S	428_03/04/2019	168.036,06 €	SI	SI	RTP: Ing. D'arrigo - Ing. D'alia - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Barbagiovanni - Ing. Lo Presti - Geol. Merk	SI	36.355,80 €
dl 13/2021	PATTO	19IR147/G1	Lavori conclusi	FSC	PA	PETRALIA SOPRANA	Lavori di consolidamento delle frazioni Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - Gulini - Fasanò	1.450.000,00 €	F	L	1015_26/10/2018	1.450.000,00 €	SI	SI	EREDI GERACI SALVATORE SRL	SI	868.365,13 €
dl 13/2021 NEW	PATTO	ND	Lavori in corso	FSC	PA	PETRALIA SOTTANA	"Lavori per la riqualificazione della trazzera e degli accessi al pianerolo di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana"	2.440.359,87 €	F	L	569_22/03/2021	2.440.359,88 €	SI	SI	MAMMANA MICHELANGELO	SI	438.085,97 €
dl 214/2022	PATTO	19IR228/G1	SIA in corso	FSC	ME	PETTINEO	Consolidamento in zona Croce e Piazza Argentina- Comune di Pettineo (ME)	182.902,43 €	F	S	952_09/07/2019 1199_04/09/2019	182.902,43 €	SI	SI	RTP: S.T.I. - ENGENO - Ing. Curcuruto - Ing. Greco - IDROTER di Lo presti - Dott. Archeologo Donato	SI	77.385,83 €
dl 13/2021	PATTO	19IR361/G1	Lavori in corso	FSC	CT	PIEDIMONTE ETNEO	Opere di regimentazione acque all'interno del centro abitato (Via Cassisi-Via Notara-Via Roma-Via Bellini-Via Nuova del Convento e Via Cimitero)	6.141.000,00 €	A	L	1208_06/09/2019 059_15/01/2020	6.141.000,00 €	SI	SI	FENIX CONSIRZIO STABILE SCARL	SI	859.302,93 €
dl 13/2021	PATTO	19IR188/G1	SIA in corso	FSC	ME	PIRAINO	Consolidamento del centro abitato di Gliaca versante sud-est del Comune di Piraino	521.000,00 €	F	S	1434_14/10/2019	268.832,89 €	SI	SI	LITOS PROGETTI SRL	SI	31.502,59 €
dl 13/2021	PATTO	19IR950/G1	SIA in corso	FSC	PA	POLIZZI GENEROSA	Lavori di consolidamento della zona sud est del C.U.	200.828,92 €	F	S	121_04/02/2019	200.828,92 €	SI	SI	RTP: ING. ZAFONTI - ING. DOMINA - ITALSIGIS ENGINEERING SRL - GEOL.ABBATE	SI	38.108,14 €
dl 13/2021	PATTO	19IR949/G1	Stipula Contratto in corso	FSC	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa.	133.878,96 €	C	S	280_11/02/2020	99.673,07 €	SI	SI	RTP: LITOS PROGETTI SRL - ING. LANZA - ING. GUAGENTI	NO	24.305,78 €
dl 13/2021	PATTO	19IR945/G1	Lavori conclusi	FSC	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Lavori urgenti+I198:1210 di stabilizzazione scarpate ripristino e protezione litorale in dissesto ed erosione zona c.da Casuzze Scalo Mandrie.	800.000,00 €	C	L	184_27/02/2018	800.000,00 €	SI	SI	CIPAR SRL	SI	503.009,36 €
dl 13/2021	PATTO	19IR933/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	AG	RAFFADALI	Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza idrogeologica ed idraulica della strada di collegamento Raffadali_loppolo_Giancaxio.	1.942.427,17 €	I	S	380_02/05/2018 022_09/01/2020 1023_21/05/2021	33.235,95 €	SS	SS	INGE.CA. s.r.l.	SI	7.879,07 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA71/G1	Stipula Contratto in corso	FSC	AG	RAFFADALI	Lavori di consolidamento attraverso alla demolizione e messa in sicurezza di edifici siti in via Don Castrenze.	155.013,64 €	F	S	737_01/08/2018 063_17/01/2019	155.013,64 €	SI	SI	RTP: SA&GI ENGINEERING SRL - PRO GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - GEOL F. NICITA - ARCH. TRIOLO IVAN	NO	27.220,74 €
dl 13/2021	PATTO	19IR802/G1	SIA in corso	FSC	CT	RAGALNA	Interventi sul territorio di messa in sicurezza per il rischio idraulico e di esondazione del vallone Rosario_1° stralcio	528.000,00 €	A	S	105_30/01/2019 682_09/04/2021	202.534,32 €	SI	SI	RTP: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL - DOTT. ADRIANO BARBAGALLO	SI	225,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IR362/G1	SIA in corso	FSC	CT	RANDAZZO	Consolidamento e messa in sicurezza dell'area sottostante l'insediamento abitativo_Torrente Annunziata	200.000,00 €	A	S	086_16/01/2020	137.331,20 €	SI	SI	RPT: Progettazione-Geotecnica - SA&GI - Studio Geol. Gian Vito Graziano e Monica Masi - Geol. Riccardo Ferraro	SI	42.353,74 €
dl 13/2021	PATTO	19IR584/G1	Lavori in corso	FSC	AG	RAVANUSA	Lavori di completamento del consolidamento della zona est dell'abitato II° Stralcio.	7.000.000,00 €	F	L	334_13/04/2018	7.000.000,00 €	SI	SI	ATI S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL - CIESSECI SRL	SI	3.787.141,74 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA04/G1	Lavori conclusi	FSC	AG	REALMONTE	Progetto per i lavori di consolidamento della zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale	1.250.000,00 €	F	L	197_01/03/2018	1.250.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO ARTEK SA.CO. REST SRL (Esecutrice)	SI	775.200,88 €

dl 13/2021	PATTO	19IRA47/G1	SIA in corso	FSC	AG	REALMONTE	Lavori di consolidamento della zona sud-ovest c.a in prossimità della scuola elementare posto a valle di via Palermo.	148.787,90 €	F	S	454_17/05/2018 072_21/01/2019	148.787,90 €	SI	SI	STI @ STUDIO TECNICO ASSOCIATO - AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL GEOL. ANTONINO SAVOCA	SI	31.040,72 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA41/G1	SIA in corso	FSC	AG	REALMONTE	Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido.	188.423,00 €	F	S	455_17/05/2018 1264_06/12/2018	188.423,40 €	SI	SI	RTP: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE & COSTRUZIONE S.R.L. - ING. CICCIA GEOL. BARBAGALLO	SI	39.768,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IRF03/G1	Lavori conclusi	FSC	AG	REALMONTE	Intervento di messa in sicurezza di una porzione di versante in località Scala dei Turchi nel Comune di Realmonte	417.000,00 €	F	L	1034_30/10/2018	417.000,00 €	SI	SI	SJLES SRL	SI	302.395,20 €
dl 13/2021	PATTO	19IR813/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	REITANO	Stralcio dei lavori di completamento della via Archimede e Piazza San Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato	2.013.885,40 €	I	L	016_12/01/2017	2.013.885,40 €	SI	SI	ATI BE.I.CO. COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.	SI	1.464.395,30 €
dl 13/2021	PATTO	19IR067/G1	Lavori conclusi	FSC	CL	RESUTTANO	Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo.	1.270.000,00 €	I	L	190_12/04/2017 698_17/07/2018_D 1664_19/11/2019	1.270.000,00 €	SI	SI	AMATO COSTRUZIONI SRL	SI	973.062,26 €
dl 13/2021	PATTO	19IR459/G1	Istruttoria	FSC	ME	ROCCAVALDINA	Mitigazione rischio idrogeologico e messa in sicurezza centro abitato di San Salvatore	990.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IRB20/G1	Istruttoria	FSC	ME	ROCCAVALDINA	Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina	1.000.000,00 €	F	L	1163_09/06/2021 976_29/06/2022_I	132.954,95 €	SS	SS	Ing. Luigi La Sala	NO	30,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IR123/G1	Lavori in corso*	FSC	ME	ROCCAVALDINA	Consolidamento del centro abitato zona Sottoforno - a monte dell'abitato ed a valle delle Pendici	1.150.000,00 €	F	L	618_08/04/2020	998.000,00 €	SI	SI	CAMEDIL COSTRUZIONI SRL	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR118/G1	Stipula Contratto in corso	FSC	ME	ROMETTA	Consolidamento del versante est del centro abitato	229.608,84 €	F	S	454_09/04/2019	79.608,84 €	SI	SI	LITOS PROGETTO SRL	NO	21.920,73 €
dl 13/2021	PATTO	19IRB81/G1	Lavori in corso	FSC	TP	SALEMI	Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti_(TP)	1.500.000,00 €	I	L	1052_29/07/2019	1.500.000,00 €	SI	SI	CO.GE.MA.LA.SRL	SI	5.447,64 €
dl 13/2021	PATTO	19IR177/G1	Lavori in corso	FSC	TP	SALEMI	Mitigazione del Rischio idrogeologico del costone roccioso di Monte delle Rose	1.554.515,80 €	F	L	042_16/01/2019	1.554.515,80 €	SI	SI	ATI COST. CAVE SPADEA & C. S.R.L. - SAFAN S.R.L.	SI	482.584,32 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IR028/G1	Istruttoria	FSC	CL	SAN CATALDO	Consolidamento del centro storico (ex zona franosa) con interventi nelle vie Quatra e tratto di via Casale.	38.000,00 €	I	S		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR311/G1	Lavori conclusi	FSC	PA	SAN GIUSEPPE JATO	Completamento opere di mitigazione rischio idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina)	1.650.000,00 €	F	L	1051_29/07/2019	1.650.000,00 €	SI	SI	CICAS SRL	SI	981.613,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA63/G1	Istruttoria	FSC	CT	SAN GREGORIO DI CATANIA	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della collina - Monte Catira - ed opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei.	1.092.572,92 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR246/G1	Lavori in corso	FSC	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento centro abitato Catorelli SS.Annunziata - Completamento	2.138.836,63 €	F	L	1304_12/12/2018	2.138.836,63 €	SI	SI	TECNOSYSTEM SRL	SI	855.350,70 €
dl 13/2021	PATTO	19IR245/G1	SIA in corso	FSC	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento centro urbano zona Cresci	350.000,00 €	F	S	085_16/01/2020	246.476,71 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO - ORION PROGETTI SRL - ING. RADICI	SI	54.590,01 €
dl 13/2021	PATTO	19IR244/G1	Lavori in corso	FSC	ME	SAN MARCO D'ALUNZIO	Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - Completamento	3.940.000,00 €	F	L	294_08/03/2019	3.940.000,00 €	SI	SI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	1.004.835,24 €

dl 13/2021	PATTO	19IR703/G1	SIA in corso	FSC	PA	SAN MAURO CASTELVERDE	Consolidamento della Fraz. Borrello limitatamente al centro storico	763.448,80 €	F	S	954_09/07/2019	763.448,80 €	SI	SI	RTP: ANTomAR ENGINEERING SRL - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PRO GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ING. PIRRERA	SI	126.970,96 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA20/G1	SIA in corso	FSC	ME	SAN PIER NICETO	Lavori di completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico centro abitato e/da Ringa	356.267,01 €	F	S	922_04/07/2019	356.267,01 €	SI	SI	RTP: CIVIL PROJECTS ENGINEERING & CONTRACTING SRLS - ING. CARDACI - ING. BUSCOLO - GEOL. PONTILLO - ING. MICALI - ARCH. PINTAUDI	SI	67.183,98 €
dl 13/2021	PATTO	19IR184/G1	Lavori in corso	FSC	ME	SAN PIERO PATTI	Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi	7.723.716,59 €	F	L	1127_15/11/2018	7.723.716,09 €	SI	SI	ATI MONDELLO COSTRUZIONI SRL - COSMAK SRL	SI	2.491.704,77 €
dl 13/2021	PATTO	19IR183/G1	Lavori in corso*	FSC	ME	SAN PIERO PATTI	Lavori di consolidamento a protezione del versante nord del centro abitato	1.529.000,00 €	F	L	682_22/05/2019	1.529.000,00 €	SI	SI	GEOS SRL	SI	5.634,84 €
dl 13/2021	PATTO	19IR970/G1	SIA in corso	FSC	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	Consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso soprastante la C/da Scrisera	172.462,87 €	F	S	758_05/06/2019	172.462,87 €	SI	SI	ATI RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ORION PROGETTI SRLS - ING. CODIGLIONE	SI	48.633,46 €
dl 13/2021	PATTO	19IRB04/G1	SIA in corso	FSC	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	Lavori di ripristino dell'assetto ambientale idrogeologico del versante in Loc. Chiaramonte	276.600,00 €	F	S	2053_10/11/2020	194.506,31 €	SI	SI	RTP: Ing. Saitta - Arch. Testagrossa - Ing. Ridolfo - Arch. Liuzzo - Geol. Stimolo - Ing. Di Franco	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	ND	Lavori in corso*	FSC	TP	SAN VITO LO CAPO	Interventi di mitigazione del rischio connessi al dissesto di una porzione del costone roccioso soprastante la strada di accesso alla Riserva dello Zingaro SP 63 - Località Torre dell'Impiso	315.174,39 €	F	L	1226_16/06/2021	315.174,39 €	SI	SI	CMS SRLS	SI	225,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IR025/G1	Lavori in corso	FSC	CL	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fenomeno franoso.	1.298.000,00 €	F	L	738_24/10/2017	1.298.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA - EMMA LAVORI COOP SCARL	SI	145.329,39 €
dl 13/2021	PATTO	19IR454/G1	SIA in corso	FSC	ME	SANTA DOMENICA VITTORIA	Consolidamento e messa in sicurezza area sottostante insediamento abitativo via S. Antonio-Vico Quasimodo.	1.062.300,00 €	I	S	1203_30/11/2018	137.245,24 €	SI	SI	RTP: GaiaTech S.r.l. - Studio di geologia dott. Geol. C. Filice - Ing. L. Ravenda - Si.Ar. Trivellazioni di Simonetti R. - Ing. A. Alicino	SI	51.215,31 €
dl 13/2021	PATTO	19IR160/G1	Lavori in corso	FSC	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Lavori di completamento del consolidamento dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costituito dalla scuola elementare sita in via Umberto I e dall'asilo nido in viale dei Pini.	1.570.000,00 €	F	L	1211_15/06/2021	1.570.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE SIKELIA SCARL	SI	208.599,50 €
dl 13/2021	PATTO	19IRF23/G1	Istruttoria	FSC	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Completamento intervento di sistemazione idraulica del Torrente Mela	3.000.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021 NEW	PATTO	ND	Lavori in corso	FSC	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Completamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la via Palombello (vico seminario) nel centro storico	1.300.000,00 €	F	L	1327_01/07/2021	1.300.000,00 €	SI	SI	CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	SI	6.809,88 €
dl 13/2021	PATTO	19IR628/G1	Istruttoria	FSC	ME	SANTA TERESA DI RIVA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Savoca	194.003,55 €	A	S	623_28/06/2018 047_16/01/2019	197.003,55 €	SI	NO		NO	29.237,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IR528/G1	Lavori in corso	FSC	ME	SANTA TERESA DI RIVA	Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Santa Teresa di Riva	10.621.735,00 €	C	S+L	1706_26/11/2019	10.621.735,00 €	SI	SI	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCpA	SI	56.834,27 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD77/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	Lavori urgenti per la ricostruzione di un muro di sostegno diruto sulla S.P. 162 del lungomare di S. Agata di Militello, tratto compreso tra la Via Campidoglio e Vallone Posta	2.079.300,58 €	I	L	199_18/04/2017	2.079.300,58 €	SI	SI	RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL	SI	1.871.161,12 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD99/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO SOMMA URGENZA	"Lavori urgenti a protezione di tratto del lungomare SP162 antistante la Caserma dei Carabinieri nel Comune di S. Agata di Militello"	120.699,42 €	I	L	053_31/01/2017 (€ 200.000,00) succ. definizione 197_14/04/2017	120.699,42 €	SI	SI	BRUNO TEODORO SPA	SI	118.880,72 €
dl 13/2021	PATTO	19IR809/G1	Istruttoria	FSC	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	Lavori urgenti di sistemazione idraulica del torrente Pidocchio a difesa del C.da Torrecandele - Completamento	703.739,51 €	A	S		- €	NO	NO		NO	- €

dl 13/2021	PATTO	19IRD89/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	"Lavori di realizzazione e via di fuga dal Centro urbano - strada esterna Pantano Alto - San Carlo"	1.635.000,00 €	I	L	325_11/04/2018	1.635.000,00 €	SI	SI	ATI VICA SRL - FOX SRL	SI	1.157.735,01 €
dl 13/2021	PATTO	19IRG14/G1	Lavori in corso	FSC	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento dle tratto della S.P. 140 all'ingresso nord del centro urbano - Via di Fuga	2.950.000,00 €	I	L	1681_20/11/2019	2.950.000,00 €	SI	SI	A.I.C.O. Società Consortile ARL	SI	792.097,44 €
dl 13/2021	PATTO	19IR048/G1	SIA in corso	FSC	AG	SANT'ANGELO MUXARO	Interventi di consolidamento del versante meridionale a salvaguardia del centro abitato e della zona archeologica.	161.534,52 €	F	S	902_27/09/2018 1402_14/10/2019	159.550,22 €	SI	SI	RTP: HYPRO SRL - EIKON - GEOL. NICITA - GEOL. BARBAGALLO - ING. ALBA	SI	27.456,49 €
dl 13/2021	PATTO	19IR355/G1	Lavori in corso	FSC	AG	SANT'ANGELO MUXARO	Consolidamento del costone roccioso	1.508.000,00 €	F	L	1200_29/11/2018	1.508.000,00 €	SI	SI	PELEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	SI	651.872,10 €
dl 13/2021	PATTO	19IR996/G1	Stipula contratto in corso	FSC	ME	SAPONARA	Progetto per la messa in sicurezza centro abitato della frazione di Scarcelli, Saponara (ME)	4.200.000,00 €	F	S	636_03/07/2018 2290_22/11/2021	4.200.000,00 €	SI	SI	ATI: DAMAR COSTRUZIONI SRL - SICIVILLE S.R.L. + RTP: GENERAL ENGINEERIG S.R.L. - CIVIL PROJECT ENGINEERING AND CONTRACTING S.R.L.S. - Geol. Savoca - Ing. Micali	NO	306.476,82 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IR537/G1	SIA in corso	FSC	AG	SCIACCA	Intervento di stabilità del viadotto Cansalamone.	395.887,17 €	I	S	806_29/08/2018 1008_22/07/2019	395.887,16 €	SI	SI	RTP: D'ARRIGO - ING. RUSTICA - ING. MANGANO - ING. LA ROSA ING. GASPARO - ING. LO PRESTI - GEOL. MERK	SI	42.744,28 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD90/G1	Aggiornamento Progettuale	FSC	RG	SCIICLI	Via di Fuga Circovallazione ovest di Scicli Corpo B	98.000,00 €	I	S	536_07/06/2018	53.000,00 €	SI	SI	ATI - GEOTER CONSULTIG SAS - DISMAT SRL	SI	33.474,37 €
dl 13/2021	PATTO	19IR061/G1	Lavori in corso*	FSC	CT	SCORDIA	Interventi di mitigazione dle rischio idrogeologico all'interno del centro urbano di Scordia - quartiere Cittadino	4.330.000,00 €	F	L	341_16/02/2021	4.330.000,00 €	SI	SI	ATI: ZEUS COSTRUZIONI SRL - GRASSO COSTRUZIONI GENERALI - C&L - COSTRUZIONI INFRASTRUTTIRE GENERALI	SI	15.593,72 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD82/G1	Istruttoria	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Opere di sistemazione della sede viaria della DSP 231 R.T. Villalba Marianopoli (da Villalba alla SS 121) dal km 2 al km 3	120.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IRD91/G1	SIA in corso	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 132 Sutera - Casalichio	134.970,96 €	I	S	776_07/06/2019	134.970,96 €	SI	SI	RTP: Studio Cangemi dei F.lli Cangemi, Vamirgeind Ambiente Geologia e Geofisica	SI	- €
dl 13/2021	PATTO	19IRD92/G1	Lavori conclusi	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della strada Bompensiere-Racalmuto-Milena	652.728,00 €	I	L	497_05/06/2018	652.728,00 €	SI	SI	Nocifora Tiranno Vincenzo	SI	441.726,22 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD93/G1	SIA in corso	FSC	PA	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP40 tra Carini Montelepre e Giardinello	129.178,89 €	I	S	399_28/03/2019	129.178,89 €	SI	SI	RTP: Studio Floramo Engineering & Architecture s.r.l. - Ing. Floramo - Geol. Puglisi - Arch.Giordano	SI	30,00 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD94/G1	Istruttoria	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 23 Serradifalco - Montedoro	528.000,00 €	I	S		- €	NO	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IRD95/G1	SIA in corso	FSC	CL	SOVRACOMUNALE	Messa in sicurezza della SP 41 tratto dalla SP 38 alla SP 16	400.000,00 €	I	S	1952_28/10/2020 2154_20/11/2020 definaziamento	399.181,65 €	SI	SI	RTP:SINTAGMA SRL - INGE.CA SRL - ORION PPROGETTI	SI	71.430,35 €
dl 13/2021	PATTO	19IR850/G1	Istruttoria	FSC	ME	SPADAFORA	Intervento per la messa in sicurezza del torrente Tonnarazza dal rischio esondazioni a protezione della C.da Cefis in corrispondenza del Ponte Ferrovario	314.000,00 €	A	S		- €	NO	NO			
dl 13/2021	PATTO	19IRD96/G1	Lavori conclusi	FSC	CL	SUTERA	Lavori di costruzione della strada esterna comunale Donna Spusa-Piano Superiore - stralcio di completamento	2.300.000,00 €	I	L	574_18/06/2018	2.300.000,00 €	SI	SI	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	SI	1.106.799,75 €
dl 13/2021	PATTO	19IRC36/G1	SIA in corso	FSC	ME	TAORMINA	Intervento di sistemazione idraulica Torrente Sirina	2.450.000,00 €	A	S	167_21/02/2018 567_14/06/2018 2351_30/11/2021	201.273,50 €	SI	SI	RTP: EIDOS CONSULTING SRL - Ing. Rizzo - Ing. Fera - Geol. Cappotto	SI	57.307,49 €

dl 13/2021	PATTO	ND	Lavori in corso	FSC	ME	TAORMINA	Messa in sicurezza della scalinata di accesso al castello di monte Tauro	300.000,00 €	I	L	1982_02/11/2020 231_02/02/2021	299.960,00 €	SI	SI	FOX S.R.L.	SI	98.577,07 €
dl 13/2021	PATTO	19IR890/G1	Gara SIA in corso	FSC	ME	TERME VIGLIATORE	Lavori di difesa e riqualificazione del litorale costiero - Terme Vigliatore (ME)	390.000,00 €	C	L	373_22/03/2019_VIA 380_04/03/2022	139.104,35 €	SS	NO		NO	2.828,20 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD97/G1	SIA in corso	FSC	PA	TERRASINI	Sistemazione e messa in sicurezza del sottopasso di Terrasini	1.800.000,00 €	I	S	012_04/01/2018	161.185,66 €	SI	SI	RTP: VOLO-NET ENGINEERING SPA - SOCIETA' COOPERATIVA TS ENGINEERIG SOC. COOP. ARL	SI	43.656,04 €
dl 13/2021	PATTO	19IR481/G1	Gara Indagini in corso	FSC	ME	TORREGROTTA	Opere di difesa della fascia costiera a salvaguardia delle Infrastrutture Litoranee	914.000,00 €	C	S	211_09/02/2022	82.795,11 €	SS	NO		NO	- €
dl 13/2021	PATTO	19IR783/G1	SIA in corso	FSC	PA	TORRETTA	Sistemazione idraulica del Torrente Torretta	371.889,11 €	A	S	358_20/04/2018 092_28/01/2019	371.889,11 €	SI	SI	RTP: Beta Studio srl - Orion Progetti srls - Vamirgeoind srl	SI	32.724,75 €
dl 13/2021	PATTO	19IR203/G1	Lavori in corso	FSC	EN	TROINA	Consolidamento del versante nord della Rocca S.Pantheon a monte della Via Madonna del Soccorso	1.320.000,00 €	F	L	198_14/02/2019	1.320.000,00 €	SI	SI	PELEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	SI	257.166,74 €
dl 13/2021	PATTO	19IRB34/G1	Lavori in corso	FSC	EN	TROINA	Mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di un ponte di seconda categoria nell'attuale attraversamento a guado nel fiume Troina, lungo la trazzera Troina-Cesarò	1.703.000,00 €	I	L	1635_13/11/2019	1.703.000,00 €	SI	SI	COGE SRL	SI	422.966,35 €
dl 13/2021	PATTO	19IR204/G1	Lavori in corso	FSC	EN	TROINA	Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel Monte Muganà - Troina - Completamento	1.270.000,00 €	F	L	2462_29/12/2020_VI ARCH 1192_10/06/2021 385_07/03/2022_D	1.270.000,00 €	SI	SI	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	SI	159.087,62 €
dl 13/2021	PATTO	ND	Lavori in corso	FSC	EN	TROINA	Consolidamento del versante sud ovest del quartiere "Borgo" e di contrada "Candela" e ripristino degli assi viari in frana.	2.997.800,00 €	F	L	339_15/02/2021	2.997.800,00 €	SI	SI	MAMMANA MICHELANGELO	SI	885.861,06 €
dl 13/2021	PATTO	19IRB19/G1	SIA in corso	FSC	ME	TUSA	Lavori di consolidamento del versante a valle della via Sant'Agostino dell'abitato di Tusa	234.000,00 €	F	S	353_20/02/2020	26.863,58 €	SI	SI	MADA ENGINEERING SRL - IEA ASSOCIATI SRLS - GEOL. CAUSAPRUNO	SI	26.863,58 €
dl 13/2021	PATTO	19IRB18/G1	SIA in corso	FSC	ME	TUSA	Lavori di consolidamento relativi al costone roccioso Castello lato est e Castello lato ovest	260.000,00 €	F	S	1269_18/09/2019 057_15/01/2020	174.356,57 €	SI	SI	RTP: Ing. Ceraolo - Geol. Pintaudi - Ing. Cappotto - Ing. Di Maggio - Arch. Ceraolo -	SI	33.113,92 €
dl 13/2021	PATTO	NEW	Lavori in corso	FSC	ME	UCRIA	Consolidamento e messa in sicurezza della zona S. Caterina.	2.250.000,00 €	F	L	894_05/05/2021	2.250.000,00 €	SI	SI	Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile Scarl	SI	11.028,13 €
dl 13/2021	PATTO	19IR991/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	VALDINA	Consolidamento centro abitato frazione Tracocchia versante ovest	980.000,00 €	F	L	619_08/04/2020	980.000,00 €	SI	SI	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	SI	632.552,04 €
dl 13/2021	PATTO	19IRD75/G1	Lavori conclusi	FSC	PA	VALLEDOLMO	Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità della strada Valledolmo-Vallelunga pratameno in corrispondenza del ponte in c.da Celso	280.000,00 €	I	L	707_20/07/2018 712_24/07/2018 499_16/04/2019 367_25/02/2020_L	297.770,13 €	SI	SI	C.A.E.C. SOC. COOP.	SI	195.172,75 €
dl 13/2021	PATTO	19IR552/G1	SIA in corso	FSC	CL	VALLELUNGA PRATAMENO	Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente "Salacio" (San Giovanni - Margiazzo) a valle del centro abitato.	408.000,00 €	A	S	1442_15/10/2019 712_24/04/2020	178.221,40 €	SI	SI	COST RTP :ENGE ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI SRL - ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL - STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - GEORETTI	SI	39.662,97 €
dl 13/2021	PATTO	19IR556/G1	SIA in corso	FSC	CL	VALLELUNGA PRATAMENO	Lavori di sistemazione e consolidamento parete soggetta a fenomeni franosi crollo nord c.a.	147.335,68 €	F	S	930_21/12/2017 1257_06/12/2018	147.335,68 €	SI	SI	RTP: Sintagma Srl - Inge.ca Srl - Geol. Angelo Alfano	SI	26.013,63 €

dl 13/2021 Mod	PATTO	19IRD98/G1	Lavori in corso	FSC	ME	VENETICO	Messa in sicurezza del Castello Medioevale del Comune di Venetico	2.398.963,22 €	I	L	931_21/12/2017_P 780_21/04/2021_L	2.398.963,22 €	SI	SI	ATI: MAMMANA MICHELANGELO - ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL + RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA - ING. BAUDO - ARCH. VERSACI - STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI - GEOL.MARTINELLO	SI	835.125,32 €
dl 13/2021	PATTO	19IRC32/G1	Lavori in corso	FSC	ME	VENETICO	Lavori di consolidamento del versante sud-est del centro abitato di Venetico superiore	7.109.095,23 €	F	L	788_07/05/2020	7.109.095,23 €	SI	SI	ATI EL.DA. COSTRUZIONI SRL - ALBERTI COSTRUZIONI SRL - LSV COSTRUZIONI SRL	SI	1.945.774,90 €
dl 13/2021	PATTO	19IR896/G1	Lavori conclusi	FSC	AG	VILLAFRANCA SICULA	Lavori di regimentazione delle acque a monte del c.a. in c.da San Rocco.	1.300.000,00 €	A	L	273_16/03/2018	1.300.000,00 €	SI	SI	EDILCAP SRL	SI	798.981,31 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IR841/G1	Lavori in corso*	FSC	ME	VILLAFRANCA TIRRENA	Lavori di manutenzione e miglioramento del deflusso delle Acque Meteoriche lungo la via Regione Siciliana.	753.514,41 €	I	L	891_21/09/2018 1666_23/09/2020	753.514,31 €	SI	SI	CMCI SCRL - SICILIANA COSTRUZIONI SRL	SI	12.286,48 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA91/G1	SIA in corso	FSC	ME	VILLAFRANCA TIRRENA	Lavori di riqualificazione del lungomare Cristoforo Colombo con annessa manutenzione delle opere di protezione dell'arenile.	417.518,16 €	I	S	490_12/04/2019	417.518,16 €	SI	SI	RTP: DINAMICA SRL - DHI SRL - GEONAUTICS - Geol. Pinizzotto	SI	82.573,99 €
dl 13/2021	PATTO	19IR092/G1	Lavori in corso	FSC	CL	VILLALBA	Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a monte della via G. Garibaldi.	939.914,00 €	I	L	154_16/02/2018 1616_15/09/2020 1612_04/08/2021_D	939.914,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI - SICIL TECNO PLUS SRL + RTP: EIDOS CONSULTING S.R.L. - RIZZO - MARSALA - CAPPOTTO	SI	168.182,93 €
dl 13/2021 Mod	PATTO	19IRD76/G1	SIA in corso	FSC	EN	VILLAROSA	Realizzazione muro di contenimento al km 7+500 della Strada provinciale n. 6 (via di fuga) in territorio di Villarosa con ripristino del manto stradale.	100.923,66 €	I	S	992_09/06/2020	100.923,66 €	SI	SI	RTP: PH3 SRL - GEOL. FEMINO'	SI	33.978,04 €
dl 13/2021	PATTO	19IRA67/G1	Lavori conclusi	FSC	CT	VIZZINI	Consolidamento Zona Piazza De Gasperi	1.500.000,00 €	F	L	1094_09/11/2018	1.500.000,00 €	SI	SI	AVENI SRL	SI	774.490,73 €
dl 13/2021	PATTO PRA			FSC	PRA	RAFFORZAMENTO PA	RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE (UCOM)	11.286.621,00 €	P R A	PRA		- €					- €


499.421.361,97 €

393.675.035,71 €

148.267.494,78 €

STATO DELL'ARTE	N.	%
Istruttoria	17	6,32%
Aggiornamento Progettuale	19	7,06%
Predisposizione atti di Gara	0	0,00%
Gara SIA in Corso	2	0,74%
SIA_Indagini In corso	78	29,00%
Gara in corso	0	0,00%
Stipula Contratto in corso	8	2,97%
Lavori in corso	84	31,23%
Lavori Conclusi	53	19,70%
Risoluzione Contratto	0	0,00%
Nuova Programmazione	8	2,97%
	269	100,00%

Attuazione Patto per il Sud

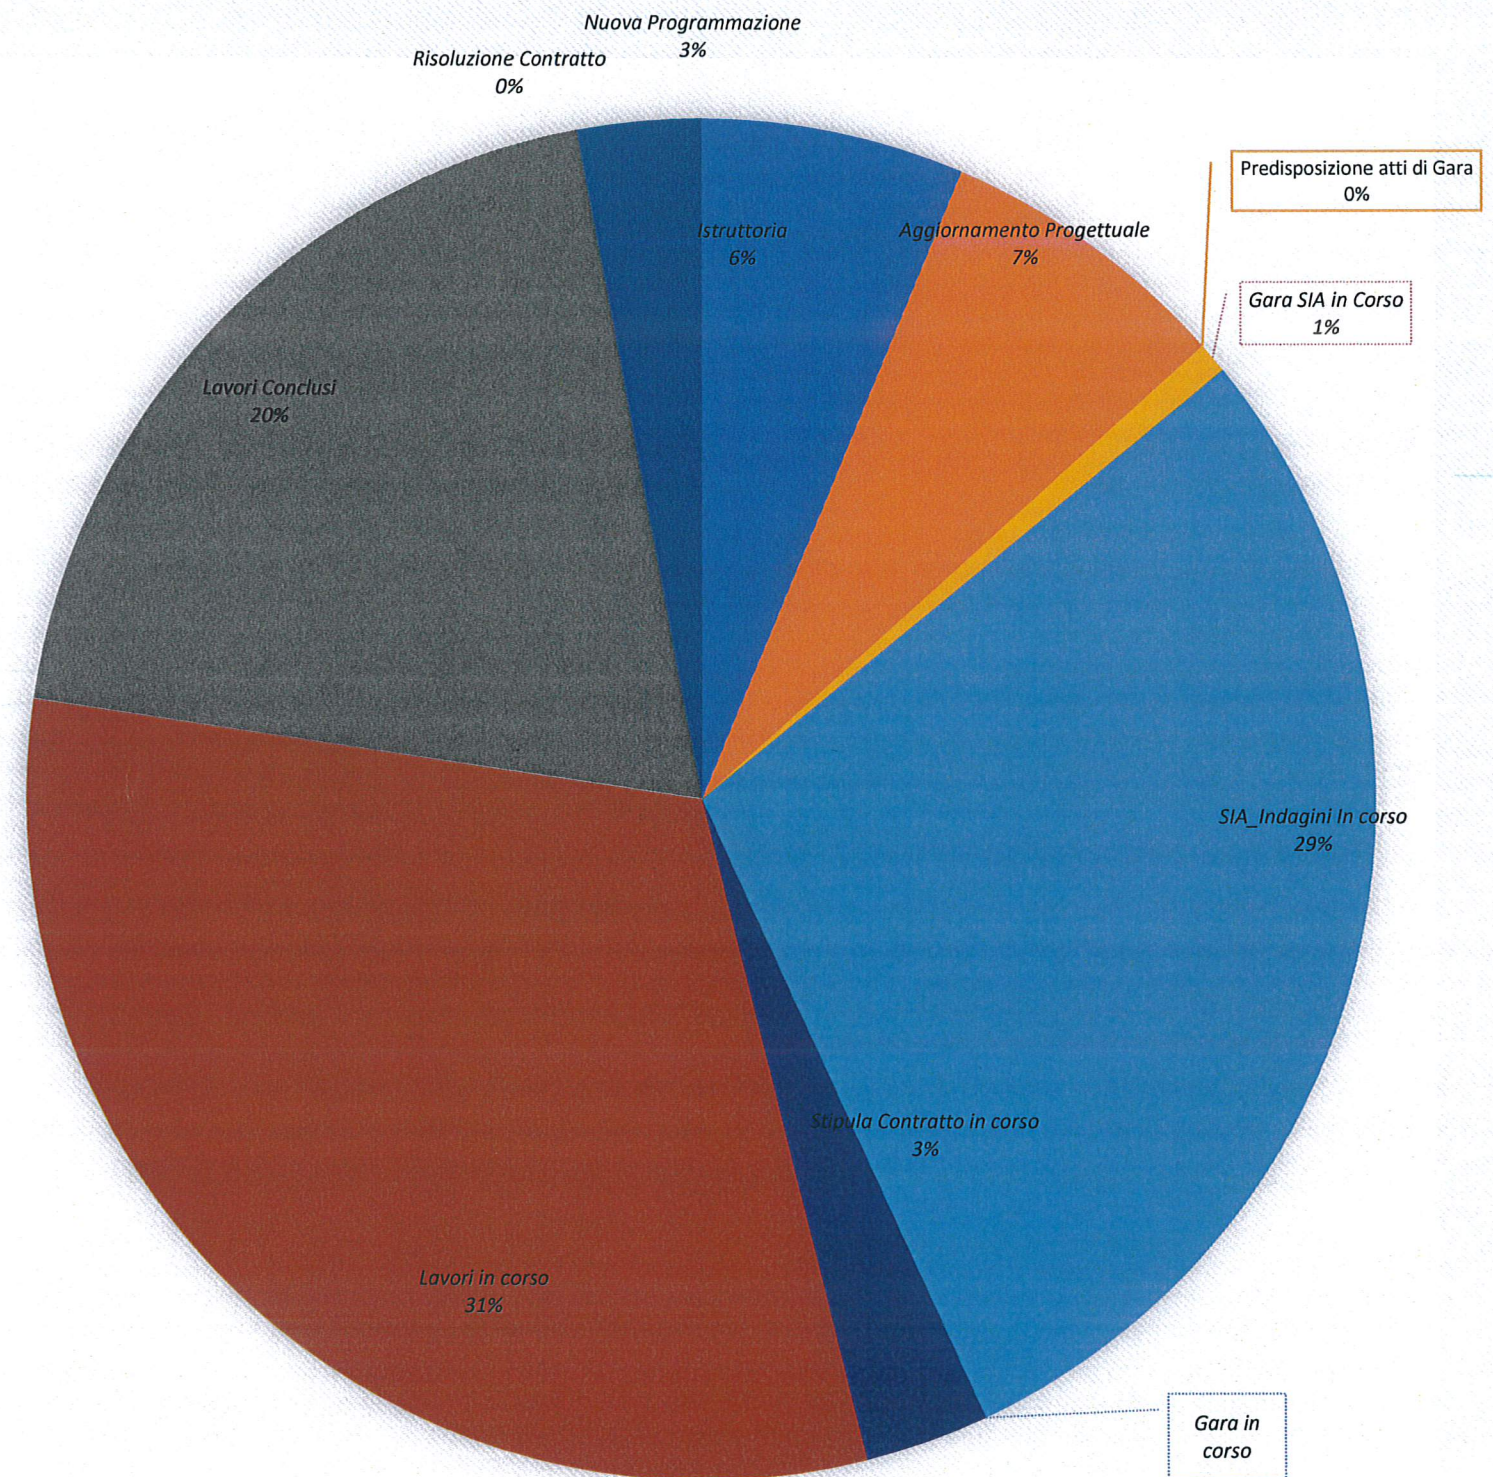

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

MONITORAGGIO INTERVENTI CITTA' METROPOLITANE





MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE SICILIANA




Fonte	Piano	RENDIS	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GA RA	OGV	ESECUTORE	REP	SPESO AL 30/06/2022
CIPE 26/2016	PSPA	19IRB84	Istruttoria	FSC	PA	PALERMO	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo sovrastante l'area urbana di Mondello. Completamento	1.764.958,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
CIPE 26/2016	PSPA	19IRB85	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO MONTEPELEGRINO	Interventi di protezione dell'area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino.	913.287,48 €	F	L	729_01/08/2018	80.644,74 €	SI	SI	R.T.P.: Ing. Micali (mandataria) - Ing. Mammoliti (mandante) - Studio Floramo Engineering & Architecture srl (mandante e ausiliaria capogruppo)	SI	26.362,10 €
CIPE 26/2016	PSPA	19IRB86	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO ADDAURA LOTTO A	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura.	30.545.000,00 €	F	S	590_20/06/2018	855.731,35 €	SI	SI	RTP: RPA srl - Technital Spa - RHM srl - Ing. Castaldini Roberto - Geologia Applicata S.A.	SI	404.753,20 €
CIPE 26/2016	PSPA	19IRB86	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO ADDAURA LOTTO B	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura.	- €	F	S		510.631,49 €	SI	SI	RTP: SERING INGEGNERIA SRL - ROCKSOIL SPA	SI	- €
CIPE 26/2016	PSPA	19IRB86	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO ADDAURA LOTTO C	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura.	- €	F	S		314.640,09 €	SI	SI	RTP: SERING Ingegneria S.R.L - ROCKSOIOL S.p.a.	SI	- €
CIPE 26/2016	PSPA	19IRB86	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO ADDAURA LOTTO D	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura.	- €	F	S		1.225.005,38 €	SI	SI	RTP: RPA srl - Technital Spa- RGM srl - Ing. Castaldini R. - geologia Applicata S.A.	SI	- €
CIPE 26/2016	PSPA	19IRB87	SIA in corso	FSC	PA	PALERMO BOCCADIFALCO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti sovrastanti l'abitato di boccadifalco - completamento	3.700.000,00 €	F	L	728_01/08/2018 760_07/08/2018	477.592,62 €	SI	SI	RTP: Hypro srl - Ing. A. Moschella - Geol. A. Alba - Geol. G. Giacchetti Geol. A. Leotta - Dott. G. Currò - Dott. F. D'Angelo	SI	108.810,95 €
CIPE 26/2016	PSME	19IRC78/G1	Concluso	FSC	ME	MESSINA PEZZOLO	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel centro abitato di Pezzolo - Messina	121.500,00 €	A	L	251_12/03/2018	121.500,00 €	SI	SI	CENTRO IDRO GEO TECNICO S.R.L.	SI	65.327,68 €
CIPE 26/2016	PSME	19IRC79	Concluso	FSC	ME	MESSINA ALTOLIA	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana lenta posta nel villaggio di Altolia - Messina	269.800,00 €	A	L	250_12/03/2018	269.800,00 €	SI	SI	Impresa Aglieri Francesco	SI	153.888,17 €
CIPE 26/2016	PSME	19IR668	Istruttoria	FSC	ME	MESSINA PORTELLA ARENA	Lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del torrente Portella Arena in corrispondenza della cooperativa Futura	650.000,00 €	A	L	724_30/07/2018 VIA	2.260,00 €	NO	NO		NO	2.260,00 €
CIPE 26/2016	PSME	19IRC75/G1	SIA in corso	FSC	ME	MESSINA PAPARDO	Opere di sistemazione in alveo e dei sistemi arginali dei Torrenti Larderìa, Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo a salvaguardia della popolazione e del tessuto economico - 1° stralcio funzionale relativo al Torrente Papardo	7.900.000,00 €	A	L	185_27/02/2018	642.605,04 €	SI	SI	RTP Technital Spa (Mandatara) - Studio Colonna srl - Ph3 Engineering srl Unipersonale (mandante) - Arch. Benedetto	SI	130.026,22 €
CIPE 26/2016	PSME	19IRC74/G1	Istruttoria	FSC	ME	MESSINA	Lavori per la mitigazione del rischio idraulico mediante l'eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi con la realizzazione di manufatti preferibilmente prefabbricati a tutela della sicurezza pubblica.	3.000.000,00 €	A	L	723_30/07/2018 VIA	3.200,00 €	NO	NO		NO	3.200,00 €
CIPE 26/2016	PSCT	19IRC01/G1	Istruttoria	FSC	CT	CATANIA	Riquilificazione e sistemazione Torrente Forcile e i suoi affluenti	28.800.000,00 €	A	L		- €	NO	NO		NO	- €

77.664.545,48 €


4.503.610,71 €

894.628,32 €


Città Metropolitana di Palermo		
N.	STATO DELL'ARTE	IMPORTO
1	ISTRUTTORIA	1.764.958,00 €
3	SIA IN CORSO	35.158.287,48 €
4	Complessivo	36.923.245,48 €

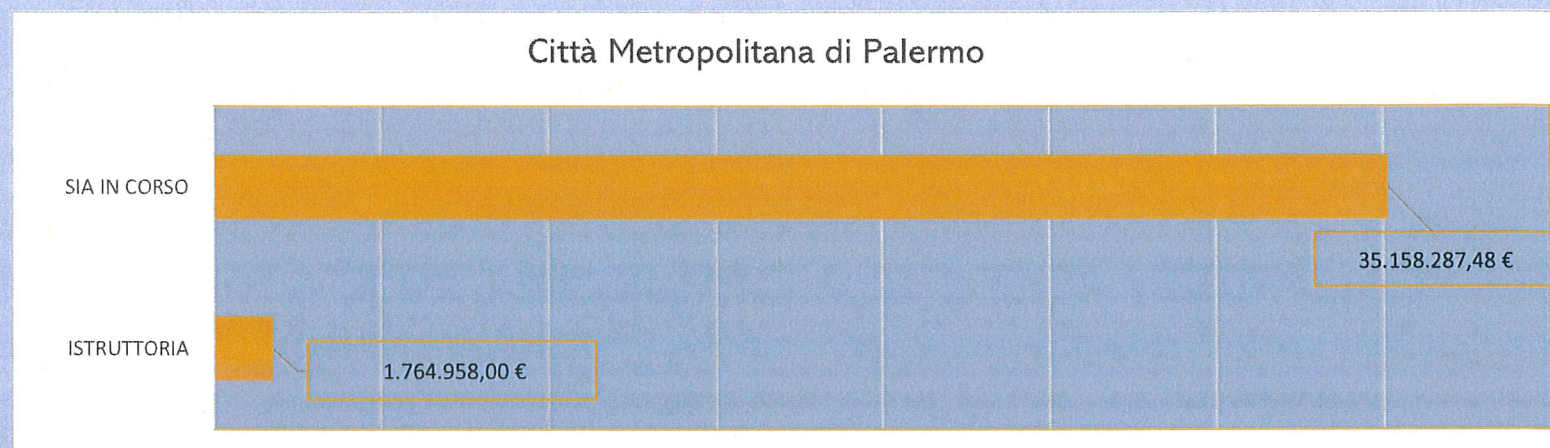

Città Metropolitana di Messina		
N.	STATO DELL'ARTE	N. Interventi
2	ISTRUTTORIA	3.650.000,00 €
	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE	- €
1	SIA IN CORSO	7.900.000,00 €
2	Intervento Concluso	391.300,00 €
5	Complessivo	11.941.300,00 €

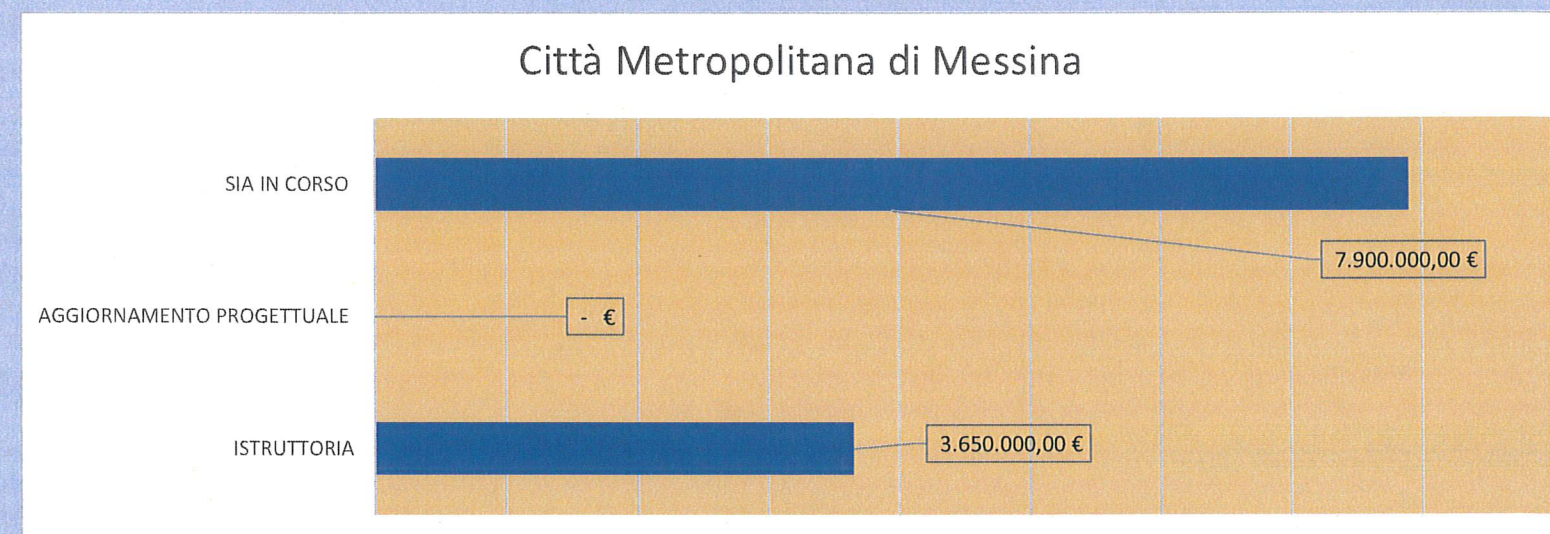

Città Metropolitana di Catania		
N.	STATO DELL'ARTE	N. Interventi
1	ISTRUTTORIA	28.800.000,00 €
1	Complessivo	28.800.000,00 €

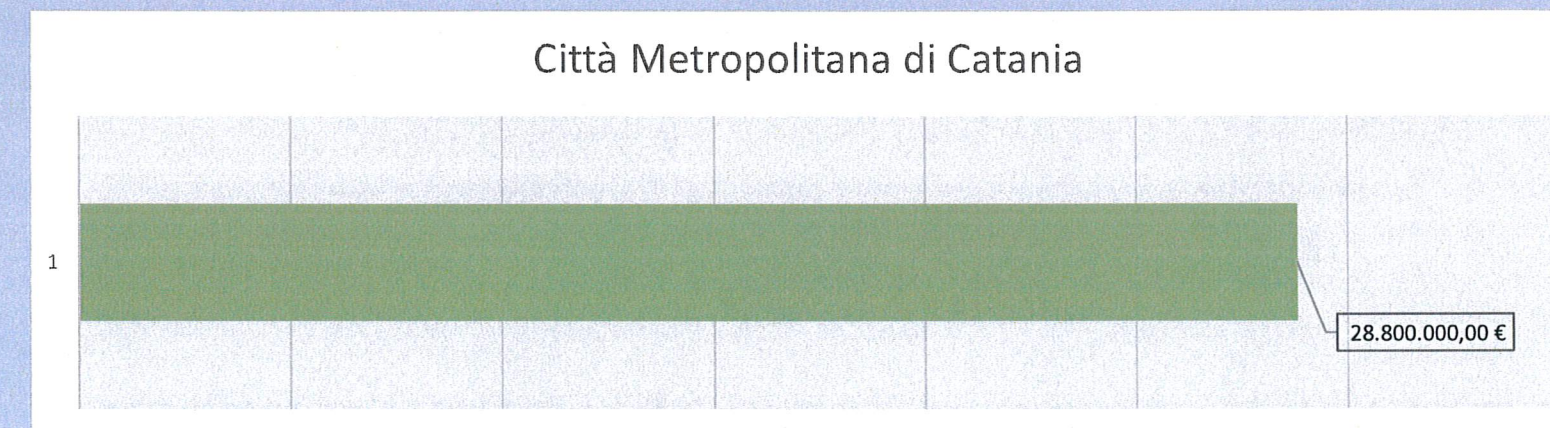

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA




COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

MONITORAGGIO INTERVENTI

FONDO PROGETTAZIONE





MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE SICILIANA



Fonte	Piano	RENDIS	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GA RA	OGV	ESECUTORE	REP	SPESE AL 30/06/2022
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IR904/G1	SIA in corso	M	AG	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	Consolidamento della Via Santuario	121.989,00 €	F	S	851_19/06/2019	121.989,00 €	SI	SI	RTP: SA & GI Engineering srl - geol. Nicita - Ing. Sciortino	SI	71.794,99 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IRB63/G1	Istruttoria	M	ME	ANTILLO	Lavori di regimentazione Alveo Torrente acqua vena, completamento del consolidamento dei versanti, sponda sx e dx, ripristino degli attraversamenti idraulici esistenti	136.817,10 €	F	S		- €	NO	NO			- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IRA12/G1	SIA in corso	M	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Progetto per i lavori urgenti di sistemazione delle Saie Riti, Bizzarro, Acquacalda e Cappuccini	228.290,00 €	A	S	1336_03/08/2020	228.290,00 €	SI	SI	RTP: Studio Colleselli & Partners - Ingegneria geotecnica - Studio di Ingegneria e Architettura dell'Ing. F. cacioppo & C S.n.c. - Geol. Cangelosi	SI	- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IRA10/G1	Stipula contratto in corso	M	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Lavori per la difesa del litorale di Barcellona P.G. nel tratto tratto tra il torrente Termini e il Torrente Longano	342.357,30 €	C	S	1625_13/11/2019	342.357,30 €	SI	SI	RTP: STUDIO MALLANDRINO SRL - CRITERIA SRL - DOTT.SSA ARCHEOLOGA SAITTA	NO	44.718,41 €
DD 227 07/12/2021	FP	19IRE76/G1	Istruttoria	M	PA	BISACQUINO	Mitigazione del rischio idrogeologico relativo all'instabilità del versante M.te Triona	557.385,69 €	F	S		- €	NO	NO			- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IRA49/G1	Istruttoria	M	ME	BROLO	Recupero ambientale a salvaguardia del torrente Pozzo	89.613,00 €	A	S		- €	NO	NO			- €
DD 227 07/12/2021	FP	19IRE55/G1	Istruttoria	M	ME	BROLO	Mitigazione del rischio idrogeologico in C.da Malpertuso. Cod. Dissesto 013-5BR-022	237.202,56 €	F	S		- €	NO	NO			- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IRB59/G1	Stipula contratto in corso	M	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	Interventi di ripascimento artificiale della spiaggia compresa tra la foce del fiume Imera e la foce	511.940,25 €	C	S	951_14/05/2021 1049_26/05/2021 1448_14/07/2021	444.310,87 €	SI	SI	RTP: PRIMA INGEGNERIA STP S.S. (mandataria) - POLISERVIZI S.R.L.	NO	25.350,55 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IRB64/G1	Istruttoria	M	ME	CAPO D'ORLANDO CDC	Intervento urgente per la difesa e salvaguardia di tratti dell'arenile di Capo d' Orlando	253.586,16 €	C	S	995_19/10/2018 1023_29/10/2018 1300_24/09/2019	268.311,93 €	NO	NO		NO	- €
DD_487_13/12/ 2019	FP	19IRF02/G1	SIA in corso	M	CT	CATANIA	Opere di mitigazione del rischio idraulico lungo l'asta del Canale Buttaceto a valle dell'immissione	834.812,04 €	A	S	1286_22/07/2020	1.400.525,56 €	SI	SI	RTP: ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL + VIA INGEGNERIA SRL - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI SRL - ENGE ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY - DOTT. ING. SAITTA	SI	54.032,00 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR919/G1	SIA in corso	M	ME	CONDRO'	Mitigazione rischio idrogeologico a protezione del centro abitato mediante sistemazione e risagomatura	159.595,80 €	F	S	1210_03/12/2018	159.595,80 €	SI	SI	RTP: Ing. Barbagioanni Gasparo - Ing. Pio D'Arrigo - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Lo Presti - Geol. Merk	SI	26.160,76 €

FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IRB31/G1	SIA in corso	M	ME	FLORESTA	La vori di messa in sicurezza del versante a monte del centro abitato di Floresta	102.984,18 €	F	S	457_10/03/2020	70.525,82 €	SI	SI	RTP: STUDIO ASSOCIATO T & P - ING. LA ROSA - GEOL. LEOTTA - GEOL. SALERNO	SI	18.205,28 €
DD 227 07/12/2021	FP	19IR797/G1	Istruttoria	M	ME	FURCI SICULO	LAVORI URGENTI DI BONIFICA DEL BACINO DEL TORRENTE FONDACALASI E RELATIVA ARGINATURA A DIFESA DEL C.	26.481,60 €	A	S		- €	NO	NO			- €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR988/G1	SIA in corso	M	ME	GALATI MAMERTINO	Consolidamento centro abitato zona S. Antonio	96.969,60 €	F	S	612_13/05/2019	96.969,60 €	SI	SI	AC2 SRL	SI	30.425,69 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR422/G1	istruttoria	M	ME	GALATI MAMERTINO	Consolidamento e messa in sicurezza del versante località Pileri	135.664,20 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IRC57/G1	Istruttoria	M	ME	GALATI MAMERTINO	Lavori di disaggio massi a protezione dell'abitato di C.da Galini- Lotto di completamento	22.396,50 €	F	S		- €	NO	NO		NO	- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IR470/G1	SIA in corso	M	ME	LENI	Lavori di consolidamento del fronte roccioso e delle grotte antistanti la spaggia Rinella	92.074,50 €	F	S	543_30/04/2019	75.727,24 €	SI	SI	RTP Dinamica SRL - Hypro SRL	SI	30.405,18 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR983/G1	SIA in corso	M	ME	LETOJANNI	Consolidamento mediante opere strutturali e di ingegneria naturalistica di prtezione passiva e attiva con canalizzazione delle acque e riforestazione	507.381,00 €	F	S	1123_14/11/2018	439.370,79 €	SI	SI	RTP: Hypro srl - Ing. Giampaolo Grasso - Geol. Fabio Nicita - Geol Giorgio Giacchetti - Ghea srl	SI	57.308,94 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IRC59/G1	SIA in corso	M	ME	LETOJANNI	Mitigazione dell'erosione cost. tratto di litorale compreso tra via Catania e torrente Letojanni	308.191,50 €	C	S	614_14/05/2019	308.191,50 €	SI	SI	RTP: Duomi Srl - Hysomar Sooc. Coop. - Ing. Antonio Moschella	SI	30.549,49 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR966/G1	SIA in corso	M	ME	LIBRIZZI	Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasi	192.074,40 €	F	S	615_14/05/2019	192.074,40 €	SI	SI	RTP: Ing. Francesco Crinò - Ing. Mariagrazia Crinò - Ing. Serena Carmela Crinò - Dott. Geol. Emerico Sciascia - Geoservice SRL	SI	48.899,97 €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IR903/G1	Stipula contratto in corso	M	ME	LIBRIZZI	Consolidamento della periferia sud-est abitato di Librizzi centro lungo la SP 126	192.074,40 €	F	S	1303_27/07/2020	192.074,40 €	SI	SI	GIGATECK ASSOCIATI	NO	- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IR561/G1	SIA in corso	M	ME	MALVAGNA	Consolidamento a protezione del c.a. versante sud - completamento	132.245,40 €	F	S	1804_12/10/2020	132.245,40 €	SI	SI	RTP: ING. CRINO' - ING. MG CRINO' - ING. IRACI -DOTT. GEOL. ANDRONACO - ING. SERENA CRINO'	SI	- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IR980/G1	Istruttoria	M	CT	MANIACE	Opere di difesa idraulica finalizzate alla protezione idrogeologica del centro abitato contrada Gala	56.597,40 €	A	S		- €	NO	NO			- €
DD_487_13/12/ 2019	FP	19IRD39/G1	SIA in corso	M	ME	MESSINA	Mitigazione rischio alluvione T.ti San Filippo, Zafferia, Mili e Marmora, Il stralcio T. San filippo	785.469,43 €	A	S	745_04/05/2020	720.374,78 €	SI	SI	RTP: TECHNITAL SPA - PH3 ENGINEERING SRL - NETEC SRL - ORION PROGETTI SRL - SIGEO DRILLING SRL	SI	61.767,44 €


DD 227 07/12/2021	FP	19IRE97/G1	Istruttoria	M	ME	MESSINA	Sistemaz. idraulica e realizzazione di una strada di collegamento tra i villaggi di Bordonaro Inf. e	140.936,90 €	A	S			- €	NO	NO			- €
DD 227 07/12/2021	FP	19IRE92/G1	Istruttoria	M	ME	MESSINA	Opere di adeguamento e sistemazione dell'alveo I Stralcio Funzionale Torrente Zafferia	768.403,66 €	A	S			- €	NO	NO			- €
FP_Sicilia II_09/08/2018	FP	19IR676/G1	Istruttoria	M	ME	MESSINA	Messa in sicurezza Idraulica del Torrente Galati tra C.da Barrace e C.da Pozzo	108.558,00 €	A	S	2132_29/10/2021		129.851,46 €	NO	NO			- €
FP_Sicilia II_09/08/2018	FP	19IR494/G1	SIA in corso	M	ME	MESSINA	Progetto della strada di collegamento tra la SS 113 ed il Villaggio di Rodia	84.138,00 €	A	S	267_10/02/2020		158.584,19 €	SI	SI	RTP: Ing. D'arrigo - Ing. D'alia - Ing. Rustica - Ing. Mangano - Ing. La Rosa - Ing. Barbagiovanni - Ing. Lo Presti - Geol. Merk	SI	34.780,60 €
FP_Sicilia II_09/08/2018	FP	19IRC82/G1	SIA in corso	M	ME	MESSINA	"Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio	365.733,90 €	C	S	1698_22/11/2019		425.012,09 €	SI	SI	RTP: Dinamica Srl - HS Marine Srl - DHI Srl - Geonautics Srl - Geol. Caterina Cuccinotta - Studium Sas	SI	88.427,39 €
FP_Sicilia II_09/08/2018	FP	19IRC80/G1	SIA in corso	M	ME	MESSINA	"Sistemazione dell'area in frana compresa tra via Noviziato Casazza - Via Sciva e Viale Italia"	340.410,00 €	A	S	279_07/03/2019		340.410,00 €	SI	SI	RTP: SUD PROGETTI SRL - Ing. A. Accardo - Ing. R. Lo Bue	SI	59.525,50 €
DD_487_13/12/ 2019	FP	19IRE91/G1	SIA in corso	M	ME	MESSINA	I Stralcio Funzionale TORRENTE LARDERIA	708.118,28 €	A	S	1109_29/06/2020		708.118,28 €	SI	SI	RTP: ING. PIO D'ARRIGO - C&C ENGINEERING SRL - ESSE INGEGNERIA SRL - ING. SCALISE - ING. RUSTICA - ING. MANGANO - ING. LA ROSA - ING. NICOTERA - ING. BARBAGIOVANNI GASPARO - ING. LO PRESTI - GEOL. MERK	SI	46.267,34 €
DD_487_13/12/ 2019	FP	19IR516/G1	SIA in corso	M	ME	MESSINA	Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti - Litorale Ionico	52.221,19 €	C	S	2142_19/11/2020		52.221,19 €	SS	SS	RTP Giosa srl e Ing. Miceli Giovanni	SI	- €
DD_487_13/12/ 2019	FP	19IRC81/G1	SIA in corso	M	ME	MESSINA	3° Stralcio di completamento Siti: Marmora, Rodia Puccino, Acqualadrone, Capo Rasocolmo	381.198,42 €	F	S	674_21/04/2020		378.886,50 €	SI	SI	RTP: ING. PIO D'ARRIGO - NETEC SRL - ING. BARATTA - ING. RUSTICA - ING. MANGANO - ING. LA ROSA - ING. BARBAGIOVANNI GASPARO - ING. LO PRESTI - GEOL. MERK	SI	39.984,07 €
DD 227 07/12/2021	FP	19IRE51/G1	Istruttoria	M	PA	MISILMERI	Completamento opere di regimazione idraulica in C.da Piano Stoppa	182.501,76 €	A	S			- €	NO	NO			- €
DD_487_13/12/ 2019	FP	19IRF04/G1	Istruttoria	M	CT	MISTERBIANCO	OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NELL'AREA PRODUTTIVA E COMMERCIALE DI C.DA MEZZOCAMPO	500.462,00 €	A	S			- €	NO	NO			- €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR450/G1	Istruttoria	M	ME	MOTTA CAMASTRA	Consolidamento e risanamento ambientale dell'area prospiciente la casa comunale sita in P.zza Croce a nor di Rocca Mancusa	53.490,78 €	F	S			- €	NO	NO			- €

DD 227 07/12/2021	FP	19IRE65/G1	Istruttoria	M	SR	PACHINO	Progetto di messa in sicurezza e ripristino bacini portuali Porto Balata e Porto Fossa - Marzamemi	92.451,01 €	F	S			- €	NO	NO		NO	- €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR021/G3	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi di manutenzione canali di Maltempo e sistemazione degli argini canale	272.500,00 €	A	S	217_04/02/2020		319.059,05 €	SI	SI	RTP: IENCON SCARL - DR GEOL. ORESTE ADELFO ING. FABIO MARINEO - C.D.G. INGEGNERIA SRL - STUDIO SCIBILIA	SI	57.761,92 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IRB94/G1	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti e scarpate di M. Pellegrino sovrastanti il tratto centrale di Via Monte Ercta	248.010,00 €	F	S	1121_14/11/2018		208.277,83 €	SI	SI	RTP: STUDIO ASSOCIATO PROTEA INGEGNERIA - SUD PROGETTI S.R.L.	SI	34.561,00 €
DD 227 07/12/2021	FP	19IRC30/G1	Istruttoria	M	PA	PALERMO	Mitigazione del rischio da crollo pareti N/E di cozzo finocchio e cozzo di paola	100.689,28 €	F	S			- €	NO	NO		NO	155.971,06 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IRB91/G1	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti gli abitati di Addaura e Mondello	1.088.675,70 €	F	S	1082_08/11/2018		1.088.548,03 €	SI	SI	RTP: HYPRO S.R.L. - ING. MOSCHELLA	SI	178.733,19 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IRB92/G1	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo area N/E	534.450,00 €	F	S	1345_21/12/2018		534.450,00 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO - Studio Geologico Graziano e Masi - Arch. D'Amico - Agr. Di Leonardo - Ing. Giannone Codiglione - Urbana Srl	SI	76.819,12 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IRB89/G1	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di monte Pellegrino sovrastanti il parco urbano della Favorita, il Viale Margherita di Savoia e il Viale Diana	873.818,40 €	F	S	69_21/01/2019		873.818,40 €	SI	SI	RTP: SERING SRL - COOPROGETTISOC.COOP. - IDROGEO SRL - Metro Test.SRL	SI	162.595,89 €
FP_Sicilia 11_09/08/2018	FP	19IRB88/G1	SIA in corso	M	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli abitati di Partanna e Tommaso Natale	449.904,00 €	F	S	955_09/07/2019		449.904,00 €	SI	SI	RTP: PRO-GEO - SA&GI Engineering srl - Studio Geologico Graziano e Masi - Dott. Ing. Pirrera - Dott. Geol. Ferraro - Dott. Ing. DiGesaro	SI	75.969,20 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR961/G1	SIA in corso	M	ME	PATTI	Consolidamento area urbana case nuove Russo, per la mitigazione del rischio geomorfologico - dissesto Cuturi, case nuove Russo	188.997,48 €	F	S	1264_17/09/2019		188.997,48 €	SI	SI	TPC Progetti snc	SI	41.762,00 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IRC64/G1	SIA in corso	M	EN	PIAZZA ARMERINA	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti Via Mazzini	190.365,00 €	F	S	1177_27/11/2018		190.365,00 €	SI	SI	RTP: GaiaTech S.r.l. - Studio di geologia dott. Geol. C. Filice - Ing. L. ravenda - Si.Ar. Trivellazioni di Simonetti R. - Dott.ssa Geol. O. Albace - Ing. A. Aulicino	SI	53.634,60 €
FP_Sicilia 11_09/08/2018	FP	19IRC06/G1	SIA in corso	M	ME	RACCUJA	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico degli agglomerati urbani della frazione Zappa	204.043,06 €	F	S	975_15/10/2018 1025_29/10/2018		204.043,06 €	SI	SI	RTP: ICPA SRL - HYPRO S.R.L.	SI	43.612,07 €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR928/G1	Istruttoria	M	AG	RAVANUSA	Completamento del consolidamento delle aree a valle del centro abitato	67.823,89 €	F	S			- €	NO	NO			- €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR935/G1	Istruttoria	M	ME	ROMETTA	Realizzazione delle opere di protezione delle aree costiere e delle spiagge del territorio comunale	183.234,15 €	C	S			- €	NO	NO			- €

FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IRB62/G1	Istruttoria	M	TP	SALAPARUTA	Progetto per il consolidamento mediante opere di risagomatura e rinforzo opere di sostegno; Opere di regimentazione della acque e riforestazione; Opere strutturali di stabilizzazione del versante	119.813,40 €	F	S	1372_07/07/2021	71.043,48 €	SS	NO		NO	- €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR533/G1	SIA in corso	M	ME	SAN PIERO PATTI	Opere di consolidamento zona centro abitato compresa tra la via Leonardo Da Vinci e la Via Catania	69.706,98 €	F	S	1256_06/12/2018	69.706,98 €	SI	SI	Ing. Oliveri Fabrizio - SUD Progetti srl	SI	- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IRA78/G1	Istruttoria	M	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	Consolidamento e messa in sicurezza dell'area Ovest del C.A. in prossimità della Piazza S. Antonio	56.983,50 €	F	S		- €	NO	NO			- €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR938/G1	Istruttoria	M	ME	SCALETTA ZANCLEA	Messa in sicurezza di C. Scaletta e ricostruzione della spiaggia a tutela delle strutture viarie	87.151,95 €	C	S		- €	NO	NO			- €
FP_Sicilia 22/11/2017	FP	19IR911/G1	Istruttoria	M	ME	SCALETTA ZANCLEA	Completamento dei lavori di protezione dell'abitato della Fraz. Divieto cod. PAI 102-SSZ- 020	58.016,01 €	F	S	479_29/05/2018	58.016,01 €	NO	NO		NO	- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IRC39/G1	Istruttoria	M	ME	SCALETTA ZANCLEA	Consolidamento centro abitato di Giudomandri Superiore - rimboschimento prog. Completamento	142.501,80 €	F	S		- €	NO	NO			- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IR828/G1	SIA in corso	M	ME	SINAGRA	Realizzazione di una via di Fuga del centro storico del paese, mediante l'adeguamento del percorso esistente	44.509,50 €	F	S	1281_11/12/2018	44.509,50 €	SI	SI	Ing. Vittorio Cacioppo	SI	24.627,89 €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IRC04/G1	SIA in corso	M	SR	SIRACUSA	Progetto mitigazione del rischio idrogeologico dell'ara denominata Pantanelli	221.573,03 €	A	S	783_11/06/2019	332.120,11 €	SI	SI	RTP: Beta Studio Srl - Orion Progetti Srls - Vamirgeoind Srl - Ing. Juan Esteban Lucca	SI	71.776,28 €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IR612/G1	SIA in corso	M	ME	TAORMINA	Consolidamento in C/DA Costa Don Lappio - Completamento	100.233,00 €	F	S	1170_07/07/2020	100.233,00 €	SI	SI	RTP STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO E CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SI	- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IR239/G1	Istruttoria	M	ME	TAORMINA	Progetto relativo al consolidamento del costone roccioso di C.da Villagonia	74.447,10 €	F	S		- €	NO	NO			- €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IR162/G1	SIA in corso	M	ME	TRIPI	Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della S.P. n. 115 Tripliciana	142.501,80 €	F	S	262_06/03/2019	142.501,00 €	SI	SI	RTO: ing. Faranna - Ing. Giannetto - Arch. Moschella - Arch. Faranna - Geol. Uchino	SI	27.056,36 €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IR887/G1	SIA in corso	M	ME	TRIPI	Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Baracca- Piazza Drago	177.212,12 €	F	S	613_13/05/2019	177.212,12 €	SI	SI	RTP: Ing. Faranna - Ing. Giannetto - Studio Moschella - Arch. A. Faranna - Geol. Uchino	SI	25.659,22 €
FP_Sicilia IL_09/08/2018	FP	19IR217/G1	SIA in corso	M	ME	TRIPI	Mitigazione rischio idrogeologico area centro abitato cod. 010-STR-133	101.360,10 €	F	S	716_30/05/2019	101.360,10 €	SI	SI	RTP: Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati Srl - Geol. Ferrarotti	SI	- €

DD_487_13/12/2019	FP	19IRE71/G1	SIA in corso	M	ME	TORREGROTTA	Canalizzazione e regolarizzazione deflusso acque piovane (SA PAI 003- E05)	73.718,80 €	A	S	1049_16/06/2020	73.718,80 €	SI	SI	RTP: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL - DOTT. ADRIANO BARBAGALLO	SI	7.588,29 €
DD_487_13/12/2019	FP	19IR557/G1	Istruttoria	M	ME	VILLAFRANCA TIRRENA	Lavori di ristrutturazione del ponte sul torrente Calvaruso	26.933,04 €	A	S		- €	NO	NO			- €
DD 227 07/12/2021	FP	19IRC43/G1	istruttoria		CT	ZAFFERANA ETNEA	Lavori di regimentazione delle acque piovane per la mitigazione del rischio idraulico sulla strada provinciale 4/1A. Via A. Diaz nelle Frazioni di Fleri-Pisano.	123.210,00 €	A	S		- €	NO	NO			- €
								15.925.200,00 €				12.613.902,05 €				1.806.731,69 €	

<i>n°</i>	<i>Stato di Attuazione</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
25	Istruttoria	4.210.212,15 €	26,44%
-	Gara SIA in corso		0,00%
3	Stipula Contratto in corso	1.046.371,95 €	6,57%
37	SIA in corso	10.668.615,90 €	66,99%
-	SIA conclusi		0,00%
-	Risoluzione contratto		0,00%
-	Richiesta Revoca		0,00%
65	<i>Complessivo</i>	<i>15.925.200,00 €</i>	<i>100,00%</i>

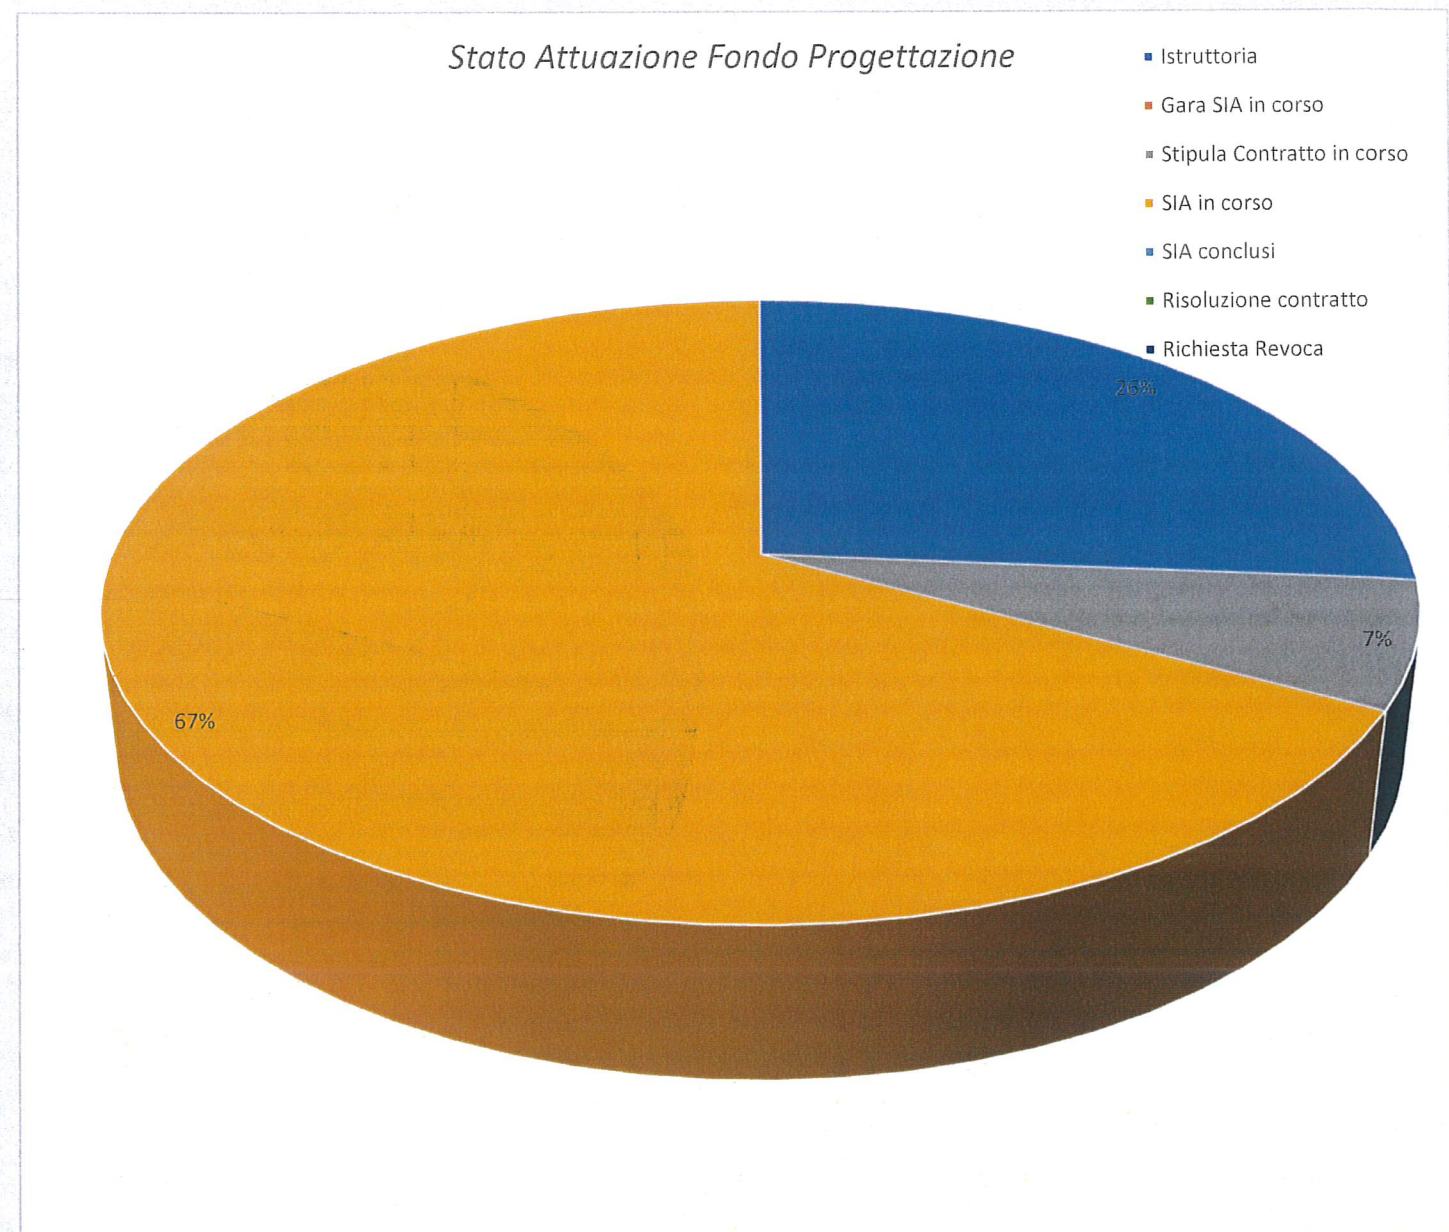

REPUBBLICA ITALIANA


REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

MONITORAGGIO INTERVENTI PIANO STRALCIO 2019

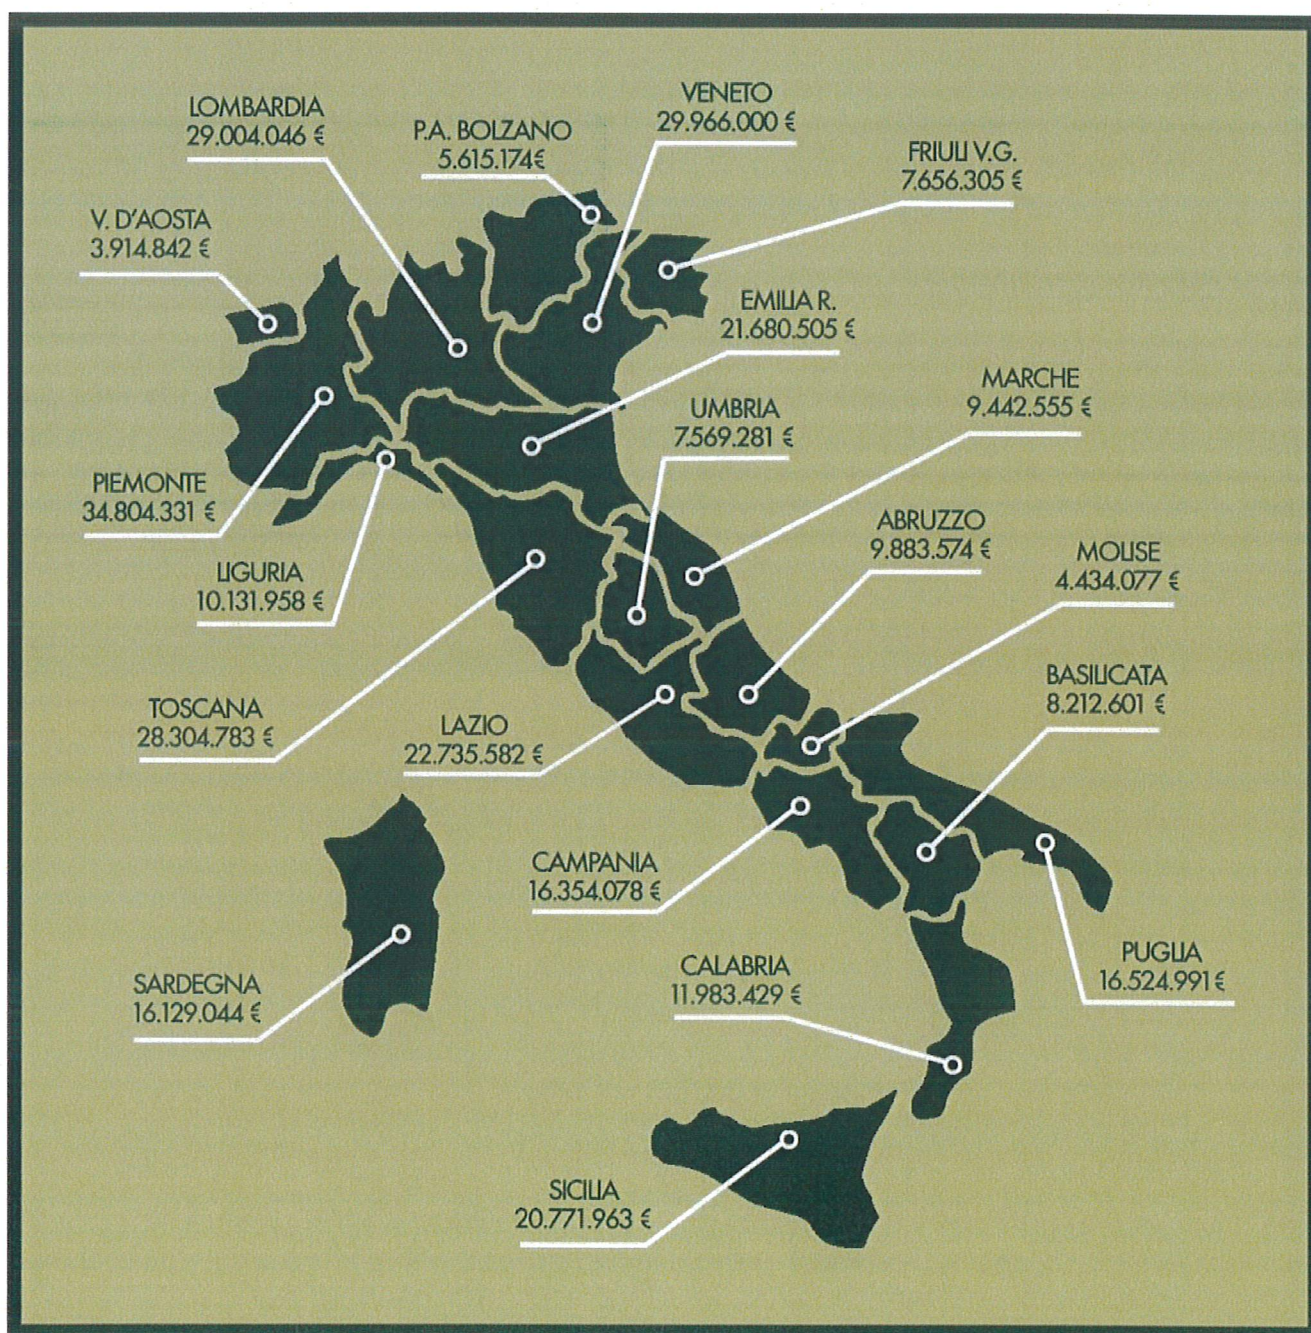



MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE SICILIANA



Fonte	Piano	RENDIS	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GA RA	OGV	ESECUTORE	REP	SPESO AL 30/06/2022
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IR167/G1	Lavori in corso	M	ME	CASTROREALE	Completamento del Consolidamento del centro abitato della frazione Bafia	1.300.000,00 €	F	L	1720_27/11/2019	1.300.000,00 €	SI	SI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	SI	327.449,59 €
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IR094/G1	Lavori in corso	M	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Consolidamento della zona di costone roccioso sovrastante l' intervento di somma urgenza eseguito nel tratto in corrispondenza della via Piedimonte. Completamento	1.500.000,00 €	F	L	1804_05/12/2019	1.500.000,00 €	SI	SI	MI.CO. SRL	SI	690.234,59 €
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IR110/G1	Lavori in corso	M	EN	NICOSIA	Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco	3.338.750,00 €	F	L	1875_13/12/2019	3.338.750,00 €	SI	SI	ATI: ALTA QUORA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL	SI	1.479.467,22 €
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IR222/G1	Lavori in corso	M	ME	SAN FRATELLO	Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, Quartiere Porta Sottana, Lavanche, Buviano e parte sottostante Quartiere San Nicolo'	4.100.000,00 €	F	L	1882_13/12/2019	4.100.000,00 €	SI	SI	DEMETRA LAVORI SRL	SI	2.213.608,48 €
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IR349/G1	Lavori in corso	M	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna	1.488.212,98 €	F	S	1667_23/09/2020 1831_17/09/2021	1.488.212,98 €	SI	SI	DEMETRA LAVORI SRL	SI	24.348,19 €
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IRC16/G1	Lavori in corso	M	ME	ROCCALUMERA	Lavori di recupero delle fiumare di Allume e Sciglio- Bonifica dei margini- Completamento Torrente S	3.750.000,00 €	F	L	1880_13/12/2019	3.750.000,00 €	SI	SI	COSPIN UNIPERSONALE SRL	SI	1.542.164,15 €
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IRA77G1	Lavori in corso	M	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Lavori di consolidamento ed eliminazione del rischio idrogeologico del perimetro urbano in C/da Curatola a protezione della Via Cesare Battisti	1.520.000,00 €	F	L	1857_11/12/2019	1.520.000,00 €	SI	SI	ATI. I.M.G.A. SAS - dott. Caramazza - ICPA S.R.L.	SI	907.115,58 €
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IRF18/G1	Lavori conclusi	M	TP	ALCAMO	Lavori di consolidamento del tratto in frana della strada per Camporeale ricadente nel Comune di Alcamo	900.000,00 €	F	L	1547_30/10/2019	900.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	SI	581.824,31 €
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IRF19/G1	Lavori in corso	M	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico	1.250.000,00 €	F	L	1858_11/12/2019	1.250.000,00 €	SI	SI	MONDELLO COSTRUZIONI SRL (RICORSO) - PI.SA.NI. SRL (NUOVA AGGIUDICATARIA)	SI	415.826,11 €
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IR429/G1	Lavori in corso	M	ME	LIBRIZZI	Opere di contenimento centro abitato	150.000,00 €	F	L	1472_18/10/2019 1716_01/10/2020 1546_27/07/2021_D	150.000,00 €	SI	SI	MORETTI QUINTILIO SRL	SI	88.780,21 €
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IR484/G1	Lavori in corso	M	ME	NASO	Lavori di consolidamento in Contrada Maina	625.000,00 €	F	L	1788_05/12/2019 1832_10/12/2019	625.000,00 €	SI	SI	COGE SRL +Atto Aggiuntivo	SI	509.195,25 €
DM 255/2019	Piano Stralcio 2019	19IR273/G1	SIA in corso	M	ME	MESSINA	Opere di consolidamento e protezione del versante meridionale dell'abitato di Bordonaro - R4	850.000,00 €	F	L	1815_14/09/2021	136.689,78 €	SI	SI	RTP EDILING SRL - GEOL. LUCIO GNAZZO	SI	11.231,07 €


20.771.962,98 €


18.758.652,76 €

8.791.244,75 €

Piano Stralcio 2019		
<i>n.</i>	<i>Stato di Attuazione</i>	<i>Importo</i>
0	ISTRUTTORIA	- €
0	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE	- €
1	SIA IN CORSO	850.000,00 €
10	LAVORI IN CORSO	19.296.962,98 €
1	LAVORI CONCLUSI	625.000,00 €
12	<i>Complessivo</i>	<i>20.771.962,98 €</i>

ATTUAZIONE PIANO STRALCIO 2019

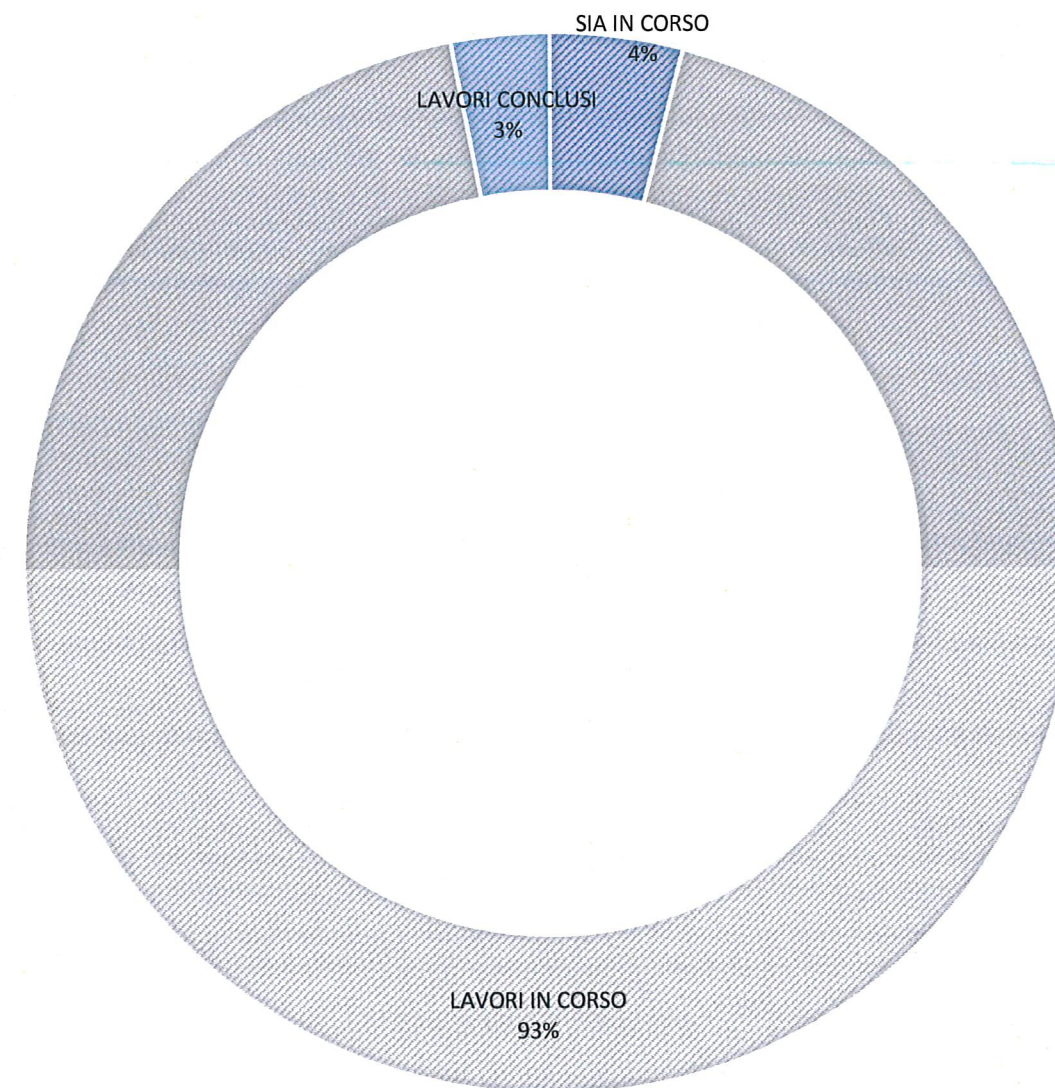



PIANO OPERATIVO AMBIENTE



MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE SICILIANA



Fonte	Piano	RENDIS	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A	FINANZIAMENTO	IMPORTO	GA RA	OGV	ESECUTORE	REP	SPESO AL 30/06/2022
DM 124/2019	POA	19IR055/G1	Istruttoria	FSC	CT	PALAGONIA	Completamento dell'intervento di consolidamento e miglioramento sismico della sede dell'U.T.C.	2.400.000,00 €	F	L		- €	NO	NO		NO	- €
DM 124/2019	POA	19IR063/G1	Lavori in corso	FSC	EN	AGIRA	Consolidamento e messa in sicurezza della periferia meridionale del centro abitato	1.315.000,00 €	F	L	259_10/02/2020	1.315.000,00 €	SI	SI	ATI S.M. S.R.L. - COS. IT S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C.SAS	SI	547.853,43 €
DM 124/2019	POA	19IR064/G1	Lavori in corso	FSC	EN	AGIRA	Consolidamento e messa in sicurezza versante ovest del Quartiere S. Maria	1.061.685,04 €	F	L	1045_26/07/2019	1.061.685,04 €	SI	SI	ILSET SRL	SI	561.753,03 €
DM 124/2019	POA	19IR148/G1	Lavori in corso	FSC	PA	PETRALIA SOPRANA	Lavori di consolidamento del centro abitato di Petralia Soprana, versante sud-ovest	1.491.274,01 €	F	L	1473_18/10/2019_P 1555_28/07/2021_L 864_18/05/2022_D	1.491.274,01 €	SI	SI	ANTONINI SRL + RTP: Ing. Zafonti - Ing. C. Zafonti - Ing. Domina - Italiasigis Engineering Srl - Geol. D'Anna	SI	290.593,46 €
DM 124/2019	POA	19IR173/G1	Lavori in corso	FSC	ME	MONTALBANO ELICONA	Consolidamento centro abitato della frazione Santa Maria	2.415.000,00 €	F	L	868_30/04/2021	2.415.000,00 €	SI	SI	UNICOS SRL	SI	291.375,54 €
DM 124/2019	POA	19IR207/G1	SIA in corso	FSC	ME	RACCUJA	Consolidamento dell'abitato S.Nicolò-Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja	1.800.000,00 €	F	S	2093_13/11/2020	198.230,20 €	SI	SI	AKWA ENGINEERING ARL	SI	225,00 €
DM 124/2019	POA	19IR403/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	SAN TEODORO	Consolidamento della zona a valle della Via degli Angeli del centro abitato	2.275.000,00 €	F	L	1323_26/09/2019	2.275.000,00 €	SI	SI	ITALCOSTRUZIONI SRL	SI	1.406.313,85 €
DM 124/2019	POA	19IR420/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	CASTELMOLA	Completamento consolidamento costone roccioso a valle centro abitato loc. Cuculunazzo - Sottoporta	2.000.000,00 €	F	L	1756_03/12/2019	2.000.000,00 €	SI	SI	ATI - COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL -EUROSTRADE SRL	SI	1.001.716,36 €
DM 124/2019	POA	19IR517/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	MESSINA	Messina_Progetto di manutenzione delle barriere frangiflutti esistenti - Litorale Tirrenico	3.000.000,00 €	F	L	130_21/01/2020	3.000.000,00 €	SI	SI	AMEC SRL	SI	2.099.701,19 €
DM 124/2019	POA	19IR529/G1	Lavori conclusi	FSC	ME	MILITELLO ROSMARINO	Consolidamento all'interno del centro abitato in c.da Ramisi	2.000.000,00 €	F	L	1672_20/11/2019	2.000.000,00 €	SI	SI	ATI CONSORES SRL - GANGI IMPIANTI SLR	SI	1.256.607,43 €
DM 124/2019	POA	19IR546/G1	Lavori in corso	FSC	ME	ITALA	Lavori di consolidamento e regimentazione idraulica dell'area in frana in località Casaleddu	1.500.000,00 €	F	L	1337_03/08/2020	1.500.000,00 €	SI	SI	SA.CO.REST SRL	SI	222.200,06 €


DM 124/2019	POA	19IR592/G1	Lavori conclusi	FSC	CL	MARIANOPOLI	Lavori di consolidamento nella zona delle Case Agricole	945.000,00 €	F	L	1578_05/11/2019	945.000,00 €	SI	SI	EDILSUN SRL	SI	459.063,51 €
DM 124/2019	POA	19IR620/G1	Istruttoria	FSC	ME	FIUMEDINISI	Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana	1.900.000,00 €	F	L	1554_30/10/2019 Supp. RUP	23.967,05 €	SS	SS	Ing. Scaglione	SI	18.200,00 €
DM 124/2019	POA	19IR897/G1	Lavori in corso	FSC	SR	FERLA	Lavori di consolidamento a sud del centro abitato, C.da Macello II° Lotto	1.200.000,00 €	F	L	1757_03/12/2019	1.200.000,00 €	SI	SI	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. a.r.l.	SI	634.146,02 €
DM 124/2019	POA	19IRB26/G1	Lavori conclusi	FSC	PA	BAUCINA	Consolidamento del cimitero comunale - 1° stralcio - messa in sicurezza per l'incolumità pubblica	398.137,47 €	F	L	1874_13/12/2019	398.137,47 €	SI	SI	GANGI IMPIANTI	SI	172.419,64 €
DM 124/2019	POA	19IRB36/G1	Lavori in corso	FSC	AG	SANT'ANGELO MUXARO	Progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso completamento - versante nord-est	3.500.000,00 €	F	L	1908_17/12/2019	3.500.000,00 €	SI	SI	ATI C.E.S.I. SRL	SI	897.174,45 €
DM 124/2019	POA	19IRB50/G1	Lavori in corso	FSC	ME	FRAZZANO'	Consolidamento della zona R4 a monte della via Libertà nel centro urbano di Frazzanò II° stralcio	2.700.000,00 €	F	L	1927_18/12/2019	2.700.000,00 €	SI	SI	MACOS SOC. COOP. (RICORSO) DI NICA COSTRUZIONI SRL	SI	667.582,14 €
DM 124/2019	POA	19IRB51/G1	Lavori in corso	FSC	ME	FRAZZANO'	_Consolidamento della zona R4 a monte della via Libertà nel centro urbano di Frazzanò I° stralcio	2.320.000,00 €	F	L	1083_01/08/2019	2.320.000,00 €	SI	SI	MAMMANA MICHELANGELO	SI	1.520.584,50 €
DM 124/2019	POA	19IRC60/G1	Lavori in corso	FSC	ME	CAPRI LEONE	Capri Leone_Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato "Torrente Paliace"	1.175.000,00 €	F	L	1890_16/12/2019	1.175.000,00 €	SI	SI	MODESIL SRL - ARLEN SRL	SI	429.308,12 €
DM 124/2019	POA	19IRC73/G1	Lavori in corso	FSC	AG	RAFFADALI	Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del Rione Barca	8.982.686,30 €	F	L	232_10/12/2020	9.612.921,90 €	SI	SI	ATI: I.G.C. SRL - S.I.F. SPA	SI	69.502,71 €
DPCM 20/02/2019	ADDENDUM	19IR043/G3	SIA In corso	FSC	CT	SAN GIOVANNI LA PUNTA	Completamento del I Lotto della rete fognante del centro abitato – Stralcio rete acque bianche	1.265.277,03 €	I	S	1660_22/09/2020	123.196,82 €	SI	SI	RTP: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO, STRAFER INGEGNERIA	SI	- €
DPCM 20/02/2019	ADDENDUM	19IR044/G3	Istruttoria	FSC	CT	TRECASTAGNI	Progetto dei lavori per la rete fognante - I° Stralcio rete acque bianche.	2.300.000,00 €	I	L		- €	NO	NO		NO	- €
DPCM 20/02/2019	ADDENDUM	19IR039/G3	Gara in corso	FSC	CT	CATANIA	Completamento Collettore pluviale B	53.302.310,49 €	I	I	2554_31/12/2021	53.302.310,49 €	SI	NO		NO	23.538,56 €

101.246.370,34 €

92.556.722,98 €

12.569.859,00 €

Stato Attuazione Piano Operativo Ambiente POA & ADDENDUM			
n.	Stato Attuazione	Importo	%
3	Istruttoria	6.600.000,00 €	6,52%
-	Predisposizione Atti di Gara	- €	0,00%
-	Gara SIA in corso	- €	0,00%
2	SIA in corso	3.065.277,03 €	3,03%
-	Gara in corso	53.302.310,49 €	52,65%
-	Stipula Contratto in corso	- €	0,00%
11	Lavori in corso	27.660.645,35 €	27,32%
6	Lavori Conclusi	10.618.137,47 €	10,49%
22	Complessivo	101.246.370,34 €	100,00%

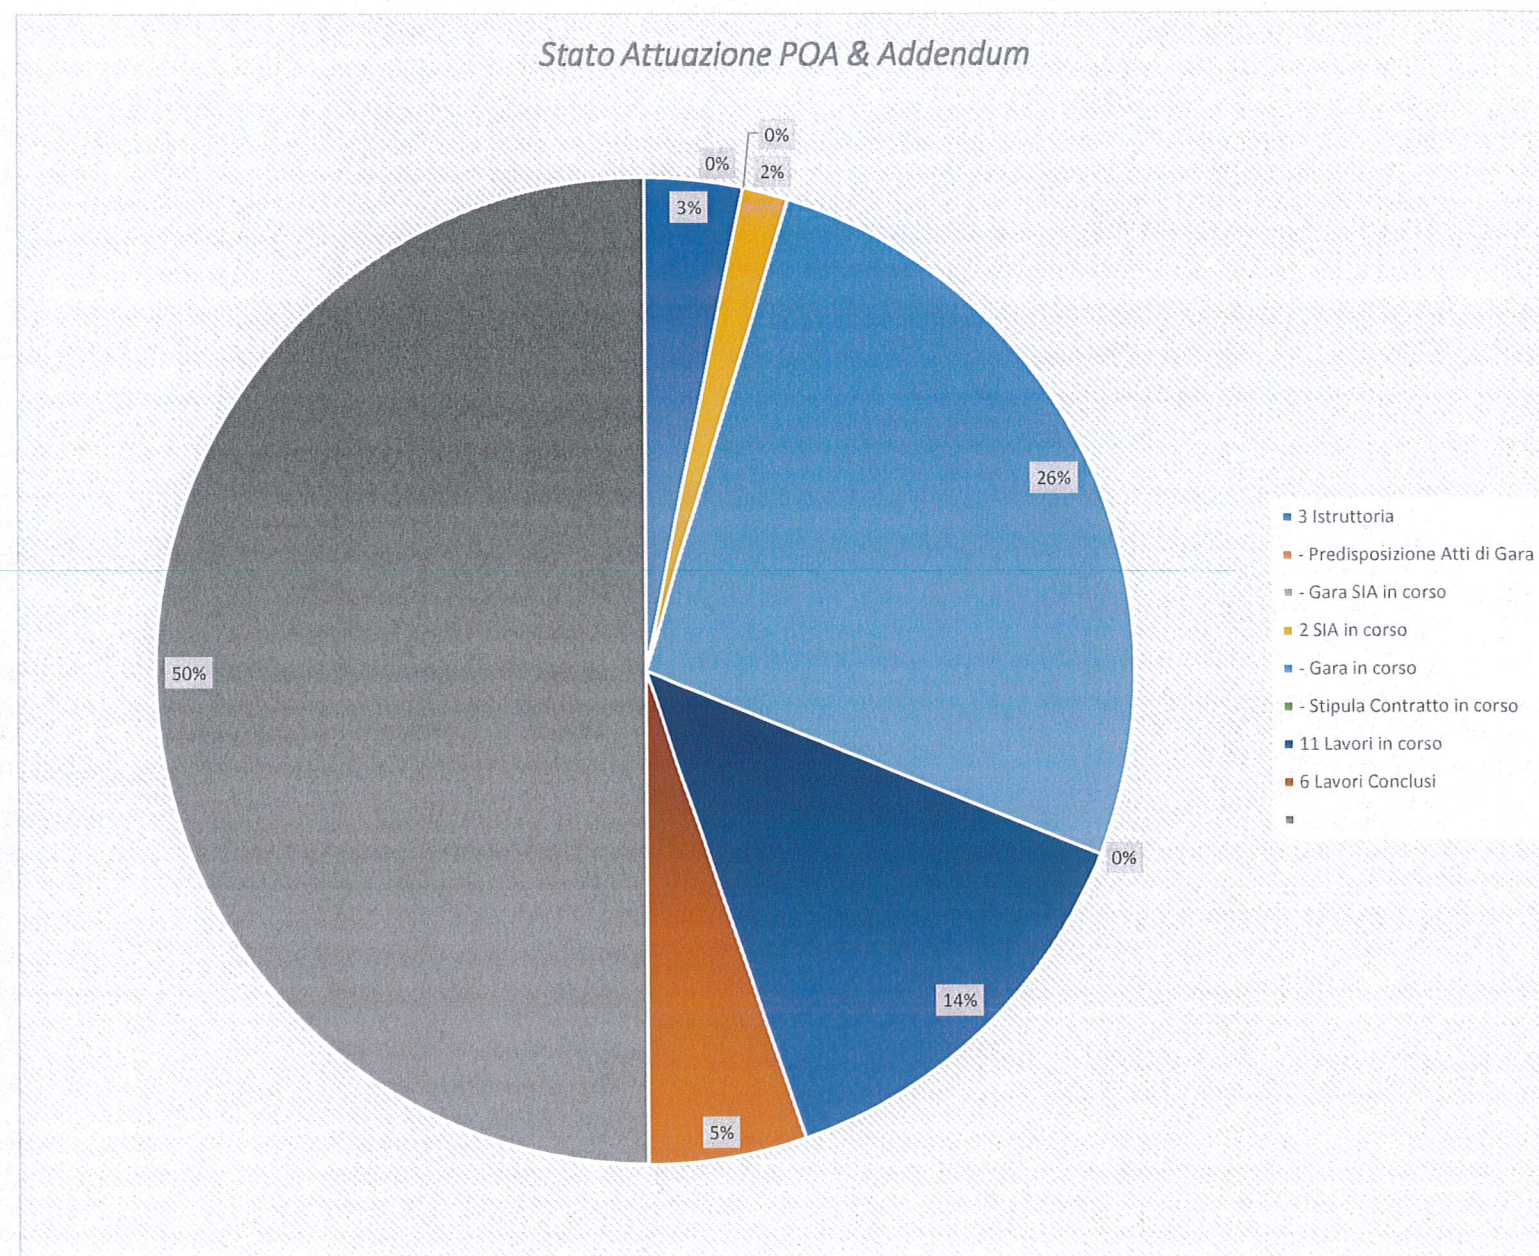

REPUBBLICA ITALIANA




REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

MONITORAGGIO INTERVENTI PIANO STRALCIO 2020

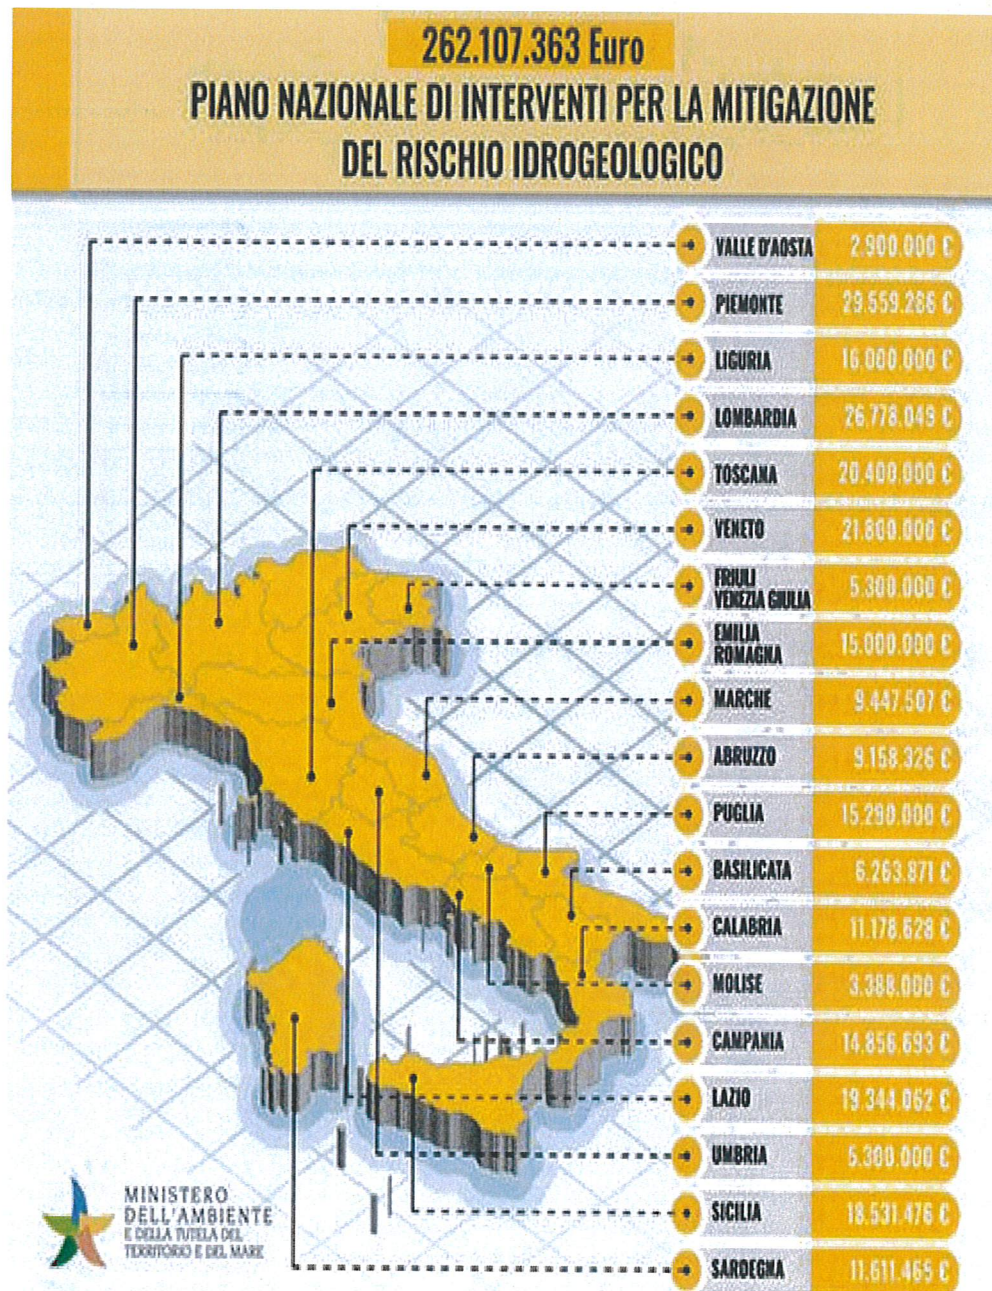



MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE SICILIANA



Fonte	Piano	RENDIS	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A
DPCM 20/02/2019	Piano Stralcio 2020	19IR156/G1	Stipula contratto in corso	FSC	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera	1.400.000,00 €	F	L
DPCM 20/02/2019	Piano Stralcio 2020	19IR235/G1	Nuova Programmazione	FSC	ME	CASTELMOLA	Progetto per il consolidamento dell'abitato di Castelmola nei tratti del "Castello lato sud e sottoporta"	2.000.000,00 €	F	L
DPCM 20/02/2019	Piano Stralcio 2020	19IR886/G1	Nuova Programmazione	FSC	SR	FRANCOFONTE	Lavori di consolidamento per la mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	2.380.000,00 €	F	L
DPCM 20/02/2019	Piano Stralcio 2020	19IRB97/G1	Nuova Programmazione	FSC	ME	NASO	Consolidamento e Messa in Sicurezza Per La Mitigazione del rischio idrogeologico in località San Giuliano	1.026.476,00 €	F	L
DPCM 20/02/2019	Piano Stralcio 2020	19IRA36/G1	Nuova Programmazione	FSC	ME	NOVARA DI SICILIA	Mitigazione Rischio Idrogeologico a protezione del centro abitato in Novara di Sicilia- Via Bnedetto Croce e C.da Rocazza Fraz. San Basilio	1.950.000,00 €	F	L
DPCM 20/02/2019	Piano Stralcio 2020	19IRB90/G1	Nuova Programmazione	FSC	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Gallo sovrastanti gli abitati si Sferracavallo e Barcarello	8.925.000,00 €	F	L
DPCM 20/02/2019	Piano Stralcio 2020	19IRC31/G1	Nuova Programmazione	FSC	PA	PALERMO	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su via Falconara	850.000,00 €	F	L

18.531.476,00 €

REPUBBLICA ITALIANA




REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

MONITORAGGIO INTERVENTI PIANO STRALCIO 2021

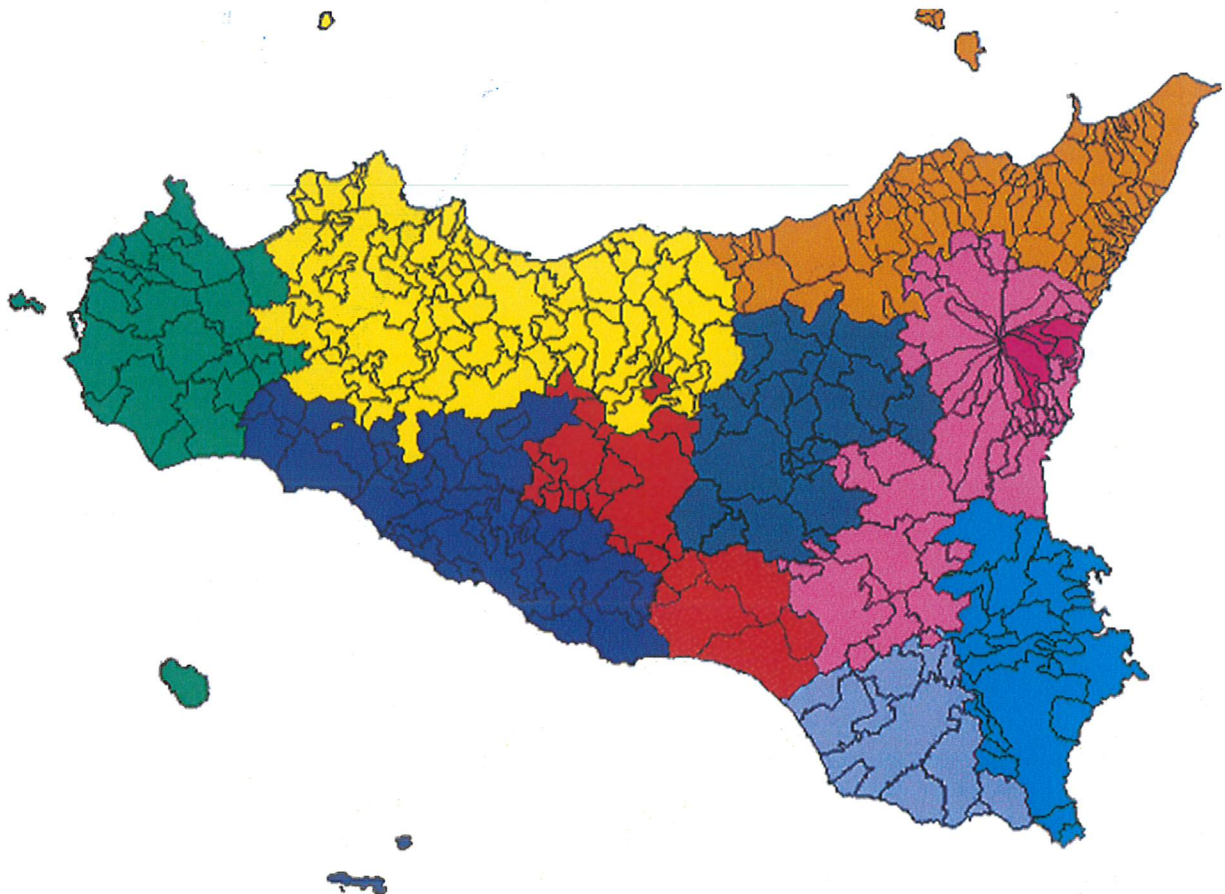



MONITORAGGIO INTERVENTI UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE SICILIANA



Fonte	Piano	RENDIS	STATO	F	PR	COMUNE	TITOLO	IMPORTO DELIBERA	D	A
DM 499/2021	VI ATTO	19IR955/G1	Istruttoria	M	ME	CAPO D'ORLANDO	Mitigazione del rischio idraulico per la difesa idraulica del Torrente S.Lucia	2.385.000,00 €	A	L
DM 499/2021	VI ATTO	19IR806/G1	Istruttoria	M	ME	MILAZZO	Lavori di consolidamento del costone roccioso sovrastante la Ngonia del Tono comprese le parti sottostanti di via Manica - 1° Stralcio funzionale	7.259.331,76 €	F	L
DM 499/2021	VI ATTO	19IRE56/G1	Istruttoria	M	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Consolidamento a salvaguardia del centro abitato "S.Antonio - Chiappi - Calindro"	3.990.000,00 €	F	L
DM 499/2021	VI ATTO	19IRC64/G1	Istruttoria	M	EN	PIAZZA ARMERINA	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti Via Mazzini	2.000.000,00 €	F	L
DM 499/2021	VI ATTO	19IRA35/G1	Istruttoria	M	ME	ROCCAFIORITA	Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo	1.500.000,00 €	F	L
DM 499/2021	VI ATTO	19IR823/G1	Istruttoria	M	TP	SALEMI	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro urbano interessato da un movimento franoso in c.da Monte delle Rose nel Comune di Salemi	2.100.000,00 €	F	L

19.234.331,76 €
