



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010  
e nei successivi Atti Integrativi”

## Relazione al 31 dicembre 2015

Relazione sulle attività commissariali dell’art. 2, comma 3, D.P.C.M del 30 marzo 2010

Il Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia  
Foti

A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'Foti', written over the printed name.

## RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE

La presente relazione illustra le attività svolte dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia (ex DPCM 10.12.2010) nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2015.

### PREMESSA

Il territorio della Regione Siciliana è caratterizzato da peculiarità geologiche e morfologiche molto particolari, in quanto nell'ambito geografico regionale si ha la compresenza, anche in ambiti geografici poco estesi, di rocce sedimentarie, vulcaniche e metamorfiche.

In maniera assolutamente generale è possibile suddividere il territorio dell'isola in funzione delle diverse litologie affioranti ovvero:

- Rocce metamorfiche: parte della Provincia di Messina
- Rocce vulcaniche: parte della Provincia di Catania ed alcune isole minori
- Rocce sedimentarie: la rimanente parte delle province.

Quindi, a seconda del contesto geologico presente, si hanno dei processi geomorfologici differenti, strettamente dipendenti dalle caratteristiche litologiche del substrato presente.

In generale le zone interessate dalla presenza di un substrato litoide a consistenza lapidea (area del trapanese, palermitano e siracusano-ragusano) sono caratterizzate da processi morfologici in cui le frane maggiormente ricorrenti sono quelle di "crollo", con scivolamenti e ribaltamenti su pendii molto acclivi; in contesti di questo tipo gli interventi maggiormente utilizzati sono stati sia di tipo attivo, ovvero reti e funi con chiodature, sia di tipo passivo con reti e barriere paramassi.

Nelle aree in cui il substrato presente è caratterizzato da coltri di materiale eluvio-colluviale, detritico e/o argilloso, i dissesti sono rappresentati da colamenti, frane di scorrimento rotazionale e/o frane complesse: in questi casi si fa ricorso a strutture di contenimento come muri e/o paratie, associate a fondazioni speciali quali pali o micropali.

Discorso a parte va fatto per gli interventi effettuati o da effettuare lungo le coste dell'isola, in cui l'elemento di maggiore criticità è rappresentato dal processo erosivo retrogressivo e, quindi, di arretramento della linea di costa: il processo erosivo associato in molti casi alla forte antropizzazione delle coste determina in molte zone situazioni assolutamente emergenziali, mettendo a rischio una notevole quantità di strutture antropiche (strade, urbanizzazioni, ecc).

Buona parte delle criticità geomorfologiche presenti nel territorio regionale sono dovute ad una assenza o ad una non funzionale presenza della regimazione idraulica che di fatto rappresenta l'elemento scatenante del dissesto, con refluenze sulla stabilità generale del territorio.

La quasi totalità degli elementi di pericolosità e rischio geomorfologico ed idraulico della Sicilia sono contenuti all'interno degli elaborati relativi al Piano dell'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (P.A.I. Sicilia), curato dal Servizio 3 – Assetto del Territorio e Difesa del Suolo dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana che si occupa dell'aggiornamento delle carte del dissesto e della pericolosità e del rischio e che, di fatto, ha il compito di monitorare lo stato dell'arte dei diversi interventi realizzati e/o in corso di realizzazione.

In contesti geologici e geomorfologici come quelli sopra descritti, gli effetti del cambiamento del regime della piovosità si traduce in situazioni di “emergenza geomorfologica” con picchi di criticità, soprattutto in alcune delle aree più critiche della Sicilia come quella della provincia messinese dove si sono verificati disastri come quello di Giampileri il 1° ottobre 2009 con 37 morti e quello di Saponara il 22 novembre 2011 con tre morti.

Il 1° ottobre 2009 un violento nubifragio, iniziato nella serata del **30 settembre 2009** e durato tutta la notte fino al mattino del giorno successivo, colpisce la Sicilia orientale causando frane, esondazioni di fiumi e torrenti, allagamenti di case e fabbriche.

La situazione più critica si è verificata nella provincia di Messina, in particolare nel Comune di Messina, lungo la costa ionica, nelle località di Giampileri, Molino, Altolia Briga, Pezzolo, Santa Marina e nei Comuni di Scaletta Zanclea e Itala, dove colate di fango bloccano il sistema viario e isolano Scaletta Zanclea. L'alluvione ha provocato 37 vittime e oltre duemila sono state le persone evacuate.

Il disastro è avvenuto in una zona a elevato rischio idrogeologico, già colpita in precedenza da eventi franosi e alluvionali (25 ottobre 2007).

Il 2 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Messina e successivamente sono state emanate tre ordinanze di Protezione Civile che hanno definito i primi interventi urgenti.

L'Opcm n. 3815 del 10 ottobre ha nominato il Presidente della Regione Siciliana Commissario Delegato, con il compito di accertare i danni causati dall'alluvione e predisporre un piano di interventi per il ripristino degli edifici e dei beni distrutti o danneggiati e di definire i contributi finanziari per le abitazioni distrutte o danneggiate dall'alluvione e assegnare i contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari rimasti senza casa.

Con la successiva Opcm n. 3825 del 27 novembre sono state introdotte ulteriori misure per le attività produttive ed economiche della zona colpita con disposizioni in materia previdenziale, assistenziale e tributaria.

Ulteriori misure sono state adottate con le Opcm n. 3865 del 15 aprile 2010, n. 3886 del 9 luglio e n. 3937 del 7 maggio 2011.

Il 22 novembre 2011 un violentissimo nubifragio ha colpito Barcellona Pozzo di Gotto e Saponara dove si sono contate tre vittime.

## 1 - L'Accordo di Programma del 30/03/2010 – Commissario Straordinario Delegato

L'articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) ha previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale possano essere utilizzate anche tramite **accordi di programma** sottoscritti dalle Regioni interessate e dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che consentano alle Regioni di operare con la massima flessibilità operativa e di far confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad una programmazione organica ed unitaria rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico.

In attuazione alla predetta disposizione di legge in data 30/03/2010 viene sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Siciliana **L'Accordo di Programma** finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, elencati nell' Allegato 1 allo stesso Accordo di Programma e volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Luglio 2010 l'Ing. Santi Muscarà è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03/03/2014 alla Corte dei Conti al n. 636, è stato prorogato l'incarico di Commissario Straordinario Delegato al Dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico.

Con l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24- 6-2014 - il Presidente della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Con la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.n.91/14, e in particolare ai sensi dei commi 2/ter e 4 del citato art. 10, - rispettivamente - "*...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*" e "*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre*

*che delle strutture e degli uffici regionali...nonchè delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana – è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario di Governo.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 518 del 18/03/2015, in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'ing. Calogero Foti, già Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia – è stato nominato soggetto attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi cui sono stati delegati i poteri di firma del Commissario di Governo.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 529 del 03/07/2015 l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana.

Con provvedimento prot. 3845 del 07/08/2015 è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 529 del 03/07/2015.

## 2 - Organizzazione delle Attività Commissariali – La Struttura Commissariale

Ai fini del sollecito espletamento delle attività tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi inseriti in A.d.P., secondo quanto disposto dall'art. 1 dell'OPCM 3886 del 09 luglio 2010, come modificato ed integrato dall'art. 21 dell'OPCM 3916 del 30 dicembre del 2012 e meglio specificato in premessa, il Commissario Straordinario Delegato può avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Il Commissario Straordinario Delegato ha pertanto istituito un gruppo di lavori con le Disposizioni Commissariali nn. 3, 5 e 6 del 2010, e successivamente ha incrementato il gruppo di lavoro avvalendosi di altro personale proveniente da Dipartimenti Regionali, dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, dal Ministero Pubblica Istruzione, dalla Regione che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 21 della OPCM 3916/10, è stato posto in posizione di comando sia a tempo pieno che parziale, nel numero massimo di 10 unità, oltre che il personale utilizzato ai sensi del C. 4 dell'Art. 1 della OPCM 3886/10.

Con l'art.7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 2011, il numero dei componenti viene elevato a 20 unità.

Nel seguito viene riportato l'elenco del personale di cui è dotata la struttura Commissariale, con indicazione dell'Amministrazione di appartenenza e della disposizione di nomina e decorrenza.

### Tabella riepilogativa del personale in posizione di comando.

<b>PERSONALE in posizione di comando</b> ex art. 1,c. 4 , c. 5 e c. 7 ex OPCM 3886/2010, così come modificato ed integrato dall'art. 21, dell'OPCM 3916/10 e dall'art. 7 dell'OPCM 3975/11 (TOT DISPONIBILITA N. 20 POSTI )			
<i>N° ordine</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Amministrazione di appartenenza</i>	<i>Disposizione Commissariale di nomina e decorrenza</i>
<b>1</b>	ABBAGNATO ANTONINO	Regione Siciliana - Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro Dipartimento del Lavoro	Disp. Comm. n. 33 del 09.12.2013 di proroga comando con decorrenza dal 01.01.2013
<b>2</b>	ARNONE MARIA FRANCESCA	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Disp. Comm. n. 42 del 09.12.2013 di proroga comando con decorrenza dal 01.01.2013
<b>3</b>	BOMPASSO STEFANO	Ministero dell'Interno - Questura di Palermo	Disposizione Commissariale n. 5 del 19.01.2012 con decorrenza dal 14.05.2012
<b>4</b>	BRUNO MADDALENA	Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia	Disp. Comm. n. 20 del 22.12.2014 di proroga comando fino al 30.06.2015
<b>5</b>	CIRRINCIONE GIROLAMO	Regione Siciliana - Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale - Servizio 8 Autoparco regionale	Disposizione Commissariale n. 4 del 29.01.2015 con decorrenza dal 02.02.2015

6	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	Regione Siciliana - Assessorato Energia e Servizi Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti	Disp. Comm. Prot. n. 4185 del 15.09.2015 – Decr. Ass. n. 441/Gab del 28/09/2015 -
7	FERRANTE GIUSEPPE	Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti	Disp. Comm. n.. 36 del 09.12.2013 proroga comando.
8	FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo	Disp. Comm. n. 29 del 28.11.2013 proroga comando
9	GENOVESE MARIARITA	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Generale per la Motorizzazione	Disp. Comm. n. 44 del 09.12.2013 proroga comando - <b>Cessazione comando 10/07/2015</b>
10	GENTILE BIAGIO	Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti- genio civile	Disp. Comm. n.. 43 del 09.12.2013 proroga comando
11	LA FATA VINCENZO	Regione Siciliana - Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro Dipartimento del Lavoro	Disp. Comm. n. . 37 del 09.12.2013 proroga comando
12	LA PICA ROSARIA	Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico	Disp. Comm. n. 46 del 09.12.2013 proroga comando - <b>Cessazione comando 10/07/2015</b>
13	LA PLACA GIUSEPPE	Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti	Disp. Comm. n. 38 del 09.12.2013 proroga comando
14	LOMBARDO VINCENZO	Comune di Altavilla Milicia	Disp. Comm. n. 45 del 09.12.2013 proroga comando
15	MAUGERI LIDIA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Provinciale di Torino	Disp. Comm. n. 30 del 28.11.2013 di proroga comando - <b>Cessazione comando 10/07/2015</b>
16	MESSINA PAOLA	Comune di Agrigento	Disposizione Commissariale n. 6 del 24.02.2015 con decorrenza dal 02.03.2015- <b>Cessazione comando 30/06/2015</b>

17	MESSINESE PAOLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia	Disposizione Commissariale n. 8 del 09.04.2015 con decorrenza dal 10.04.2015 <b>Cessazione comando</b> 30/06/2015
18	NICASTRO ANGELO SALVATORE	Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti	Disp. Comm. n. 40 del 09.12.2013 proroga comando
19	NICOLICCHIA PIERO	Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti	Disp. Comm. n. 41 del 09.12.2013 - <b>Cessazione</b> <b>comando</b> dal 18/05/2015 con disposizione n. 12 del 14/05/2015
20	SPARACINO ROMINA	Regione Emilia Romagna	Disp. Comm. n. 31 del 09.12.2013 proroga comando
21	PROFETA RENATO	Regione Siciliana - Presidenza della Regione - Segreteria Generale	Disp. Comm. n. 28 del 27.11.2013 proroga comando

#### Tabella riepilogativa di personale in posizione di avvalimento

<b>PERSONALE in avvalimento</b> ex art. 1, c. 5 del DPCM del 20.07.2011			
<i>Numero ordine</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Amministrazione di appartenenza</i>	<i>Disposizione Commissariale di nomina e decorrenza</i>
1	IACONO MANNO DANIELA	Lavoro Sicilia S.p.A.	Disp. Comm. n. 25 del 26.11.2013 <b>Cessazione</b> <b>comando</b> dal 12/06/2015 con disposizione n. 13 del 16/06/2015
2	LOMBARDO GIUSEPPE	Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti	Disp. Comm. n. 14 del 8.09.14 di avvalimento a tempo pieno, a decorrenza dal 10.09.14.
3	MAMMO ZAGARELLA DIEGO	Invitalia Attività Produttive S.p.A.	Disposizione n. 16 del 31.10.14 comando dal 03.11.14 fino al 30/06/2015 e successiva proroga a partire dal 07/09/2015
4	REALE TERESA	ATO ME 4	Disp. Comm. n. 23 del 26.11.2013 proroga comando



5	SCAPARRA ROSA	Comune di Gangi	Disp. Comm. n. 20 del 26.11.2013 proroga comando
6	SORCI ALESSANDRA	Italia Lavoro S.p.A.	Disp. Comm. n. 1 del 09.01.2015 proroga comando fino al 30/06/2015, data <b>Cessazione comando</b>
7	USTICANO FRANCESCA	Comune di Castellammare del Golfo	Disp. Comm. n. 26 del 26.11.2013 proroga comando
8	VALLONE STEFANIA	Co.In.R.E.S.	Disp. Comm. n. 21 del 26.11.2013 - <b>Cessazione comando</b> dal 21/04/2015 con disposizione n. 9 del 20/04/2015
9	VASTA FRANCESCO	Provincia Regionale di Palermo	Disp. Comm. n. 22 del 26.11.2013 proroga comando - <b>Cessazione comando</b> 10/07/2015

Secondo quanto disposto dall'art. 1 dell'OPCM 3886 del 09 luglio 2010, come modificato ed integrato dall'art. 21 dell'OPCM 3916 del 30 dicembre 2010, è prevista la possibilità di avvalersi di personale – selezionato sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli artt. 7 e 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, all'art. 1, comma 1180 della L. n. 296 del 2006 nonché in deroga all'art. 3, comma 54, della L. n. 244 del 2007 – con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo di cinque unità e per tutta la durata dello stato di emergenza, nonché di un esperto avente specifica competenza nelle materie di interesse.

#### Tabella riepilogativa dei rapporti di collaborazione

<i>Incarico</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Titolo professionale e Amministrazione di appartenenza</i>	<i>Disposizione commissariale di nomina e decorrenza</i>
Esperto	Bruno Brunella	Magistrato - Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa	Decreto Commissariale n. 267 del 5.05.14 e relativo contratto del 23.04.14, con decorrenza dal 2.05.14 - <b>Rapporto contrattuale cessato</b> in data 23/04/2015 con decreto n. 276/15
	Caffarelli Alessandra	Ingegnere	Decreto Commissariale n. 270 del 26.05.15 e relativo contratto con decorrenza immediata e fino al 30.06.15 - <b>Rapporto contrattuale riattivato</b> in data 02/09/2015 con decreto n. 276/15 fino al 31/12/2015

<b>Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa</b>	Daina Ester	Avvocato	Decreto n. 5 del 08.01.15 di proroga fino al 30.06.15 ( <b>cessazione rapporto contrattuale</b> ) del contratto sottoscritto il 1° ott. 14
	Lorenzini Elena	Magistrato - Corte dei Conti	Decreto n. 134 del 17.03.14 e relativo contratto di pari data con decorrenza immediata - <b>Rapporto contrattuale cessato</b> in data 30/06/2015, ex lege 116/14
	Mancuso Luigi	Dottore in Economia e Commercio	Decreto n. 271 del 06.05.14 e relativo contratto di pari data decorrente dal 07.05.14 al 09.12.15, così come modificato dal Decreto n. 554/14 del 17.09.14 - <b>Rapporto contrattuale cessato</b> in data 30/06/2015, ex lege 116/14 e <b>riattivato</b> in data 08/09/2015 con decreto n. 433/15 fino al 31/12/15
	Vazzana Francesco	Dottore in Chimica	Decreto n. 126 del 12.03.14 e relativo contratto di pari data decorrente dal 12.03.14 al 09.12.15, modificato dal Decreto n. 551/14 del 11.09.14 – <b>Rapporto contrattuale cessato</b> in data 26/05/15 con decreto n. 269/15
	Venuti Rossella	Geometra	Decreto n. 1 del 02.01.15 di proroga al 30.06.15 del contratto sottoscritto in data 1° ott. 2014 - <b>Rapporto contrattuale riattivato</b> in data 02/09/15 con decreto n. 413/15 e fino al 31/10/15, <b>cessato</b> con decreto n. 525/2015
	Vinci Irene	Ingegnere	Decreto Commissariale n. 412/15 e relativo contratto del 02/09/2015 con decorrenza immediata e fino al 31.12.15
	Gaglio Gerlando	Agronomo	Decreto Commissariale n. 415/15 e relativo contratto del 02/09/2015 con decorrenza immediata e fino al 31.12.15
	Cascino Fabrizio	Geometra	Decreto Commissariale n. 416/15 e relativo contratto del 01/09/2015 con decorrenza 02/09 e fino al 31.12.15
	Puccio Salvo	Geologo	Decreto n. 515/15 e relativo contratto del 02/11/15 con decorrenza immediata e fino al 31.12.15

### 3.1 - SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

<b>Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente</b>			
<b>Importo accreditato</b> (1° gen. - 31 dic. 2015)	<b>Importo cumulato</b> (al 31 dic. 2015)	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
Z E R O	€ 110.249.576,91	€ 85.073.423,66	€ 25.176.153,25

<b>Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti</b>			
<b>Importo accreditato</b> (1° gen. - 31 dic. 2015)	<b>Importo cumulato</b> (al 31 dic. 2015)	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>
€ 9.364.876,48	€ 12.021.650,48	€ 6.820.284,50	€ 5.201.365,98

### 3.2 - ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

<b>Descrizione attività</b>	<b>Importo speso corrente</b> (1° gen. - 31 dic. 15)	<b>Importo speso cumulato</b> (al 30 giu. 2015)
Struttura commissariale	€ 1.051.627,98	€ 5.593.520,19
Attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo	€ 15.111.895,93	€ 86.300.197,97

### 3.3 - Prospetto Contabilità Speciale

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



**Ordinanza n. 3886 del 09/07/2010 Attuaz. Int. Rischio idrogeologico in Sicilia**

RENDICONTO N. 1

Esercizio finanziario (a) 2015

Contabilità speciale n. 5447 aperta il 17 agosto 2010

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 37.176.156,66	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€	1) Redditi di lavoro dipendente (b)	€ 500.011,97
2) Fondi Statali	€ 0,00	2) Consumi intermedi (c)	€ 94.857,56
3) Fondi regionali	€ 9.303.318,85	3) Interessi passivi	€
4) Fondi di Enti Locali	€	4) Trasferimenti a Regioni	€
5) Tariffe e proventi per servizi	€	5) Trasferimenti a Enti Locali	€
6) Accensione prestiti	€	6) Investimenti diretti (d)	€ 15.093.382,76
7) Altro	€ 61.557,63	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€
		8) Rimborso prestiti	€
		9) Versamenti erariali	€ 172.353,85
		10) Versamenti previdenziali	€ 106.737,33
		11) Altro (f)	€ 196.170,44
		<b>Totale uscite</b>	<b>€ 16.163.513,91</b>
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	
<b>Totale al 31/12/2015</b>	<b>€ 46.541.033,14</b>	Disponibilità di cassa	€ 30.377.519,23
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 46.541.033,14</b>

#### 4 - CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

L'art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010 prevede che per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato possa avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli Enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle Amministrazioni periferiche dello Stato, dell'Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli Enti locali anche territoriali, dei consorzi e delle università, delle aziende pubbliche di servizi.

Il Commissario, per la realizzazione degli interventi, potendosi avvalere anche di società specializzate a totale capitale pubblico, ha stipulato in data 18 febbraio 2011 una specifica convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia S.p.A. [Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A, di seguito denominata "INVITALIA" o Agenzia], riguardante attività funzionali e/o di assistenza tecnico – amministrativa - e specialistica.

In particolare, nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-amministrativa, l'Agenzia ha garantito tra l'altro, sino alla scadenza della convenzione avvenuta il 31/12/2013 (scadenza del mandato), la progettazione ed il supporto nelle attività di predisposizione ed affidamento delle procedure di gara (anche ricorrendo a strumenti informatici dedicati) e di progettazione, e nelle fase esecutiva dei lavori e di collaudo. L'Agenzia si è impegnata inoltre a predisporre tutta la documentazione necessaria per l'adempimento, da parte del Commissario, degli oneri informativi al medesimo spettanti nei confronti del Parlamento, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, della Regione Sicilia, del Comitato di gestione e di indirizzo per la gestione dell'Accordo, dell'ISPRA, del Repertorio Nazionale degli Interventi per la difesa del suolo (ReNDiS).

Qui di seguito viene riportata una tabella riassuntiva in cui vengono elencati tutti gli interventi di cui INVITALIA ha curato la progettazione:

- CT 036 Ramacca A *Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato* €1.200.000,00;
- EN 044 Gagliano Castelferrato A *Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga* € 800.000,00;
- ME 049 Alcara Li Fusi A *Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini* € 1.200.000,00;
- ME 079 Librizzi A *Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale* € 2.150.000,00;
- ME 081 Librizzi A *Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà* €500.000,00;
- ME 091 Mirto A *Consolidamento centro abitato* € 2.500.000,00;
- ME 099 Piraino A *Opere di consolidamento – Zona Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole* € 1.100.000,00;
- ME 109 San Pier Niceto A *Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato* € 600.000,00;
- ME 119 Sinagra A *Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò* € 3.000.000,00;
- ME 132 Ucria A *Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – Zona via Annunziata* € 2.500.000,00;

- SR 163 Pachino A *Intervento in Contrada Raneddi* € 2.000.000,00;
- PA 180 Cefalù A *Messa in sicurezza movimenti franosi* € 90.000,00;
- PA 181 Cefalù A *Messa in sicurezza movimenti franosi* € 400.000,00;
- AG 174 Cattolica Eraclea B\* *Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (loc. Zagarella)* € 1.170.000,00;
- CL 020 Serradifalco A *Progetto per lo studio ed il monitoraggio dell'area a rischio "R4" interessate da cavità sotterranee e perimetrata con il dissesto 063-2SR-082 nel Comune di Serradifalco* €1.700.000,00;
- CT 023 Calatabiano A *Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide – Pasteria* € 250.000,00;
- ME 115\_3 Sant'Angelo di Brolo A *Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro Urbano* € 2.500.000,00;
- ME 177\_int Brolo A *Consolidamento e salvaguardia fabbricati c.da Iannello Alto* € 600.000,00;
- PA 142 Carini A *Barriere paramassi – zona industriale* € 1.000.000,00;
- PA 143 Castelbuono A *Opere di drenaggio e consolidamento – c.da Liccia* € 2.000.000,00;
- SR 162 Carlentini A *Messa in sicurezza costone centro abitato – zona via Venezia , via 4 novembre e via dei caduti* € 800.000,00;
- SR 186 Portopalo di Capo Passero A *Regimazione acque e consolidamento scarpata* € 600.000,00;
- ME 071 Frazzanò A *Monitoraggio delle aree in frana del centro abitato e delle aree ad elevato rischio idrogeologico (R4)* € 300.000,00;
- ME 092 Mistretta A *Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta – Torrente Santa Domenica* € 800.000,00;
- TP 190 San Vito Lo Capo B *Consolidamento del tratto di costa* € 1.350.000,00.

La progettazione dei sopra citati interventi è stata conclusa per ognuno di essi.

Sono state inoltre stipulate le seguenti convenzioni:

- 1) Convenzione con il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria stipulata in data 28.10.10.

**Contenuti:** RUP, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

- ME 113 Santa Marina Salina A *Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro* € 2.000.000,00;
- ME 124 Terme Vigliatore B\* *Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana* €3.823.875,00;
- ME 130 Tusa B\* *Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)* € 1.500.000,00;
- TP 169 Mazara del Vallo A *Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture – Zona Tonnarella* € 800.000,00

- TP 189 Mazara del Vallo A *Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale – I stralcio* € 2.000.000,00.

2) Protocollo d'intesa per l'accelerazione delle procedure di cui agli articoli 19 e ss. del D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm. in relazione ai progetti relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia di cui all'allegato 1 dell'Accordo di Programma stipulato il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana stipulato con il Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 VIA/VAS – dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana in data 28.10.10.

3) Convenzione con il Servizio Provinciale di Palermo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile stipulata in data 10.11.10.

**Contenuti:** RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

PA 136 Belmonte Mezzagno A *Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano* € 3.000.000,00;

PA 156 Termini Imerese A *Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto* € 800.000,00.

4) Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento stipulata in data 10.11.10.

**Contenuti:** RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

- AG 001 Agrigento A *Interventi di messa in sicurezza del centro abitato* € 2.000.000,00;
- AG 006 Favara A *Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis* € 1.500.000,00.

5) Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Palermo stipulata in data 11.11.10.

**Contenuti:** RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

- PA 140 Camporeale B *Opere di consolidamento del centro abitato* € 1.500.000,00;
- PA 154 Polizzi Generosa A *Opere di regimazione idraulica – zona via Borgese* € 500.000,00;
- PA 150 Palermo B *Opere di regimazione idraulica - C.da Belmonte Chiavelli* € 4.300.000,00.

6) Convenzione con il Servizio Provinciale di Siracusa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile stipulata in data 12.11.10.

**Contenuti:** RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

- SR 161 Avola A *Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da Cavagrande del Cassibile* € 600.000,00;

7) Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa stipulata in data 15.11.10.

**Contenuti:** RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

- 8) Convenzione con il Comune di Valledolmo stipulata in data 17.11.10.  
**Contenuti:** RUP, responsabile lavori, funzioni di stazione appaltante, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.  
**Progetti assegnati:**  
- PA 157 Valledolmo A Opere di consolidamento - C.da Renella € 500.000,00.
- 9) Convenzione con il Comune di Ficarra stipulata in data 18.11.10.  
**Contenuti:** RUP, responsabile lavori, funzioni di stazione appaltante, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.  
**Progetti assegnati:**  
ME 065 Ficarra B *Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Grenne* € 1.028.981,00.
- 10) Convenzione D.R.P.C. Servizio Provinciale di Catania stipulata in data 18.11.10.  
**Contenuti:** RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.  
**Progetti assegnati:**  
- CT 031 Misterbianco A Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo € 500.000,00;  
- CT 033 Piedimonte Etneo A Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa €500.000,00.
- 11) Convenzione D.R.P.C. Servizio Provinciale di Trapani stipulata in data 18.11.10.  
**Contenuti:** RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.  
**Progetti assegnati:**  
TP 168 Erice A *Consolidamento costone roccioso – Zona Crocifissello* € 500.000,00;  
TP 172 San Vito Lo Capo A *Collocazione rete paramassi – Zona Makari* € 450.000,00.
- 12) Convenzione Ufficio del Genio Civile di Trapani stipulata in data 26.11.10.  
**Contenuti:** RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.  
**Progetti assegnati:**  
- TP 173 Trapani B Opere di regimazione idraulica – Zona Salinagrande € 4.000.000,00
- 13) Convenzione con il Dipartimento Di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Catania stipulata in data 12.09.11  
**Contenuti:** “Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche dei sedimenti marini di un tratto di mare prospiciente il Comune di Pachino (SR)” e la “realizzazione di un modello d’onda di larga scala del settore di mare della Sicilia sud orientale.  
**Intervento:** SR 163 “Interventi in contrada Raneddi” – Comune di Pachino (SR).
- 14) Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Messina stipulata in data 14.09.11



**Contenuti:** "Analisi diacronica e delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) compreso tra la punta Castellazzo e Punta delle Formiche".

**Intervento:** SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" – Comune di Pachino (SR).

**15)** Convenzione con la DHI -Italia stipulata in data 16.11.11

**Contenuti:** per "Acquisizione e processamento dei dati del modello d'onda del Mar Mediterraneo di Met – Office per tre celle situate a largo della Costa Sud – Orientale della Sicilia" e la "realizzazione di un modello d'onda di larga scala del settore di mare della Sicilia sud orientale".

**Intervento:** SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" – Comune di Pachino (SR).

**16)** Convenzione con Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo stipulata in data 30.11.11

**Contenuti:**

*a. Rilievo con tecniche da terra, aeree e da satellite di dati territoriali ed ambientali. In particolare, questa attività prevede in fase di rilievo l'utilizzo di GPS, laser scanner, camere fotogrammetriche, videocamere digitali, sensori iperspettrali, sensori IR ed in fase di postprocessing l'impiego dei più evoluti sistemi software di elaborazione oltre che codici di calcolo appositamente realizzati;*

*b. Post-processing di dati disponibili e/o rilevati, anche con modelli e procedure previsionali e di tipo anche statistico, al fine di pervenire alla definizione delle zone o delle situazioni di rischio per le quali provvedere, quindi, alla valutazione della vulnerabilità ambientale e territoriale legata ad eventi naturali ed antropici relativamente ad aree urbanizzate e non urbanizzate, con particolare riguardo al rischio: sismico, idrogeologico, idraulico (piene e siccità) e di incendio;*

*c. Sistema di monitoraggio del territorio per il controllo dei diversi fattori di rischio con la redazione di mappe dinamiche per la definizione della vulnerabilità delle risorse del territorio e dei possibili scenari previsionali;*

*d. Interventi di rilevamento delle condizioni di sicurezza del costruito e delle infrastrutture (strade, ferrovie e acquedotti, ecc.) con priorità per quelli di importanza strategica, con tecniche di rilievo innovative al fine di rilevarne il grado di vulnerabilità e pericolosità in relazione a possibili eventi calamitosi e prefigurarne l'eventuale intervento di adeguamento occorrente;*

*e. Progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo per le emergenze che permetta una gestione informatizzata di tutte le attività connesse con le problematiche di intervento sul territorio sia in situazioni ordinarie sia in condizioni di allerta;*

*f. Supporto all'organizzazione ed istituzione di unità di crisi e sale operative, intese come sistema composto dal personale, locali, ed attrezzature, tecnologie, metodologie, finalizzate alla gestione delle emergenze;*

*g. Man power dedicato e/o a tempo da adibire a mansioni specialistiche di acquisizione, elaborazione, restituzione dati;*

*h. Mezzi (aereo ed elicottero) per la ricognizione aerea, ove necessario equipaggiati con adeguata strumentazione per l'indagine e l'osservazione, da impiegare anche per interventi con carattere di urgenza;*

*i. Attività finalizzate al coinvolgimento in progetti e al reperimento di fondi in ambito nazionale ed internazionale."*

### Progetti assegnati:

- ME 079 A Librizzi Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale € 2.150.000,00;
- ME 081 A Librizzi Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà € 500.000,00;
- ME 091 A Mirto Consolidamento centro abitato € 2.500.000,00;
- ME 115\_3 A Sant'Angelo di Brolo Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano € 2.500.000,00;
- ME 119 A Sinagra Drenaggi e consolidamenti - C.da Faranò € 3.000.000,00;
- ME 132 A Ucria Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – Zona via Annunziata € 2.500.000,00;
- ME 177 A Brolo Consolidamento e salvaguardia fabbricati € 600.000,00;
- PA 142 A Carini Barriera paramassi zona industriale – Monte Columbrina € 1.000.000,00;
- PA 179 A Altofonte Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto € 600.000,00;
- PA 181 A Cefalù Messa in sicurezza movimenti franosi € 400.000,00,
- SR 186 A Porto Palo di Capo Passero Regimazione acque e consolidamento scarpata € 600.000,00;
- SR 187 A Rosolini Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato € 1.800.000,00;
- ME 099 Piraino A Opere di consolidamento – Zona Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole € 1.100.000,00;
- AG 174 Cattolica Eraclea B\* Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (loc. Zagarella) €1.170.000,00;
- SR 162 Carlentini A Messa in sicurezza costone centro abitato – zona via Venezia , via 4 novembre e via dei caduti € 800.000,00;
- ME 100 Raccuja A Opere di consolidamento – zona centro abitato € 5.000.000,00;
- TP 190 San Vito Lo Capo B\* Consolidamento del tratto di costa € 1.350.000,00;
- PA 149 Misilmeri A Opere di regimazione idraulica – c.da Piano Stoppa € 2.000.000,00.
- ME 120 Sinagra A Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia – zona Martini € 1.000.000,00.

**17)** Protocollo di intesa con il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo stipulato in data 15.03.12 per la collaborazione nell'analisi dei dati esistenti di geologia marina nell'offshore della Sicilia Sud orientale per l'individuazione delle strategie ottimali finalizzate al reperimento di giacimenti sommersi di sabbie da utilizzare nel ripascimento di spiagge in arretramento.

**18)** Convenzione con l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero UOS di Capo Granitola del Consiglio Nazionale Delle Ricerche stipulata in data 18 aprile 2012 per il "Progetto di ricerca finalizzato all'individuazione di sabbie relitte sulla piattaforma Siciliana nell'area prospiciente il golfo di Gela".

**Contenuti:** per "Acquisizione e processamento dei dati del modello d'onda del Mar Mediterraneo di Met – Office per tre celle situate a largo della Costa Sud – Orientale della Sicilia" e la "realizzazione di un modello d'onda di larga scala del settore di mare della Sicilia sud orientale".

**Intervento:** SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" – Comune di Pachino (SR).

19) Convenzione con l'Azienda Regionale Foreste Demaniali stipulata in data 06.09.12.

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, funzioni di stazione appaltante, direzione lavori e collaudi, assistenza tecnico-amministrativa. Protocollo d'intesa stipulato con il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo

## 5 – ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI E DELL'ALBO DELLE IMPRESE – SERVIZIO E\_PROCUREMENT

### 5.1 - Albo professionisti

In data 20 aprile 2011, con decreto commissariale n° 55, è stato emanato il Bando per la istituzione presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'albo dei professionisti a cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006.

L'elenco ha validità per il triennio 2011/2013 così come stabilito dal Bando di cui sopra, è previsto un aggiornamento dello stesso ogni anno.

Con tale inserimento si possono affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

I suddetti ELENCHI sono stati suddivisi in ragione delle classi e categorie di cui alla tabella dell'art.14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii.

Le modalità di aggiornamento dell'elenco è regolamentato dallo stesso bando il quale prevede che:

- "Entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, i Professionisti iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall'Elenco dei Professionisti, una richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati";

- "Le nuove domande pervenute entro il 30 maggio di ogni anno verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo; le conferme dell'iscrizione, da effettuarsi entro la stessa data, saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione.

In data 17 maggio 2012 si è pertanto provveduto alla pubblicazione dell'avviso sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) relativo alla istanza e/o al rinnovo dell'iscrizione da effettuare mediante collegamento on line al sito dedicato al Commissario <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor>.

Inoltre, al fine di dare maggiore pubblicità all'obbligo di conferma della propria istanza, il predetto avviso è stato, trasmesso in data 18 maggio 2012 ai tutti professionisti già inseriti nell'elenco pubblicato in data 20 luglio 2011 mediante e-mail certificata e/o fax pena la cancellazione dall'Elenco;

Con Decreto n. 515 del 04 ottobre 2012 è stato approvato l'Aggiornamento dell'Elenco Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000 (euro centomila/00), con le modalità di cui all'art.91, comma2, del d.lgs. n. 163/2006, per l'anno 2012-2013.

In data 15 Maggio 2014, con nota n° 2323 del 15 Maggio 2014, è stato emanato il Bando per la istituzione presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'elenco dei professionisti a cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006.

L'elenco ha validità fino al 31 Dicembre 2015 così come stabilito dal Bando di cui sopra.

Con tale inserimento si possono affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

I suddetti Elenchi sono stati suddivisi in ragione delle classi e categorie di cui alla tabella dell'art.14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii.

Le modalità di aggiornamento dell'elenco è regolamentato dallo stesso bando il quale prevede che:

“Le nuove domande pervenute oltre i termini previsti dal Bando di ogni anno verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo e saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Con Decreto Commissariale 454 del 4 Luglio 2014, pubblicato lo stesso giorno sul sito del Committente [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), è stato approvato l'elenco delle istanze pervenute, fornendo ai professionisti 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso per presentare eventuali richieste di chiarimento e/o integrazione. Le istanze pervenute, sono 349 e sono state pubblicate nell'ordine alfabetico delle denominazioni pervenute.

Con Decreto n. 266 del 21 maggio 2015 è stato approvato l'Aggiornamento dell'Elenco Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000 (euro centomila/00), con le modalità di cui all'art.91, comma2, del d.lgs. n. 163/2006. In sede di integrazione le istanze pervenute, sono state 27, le quali sommate alle 349 istanze del già recepite, compongono un elenco complessivo di 376 istanze e sono state pubblicate in allegato al suddetto decreto nell'ordine alfabetico delle denominazioni pervenute.

L'elenco ha validità fino al 31 Dicembre 2015 così come stabilito dal Bando di cui sopra.

## **5.2 - Albo Imprese**

Il Commissario Straordinario Delegato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha istituito, con il Decreto Commissariale n° 54 del 20 aprile 2011, l'albo delle imprese per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Occorre evidenziare che, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi previsti dall'A.d.P., il Commissario ha direttamente provveduto alla predisposizione ed all'affidamento delle procedure di gara relative agli interventi, individuando un numero congruo di soggetti, iscritti agli Albo di Fiducia, da invitare tra coloro che hanno dichiarato di possedere idonei requisiti.

In particolare, si rappresenta che il Commissario ha provveduto:

-per l'anno 2011: ad istituire l'Albo di Fiducia con il Decreto Commissariale n° 54 del 20 aprile 2011.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) nonché per estratto sulla G.U.R.I. – Serie speciale n.51 del 02.05.2011,

sulla G.U.R.S. del 20 maggio 2011 e su il Sole 24ore del 04.05.2011, su La Repubblica del 04.05.2011, su La Sicilia del 04.04.2011 e su Il Giornale di Sicilia del 04.05.2011.

Entro i termini previsti sono pervenute n. 492 istanze di ammissione all'Albo delle imprese 2011.

Per l'anno 2012: si è provveduto ad istituire, con Decreto Commissariale n. 323 del 15 novembre 2011, l'Albo di Fiducia Imprese.

Avendo attivato nel corso del 2011 la piattaforma e-procurement, di cui al successivo punto, i soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro il 15 dicembre 2011 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

Entro i termini previsti sono pervenute n. 481 istanze di ammissione all'Elenco delle imprese 2012. Il cui elenco è stato pubblicato sul sito della Struttura Commissariale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 26 gennaio 2012.

In data 30 ottobre 2012 è stato aggiornato l'Elenco Imprese 2012 limitatamente ai cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, mediante l'integrazione con le domande ammissibili pervenute nel corso del terzo trimestre, entro il 26 ottobre 2012. Il numero delle istanze ammonta complessivamente a 610 imprese.

Per le procedure ristrette semplificate, l'Elenco imprese istituito non può per legge essere integrato e l'elenco a cui si deve far riferimento rimane quello pubblicato il 26 gennaio 2012 con 481 iscritte.

Per l'anno 2013: si è provveduto ad istituire, con Decreto Commissariale n. 651 del 27 novembre 2012, l'Albo di Fiducia Imprese.

I soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro le ore 24:00 del 15 dicembre 2012 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

Entro i termini previsti sono pervenute più di 520 istanze di ammissione all'Elenco delle imprese 2013. Allo stato sono in corso le verifiche al fine di poter procedere con la pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

L'albo 2013 è stato aggiornato a seguito emissione del Decreto commissariale n. 264 del 08/04/2013.

I soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

Entro i termini previsti sono pervenute più di 370 istanze di ammissione all'Elenco delle imprese 2013. Il nuovo albo aggiornato è stato pubblicato sul sito della Struttura Commissariale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) giust. Decreto commissariale n. 452 del 17/07/2013

In data 27 Novembre 2013, il Commissario Straordinario Delegato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha emanato un Avviso di Costituzione Bando per la costituzione di un elenco imprese di fiducia per l'anno 2014.

Entro i termini previsti sono pervenute n. 306 richieste di iscrizione. L'elenco definitivo è stato pubblicato sul sito della Struttura Commissariale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 06 Maggio 2014 con Decreto Commissariale n° 262 del 29 Aprile 2014, che ha approvato l'elenco delle imprese di fiducia per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web

www.ucomidrogeosicilia.it nonché per estratto sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n.141 del 02.12.2013, e su il Sole 24ore del 03.12.2013, sul Corriere della Sera del 03.12.2013, su La Repubblica ed. Palermo del 03.12.2013, sul Quotidiano di Sicilia del 03.12.2013.

Inoltre, al fine di dare maggiore pubblicità, il predetto avviso è stato pubblicato sul sito del Committente [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 15 Maggio 2014, e, conformemente a quanto previsto dall'art 123 del D.lgs 163/2006, inviato all'Osservatorio dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici in data 06 Maggio 2104.

L'istituzione dell'Albo di Fiducia delle imprese ha consentito la predisposizione di procedure di gara relative all'appalto dei lavori per l'esecuzione degli interventi, individuando un numero congruo di soggetti, iscritti, da invitare tra coloro che hanno dichiarato di possedere idonei requisiti.

Relativamente alla costituzione dell'albo di fiducia per l'anno 2014 in data 27 Novembre 2013, il Commissario, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha emanato un Avviso di Costituzione Bando.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) nonché per estratto sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n.141 del 02.12.2013, e su il Sole 24ore del 03.12.2013, sul Corriere della Sera del 03.12.2013, su La Repubblica ed. Palermo del 03.12.2013, sul Quotidiano di Sicilia del 03.12.2013.

Entro i termini previsti sono pervenute n. 306 richieste di iscrizione. L'elenco definitivo è stato pubblicato sul sito della Struttura Commissariale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 06 Maggio 2014 con Decreto Commissariale n° 262 del 29 Aprile 2014, che ha approvato l'elenco delle imprese di fiducia per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Relativamente alla costituzione dell'albo di fiducia per l'anno 2015 in data 27 Novembre 2014, il Commissario, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha emanato un Avviso di Costituzione Bando per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Ai fini della costituzione del suddetto Elenco sono stati considerati validi esclusivamente i Questionari presentati tra la data di pubblicazione del suddetto bando sul sito sul sito del Committente [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 27 novembre 2014 e le ore 23:59'59" del 15 dicembre 2014.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) nonché per estratto sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n.138 del 1.12.2014, e su Italia Oggi ed. Nazionale del 2.12.2015 e su Milano Finanza ed Sicilia del 2.12.2015.

Entro i termini previsti sono pervenute n. 1254 richieste di iscrizione. Con Decreto Commissariale n° 167 del 26 marzo 2015, è stato ha approvato l'elenco delle imprese di fiducia per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

In data 29 aprile 2015 alle ore 10:00, la Stazione Appaltante ha proceduto al sorteggio pubblico ai sensi dell'art 123 D.lgs 163/2006, dinanzi ad un pubblico ufficiale, per ordinare randomicamente le istanze pervenute e stabilire l'ordine definitivo dell'elenco delle imprese per inviti a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2015, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e

procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara. il risultato del sorteggio è stato pubblicato sul sito del Committente [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 18 maggio 2015.

### **5.3 - E-procurement**

Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto di lavori, secondo quanto previsto dall'art. 85 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii, si è provveduto, all'individuazione di una soluzione tecnologica in modalità Software as a Service (SaaS)/Application Service Provider (ASP), che consenta l'esecuzione di gare telematiche, la gestione di Elenchi di Operatori Economici, la fornitura di servizi di Help Desk Tecnico e Informativo, la formazione degli utenti.

Con Decreto Commissariale n. 129 del 12.07.11, è stato disposto, a seguito di procedura di gara comunitaria esperita presso la sede del Commissario Straordinario di Roma c/o IAP l'affidamento della suddetta fornitura e la gestione del relativo servizio di e-procurement all'Impresa I-FABER S.p.A..

La piattaforma e-Procurement sviluppata da i-Faber per il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia è composta da due moduli, perfettamente integrati tra di loro: la piattaforma per la gestione dell'Elenco Fornitori e la piattaforma per la gestione delle gare telematiche.

La finalità del suddetto servizio è quella di conseguire celermente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, gli obiettivi previsti dall'Accordo di Programma.

I principali vantaggi della Piattaforma elettronica sono:

- E' stata sviluppata specificamente per il settore italiano P.A. conforme al D.Lgs. 163/2006, recependo immediatamente eventuali modifiche del quadro normativo;
- Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 296, comma 2, D.P.R. 207/2010 e dall'art. 70, commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006, permette una riduzione dei tempi dell'intero processo di gara: i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti di sette giorni se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica; se le stazioni appaltanti offrono per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i termini minimi per la ricezione delle offerte sono ridotti di ulteriori 5 giorni per le procedure aperte e ristrette;
- Gestisce tutto il processo di acquisto, dalla pubblicazione del bando di gara all'aggiudicazione dell'appalto nell'ambito dei lavori, beni e servizi;
- Garantisce una totale trasparenza sul processo negoziale;
- Permette una riduzione del contenzioso.

La Piattaforma elettronica è pienamente funzionante dal 1 gennaio 2012 e si precisa, a tal proposito, che tutte le gare esperite a decorrere da tale data sono state espletate mediante procedure telematiche.

Il fornitore della piattaforma e-Procurement è la società i-Faber SPA ed è composta da due moduli, perfettamente integrati tra di loro:

- modulo per la gestione dell'Elenco Fornitori e quindi delle imprese e dei professionisti iscritti all'albo del Commissario;

- modulo per la gestione delle gare telematiche.

L'utilizzo della piattaforma permette di velocizzare le procedure di gara, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità e degli obiettivi previsti dall'Accordo di Programma e dalla normativa vigente.

#### 5.4 - Procedure di gara espletate e avviate

Nel corso del secondo semestre 2015 sono state espletate tre gare in modalità telematica per l'affidamento di Lavori.

Il dettaglio delle gare espletate è di seguito riportato:

n.	Codice	Comune	Titolo Intervento	Tipologia Gara espletata	Importi e ribasso
1	CT_038	Santa Venerina	Consolidamento della sponda destra del torrente FAGO – località Badia	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando art. 122 D.Lgs 163/2006	Ribasso 37,5227% - lavori netti € 282.606,64 – costi personale 170.921,26 – oneri sicurezza 7.032,40 – TOTALE 460.560,30
2	ME_089_4c	Messina	Interventi urgenti per la rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio "Marina Sud" e delle aree limitrofe ai villaggi S. Margherita e Galati Marina nel Comune di Messina	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando art. 122 D.Lgs 163/2006	Ribasso 37,4670% - lavori netti € 161.194,48 – costi personale 71.724,68 – oneri sicurezza 0,00 – TOTALE 232.919,16
3	PA_148	Mezzojuso	Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso	Procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 D.Lgs 163/2006	Ribasso 35,7773% - lavori netti € 697.426,71 – costi personale 140.145,08 – oneri sicurezza 30.002,60 – TOTALE 867.594,39

Con riferimento alle gare d'appalto esperite nel secondo semestre 2015, si rappresenta che l'ammontare complessivo degli importi aggiudicati è pari a 1.561.073,85 con una media dei ribassi pari al 36,9223 %.

Per le procedure di gara sopra elencate in parte si è proceduto alla stipula e registrazione dei contratti (ME\_089\_4c\_Messina) ed in parte la contrattualizzazione è in corso.

Nel corso del secondo semestre 2015 sono state **avviate** sette gare di cui tre per l'affidamento di lavori, due per l'affidamento del monitoraggio post operam e due per l'affidamento di servizi di ingegneria relativi alle prestazioni di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il dettaglio delle gare avviate ed in corso di espletamento è di seguito riportato:



n.	Codice	Comune	Intervento	Tipologia Gara avviata	Descrizione servizio o fornitura o lavoro
1	ME_105	Rometta	Mitigazione rischio idrogeologico – Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando art. 122 D.Lgs 163/2006	Avvio gara per affidamento LAVORI
2	AG_001_b	Agrigento	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento – Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle	Procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 D.Lgs 163/2006	Avvio gara per affidamento LAVORI
3	AG_015	Sciacca	Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel comune di Sciacca	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando art. 122 D.Lgs 163/2006	Avvio gara per affidamento LAVORI
4	PA_180_181	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando art. 122 D.Lgs 163/2006	Avvio gara per affidamento MONITORAGGIO POST OPERAM
5	AG_007	Lucca Sicula	Opere di consolidamento del centro abitato – Consolidamento dell'area compresa tra Via Cabalista e via Emanuele nel comune di Lucca Sicula	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando art. 122 D.Lgs 163/2006	Avvio gara per affidamento MONITORAGGIO POST OPERAM
6	CT_038	Santa Venerina	Consolidamento della sponda destra del torrente FAGO – località Badia	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando art. 122 D.Lgs 163/2006	Avvio gara per affidamento SERVIZI INGEGNERIA (Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione)
7	PA_148	Mezzojuso	Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone Brigna a monte dell'abitato di Mezzojuso	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando art. 122 D.Lgs 163/2006	Avvio gara per affidamento SERVIZI INGEGNERIA (Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione)

## 6 – Aspetti generali dell’Accordo di Programma e degli Atti Integrativi

### 6.1 - Accordo di Programma del 30/03/2010

In data 30 marzo 2010 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Del Mare e la Regione Siciliana hanno sottoscritto l’**Accordo di Programma** – registrato alla Corte dei Conti in data 03/05/2010 reg n. 4 fog. 297 – finalizzato alla individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Siciliana con il quale sono stati stanziati complessivamente € 304.337.176,92 di cui € 152.692.572,11 a valere sulle risorse statali previsti dalla Legge n° 19 del 23 dicembre 2009, e destinati all’attuazione di **94 interventi** identificati con la **lettera A**, e € 151.644.604,81 a valere su risorse regionali del Programma Operativo FERS 2007/2013 e destinati all’attuazione di **79 interventi** identificati **dalla lettera B** come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

<b>Accordo di programma del 30.03.2010</b>	
N° 94 Interventi lettera A	€ 152.705.374,00
N° 79 Interventi lettera B	€ 151.631.802,91
<b>N° 173 Interventi</b>	<b>€ 304.337.176,92</b>

### 6.2 - I Atto Integrativo del 03/05/2011

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Difesa del Territorio e delle Risorse Idriche del 03/08/2011 è stato approvato il **primo Atto Integrativo** all’Accordo di Programma sottoscritto il 03/05/2011 dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Sicilia - registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/11 reg n. 14 fog. 104 – con il quale sono stati ulteriormente stanziati complessivi € 21.251.185,84 di cui € 12.756.002,61 a valere sulle risorse statali destinati all’attuazione di ulteriori **11 interventi** identificati con la **lettera A** e € 8.495.183,23 a valere su risorse regionali del Programma Operativo FESR 2007/2013 linee di intervento 2.3.1.1, destinati all’attuazione di ulteriori **6 interventi** identificati con la **lettera B**, come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

<b>I Atto integrativo del 03/05/2011 all’Accordo di programma</b>	
N° 11 Interventi lettera A	€ 12.756.002,61
N° 6 Interventi lettera B	€ 8.495.183,23
<b>N° 17 Interventi</b>	<b>€ 21.251.185,84</b>

### 6.3 - Deliberazione CIPE n° 08/2012 del 20/01/2012

Con deliberazione CIPE n° 08/2012 del 20/01/2012, per gli 11 interventi a valere sulle risorse statali inseriti nel I Atto Integrativo del 03/05/2011, ed identificati nella delibera stessa, è stata assegnata la somma di € 12.756.002,61 di cui € 1.153.004,80 di quota statale e € 11.602.997,18 di quota regionale.

### 6.4 - II Atto Integrativo

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Difesa del Territorio e delle Risorse Idriche - prot.5535 del 03.12.2014, registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 al Reg. n°1 fog.4854, è stato approvato il **II Atto Integrativo** all'Accordo di Programma sottoscritto il 28/10/2014 tra il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana con il quale sono stati ulteriormente stanziati complessivi € 25.000.000,00 di cui € 10.000.000,00 a valere sulle risorse statali destinati all'attuazione di ulteriori **11 interventi** identificati con la lettera A e € 15.000.000,00 a valere su risorse regionali del Programma Operativo FESR 2007/2013 linee di intervento 2.3.1.1, destinati all'attuazione di ulteriori **12 interventi** identificati con la lettera B, come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

<b>II Atto integrativo del 28/10/2014 all'Accordo di programma</b>	
N° 11 Interventi lettera A	€ 10.000.000,00
N° 12 Interventi lettera B	€ 15.000.000,00
<b>N° 23 Interventi</b>	<b>€ 25.000.000,00</b>

### 6.5 - III Atto Integrativo del 20/01/2015

Nel corso delle riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma del 21/10/2010, 24/02/2011, 24/03/2011, 15/09/2011, 18/05/2012, 15/02/2013 23/09/2013, 06/06/2014 e 06/10/2014 è stata concordata la correzione di alcuni errori materiali, la rimodulazione, la revoca e la riprogrammazione di vari interventi a valere sia sul finanziamento statale che sul finanziamento regionale, l'inserimento di una parte programmatica e l'aggiornamento di alcuni codici ai fini della loro compatibilità con il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi di difesa del Suolo (ReNDiS).

Con nota prot. 5998 del 02/12/2014 la Regione Siciliana, stante quanto rappresentato e convenuto nella riunione del Comitato del 06/10/2014 e facendo seguito a quanto convenuto nelle precedenti sedute del Comitato nonché di quanto disposto dagli Atti Integrativi già formalizzati, ha comunicato il quadro economico complessivo dell'Accordo di Programma nonché l'elenco complessivo completo e aggiornato degli interventi posti in fase attuativa nonché in fase programmatica da allegare al III Atto Integrativo all'Accordo di Programma, opportunamente modificato per recepire la correzione di piccoli errori materiali, rappresentando altresì la disponibilità di euro 613.104,30 di

economie a valere sulle risorse statali che potranno essere utilizzate a copertura degli interventi posti in fase programmatica e di altri interventi da determinare.

In data 20/01/2015 è stato stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Sicilia il **III Atto Integrativo** all'Accordo di Programma del 30/03/2010 - registrato alla Corte dei Conti in data 25/03/2015 reg n. 1 fog. 1193 – con il quale si è proceduto a riordinare l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle integrazioni e variazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi nonché del I Atto integrativo del 03/05/2011 e del II Atto integrativo del 28/10/2014.

Il predetto III Atto integrativo, finalizzato all'attuazione del comma 111 dell'art. 1 della legge 147/2013 ed al recepimento delle modifiche sottoposte al Comitato di Indirizzo e Controllo per la Gestione dell'Accordo, si compone di una "Sezione attuativa" contenente complessivi 220 interventi e di una "Sezione programmatica" contenente n° 1 intervento (identificato con il codice ME051A nel Comune di Ali Terme) per l'importo di euro 3.000.000,00 da finanziare con eventuali economie derivanti dall'attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30/03/2010 nonché del I Atto integrativo del 03/05/2011, del II Atto integrativo del 28/10/2014, del III Atto Integrativo e con eventuali ulteriori stanziamenti da parte dei soggetti sottoscrittori.

In definitiva, l'Accordo di Programma sottoscritto il 30/03/2010 così come riordinato e rimodulato dal III Atto Integrativo, comprende 220 interventi elencati nella "Sezione attuativa", n° 1 intervento elencato nella "Sezione programmatica", oltre ad economie accertate nella misura di euro 613.104,30. Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli interventi previsti nel III Atto integrativo:

Sezione attuativa	N° interventi	Commissario	N° interventi	Regione	N° interventi	TOTALE
AdP 2010	80	€ 152.079.467,81	100	€ 151.644.604,81	180	€ 303.724.072,62
1° Atto integrativo	11	€ 12.756.002,61	6	€ 8.495.183,23	17	€ 21.251.185,84
2° Atto integrativo	11	€ 10.000.000,00	12	€ 15.000.000,00	23	€ 25.000.000,00
economie AdP 2010		€ 613.104,30		€ -	0	€ 613.104,30
<b>TOTALE</b>	<b>102</b>	<b>€ 175.448.574,72</b>	<b>118</b>	<b>€ 175.139.788,04</b>	<b>220</b>	<b>€ 350.588.362,76</b>

Sezione programmatica	N° interventi	Commissario	N° interventi	Regione	N° interventi	TOTALE
ME051A - Ali Terme	1	€ 3.000.000,00	0	€ -	1	€ 3.000.000,00

La **copertura finanziaria** del fabbisogno ammonta complessivamente a euro 350.588.362,76, di cui euro 163.845.576,91 a valere su risorse statali ed euro 186.742.785,85 a valere su risorse regionali, come riportato nel seguente prospetto:

Atto	Risorse statali	Risorse regionali	Totale risorse
Accordo di Programma del 30/03/2010	152.692.572,11	151.644.604,81	<b>304.337.176,92</b>
I Atto integrativo del 03/05/2011	1.153.004,80	20.098.180,41	<b>21.251.185,21</b>
II Atto integrativo del 28/10/2014	10.000.000,00	15.000.000,00	<b>25.000.000,00</b>
<b>Sommano</b>	<b>163.845.576,91</b>	<b>186.742.785,22</b>	<b>350.588.362,13</b>

## **6.6 - Attuazione dell'Accordo di Programma**

Ai sensi dell'art. 5 del III Atto Integrativo l'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma e negli Atti Integrativi, in base al disposto dell'art. 7 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.

## **6.7 - Il Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo**

L'Articolo 8 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 30/03/2010 ha istituito il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo (Comitato), composto da un rappresentante dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente e da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dal Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse idriche del MATTM o suo delegato.

Al "Comitato per la gestione dell'Accordo" spetta in particolare il compito di:

- Governare e controllare il processo complessivo di programmazione e realizzazione degli interventi ricompresi nell' Accordo;
- assicurare, sulla base dei risultati del monitoraggio la ricognizione sull'attuazione degli interventi, con cadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna annualità, evidenziando le eventuali situazioni di criticità;
- garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare il processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale interessato, che avverrà in coincidenza con le scadenze di cui al punto precedente;
- promuovere l'eventuale attivazione delle procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi;
- indicare ai Soggetti Attuatori ed ai Responsabili dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo;
- definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie accertate sugli stessi - compresi i ribassi d'asta - nonché definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore.
- assicurare la corretta ed efficace attuazione dell'Accordo di programma;
- in caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dell'Accordo di Programma, su segnalazione dei Responsabili dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei Soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convocare le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

Ciò premesso, è utile riassumere le principali determinazioni assunte nel corso delle riunioni svolte dal Comitato di indirizzo e controllo in merito alle rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie accertate sugli stessi - compresi i ribassi d'asta - e alla riprogrammazione delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore, in seguito definitivamente recepite nel III Atto integrativo.

In data 17 ottobre 2010, il Comitato, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi il 1° ottobre 2009 nella zona di Giampileri (ME) e di S. Fratello (ME), ha fatto transitare le risorse finanziarie, originariamente previste sui fondi regionali (elenco B), sulle risorse statali (elenco A) relativamente agli interventi ME087 "Opere di consolidamento località Giampileri" di importo pari a €\_24.000.000,00 e ME107 "Opere di consolidamento centro abitato" nel comune di San Fratello per un importo € 18.000.000,00.

Successivamente, a seguito dell'OPCM 3886 del 9 luglio 2010, i suddetti interventi sono stati gestiti dal Commissario Delegato di cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009 e di cui all'OPCM 3865/10. I relativi fondi sono stati trasferiti dal Ministero dell'Ambiente nella contabilità speciale di cui al suddetto Commissario (Dipartimento Regionale di Protezione Civile).

Nel corso delle sedute del Comitato del 21/10/2010, 24/02/2011, 24/03/2011, 15/09/2011, 18/05/2012, 15/02/2013 23/09/2013, 06/06/2014 e 06/10/2014 sono stati fatti transitare degli interventi dalla Lettera A alla Lettera B, e viceversa, al fine di riequilibrare la copertura finanziaria originariamente prevista nell'A.d.P; è stata concordata la correzione di alcuni errori materiali, la rimodulazione, la revoca e la riprogrammazione di vari interventi a valere sia sul finanziamento statale che sul finanziamento regionale, l'inserimento di una parte programmatica e l'aggiornamento di alcuni codici ai fini della loro compatibilità con il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi di difesa del Suolo (ReNDiS).

In definitiva rispetto all'originario Accordo di Programma del 2010 e ai successivi 1° e 2° Atto Integrativo, la rimodulazione degli interventi così come riportata nel 3° Atto Integrativo ha recepito:

- il transito di alcuni interventi dalla lettera A (fondi ministeriali) alla lettera B (fondi regionali e viceversa);
- la revoca di 8 interventi, definitivamente eliminati dall'elenco di cui all'ALLEGATO 1 del III Atto integrativo e di seguito elencati:

#### Interventi revocati

N°	Codice Intervento	Lettera definitiva	Comune
1	CL_020	A	Serradifalco
2	EN_044	A	Gagliano Castelferrato
3	ME_080	A	Librizzi
4	ME_100	A	Raccuja
5	PA_136	A	Belmonte Mezzagno
6	RG_159	A	Modica
7	SR_163	A	Pachino
8	SR_165	A	Portopalo di Capo Passero

- l'inserimento di 3 nuovi interventi (**AG 218 A Cammarata, ME 219 A Naso e PA 220 A Prizzi**) in sostituzione di quelli revocati;

- la sostituzione di 6 interventi previsti nell'Accordo di Programma del 30/03/2010 (**EN045 Leonforte, ME089 Messina, ME115 Sant'Angelo di Brolo, ME117 Scaletta Zancalea, PA137 Blufi e RG158 Modica**), con 15 sub-interventi di seguito elencati:

#### INTERVENTI SUDDIVISI IN 2 o PIU' SUB-INTERVENTI

N°	Cod. Int	N°	Cod. Int	Lettera definitiva	COMUNE	importo
1	EN_045	1	EN_045_1	B	Leonforte	400.000,00
2	ME_089	2	ME_089_1	A	Messina	900.000,00
		3	ME_089_2	A	Messina	1.390.000,00
		4	ME_089_3	A	Messina	510.000,00
		5	ME_089_4	A	Messina	650.000,00
		6	ME_089_5	A	Messina	550.000,00
3	ME_115	7	ME_115_1	A	Sant'Angelo di Brolo	3.000.000,00
		8	ME_115_2	A	Sant'Angelo di Brolo	2.930.000,00
		9	ME_115_3	A	Sant'Angelo di Brolo	2.070.000,00
4	ME_117	10	ME_117_1	B	Scaletta Zancalea	2.700.000,00
		11	ME_117_2	B	Scaletta Zancalea	1.000.000,00
5	PA_137	12	PA_137_1	A	Blufi	1.310.000,00
		13	PA_137_2	A	Blufi	690.000,00
6	RG_158	14	RG_158_1	B*	Modica	2.000.000,00
		15	RG_158_2	B	Modica	1.000.000,00
					<b>TOTALE</b>	<b>21.100.000,00</b>

Per quanto riguarda gli interventi **PA180 e PA181**, entrambi nel comune di Cefalù, si rileva che ai fini dell'attuazione gli stessi sono stati accorpati nell'ambito di un progetto unico di importo pari a € 490.000,00 corrispondente alla somma dei finanziamenti previsti nell'Accordo di Programma del 30/03/2010.

Tuttavia, nell'elenco di cui all'ALLEGATO 1 del III Atto integrativo risultano ancora inseriti i due interventi originari PA180 e PA181.

## 7- ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE SVOLTE

### 7.1 Istruttoria preliminare, definizione cronoprogramma e ripartizione annuale delle risorse.

In primo luogo, a seguito di una serie di incontri effettuati con i singoli Comuni, con tutte le Amministrazioni e gli Enti convenzionati di cui al precedente paragrafo si è proceduto ad una istruttoria preliminare della documentazione tecnico – amministrativa relativa ai singoli interventi, ed in particolare in ordine alle seguenti priorità:

- stato e livello della progettazione disponibile;
- eventuali incarichi esterni affidati;
- importo aggiornato degli interventi (suddiviso ove possibile tra lavori, somme a disposizione ed IVA);
- vincoli e livello/stato delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere;
- presenza o meno del RUP dell'intervento;
- disponibilità o meno delle aree di intervento (occupazione dei suoli);

- eventuali lavori già affidati;
- eventuale previsione di affidamento “interno” di attività di progettazione e gestione dell’intervento (ex comma 5, art. 92 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.);
- eventuale previsione di quota del finanziamento da destinare alla struttura commissariale per la gestione degli interventi;
- eventuali note particolari emerse dall’analisi dei dati trasmessi.

Sulla base di tali dati, ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 del DPCM del 10.12.2010, è stato quindi redatto un cronoprogramma di attuazione degli interventi, basato sullo stato ed il livello di progettazione già disponibile per gli stessi, alla data di aprile 2011.

Lo schema di crono programma ripartiva tutti gli interventi ricadenti nella lettera A sui tre anni previsti di attività, fornendo anche una stima preliminare, suddivisa per trimestri, della potenziale cantierabilità di tutti gli interventi, anche se la fase di istruttoria e soprattutto, di incontro diretto con i Comuni era ancora in corso.

Il Cronoprogramma è stato periodicamente aggiornato per tener conto degli interventi transitati da copertura finanziaria ministeriale a quella regionale e viceversa e lo stato reale di avanzamento dell’istruttoria, progettazione e realizzazione degli interventi.

## 7.2 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI al 31.12.2015

Come già detto l’Accordo di Programma del 30/03/2010, così come rimodulato con il III Atto integrativo, prevede complessivamente l’attuazione di 220 interventi di cui 102 (**lettera A**) in capo alla Struttura commissariale e 118 (**lettera B**) in capo alla Regione Siciliana come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

	N°	Lettera A	N°	Lettera B	N°	A + B
AdP 2010	80	152.079.467,81	100	151.644.604,81	180	303.724.072,62
1° Atto integrativo	11	12.756.002,61	6	8.495.183,23	17	21.251.185,84
2° Atto integrativo	11	10.000.000,00	12	15.000.000,00	23	25.000.000,00
economie AdP 2010		613.104,30	0	0,00	0	613.104,30
<b>TOTALE</b>	<b>102</b>	<b>175.448.574,72</b>	<b>118</b>	<b>175.139.788,04</b>	<b>220</b>	<b>350.588.362,76</b>

Per quanto riguarda gli interventi lettera B di competenza della Regione (fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d’intervento 2.3.1), il complemento di Programmazione del PO FESR prevedeva che gli unici Enti beneficiari di tali risorse fossero le Amministrazioni locali che erano le uniche a fungere da stazioni appaltanti, sotto il controllo di gestione della Direzione Generale Ambiente dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della regione Sicilia.

I vincoli derivanti dai fondi comunitari messi a disposizione dalla Regione Sicilia hanno però, di fatto, diviso in due l’AdP in quanto tali fondi non potevano essere nella disponibilità dell’Ufficio del Commissario, né in termini di cassa né in termini di gestione ed attuazione dei relativi interventi.

Tale distinzione ha fatto sì che la fase attuativa degli interventi di cui alla lettera “B” è stata gestita direttamente dalle Amministrazioni comunali (beneficiarie del finanziamento) esclusivamente in regime ordinario e con tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente che disciplina i contratti pubblici sia sul territorio nazionale che europeo.

La rimodulazione del complemento di Programmazione del suddetto PO FESR, approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011, adottata dalla Giunta Regionale di Governo con



Delibera n. 20 del 19.01.2012, ha previsto anche quale Ente Beneficiario l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato. In virtù di tale rimodulazione, la Regione ha indicato 23 interventi, per un importo complessivo pari a € 39.674.016,28, corrispondenti circa il 30% degli interventi di propria competenza per i quali il Commissario Straordinario è stato individuato quale soggetto beneficiario.

Stante infatti l'approssimarsi delle date di scadenza del Programma PO FESR, la Regione ha ritenuto opportuno avvalersi degli uffici del Commissario al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, prioritari e urgenti, ricadenti nella lettera B che presentavano ritardi e criticità di difficile risoluzione da parte degli Enti Beneficiari precedentemente individuati.

Si precisa che per gli interventi sopra elencati alla Struttura Commissariale compete:

- l'istruttoria e l'iter autorizzativo propedeutico all'emissione del Decreto di Finanziamento che rimane a carico della Regione;

- la funzione di Stazione Appaltante.

Si riporta di seguito l'elenco dei 23 interventi individuati con la **lettera B** (fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d'intervento 2.3.1), che la Regione ha trasferito al Commissario - individuato quale soggetto beneficiario:

N°	CODICI	letti	Pro	COMUNE	IMPORTO	PROVVEDIMENTO
1	AG004	B*	AG	CATTOLICA ERACLEA	1.480.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
2	AG014	B*	AG	SANTO STEFANO QUISQUINA	2.272.997,00	AdP 2010 del 30/03/2010
3	AG174	B*	AG	CATTOLICA ERACLEA	1.170.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
4	CL017	B*	CL	BUTERA	1.200.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
5	CL018	B*	CL	BUTERA	800.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
6	CL019	B*	CL	CALTANISSETTA	4.160.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
7	CT028	B*	CT	LICODIA EUBEA	880.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
8	CT038	B*	CT	SANTA VENERINA	1.000.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
9	CT039	B*	CT	SANT'AGATA LI BATTIATI	1.000.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
10	ME065	B*	ME	FICARRA	1.028.981,00	AdP 2010 del 30/03/2010
11	ME068	B*	ME	FORZA D'AGRO'	414.163,28	AdP 2010 del 30/03/2010
12	ME105	B*	ME	ROMETTA	1.000.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
13	ME106	B*	ME	SANT'ALESSIO SICULO	5.000.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
14	ME124	B*	ME	TERME VIGLIATORE	3.823.875,00	AdP 2010 del 30/03/2010
15	ME127	B*	ME	TORTORICI	2.300.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
16	ME130	B*	ME	TUSA	1.500.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
17	PA140	B*	PA	CAMPOREALE	1.500.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
18	PA148	B*	PA	MEZZOJUSO	2.144.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
19	PA151	B*	PA	PARTINICO	950.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
20	PA152	B*	PA	PETRALIA SOTTANA	1.200.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
21	RG158_1	B*	RG	MODICA	2.000.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
22	SR166	B*	SR	ROSOLINI	1.500.000,00	AdP 2010 del 30/03/2010
23	TP190	B*	TP	SAN VITO LO CAPO	1.350.000,00	1° Atto Integrativo del 03/05/2011
<b>TOTALE</b>					<b>39.674.016,28</b>	

Ciò premesso, i dati relativi allo stato di attuazione degli interventi rientranti nell'accordo di Programma sottoscritto il 30/03/2010 così come riordinato e rimodulato nel III Atto integrativo, distinti in interventi lettera A, interventi lettera B e interventi lettera B\*, e classificati in base allo stato di avanzamento alla data del **31/12/2015** come:


- interventi in fase di progettazione;
- interventi con progetti approvati e finanziati per i quali risulta avviata la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori;
- interventi con lavori in fase di esecuzione;
- interventi con lavori ultimati.

Per ciascun gruppo di interventi è riportato inoltre l'ammontare complessivo delle risorse stanziato nell'Accordo di Programma e l'incidenza percentuale sull'importo complessivo delle risorse assegnate.

### 7.3 – Interventi lettera A

<i>Interventi A - 3° Atto integrativo del 20/01/2015</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>Importo AdP</i>
17	<i>in fase di progettazione</i>	13,52%	23.721.010,50
1	<i>in procedura di gara</i>	0,46%	800.000,00
22	<i>lavori in esecuzione</i>	21,94%	38.498.502,61
62	<i>lavori ultimati</i>	63,73%	111.815.957,31
0	<i>economie</i>	0,35%	613.104,30
<b>102</b>	<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>100,00%</b>	<b>175.448.574,72</b>


Interventi A - 3° Atto integrativo del 20/01/2015 %

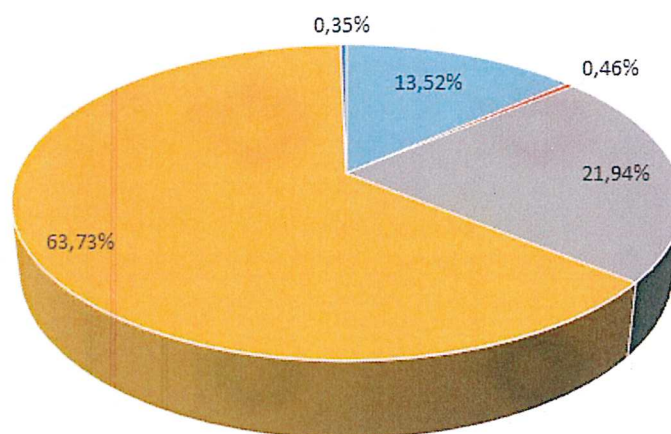

■ 17 in fase di progettazione   
 ■ 1 in procedura di gara   
 ■ 22 lavori in esecuzione  
■ 62 lavori ultimati   
 ■ 0 economie


#### 7.4 – Interventi lettera B (fondi regionali - PO FESR 2007-2013)

<i>Interventi B - 3° Atto integrativo del 20/01/2015</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>Importo AdP</i>
15	<i>in fase di progettazione</i>	14,07%	19.061.000,00
4	<i>in procedura di gara</i>	6,57%	8.900.000,00
28	<i>lavori in esecuzione</i>	34,41%	46.610.610,01
48	<i>lavori ultimati</i>	44,95%	60.894.161,75
0	<i>economie</i>	0,00%	-
<b>95</b>	<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.465.771,76</b>

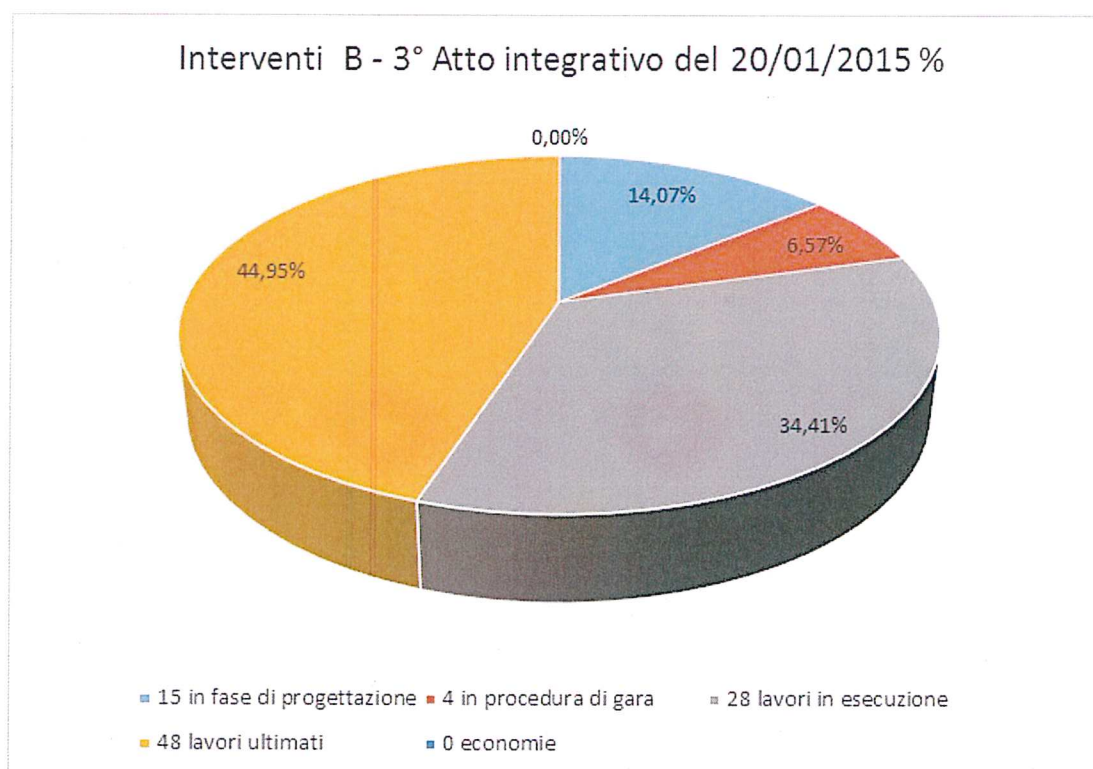

## 7.5 – Interventi lettera B\*

<b>Interventi B* - 3° Atto integrativo del 20/01/2015</b>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>Importo AdP</i>
11	<i>in fase di progettazione</i>	37,65%	14.937.160,28
4	<i>in procedura di gara</i>	15,49%	6.144.000,00
4	<i>lavori in esecuzione</i>	27,83%	11.040.000,00
4	<i>lavori ultimati</i>	19,04%	7.552.856,00
0	<i>economie</i>	0,00%	-
<b>23</b>	<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.674.016,28</b>

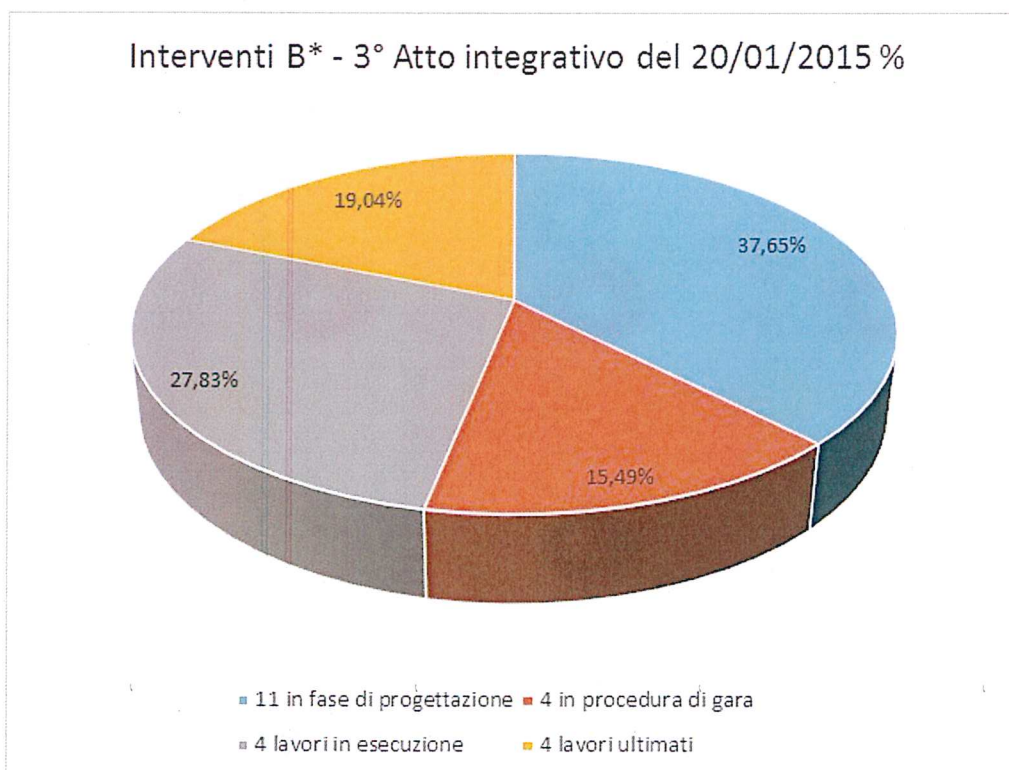


## 7.6 – Interventi lettera B+B\*

### Interventi B + B\* (3° Atto integrativo del 20/01/2015)

N. Interventi	Stato	%	Importo AdP
26	in fase di progettazione	19,41%	33.998.160,28
8	in procedura di gara	8,59%	15.044.000,00
32	lavori in esecuzione	32,92%	57.650.610,01
52	lavori ultimati	39,08%	68.447.017,75
0	economie	0,00%	-
<b>118</b>	<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>100,00%</b>	<b>175.139.788,04</b>

Interventi B + B\* (3° Atto integrativo del 20/01/2015) %

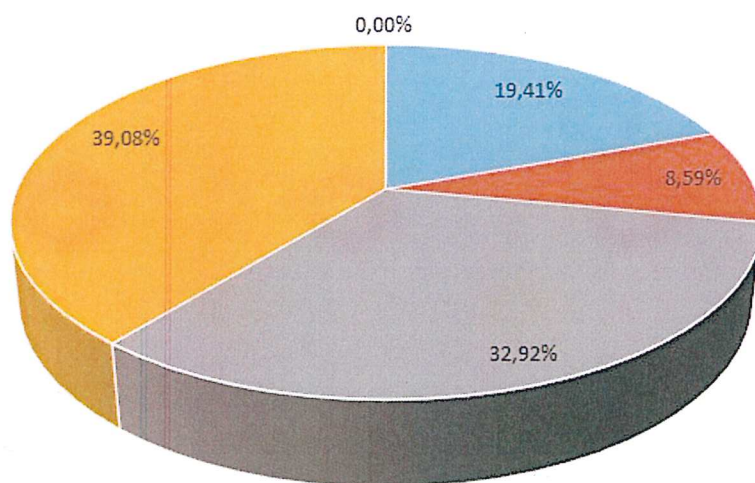


■ 26 in fase di progettazione   
 ■ 8 in procedura di gara   
 ■ 32 lavori in esecuzione  
■ 52 lavori ultimati   
 ■ 0 economie

## 7.7 – Tutti gli interventi (lettera A+B+B\* )

In definitiva con riferimento al complesso degli interventi previsti dall'Accordo di Programma i dati sono quelli riportati di seguito

<b>Interventi A + B + B* (3° Atto integrativo del 20/01/2015)</b>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>Importo AdP</i>
43	<i>in fase di progettazione</i>	16,46%	57.719.170,78
9	<i>in procedura di gara</i>	4,52%	15.844.000,00
54	<i>lavori in esecuzione</i>	27,43%	96.149.112,62
114	<i>lavori ultimati</i>	51,42%	180.262.975,06
0	<i>economie</i>	0,17%	613.104,30
<b>220</b>	<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.588.362,76</b>

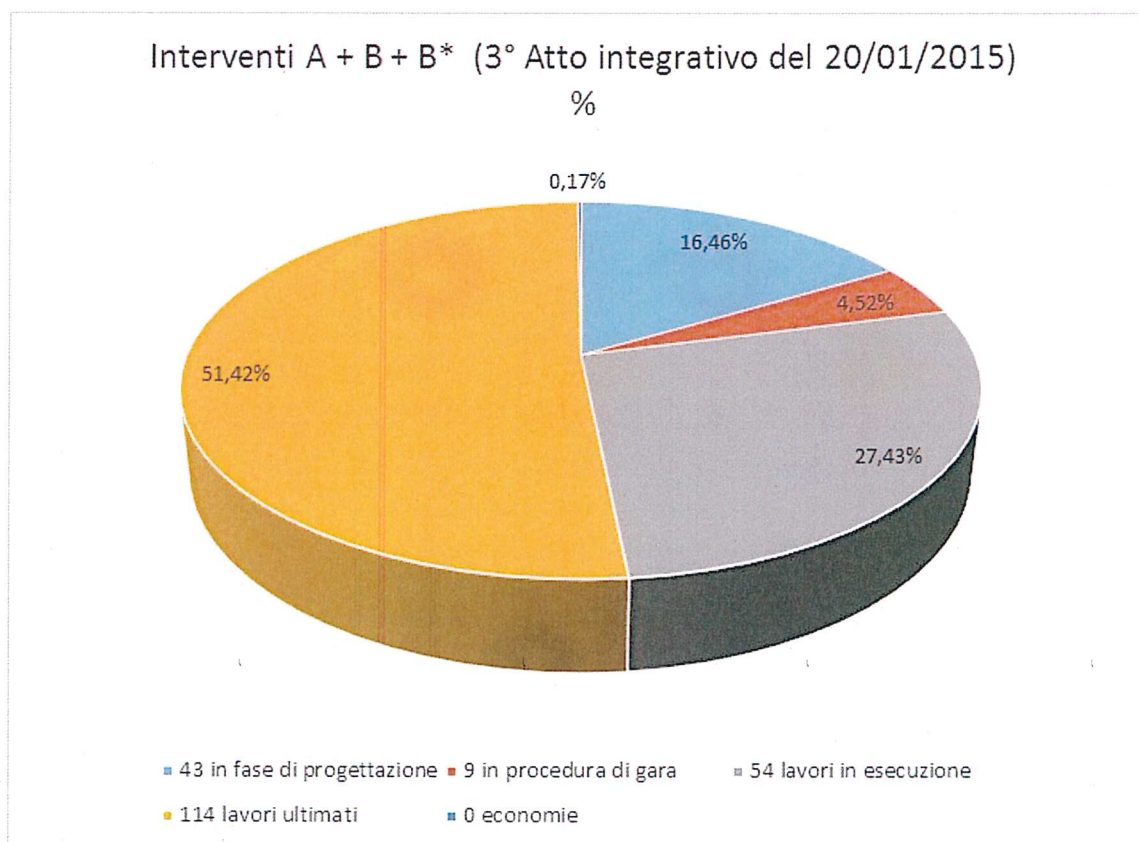

Si allegano alla presente relazione copia dell'Accordo di Programma di cui al III Atto integrativo, nonché gli elenchi riassuntivi dello stato dell'arte al 31.12.2015 di tutti gli interventi.

Il Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia

*Eoti*

ELENCO DI TUTTI GLI INTERVENTI INSERITI NEL 3° ATTO INTEGRATIVO

Sezione attuativa

CODICE	Letto	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
AG001	A	AG	AGRIGENTO	2.000.000,00	lavori in esecuzione
AG002	B	AG	CALTABELLOTTA	600.000,00	lavori ultimati
AG003	B	AG	CAMMARATA	1.050.000,00	lavori ultimati
AG004	B*	AG	CATTOLICA ERACLEA	1.480.000,00	in fase di progettazione
AG005	B	AG	CIANCIANA	855.618,05	lavori ultimati
AG006	A	AG	FAVARA	1.500.000,00	lavori ultimati
AG007	A	AG	LUCCA SICULA	1.500.000,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
AG008	B	AG	MONTALLEGRO	1.435.536,03	lavori ultimati
AG009	B	AG	RAVANUSA	996.908,73	lavori ultimati
AG010	A	AG	RIBERA	2.600.000,00	lavori in esecuzione
AG011	A	AG	RIBERA	939.021,00	lavori ultimati
AG012	B	AG	SAMBUCA DI SICILIA	1.025.000,00	lavori ultimati
AG013	B	AG	SAN GIOVANNI GEMINI	2.474.826,76	lavori ultimati
AG014	B*	AG	SANTO STEFANO QUISQUINA	2.272.997,00	in fase di progettazione
AG015	A	AG	SCIACCA	800.000,00	in procedura di gara
AG174	B*	AG	CATTOLICA ERACLEA	1.170.000,00	in fase di progettazione
AG191	B	AG	NARO	1.067.000,00	lavori in esecuzione
AG192	B	AG	PALMA DI MONTECHIARO	1.800.000,00	lavori in esecuzione
AG195	A	AG	CASTELTERMINI	800.000,00	in fase di progettazione
AG196	A	AG	ARAGONA	700.000,00	in fase di progettazione
AG197	A	AG	PALMA DI MONTECHIARO	700.000,00	in fase di progettazione
AG218	A	AG	CAMMARATA	2.380.000,00	in fase di progettazione
CL016	B	CL	ACQUAVIVA PLATANI	986.525,06	lavori ultimati
CL017	B*	CL	BUTERA	1.200.000,00	in fase di progettazione
CL018	B*	CL	BUTERA	800.000,00	in fase di progettazione
CL019	B*	CL	CALTANISSETTA	4.160.000,00	lavori in esecuzione
CL198	A	CL	MUSSOMELI	700.000,00	in fase di progettazione
CT021	B	CT	ACI CATENA	4.500.000,00	in procedura di gara
CT022	A	CT	BRONTE	1.092.500,00	lavori in esecuzione
CT023	A	CT	CALATABIANO	250.000,00	lavori ultimati
CT024	A	CT	CASTEL DI IUDICA	3.000.000,00	lavori ultimati
CT025	A	CT	GIARRE	1.000.000,00	lavori ultimati
CT026	A	CT	GIARRE	1.000.000,00	lavori ultimati
CT027	A	CT	GRAMMICHELE	700.000,00	lavori ultimati
CT028	B*	CT	LICODIA EUBEA	880.000,00	lavori in esecuzione
CT029	B	CT	MANIACE	1.500.000,00	in procedura di gara
CT030	B	CT	MANIACE	1.000.000,00	lavori in esecuzione
CT031	A	CT	MISTERBIANCO	500.000,00	lavori ultimati
CT032	B	CT	MOTTA SANT' ANASTASIA	1.500.000,00	lavori ultimati
CT033	A	CT	PIEDIMONTE ETNEO	500.000,00	lavori ultimati
CT034	A	CT	RADDUSA	2.000.000,00	lavori in esecuzione
CT035	B	CT	RADDUSA	2.500.000,00	lavori ultimati
CT036	A	CT	RAMACCA	1.200.000,00	lavori ultimati
CT037	A	CT	RANDAZZO	960.000,00	lavori ultimati
CT038	B*	CT	SANTA VENERINA	1.000.000,00	in procedura di gara
CT039	B*	CT	SANT' AGATA LI BATTIATI	1.000.000,00	lavori in esecuzione
CT040	B	CT	TRECASTAGNI	446.849,79	lavori ultimati
CT193	B	CT	SANT' ALFIO	1.900.000,00	in procedura di gara
CT199	A	CT	RANDAZZO	700.000,00	in fase di progettazione
EN041	B	EN	BARRAFRANCA	1.608.973,06	lavori in esecuzione
EN042	A	EN	CENTURIFE	770.000,00	lavori ultimati
EN043	B	EN	GAGLIANO CASTELFERRATO	1.557.285,46	lavori ultimati
EN045_1	B	EN	LEONFORTE	400.000,00	lavori in esecuzione
EN046	B	EN	PIAZZA ARMERINA	1.130.000,00	lavori in esecuzione
EN047	A	EN	REGALBUTO	1.500.000,00	lavori ultimati
EN175	A	EN	BARRAFRANCA	1.500.000,00	lavori in esecuzione
EN200	A	EN	TROINA	1.240.000,00	in fase di progettazione
ME048	B	ME	ALCARA LI FUSI	1.880.000,00	lavori ultimati
ME049	A	ME	ALCARA LI FUSI	1.200.000,00	lavori ultimati
ME050	B	ME	ALI'	900.000,00	lavori in esecuzione
ME052	A	ME	BASICO'	1.300.000,00	lavori ultimati
ME053	A	ME	BROLO	3.630.000,00	lavori ultimati

<b>CODICE</b>	<b>Let</b>	<b>Prov</b>	<b>COMUNE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>fase</b>
ME054	B	ME	CAPIZZI	1.192.623,56	lavori ultimati
ME055	B	ME	CAPO D ' ORLANDO	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME056	A	ME	CAPRI LEONE	550.000,00	lavori ultimati
ME057	A	ME	CAPRI LEONE	600.000,00	lavori ultimati
ME058	A	ME	CARONIA	3.653.083,31	lavori ultimati
ME059	A	ME	CASALVECCHIO SICULO	1.363.853,00	lavori ultimati
ME060	B	ME	CASTEL DI LUCIO	999.676,87	lavori ultimati
ME061	A	ME	CASTEL DI LUCIO	1.500.000,00	lavori ultimati
ME062	A	ME	CASTELL ' UMBERTO	300.000,00	lavori in esecuzione
ME063	A	ME	CASTROREALE	1.650.000,00	lavori in esecuzione
ME064	B	ME	CESARO '	965.547,00	lavori ultimati
ME065	B*	ME	FICARRA	1.028.981,00	lavori ultimati
ME066	A	ME	FICARRA	1.450.000,00	lavori ultimati
ME067	B	ME	FONDACHELLI-FANTINA	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME068	B*	ME	FORZA D ' AGRO '	414.163,28	in fase di progettazione
ME069	B	ME	FRAZZANO '	1.165.000,00	lavori in esecuzione
ME070	B	ME	FRAZZANO '	2.500.000,00	lavori in esecuzione
ME071	A	ME	FRAZZANO '	300.000,00	lavori ultimati
ME072	A	ME	GALATI MAMERTINO	500.000,00	lavori ultimati
ME073	A	ME	GALATI MAMERTINO	1.100.000,00	lavori ultimati
ME074	B	ME	GIARDINI-NAXOS	2.200.000,00	lavori in esecuzione
ME075	B	ME	GUALTIERI SICAMINO '	1.651.041,00	lavori in esecuzione
ME076	B	ME	ITALA	1.500.000,00	lavori ultimati
ME077	B	ME	LENI	1.500.000,00	lavori ultimati
ME078	A	ME	LETOJANNI	2.000.000,00	lavori in esecuzione
ME079	A	ME	LIBRIZZI	2.150.000,00	lavori in esecuzione
ME081	A	ME	LIBRIZZI	500.000,00	lavori ultimati
ME082	B	ME	LIMINA	1.666.000,00	lavori in esecuzione
ME083	B	ME	LONGI	1.474.985,06	lavori ultimati
ME084	B	ME	MALFA	1.000.000,00	lavori ultimati
ME085	B	ME	MALVAGNA	1.000.000,00	lavori ultimati
ME086	B	ME	MANDANICI	1.149.942,49	lavori ultimati
ME087	A	ME	MESSINA	24.000.000,00	lavori ultimati
ME088	A	ME	MESSINA	3.000.000,00	lavori ultimati
ME089_1	A	ME	MESSINA	900.000,00	lavori ultimati
ME089_2	A	ME	MESSINA	1.390.000,00	lavori in esecuzione
ME089_3	A	ME	MESSINA	510.000,00	lavori ultimati
ME089_4	A	ME	MESSINA	650.000,00	lavori in esecuzione
ME089_5	A	ME	MESSINA	550.000,00	lavori in esecuzione
ME090	B	ME	MILITELLO ROSMARINO	1.500.000,00	lavori in esecuzione
ME091	A	ME	MIRTO	2.500.000,00	lavori ultimati
ME092	A	ME	MISTRETTA	800.000,00	lavori ultimati
ME093	B	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	1.200.000,00	lavori ultimati
ME094	B	ME	MOTTA CAMASTRA	993.521,35	lavori ultimati
ME095	A	ME	NASO	1.650.000,00	lavori in esecuzione
ME096	B	ME	NOVARA DI SICILIA	399.110,40	lavori ultimati
ME097	B	ME	PAGLIARA	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME098	B	ME	PATTI	1.085.544,63	lavori in esecuzione
ME099	A	ME	PIRAINO	1.100.000,00	lavori in esecuzione
ME101	B	ME	REITANO	980.000,00	lavori ultimati
ME102	B	ME	ROCCALUMERA	850.000,00	lavori ultimati
ME103	B	ME	ROCCAVALDINA	1.885.000,00	lavori ultimati
ME104	B	ME	ROCCELLA VALDEMONTE	875.000,00	lavori ultimati
ME105	B*	ME	ROMETTA	1.000.000,00	in procedura di gara
ME106	B*	ME	SANT ' ALESSIO SICULO	5.000.000,00	lavori in esecuzione
ME107	A	ME	SAN FRATELLO	18.000.000,00	lavori ultimati
ME108	B	ME	SAN PIER NICETO	1.550.000,00	lavori in esecuzione
ME109	A	ME	SAN PIER NICETO	600.000,00	lavori ultimati
ME110	B	ME	SAN PIERO PATTI	1.850.000,00	lavori in esecuzione
ME111	B	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	1.300.000,00	lavori ultimati
ME112	B	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	1.200.000,00	lavori ultimati
ME113	A	ME	SANTA MARINA SALINA	2.000.000,00	in fase di progettazione
ME114	B	ME	SANT ' AGATA DI MILITELLO	1.710.000,00	lavori ultimati
ME115_1	A	ME	SANT ' ANGELO DI BROLO	3.000.000,00	lavori ultimati
ME115_2	A	ME	SANT ' ANGELO DI BROLO	2.930.000,00	lavori ultimati
ME115_3	A	ME	SANT ' ANGELO DI BROLO	2.070.000,00	lavori ultimati



<b>CODICE</b>	<b>Letto</b>	<b>Prov</b>	<b>COMUNE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>fase</b>
ME116	B	ME	SAVOCA	1.195.875,88	lavori ultimati
ME117_1	B	ME	SCALETTA ZANCLEA	2.700.000,00	lavori in esecuzione
ME117_2	B	ME	SCALETTA ZANCLEA	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME118	B	ME	SCALETTA ZANCLEA	1.400.000,00	in fase di progettazione
ME119	A	ME	SINAGRA	3.000.000,00	lavori in esecuzione
ME120	A	ME	SINAGRA	1.000.000,00	in fase di progettazione
ME121	A	ME	SINAGRA	2.500.000,00	lavori in esecuzione
ME122	B	ME	SPADAFORA	1.327.891,32	lavori ultimati
ME123	B	ME	SPADAFORA	1.500.000,00	lavori ultimati
ME124	B*	ME	TERME VIGLIATORE	3.823.875,00	lavori ultimati
ME125	A	ME	TORTORICI	1.500.000,00	lavori ultimati
ME126	A	ME	TORTORICI	500.000,00	lavori ultimati
ME127	B*	ME	TORTORICI	2.300.000,00	in fase di progettazione
ME128	A	ME	TORTORICI	500.000,00	lavori ultimati
ME129	B	ME	TORTORICI	4.000.000,00	lavori in esecuzione
ME130	B*	ME	TUSA	1.500.000,00	lavori ultimati
ME131	B	ME	UCRIA	1.261.000,00	in fase di progettazione
ME132	A	ME	UCRIA	2.500.000,00	lavori ultimati
ME133	B	ME	VALDINA	2.000.000,00	lavori ultimati
ME134	B	ME	VENETICO	1.554.100,81	lavori ultimati
ME176	B	ME	GIARDINI-NAXOS	1.400.000,00	in fase di progettazione
ME178	A	ME	CAPRI LEONE	1.000.000,00	lavori ultimati
ME194	A	ME	BROLO	600.000,00	lavori in esecuzione
ME201	A	ME	LIPARI	2.400.000,00	in fase di progettazione
ME202	A	ME	SANTA MARINA SALINA	700.000,00	in fase di progettazione
ME206	B	ME	ANTILLO	1.500.000,00	in fase di progettazione
ME207	B	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	800.000,00	in fase di progettazione
ME208	B	ME	CASTROREALE	800.000,00	in fase di progettazione
ME209	B	ME	CONDRO ´	1.200.000,00	in fase di progettazione
ME210	B	ME	MESSINA	1.270.000,00	in fase di progettazione
ME211	B	ME	MILAZZO	1.360.000,00	in fase di progettazione
ME212	B	ME	PACE DEL MELA	1.400.000,00	in fase di progettazione
ME213	B	ME	ROCCAVALDINA	1.000.000,00	in fase di progettazione
ME214	B	ME	RODI ´ MILICI	1.000.000,00	in fase di progettazione
ME215	B	ME	SAPONARA	1.700.000,00	in fase di progettazione
ME216	B	ME	SAPONARA	1.570.000,00	in fase di progettazione
ME217	B	ME	VILLAFRANCA TIRRENA	1.400.000,00	in fase di progettazione
ME219	A	ME	NASO	3.841.010,50	in fase di progettazione
PA135	B	PA	ALTOFONTE	789.270,00	lavori ultimati
PA137_1	A	PA	BLUFI	1.310.000,00	lavori ultimati
PA137_2	A	PA	BLUFI	690.000,00	lavori ultimati
PA138	B	PA	CALTAVUTURO	793.690,51	lavori ultimati
PA139	B	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	1.500.000,00	lavori ultimati
PA140	B*	PA	CAMPOREALE	1.500.000,00	in fase di progettazione
PA141	A	PA	CAPACI	1.200.000,00	lavori ultimati
PA142	A	PA	CARINI	1.000.000,00	lavori ultimati
PA143	A	PA	CASTELBUONO	2.000.000,00	lavori in esecuzione
PA144	B	PA	CASTRONUOVO DI SICILIA	1.600.000,00	lavori ultimati
PA145	B	PA	CASTRONUOVO DI SICILIA	1.344.000,00	lavori in esecuzione
PA146	B	PA	GERACI SICULO	1.057.000,00	lavori ultimati
PA147	B	PA	MARINEO	2.257.528,00	lavori ultimati
PA148	B*	PA	MEZZOJUSO	2.144.000,00	in procedura di gara
PA149	A	PA	MISILMERI	2.000.000,00	lavori ultimati
PA150	B	PA	PALERMO	4.300.000,00	lavori in esecuzione
PA151	B*	PA	PARTINICO	950.000,00	in fase di progettazione
PA152	B*	PA	PETRALIA SOTTANA	1.200.000,00	lavori ultimati
PA153	B	PA	POLIZZI GENEROSA	908.469,01	lavori ultimati
PA154	A	PA	POLIZZI GENEROSA	500.000,00	lavori ultimati
PA155	B	PA	TERMINI IMERESE	198.196,38	lavori ultimati
PA156	A	PA	TERMINI IMERESE	800.000,00	lavori ultimati
PA157	A	PA	VALLEDOLMO	500.000,00	lavori ultimati
PA179	A	PA	ALTOFONTE	600.000,00	lavori ultimati
PA180	A	PA	CEFALU ´	490.000,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
PA181	A	PA	CEFALU ´	0,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
PA182	B	PA	CORLEONE	1.578.183,23	lavori ultimati
PA183	B	PA	POLLINA	800.000,00	lavori in esecuzione

<b>CODICE</b>	<b>Lett</b>	<b>Prov</b>	<b>COMUNE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>fase</b>
PA203	A	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	800.000,00	in fase di progettazione
PA204	A	PA	PETRALIA SOTTANA	460.000,00	in fase di progettazione
PA205	A	PA	VALLEDOLMO	800.000,00	in fase di progettazione
PA220	A	PA	PRIZZI	2.500.000,00	in fase di progettazione
RG158_1	B*	RG	MODICA	2.000.000,00	in procedura di gara
RG158_2	B	RG	MODICA	1.000.000,00	in procedura di gara
RG160	B	RG	RAGUSA	1.674.051,32	lavori in esecuzione
SR161	A	SR	AVOLA	600.000,00	lavori ultimati
SR162	A	SR	CARLENTINI	800.000,00	lavori ultimati
SR164	B	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	719.000,00	lavori in esecuzione
SR166	B*	SR	ROSOLINI	1.500.000,00	in fase di progettazione
SR167	A	SR	ROSOLINI	1.500.000,00	lavori ultimati
SR177	A	SR	CARLENTINI	2.500.000,00	lavori in esecuzione
SR184	A	SR	AVOLA	2.000.000,00	lavori in esecuzione
SR185	A	SR	BUSCEMI	200.000,00	lavori ultimati
SR186	A	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	600.000,00	lavori ultimati
SR187	A	SR	ROSOLINI	1.800.000,00	lavori in esecuzione
SR188	A	SR	SIRACUSA	3.466.002,61	lavori in esecuzione
TP168	A	TP	ERICE	500.000,00	lavori ultimati
TP169	A	TP	MAZARA DEL VALLO	800.000,00	lavori ultimati
TP170	B	TP	POGGIOREALE	1.500.000,00	lavori ultimati
TP171	B	TP	SALEMI	1.650.000,00	lavori ultimati
TP172	A	TP	SAN VITO LO CAPO	450.000,00	lavori ultimati
TP173	B	TP	TRAPANI	4.000.000,00	lavori in esecuzione
TP189	A	TP	MAZARA DEL VALLO	2.000.000,00	in fase di progettazione
TP190	B*	TP	SAN VITO LO CAPO	1.350.000,00	in fase di progettazione
	A		<i>ECONOMIE</i>	<i>613.104,30</i>	
<b>220</b>			<b>TOTALE</b>	<b>350.588.362,76</b>	

**Sezione programmatica**

<b>CODICE</b>	<b>lett</b>	<b>Prov</b>	<b>COMUNE</b>	<b>IMPORTO</b>	
ME051	A	ME	ALI' TERME	3.000.000,00	da finanziare con eventuali economie

**INTERVENTI IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO (LETTERA A)**
**Sezione attuativa**

<b>CODICE</b>	<b>Let</b>	<b>Prov</b>	<b>COMUNE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>fase</b>
AG001	A	AG	AGRIGENTO	2.000.000,00	lavori in esecuzione
AG006	A	AG	FAVARA	1.500.000,00	lavori ultimati
AG007	A	AG	LUCCA SICULA	1.500.000,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
AG010	A	AG	RIBERA	2.600.000,00	lavori in esecuzione
AG011	A	AG	RIBERA	939.021,00	lavori ultimati
AG015	A	AG	SCIACCA	800.000,00	in procedura di gara
AG195	A	AG	CASTELTERMINI	800.000,00	in fase di progettazione
AG196	A	AG	ARAGONA	700.000,00	in fase di progettazione
AG197	A	AG	PALMA DI MONTECHIARO	700.000,00	in fase di progettazione
AG218	A	AG	CAMMARATA	2.380.000,00	in fase di progettazione
CL198	A	CL	MUSSOMELI	700.000,00	in fase di progettazione
CT022	A	CT	BRONTE	1.092.500,00	lavori in esecuzione
CT023	A	CT	CALATABIANO	250.000,00	lavori ultimati
CT024	A	CT	CASTEL DI IUDICA	3.000.000,00	lavori ultimati
CT025	A	CT	GIARRE	1.000.000,00	lavori ultimati
CT026	A	CT	GIARRE	1.000.000,00	lavori ultimati
CT027	A	CT	GRAMMICHELE	700.000,00	lavori ultimati
CT031	A	CT	MISTERBIANCO	500.000,00	lavori ultimati
CT033	A	CT	PIEDIMONTE ETNEO	500.000,00	lavori ultimati
CT034	A	CT	RADDUSA	2.000.000,00	lavori in esecuzione
CT036	A	CT	RAMACCA	1.200.000,00	lavori ultimati
CT037	A	CT	RANDAZZO	960.000,00	lavori ultimati
CT199	A	CT	RANDAZZO	700.000,00	in fase di progettazione
EN042	A	EN	CENTURIFE	770.000,00	lavori ultimati
EN047	A	EN	REGALBUTO	1.500.000,00	lavori ultimati
EN175	A	EN	BARRAFRANCA	1.500.000,00	lavori in esecuzione
EN200	A	EN	TROINA	1.240.000,00	in fase di progettazione
ME049	A	ME	ALCARA LI FUSI	1.200.000,00	lavori ultimati
ME052	A	ME	BASICO ´	1.300.000,00	lavori ultimati
ME053	A	ME	BROLO	3.630.000,00	lavori ultimati
ME056	A	ME	CAPRI LEONE	550.000,00	lavori ultimati
ME057	A	ME	CAPRI LEONE	600.000,00	lavori ultimati
ME058	A	ME	CARONIA	3.653.083,31	lavori ultimati
ME059	A	ME	CASALVECCHIO SICULO	1.363.853,00	lavori ultimati
ME061	A	ME	CASTEL DI LUCIO	1.500.000,00	lavori ultimati
ME062	A	ME	CASTELL ´ UMBERTO	300.000,00	lavori in esecuzione
ME063	A	ME	CASTROREALE	1.650.000,00	lavori in esecuzione
ME066	A	ME	FICARRA	1.450.000,00	lavori ultimati
ME071	A	ME	FRAZZANO ´	300.000,00	lavori ultimati
ME072	A	ME	GALATI MAMERTINO	500.000,00	lavori ultimati
ME073	A	ME	GALATI MAMERTINO	1.100.000,00	lavori ultimati
ME078	A	ME	LETOJANNI	2.000.000,00	lavori in esecuzione
ME079	A	ME	LIBRIZZI	2.150.000,00	lavori in esecuzione
ME081	A	ME	LIBRIZZI	500.000,00	lavori ultimati
ME087	A	ME	MESSINA	24.000.000,00	lavori ultimati
ME088	A	ME	MESSINA	3.000.000,00	lavori ultimati
ME089_1	A	ME	MESSINA	900.000,00	lavori ultimati
ME089_2	A	ME	MESSINA	1.390.000,00	lavori in esecuzione
ME089_3	A	ME	MESSINA	510.000,00	lavori ultimati
ME089_4	A	ME	MESSINA	650.000,00	lavori in esecuzione
ME089_5	A	ME	MESSINA	550.000,00	lavori in esecuzione
ME091	A	ME	MIRTO	2.500.000,00	lavori ultimati
ME092	A	ME	MISTRETTA	800.000,00	lavori ultimati
ME095	A	ME	NASO	1.650.000,00	lavori in esecuzione
ME099	A	ME	PIRAINO	1.100.000,00	lavori in esecuzione
ME107	A	ME	SAN FRATELLO	18.000.000,00	lavori ultimati
ME109	A	ME	SAN PIER NICETO	600.000,00	lavori ultimati
ME113	A	ME	SANTA MARINA SALINA	2.000.000,00	in fase di progettazione
ME115_1	A	ME	SANT ´ ANGELO DI BROLO	3.000.000,00	lavori ultimati
ME115_2	A	ME	SANT ´ ANGELO DI BROLO	2.930.000,00	lavori ultimati
ME115_3	A	ME	SANT ´ ANGELO DI BROLO	2.070.000,00	lavori ultimati
ME119	A	ME	SINAGRA	3.000.000,00	lavori in esecuzione

CODICE	Let	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
ME120	A	ME	SINAGRA	1.000.000,00	in fase di progettazione
ME121	A	ME	SINAGRA	2.500.000,00	lavori in esecuzione
ME125	A	ME	TORTORICI	1.500.000,00	lavori ultimati
ME126	A	ME	TORTORICI	500.000,00	lavori ultimati
ME128	A	ME	TORTORICI	500.000,00	lavori ultimati
ME132	A	ME	UCRIA	2.500.000,00	lavori ultimati
ME178	A	ME	CAPRI LEONE	1.000.000,00	lavori ultimati
ME194	A	ME	BROLO	600.000,00	lavori in esecuzione
ME201	A	ME	LIPARI	2.400.000,00	in fase di progettazione
ME202	A	ME	SANTA MARINA SALINA	700.000,00	in fase di progettazione
ME219	A	ME	NASO	3.841.010,50	in fase di progettazione
PA137_1	A	PA	BLUFI	1.310.000,00	lavori ultimati
PA137_2	A	PA	BLUFI	690.000,00	lavori ultimati
PA141	A	PA	CAPACI	1.200.000,00	lavori ultimati
PA142	A	PA	CARINI	1.000.000,00	lavori ultimati
PA143	A	PA	CASTELBUONO	2.000.000,00	lavori in esecuzione
PA149	A	PA	MISILMERI	2.000.000,00	lavori ultimati
PA154	A	PA	POLIZZI GENEROSA	500.000,00	lavori ultimati
PA156	A	PA	TERMINI IMERESE	800.000,00	lavori ultimati
PA157	A	PA	VALLEDOLMO	500.000,00	lavori ultimati
PA179	A	PA	ALTOFONTE	600.000,00	lavori ultimati
PA180	A	PA	CEFALU'	490.000,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
PA181	A	PA	CEFALU'	0,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
PA203	A	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	800.000,00	in fase di progettazione
PA204	A	PA	PETRALIA SOTTANA	460.000,00	in fase di progettazione
PA205	A	PA	VALLEDOLMO	800.000,00	in fase di progettazione
PA220	A	PA	PRIZZI	2.500.000,00	in fase di progettazione
SR161	A	SR	AVOLA	600.000,00	lavori ultimati
SR162	A	SR	CARLENTINI	800.000,00	lavori ultimati
SR167	A	SR	ROSOLINI	1.500.000,00	lavori ultimati
SR177	A	SR	CARLENTINI	2.500.000,00	lavori in esecuzione
SR184	A	SR	AVOLA	2.000.000,00	lavori in esecuzione
SR185	A	SR	BUSCEMI	200.000,00	lavori ultimati
SR186	A	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	600.000,00	lavori ultimati
SR187	A	SR	ROSOLINI	1.800.000,00	lavori in esecuzione
SR188	A	SR	SIRACUSA	3.466.002,61	lavori in esecuzione
TP168	A	TP	ERICE	500.000,00	lavori ultimati
TP169	A	TP	MAZARA DEL VALLO	800.000,00	lavori ultimati
TP172	A	TP	SAN VITO LO CAPO	450.000,00	lavori ultimati
TP189	A	TP	MAZARA DEL VALLO	2.000.000,00	in fase di progettazione
	A		ECONOMIE	613.104,30	

102

175.448.574,72

ELENCO INTERVENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE  
IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO (LETTERA A)

Sezione attuativa

CODICE	Letto	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
AG195	A	AG	CASTELTERMINI	800.000,00	in fase di progettazione
AG196	A	AG	ARAGONA	700.000,00	in fase di progettazione
AG197	A	AG	PALMA DI MONTECHIARO	700.000,00	in fase di progettazione
AG218	A	AG	CAMMARATA	2.380.000,00	in fase di progettazione
CL198	A	CL	MUSSOMELI	700.000,00	in fase di progettazione
CT199	A	CT	RANDAZZO	700.000,00	in fase di progettazione
EN200	A	EN	TROINA	1.240.000,00	in fase di progettazione
ME113	A	ME	SANTA MARINA SALINA	2.000.000,00	in fase di progettazione
ME120	A	ME	SINAGRA	1.000.000,00	in fase di progettazione
ME201	A	ME	LIPARI	2.400.000,00	in fase di progettazione
ME202	A	ME	SANTA MARINA SALINA	700.000,00	in fase di progettazione
ME219	A	ME	NASO	3.841.010,50	in fase di progettazione
PA203	A	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	800.000,00	in fase di progettazione
PA204	A	PA	PETRALIA SOTTANA	460.000,00	in fase di progettazione
PA205	A	PA	VALLEDOLMO	800.000,00	in fase di progettazione
PA220	A	PA	PRIZZI	2.500.000,00	in fase di progettazione
TP189	A	TP	MAZARA DEL VALLO	2.000.000,00	in fase di progettazione
<b>17</b>				<b>23.721.010,50</b>	

ELENCO INTERVENTI IN PROCEDURA DI GARA  
IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO (LETTERA A)

Sezione attuativa

CODICE	Letto	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
AG015	A	AG	SCIACCA	800.000,00	in procedura di gara
<b>1</b>				<b>800.000,00</b>	

ELENCO INTERVENTI CON LAVORI IN ESECUZIONE  
IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO (LETTERA A)

Sezione attuativa

CODICE	Letto	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
AG001	A	AG	AGRIGENTO	2.000.000,00	lavori in esecuzione
AG010	A	AG	RIBERA	2.600.000,00	lavori in esecuzione
CT022	A	CT	BRONTE	1.092.500,00	lavori in esecuzione
CT034	A	CT	RADDUSA	2.000.000,00	lavori in esecuzione
EN175	A	EN	BARRAFRANCA	1.500.000,00	lavori in esecuzione
ME062	A	ME	CASTELL' UMBERTO	300.000,00	lavori in esecuzione
ME063	A	ME	CASTROREALE	1.650.000,00	lavori in esecuzione
ME078	A	ME	LETOJANNI	2.000.000,00	lavori in esecuzione
ME079	A	ME	LIBRIZZI	2.150.000,00	lavori in esecuzione
ME089_2	A	ME	MESSINA	1.390.000,00	lavori in esecuzione
ME089_4	A	ME	MESSINA	650.000,00	lavori in esecuzione
ME089_5	A	ME	MESSINA	550.000,00	lavori in esecuzione
ME095	A	ME	NASO	1.650.000,00	lavori in esecuzione
ME099	A	ME	PIRAINO	1.100.000,00	lavori in esecuzione
ME119	A	ME	SINAGRA	3.000.000,00	lavori in esecuzione
ME121	A	ME	SINAGRA	2.500.000,00	lavori in esecuzione
ME194	A	ME	BROLO	600.000,00	lavori in esecuzione
PA143	A	PA	CASTELBUONO	2.000.000,00	lavori in esecuzione
SR177	A	SR	CARLENTINI	2.500.000,00	lavori in esecuzione
SR184	A	SR	AVOLA	2.000.000,00	lavori in esecuzione
SR187	A	SR	ROSOLINI	1.800.000,00	lavori in esecuzione
SR188	A	SR	SIRACUSA	3.466.002,61	lavori in esecuzione
<b>22</b>				<b>38.498.502,61</b>	

ELENCO INTERVENTI CON LAVORI ULTIMATI  
IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO (LETTERA A)

Sezione attuativa

CODICE	Let	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
AG006	A	AG	FAVARA	1.500.000,00	lavori ultimati
AG007	A	AG	LUCCA SICULA	1.500.000,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
AG011	A	AG	RIBERA	939.021,00	lavori ultimati
CT023	A	CT	CALATABIANO	250.000,00	lavori ultimati
CT024	A	CT	CASTEL DI IUDICA	3.000.000,00	lavori ultimati
CT025	A	CT	GIARRE	1.000.000,00	lavori ultimati
CT026	A	CT	GIARRE	1.000.000,00	lavori ultimati
CT027	A	CT	GRAMMICHELE	700.000,00	lavori ultimati
CT031	A	CT	MISTERBIANCO	500.000,00	lavori ultimati
CT033	A	CT	PIEDIMONTE ETNEO	500.000,00	lavori ultimati
CT036	A	CT	RAMACCA	1.200.000,00	lavori ultimati
CT037	A	CT	RANDAZZO	960.000,00	lavori ultimati
EN042	A	EN	CENTURIFE	770.000,00	lavori ultimati
EN047	A	EN	REGALBUTO	1.500.000,00	lavori ultimati
ME049	A	ME	ALCARA LI FUSI	1.200.000,00	lavori ultimati
ME052	A	ME	BASICO'	1.300.000,00	lavori ultimati
ME053	A	ME	BROLO	3.630.000,00	lavori ultimati
ME056	A	ME	CAPRI LEONE	550.000,00	lavori ultimati
ME057	A	ME	CAPRI LEONE	600.000,00	lavori ultimati
ME058	A	ME	CARONIA	3.653.083,31	lavori ultimati
ME059	A	ME	CASALVECCHIO SICULO	1.363.853,00	lavori ultimati
ME061	A	ME	CASTEL DI LUCIO	1.500.000,00	lavori ultimati
ME066	A	ME	FIGARRA	1.450.000,00	lavori ultimati
ME071	A	ME	FRAZZANO'	300.000,00	lavori ultimati
ME072	A	ME	GALATI MAMERTINO	500.000,00	lavori ultimati
ME073	A	ME	GALATI MAMERTINO	1.100.000,00	lavori ultimati
ME081	A	ME	LIBRIZZI	500.000,00	lavori ultimati
ME087	A	ME	MESSINA	24.000.000,00	lavori ultimati
ME088	A	ME	MESSINA	3.000.000,00	lavori ultimati
ME089_1	A	ME	MESSINA	900.000,00	lavori ultimati
ME089_3	A	ME	MESSINA	510.000,00	lavori ultimati
ME091	A	ME	MIRTO	2.500.000,00	lavori ultimati
ME092	A	ME	MISTRETTA	800.000,00	lavori ultimati
ME107	A	ME	SAN FRATELLO	18.000.000,00	lavori ultimati
ME109	A	ME	SAN PIER NICETO	600.000,00	lavori ultimati
ME115_1	A	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	3.000.000,00	lavori ultimati
ME115_2	A	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	2.930.000,00	lavori ultimati
ME115_3	A	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	2.070.000,00	lavori ultimati
ME125	A	ME	TORTORICI	1.500.000,00	lavori ultimati
ME126	A	ME	TORTORICI	500.000,00	lavori ultimati
ME128	A	ME	TORTORICI	500.000,00	lavori ultimati
ME132	A	ME	UCRIA	2.500.000,00	lavori ultimati
ME178	A	ME	CAPRI LEONE	1.000.000,00	lavori ultimati
PA137_1	A	PA	BLUFI	1.310.000,00	lavori ultimati
PA137_2	A	PA	BLUFI	690.000,00	lavori ultimati
PA141	A	PA	CAPACI	1.200.000,00	lavori ultimati
PA142	A	PA	CARINI	1.000.000,00	lavori ultimati
PA149	A	PA	MISILMERI	2.000.000,00	lavori ultimati
PA154	A	PA	POLIZZI GENEROSA	500.000,00	lavori ultimati
PA156	A	PA	TERMINI IMERESE	800.000,00	lavori ultimati
PA157	A	PA	VALLEDOLMO	500.000,00	lavori ultimati
PA179	A	PA	ALTOFONTE	600.000,00	lavori ultimati
PA180	A	PA	CEFALU'	490.000,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
PA181	A	PA	CEFALU'	0,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
SR161	A	SR	AVOLA	600.000,00	lavori ultimati
SR162	A	SR	CARLENTINI	800.000,00	lavori ultimati
SR167	A	SR	ROSOLINI	1.500.000,00	lavori ultimati
SR185	A	SR	BUSCEMI	200.000,00	lavori ultimati
SR186	A	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	600.000,00	lavori ultimati
TP168	A	TP	ERICE	500.000,00	lavori ultimati
TP169	A	TP	MAZARA DEL VALLO	800.000,00	lavori ultimati
TP172	A	TP	SAN VITO LO CAPO	450.000,00	lavori ultimati
CODICE	Let	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase

## ELENCO INTERVENTI

## IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO (LETTERA B\*)

## Sezione attuativa

CODICE	Let	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
AG004	B*	AG	CATTOLICA ERACLEA	1.480.000,00	in fase di progettazione
AG014	B*	AG	SANTO STEFANO QUISQUINA	2.272.997,00	in fase di progettazione
AG174	B*	AG	CATTOLICA ERACLEA	1.170.000,00	in fase di progettazione
CL017	B*	CL	BUTERA	1.200.000,00	in fase di progettazione
CL018	B*	CL	BUTERA	800.000,00	in fase di progettazione
CL019	B*	CL	CALTANISSETTA	4.160.000,00	lavori in esecuzione
CT028	B*	CT	LICODIA EUBEA	880.000,00	lavori in esecuzione
CT038	B*	CT	SANTA VENERINA	1.000.000,00	in procedura di gara
CT039	B*	CT	SANT'AGATA LI BATTIATI	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME065	B*	ME	FICARRA	1.028.981,00	lavori ultimati
ME068	B*	ME	FORZA D'AGRO	414.163,28	in fase di progettazione
ME105	B*	ME	ROMETTA	1.000.000,00	in procedura di gara
ME106	B*	ME	SANT'ALESSIO SICULO	5.000.000,00	lavori in esecuzione
ME124	B*	ME	TERME VIGLIATORE	3.823.875,00	lavori ultimati
ME127	B*	ME	TORTORICI	2.300.000,00	in fase di progettazione
ME130	B*	ME	TUSA	1.500.000,00	lavori ultimati
PA140	B*	PA	CAMPOREALE	1.500.000,00	in fase di progettazione
PA148	B*	PA	MEZZOJUSO	2.144.000,00	in procedura di gara
PA151	B*	PA	PARTINICO	950.000,00	in fase di progettazione
PA152	B*	PA	PETRALIA SOTTANA	1.200.000,00	lavori ultimati
RG158_1	B*	RG	MODICA	2.000.000,00	in procedura di gara
SR166	B*	SR	ROSOLINI	1.500.000,00	in fase di progettazione
TP190	B*	TP	SAN VITO LO CAPO	1.350.000,00	in fase di progettazione

23

39.674.016,28

**ELENCO INTERVENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE  
IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO (LETTERA B\*)**

**Sezione attuativa**

CODICE	Letto	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
AG004	B*	AG	CATTOLICA ERACLEA	1.480.000,00	in fase di progettazione
AG014	B*	AG	SANTO STEFANO QUISQUINA	2.272.997,00	in fase di progettazione
AG174	B*	AG	CATTOLICA ERACLEA	1.170.000,00	in fase di progettazione
CL017	B*	CL	BUTERA	1.200.000,00	in fase di progettazione
CL018	B*	CL	BUTERA	800.000,00	in fase di progettazione
ME068	B*	ME	FORZA D'AGRO'	414.163,28	in fase di progettazione
ME127	B*	ME	TORTORICI	2.300.000,00	in fase di progettazione
PA140	B*	PA	CAMPOREALE	1.500.000,00	in fase di progettazione
PA151	B*	PA	PARTINICO	950.000,00	in fase di progettazione
SR166	B*	SR	ROSOLINI	1.500.000,00	in fase di progettazione
TP190	B*	TP	SAN VITO LO CAPO	1.350.000,00	in fase di progettazione
<b>11</b>				<b>14.937.160,28</b>	

**ELENCO INTERVENTI IN PROCEDURA DI GARA  
IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO (LETTERA B\*)**

**Sezione attuativa**

CODICE	Letto	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
CT038	B*	CT	SANTA VENERINA	1.000.000,00	in procedura di gara
ME105	B*	ME	ROMETTA	1.000.000,00	in procedura di gara
PA148	B*	PA	MEZZOJUSO	2.144.000,00	in procedura di gara
RG158_1	B*	RG	MODICA	2.000.000,00	in procedura di gara
<b>4</b>				<b>6.144.000,00</b>	

**ELENCO INTERVENTI CON LAVORI IN ESECUZIONE  
IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO (LETTERA B\*)**

**Sezione attuativa**

CODICE	Letto	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
CL019	B*	CL	CALTANISSETTA	4.160.000,00	lavori in esecuzione
CT028	B*	CT	LICODIA EUBEA	880.000,00	lavori in esecuzione
CT039	B*	CT	SANT'AGATA LI BATTIATI	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME106	B*	ME	SANT'ALESSIO SICULO	5.000.000,00	lavori in esecuzione
<b>4</b>				<b>11.040.000,00</b>	

**ELENCO INTERVENTI CON LAVORI ULTIMATI  
IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO (LETTERA B\*)**

**Sezione attuativa**

CODICE	Letto	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
ME065	B*	ME	FICARRA	1.028.981,00	lavori ultimati
ME124	B*	ME	TERME VIGLIATORE	3.823.875,00	lavori ultimati
ME130	B*	ME	TUSA	1.500.000,00	lavori ultimati
PA152	B*	PA	PETRALIA SOTTANA	1.200.000,00	lavori ultimati
<b>4</b>				<b>7.552.856,00</b>	



## INTERVENTI IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO (LETTERA A)

## INTERVENTI IN CAPO AL COMMISSARIO DI GOVERNO BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO (LETTERA B\*)

## Sezione attuativa

CODICE	Let	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
AG001	A	AG	AGRIGENTO	2.000.000,00	lavori in esecuzione
AG004	B*	AG	CATTOLICA ERACLEA	1.480.000,00	in fase di progettazione
AG006	A	AG	FAVARA	1.500.000,00	lavori ultimati
AG007	A	AG	LUCCA SICULA	1.500.000,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
AG010	A	AG	RIBERA	2.600.000,00	lavori in esecuzione
AG011	A	AG	RIBERA	939.021,00	lavori ultimati
AG014	B*	AG	SANTO STEFANO QUISQUINA	2.272.997,00	in fase di progettazione
AG015	A	AG	SCIACCA	800.000,00	in procedura di gara
AG174	B*	AG	CATTOLICA ERACLEA	1.170.000,00	in fase di progettazione
AG195	A	AG	CASTELTERMINI	800.000,00	in fase di progettazione
AG196	A	AG	ARAGONA	700.000,00	in fase di progettazione
AG197	A	AG	PALMA DI MONTECHIARO	700.000,00	in fase di progettazione
AG218	A	AG	CAMMARATA	2.380.000,00	in fase di progettazione
CL017	B*	CL	BUTERA	1.200.000,00	in fase di progettazione
CL018	B*	CL	BUTERA	800.000,00	in fase di progettazione
CL019	B*	CL	CALTANISSETTA	4.160.000,00	lavori in esecuzione
CL198	A	CL	MUSSOMELI	700.000,00	in fase di progettazione
CT022	A	CT	BRONTE	1.092.500,00	lavori in esecuzione
CT023	A	CT	CALATABIANO	250.000,00	lavori ultimati
CT024	A	CT	CASTEL DI IUDICA	3.000.000,00	lavori ultimati
CT025	A	CT	GIARRE	1.000.000,00	lavori ultimati
CT026	A	CT	GIARRE	1.000.000,00	lavori ultimati
CT027	A	CT	GRAMMICHELE	700.000,00	lavori ultimati
CT028	B*	CT	LICODIA EUBEA	880.000,00	lavori in esecuzione
CT031	A	CT	MISTERBIANCO	500.000,00	lavori ultimati
CT033	A	CT	PIEDIMONTE ETNEO	500.000,00	lavori ultimati
CT034	A	CT	RADDUSA	2.000.000,00	lavori in esecuzione
CT036	A	CT	RAMACCA	1.200.000,00	lavori ultimati
CT037	A	CT	RANDAZZO	960.000,00	lavori ultimati
CT038	B*	CT	SANTA VENERINA	1.000.000,00	in procedura di gara
CT039	B*	CT	SANT 'AGATA LI BATTIATI	1.000.000,00	lavori in esecuzione
CT199	A	CT	RANDAZZO	700.000,00	in fase di progettazione
EN042	A	EN	CENTURIFE	770.000,00	lavori ultimati
EN047	A	EN	REGALBUTO	1.500.000,00	lavori ultimati
EN175	A	EN	BARRAFRANCA	1.500.000,00	lavori in esecuzione
EN200	A	EN	TROINA	1.240.000,00	in fase di progettazione
ME049	A	ME	ALCARA LI FUSI	1.200.000,00	lavori ultimati
ME052	A	ME	BASICO '	1.300.000,00	lavori ultimati
ME053	A	ME	BROLO	3.630.000,00	lavori ultimati
ME056	A	ME	CAPRI LEONE	550.000,00	lavori ultimati
ME057	A	ME	CAPRI LEONE	600.000,00	lavori ultimati
ME058	A	ME	CARONIA	3.653.083,31	lavori ultimati
ME059	A	ME	CASALVECCHIO SICULO	1.363.853,00	lavori ultimati
ME061	A	ME	CASTEL DI LUCIO	1.500.000,00	lavori ultimati
ME062	A	ME	CASTELL ' UMBERTO	300.000,00	lavori in esecuzione
ME063	A	ME	CASTROREALE	1.650.000,00	lavori in esecuzione
ME065	B*	ME	FICARRA	1.028.981,00	lavori ultimati
ME066	A	ME	FICARRA	1.450.000,00	lavori ultimati
ME068	B*	ME	FORZA D 'AGRO '	414.163,28	in fase di progettazione
ME071	A	ME	FRAZZANO '	300.000,00	lavori ultimati
ME072	A	ME	GALATI MAMERTINO	500.000,00	lavori ultimati
ME073	A	ME	GALATI MAMERTINO	1.100.000,00	lavori ultimati
ME078	A	ME	LETOJANNI	2.000.000,00	lavori in esecuzione
ME079	A	ME	LIBRIZZI	2.150.000,00	lavori in esecuzione
ME081	A	ME	LIBRIZZI	500.000,00	lavori ultimati
ME087	A	ME	MESSINA	24.000.000,00	lavori ultimati
ME088	A	ME	MESSINA	3.000.000,00	lavori ultimati
ME089_1	A	ME	MESSINA	900.000,00	lavori ultimati
ME089_2	A	ME	MESSINA	1.390.000,00	lavori in esecuzione
ME089_3	A	ME	MESSINA	510.000,00	lavori ultimati
ME089_4	A	ME	MESSINA	650.000,00	lavori in esecuzione
ME089_5	A	ME	MESSINA	550.000,00	lavori in esecuzione

CODICE	Letto	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
ME091	A	ME	MIRTO	2.500.000,00	lavori ultimati
ME092	A	ME	MISTRETTA	800.000,00	lavori ultimati
ME095	A	ME	NASO	1.650.000,00	lavori in esecuzione
ME099	A	ME	PIRAINO	1.100.000,00	lavori in esecuzione
ME105	B*	ME	ROMETTA	1.000.000,00	in procedura di gara
ME106	B*	ME	SANT'ALESSIO SICULO	5.000.000,00	lavori in esecuzione
ME107	A	ME	SAN FRATELLO	18.000.000,00	lavori ultimati
ME109	A	ME	SAN PIER NICETO	600.000,00	lavori ultimati
ME113	A	ME	SANTA MARINA SALINA	2.000.000,00	in fase di progettazione
ME115_1	A	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	3.000.000,00	lavori ultimati
ME115_2	A	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	2.930.000,00	lavori ultimati
ME115_3	A	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	2.070.000,00	lavori ultimati
ME119	A	ME	SINAGRA	3.000.000,00	lavori in esecuzione
ME120	A	ME	SINAGRA	1.000.000,00	in fase di progettazione
ME121	A	ME	SINAGRA	2.500.000,00	lavori in esecuzione
ME124	B*	ME	TERME VIGLIATORE	3.823.875,00	lavori ultimati
ME125	A	ME	TORTORICI	1.500.000,00	lavori ultimati
ME126	A	ME	TORTORICI	500.000,00	lavori ultimati
ME127	B*	ME	TORTORICI	2.300.000,00	in fase di progettazione
ME128	A	ME	TORTORICI	500.000,00	lavori ultimati
ME130	B*	ME	TUSA	1.500.000,00	lavori ultimati
ME132	A	ME	UCRIA	2.500.000,00	lavori ultimati
ME178	A	ME	CAPRI LEONE	1.000.000,00	lavori ultimati
ME194	A	ME	BROLO	600.000,00	lavori in esecuzione
ME201	A	ME	LIPARI	2.400.000,00	in fase di progettazione
ME202	A	ME	SANTA MARINA SALINA	700.000,00	in fase di progettazione
ME219	A	ME	NASO	3.841.010,50	in fase di progettazione
PA137_1	A	PA	BLUFI	1.310.000,00	lavori ultimati
PA137_2	A	PA	BLUFI	690.000,00	lavori ultimati
PA140	B*	PA	CAMPOREALE	1.500.000,00	in fase di progettazione
PA141	A	PA	CAPACI	1.200.000,00	lavori ultimati
PA142	A	PA	CARINI	1.000.000,00	lavori ultimati
PA143	A	PA	CASTELBUONO	2.000.000,00	lavori in esecuzione
PA148	B*	PA	MEZZOJUSO	2.144.000,00	in procedura di gara
PA149	A	PA	MISILMERI	2.000.000,00	lavori ultimati
PA151	B*	PA	PARTINICO	950.000,00	in fase di progettazione
PA152	B*	PA	PETRALIA SOTTANA	1.200.000,00	lavori ultimati
PA154	A	PA	POLIZZI GENEROSA	500.000,00	lavori ultimati
PA156	A	PA	TERMINI IMERESE	800.000,00	lavori ultimati
PA157	A	PA	VALLEDOLMO	500.000,00	lavori ultimati
PA179	A	PA	ALTOFONTE	600.000,00	lavori ultimati
PA180	A	PA	CEFALU'	490.000,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
PA181	A	PA	CEFALU'	0,00	lavori ultimati - monitoraggio post operam
PA203	A	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	800.000,00	in fase di progettazione
PA204	A	PA	PETRALIA SOTTANA	460.000,00	in fase di progettazione
PA205	A	PA	VALLEDOLMO	800.000,00	in fase di progettazione
PA220	A	PA	PRIZZI	2.500.000,00	in fase di progettazione
RG158_1	B*	RG	MODICA	2.000.000,00	in procedura di gara
SR161	A	SR	AVOLA	600.000,00	lavori ultimati
SR162	A	SR	CARLENTINI	800.000,00	lavori ultimati
SR166	B*	SR	ROSOLINI	1.500.000,00	in fase di progettazione
SR167	A	SR	ROSOLINI	1.500.000,00	lavori ultimati
SR177	A	SR	CARLENTINI	2.500.000,00	lavori in esecuzione
SR184	A	SR	AVOLA	2.000.000,00	lavori in esecuzione
SR185	A	SR	BUSCEMI	200.000,00	lavori ultimati
SR186	A	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	600.000,00	lavori ultimati
SR187	A	SR	ROSOLINI	1.800.000,00	lavori in esecuzione
SR188	A	SR	SIRACUSA	3.466.002,61	lavori in esecuzione
TP168	A	TP	ERICE	500.000,00	lavori ultimati
TP169	A	TP	MAZARA DEL VALLO	800.000,00	lavori ultimati
TP172	A	TP	SAN VITO LO CAPO	450.000,00	lavori ultimati
TP189	A	TP	MAZARA DEL VALLO	2.000.000,00	in fase di progettazione
TP190	B*	TP	SAN VITO LO CAPO	1.350.000,00	in fase di progettazione

125

**TOTALE****214.509.486,70**

**ELENCO INTERVENTI  
IN CAPO ALLA REGIONE (LETTERA B)**

**Sezione attuativa**

<b>CODICE</b>	<b>Let</b>	<b>Prov</b>	<b>COMUNE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>fase</b>
AG002	B	AG	CALTABELLOTTA	600.000,00	lavori ultimati
AG003	B	AG	CAMMARATA	1.050.000,00	lavori ultimati
AG005	B	AG	CIANCIANA	855.618,05	lavori ultimati
AG008	B	AG	MONTALLEGRO	1.435.536,03	lavori ultimati
AG009	B	AG	RAVANUSA	996.908,73	lavori ultimati
AG012	B	AG	SAMBUCA DI SICILIA	1.025.000,00	lavori ultimati
AG013	B	AG	SAN GIOVANNI GEMINI	2.474.826,76	lavori ultimati
AG191	B	AG	NARO	1.067.000,00	lavori in esecuzione
AG192	B	AG	PALMA DI MONTECHIARO	1.800.000,00	lavori in esecuzione
CL016	B	CL	ACQUAVIVA PLATANI	986.525,06	lavori ultimati
CT021	B	CT	ACI CATENA	4.500.000,00	in procedura di gara
CT029	B	CT	MANIACE	1.500.000,00	in procedura di gara
CT030	B	CT	MANIACE	1.000.000,00	lavori in esecuzione
CT032	B	CT	MOTTA SANT 'ANASTASIA	1.500.000,00	lavori ultimati
CT035	B	CT	RADDUSA	2.500.000,00	lavori ultimati
CT040	B	CT	TRECASTAGNI	446.849,79	lavori ultimati
CT193	B	CT	SANT 'ALFIO	1.900.000,00	in procedura di gara
EN041	B	EN	BARRAFRANCA	1.608.973,06	lavori in esecuzione
EN043	B	EN	GAGLIANO CASTELFERRATO	1.557.285,46	lavori ultimati
EN045_1	B	EN	LEONFORTE	400.000,00	lavori in esecuzione
EN046	B	EN	PIAZZA ARMERINA	1.130.000,00	lavori in esecuzione
ME048	B	ME	ALCARA LI FUSI	1.880.000,00	lavori ultimati
ME050	B	ME	ALI '	900.000,00	lavori in esecuzione
ME054	B	ME	CAPIZZI	1.192.623,56	lavori ultimati
ME055	B	ME	CAPO D 'ORLANDO	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME060	B	ME	CASTEL DI LUCIO	999.676,87	lavori ultimati
ME064	B	ME	CESARO '	965.547,00	lavori ultimati
ME067	B	ME	FONDACHELLI-FANTINA	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME069	B	ME	FRAZZANO '	1.165.000,00	lavori in esecuzione
ME070	B	ME	FRAZZANO '	2.500.000,00	lavori in esecuzione
ME074	B	ME	GIARDINI-NAXOS	2.200.000,00	lavori in esecuzione
ME075	B	ME	GUALTIERI SICAMINO '	1.651.041,00	lavori in esecuzione
ME076	B	ME	ITALA	1.500.000,00	lavori ultimati
ME077	B	ME	LENI	1.500.000,00	lavori ultimati
ME082	B	ME	LIMINA	1.666.000,00	lavori in esecuzione
ME083	B	ME	LONGI	1.474.985,06	lavori ultimati
ME084	B	ME	MALFA	1.000.000,00	lavori ultimati
ME085	B	ME	MALVAGNA	1.000.000,00	lavori ultimati
ME086	B	ME	MANDANICI	1.149.942,49	lavori ultimati
ME090	B	ME	MILITELLO ROSMARINO	1.500.000,00	lavori in esecuzione
ME093	B	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	1.200.000,00	lavori ultimati
ME094	B	ME	MOTTA CAMASTRA	993.521,35	lavori ultimati
ME096	B	ME	NOVARA DI SICILIA	399.110,40	lavori ultimati
ME097	B	ME	PAGLIARA	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME098	B	ME	PATTI	1.085.544,63	lavori in esecuzione
ME101	B	ME	REITANO	980.000,00	lavori ultimati
ME102	B	ME	ROCCALUMERA	850.000,00	lavori ultimati
ME103	B	ME	ROCCAVALDINA	1.885.000,00	lavori ultimati
ME104	B	ME	ROCCELLA VALDEMONE	875.000,00	lavori ultimati
ME108	B	ME	SAN PIER NICETO	1.550.000,00	lavori in esecuzione
ME110	B	ME	SAN PIERO PATTI	1.850.000,00	lavori in esecuzione
ME111	B	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	1.300.000,00	lavori ultimati
ME112	B	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	1.200.000,00	lavori ultimati
ME114	B	ME	SANT 'AGATA DI MILITELLO	1.710.000,00	lavori ultimati
ME116	B	ME	SAVOCA	1.195.875,88	lavori ultimati
ME117_1	B	ME	SCALETTA ZANCLEA	2.700.000,00	lavori in esecuzione
ME117_2	B	ME	SCALETTA ZANCLEA	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME118	B	ME	SCALETTA ZANCLEA	1.400.000,00	in fase di progettazione
ME122	B	ME	SPADAFORA	1.327.891,32	lavori ultimati
ME123	B	ME	SPADAFORA	1.500.000,00	lavori ultimati
ME129	B	ME	TORTORICI	4.000.000,00	lavori in esecuzione
ME131	B	ME	UCRIA	1.261.000,00	in fase di progettazione

CODICE	Let	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
ME133	B	ME	VALDINA	2.000.000,00	lavori ultimati
ME134	B	ME	VENETICO	1.554.100,81	lavori ultimati
ME176	B	ME	GIARDINI-NAXOS	1.400.000,00	in fase di progettazione
ME206	B	ME	ANTILLO	1.500.000,00	in fase di progettazione
ME207	B	ME	BARCELONA POZZO DI GOTTO	800.000,00	in fase di progettazione
ME208	B	ME	CASTROREALE	800.000,00	in fase di progettazione
ME209	B	ME	CONDRO'	1.200.000,00	in fase di progettazione
ME210	B	ME	MESSINA	1.270.000,00	in fase di progettazione
ME211	B	ME	MILAZZO	1.360.000,00	in fase di progettazione
ME212	B	ME	PACE DEL MELA	1.400.000,00	in fase di progettazione
ME213	B	ME	ROCCAVALDINA	1.000.000,00	in fase di progettazione
ME214	B	ME	RODI' MILICI	1.000.000,00	in fase di progettazione
ME215	B	ME	SAPONARA	1.700.000,00	in fase di progettazione
ME216	B	ME	SAPONARA	1.570.000,00	in fase di progettazione
ME217	B	ME	VILLAFRANCA TIRRENA	1.400.000,00	in fase di progettazione
PA135	B	PA	ALTOFONTE	789.270,00	lavori ultimati
PA138	B	PA	CALTAVUTURO	793.690,51	lavori ultimati
PA139	B	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	1.500.000,00	lavori ultimati
PA144	B	PA	CASTRONUOVO DI SICILIA	1.600.000,00	lavori ultimati
PA145	B	PA	CASTRONUOVO DI SICILIA	1.344.000,00	lavori in esecuzione
PA146	B	PA	GERACI SICULO	1.057.000,00	lavori ultimati
PA147	B	PA	MARINEO	2.257.528,00	lavori ultimati
PA150	B	PA	PALERMO	4.300.000,00	lavori in esecuzione
PA153	B	PA	POLIZZI GENEROSA	908.469,01	lavori ultimati
PA155	B	PA	TERMINI IMERESE	198.196,38	lavori ultimati
PA182	B	PA	CORLEONE	1.578.183,23	lavori ultimati
PA183	B	PA	POLLINA	800.000,00	lavori in esecuzione
RG158_2	B	RG	MODICA	1.000.000,00	in procedura di gara
RG160	B	RG	RAGUSA	1.674.051,32	lavori in esecuzione
SR164	B	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	719.000,00	lavori in esecuzione
TP170	B	TP	POGGIOREALE	1.500.000,00	lavori ultimati
TP171	B	TP	SALEMI	1.650.000,00	lavori ultimati
TP173	B	TP	TRAPANI	4.000.000,00	lavori in esecuzione

95

135.465.771,76

## INTERVENTI IN CAPO ALLA REGIONE IN FASE DI PROGETTAZIONE (LETTERA B)

## Sezione attuativa

CODICE	Lett	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
ME118	B	ME	SCALETTA ZANCLEA	1.400.000,00	in fase di progettazione
ME131	B	ME	UCRIA	1.261.000,00	in fase di progettazione
ME176	B	ME	GIARDINI-NAXOS	1.400.000,00	in fase di progettazione
ME206	B	ME	ANTILLO	1.500.000,00	in fase di progettazione
ME207	B	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	800.000,00	in fase di progettazione
ME208	B	ME	CASTROREALE	800.000,00	in fase di progettazione
ME209	B	ME	CONDRO'	1.200.000,00	in fase di progettazione
ME210	B	ME	MESSINA	1.270.000,00	in fase di progettazione
ME211	B	ME	MILAZZO	1.360.000,00	in fase di progettazione
ME212	B	ME	PACE DEL MELA	1.400.000,00	in fase di progettazione
ME213	B	ME	ROCCAVALDINA	1.000.000,00	in fase di progettazione
ME214	B	ME	RODI' MILICI	1.000.000,00	in fase di progettazione
ME215	B	ME	SAPONARA	1.700.000,00	in fase di progettazione
ME216	B	ME	SAPONARA	1.570.000,00	in fase di progettazione
ME217	B	ME	VILAFRANCA TIRRENA	1.400.000,00	in fase di progettazione
<b>15</b>				<b>19.061.000,00</b>	

## INTERVENTI IN CAPO ALLA REGIONE IN PROCEDURA DI GARA (LETTERA B)

## Sezione attuativa

CODICE	Lett	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
CT021	B	CT	ACI CATENA	4.500.000,00	in procedura di gara
CT029	B	CT	MANIACE	1.500.000,00	in procedura di gara
CT193	B	CT	SANT'ALFIO	1.900.000,00	in procedura di gara
RG158_2	B	RG	MODICA	1.000.000,00	in procedura di gara
<b>4</b>				<b>8.900.000,00</b>	

## INTERVENTI IN CAPO ALLA REGIONE CON LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE (LETTERA B)

## Sezione attuativa

CODICE	Lett	Prov	COMUNE	IMPORTO	fase
AG191	B	AG	NARO	1.067.000,00	lavori in esecuzione
AG192	B	AG	PALMA DI MONTECHIARO	1.800.000,00	lavori in esecuzione
CT030	B	CT	MANIACE	1.000.000,00	lavori in esecuzione
EN041	B	EN	BARRAFRANCA	1.608.973,06	lavori in esecuzione
EN045_1	B	EN	LEONFORTE	400.000,00	lavori in esecuzione
EN046	B	EN	PIAZZA ARMERINA	1.130.000,00	lavori in esecuzione
ME050	B	ME	ALI'	900.000,00	lavori in esecuzione
ME055	B	ME	CAPO D'ORLANDO	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME067	B	ME	FONDACHELLI-FANTINA	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME069	B	ME	FRAZZANO'	1.165.000,00	lavori in esecuzione
ME070	B	ME	FRAZZANO'	2.500.000,00	lavori in esecuzione
ME074	B	ME	GIARDINI-NAXOS	2.200.000,00	lavori in esecuzione
ME075	B	ME	GUALTIERI SICAMINO'	1.651.041,00	lavori in esecuzione
ME082	B	ME	LIMINA	1.666.000,00	lavori in esecuzione
ME090	B	ME	MILITELLO ROSMARINO	1.500.000,00	lavori in esecuzione
ME097	B	ME	PAGLIARA	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME098	B	ME	PATTI	1.085.544,63	lavori in esecuzione
ME108	B	ME	SAN PIER NICETO	1.550.000,00	lavori in esecuzione
ME110	B	ME	SAN PIERO PATTI	1.850.000,00	lavori in esecuzione
ME117_1	B	ME	SCALETTA ZANCLEA	2.700.000,00	lavori in esecuzione
ME117_2	B	ME	SCALETTA ZANCLEA	1.000.000,00	lavori in esecuzione
ME129	B	ME	TORTORICI	4.000.000,00	lavori in esecuzione
PA145	B	PA	CASTRONUOVO DI SICILIA	1.344.000,00	lavori in esecuzione
PA150	B	PA	PALERMO	4.300.000,00	lavori in esecuzione
PA183	B	PA	POLLINA	800.000,00	lavori in esecuzione
RG160	B	RG	RAGUSA	1.674.051,32	lavori in esecuzione
SR164	B	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	719.000,00	lavori in esecuzione
TP173	B	TP	TRAPANI	4.000.000,00	lavori in esecuzione
<b>28</b>				<b>46.610.610,01</b>	

**INTERVENTI IN CAPO ALLA REGIONE CON LAVORI ULTIMATI (LETTERA B)**
**Sezione attuativa**

<b>CODICE</b>	<b>Let</b>	<b>Prov</b>	<b>COMUNE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>fase</b>
AG002	B	AG	CALTABELLOTTA	600.000,00	lavori ultimati
AG003	B	AG	CAMMARATA	1.050.000,00	lavori ultimati
AG005	B	AG	CIANCIANA	855.618,05	lavori ultimati
AG008	B	AG	MONTALLEGRO	1.435.536,03	lavori ultimati
AG009	B	AG	RAVANUSA	996.908,73	lavori ultimati
AG012	B	AG	SAMBUCA DI SICILIA	1.025.000,00	lavori ultimati
AG013	B	AG	SAN GIOVANNI GEMINI	2.474.826,76	lavori ultimati
CL016	B	CL	ACQUAVIVA PLATANI	986.525,06	lavori ultimati
CT032	B	CT	MOTTA SANT'ANASTASIA	1.500.000,00	lavori ultimati
CT035	B	CT	RADDUSA	2.500.000,00	lavori ultimati
CT040	B	CT	TRECASTAGNI	446.849,79	lavori ultimati
EN043	B	EN	GAGLIANO CASTELFERRATO	1.557.285,46	lavori ultimati
ME048	B	ME	ALCARA LI FUSI	1.880.000,00	lavori ultimati
ME054	B	ME	CAPIZZI	1.192.623,56	lavori ultimati
ME060	B	ME	CASTEL DI LUCIO	999.676,87	lavori ultimati
ME064	B	ME	CESARO'	965.547,00	lavori ultimati
ME076	B	ME	ITALA	1.500.000,00	lavori ultimati
ME077	B	ME	LENI	1.500.000,00	lavori ultimati
ME083	B	ME	LONGI	1.474.985,06	lavori ultimati
ME084	B	ME	MALFA	1.000.000,00	lavori ultimati
ME085	B	ME	MALVAGNA	1.000.000,00	lavori ultimati
ME086	B	ME	MANDANICI	1.149.942,49	lavori ultimati
ME093	B	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	1.200.000,00	lavori ultimati
ME094	B	ME	MOTTA CAMASTRA	993.521,35	lavori ultimati
ME096	B	ME	NOVARA DI SICILIA	399.110,40	lavori ultimati
ME101	B	ME	REITANO	980.000,00	lavori ultimati
ME102	B	ME	ROCCALUMERA	850.000,00	lavori ultimati
ME103	B	ME	ROCCAVALDINA	1.885.000,00	lavori ultimati
ME104	B	ME	ROCCELLA VALDEMONTE	875.000,00	lavori ultimati
ME111	B	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	1.300.000,00	lavori ultimati
ME112	B	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	1.200.000,00	lavori ultimati
ME114	B	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	1.710.000,00	lavori ultimati
ME116	B	ME	SAVOCA	1.195.875,88	lavori ultimati
ME122	B	ME	SPADAFORA	1.327.891,32	lavori ultimati
ME123	B	ME	SPADAFORA	1.500.000,00	lavori ultimati
ME133	B	ME	VALDINA	2.000.000,00	lavori ultimati
ME134	B	ME	VENETICO	1.554.100,81	lavori ultimati
PA135	B	PA	ALTOFORTE	789.270,00	lavori ultimati
PA138	B	PA	CALTAVUTURO	793.690,51	lavori ultimati
PA139	B	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	1.500.000,00	lavori ultimati
PA144	B	PA	CASTRONUOVO DI SICILIA	1.600.000,00	lavori ultimati
PA146	B	PA	GERACI SICULO	1.057.000,00	lavori ultimati
PA147	B	PA	MARINEO	2.257.528,00	lavori ultimati
PA153	B	PA	POLIZZI GENEROSA	908.469,01	lavori ultimati
PA155	B	PA	TERMINI IMERESE	198.196,38	lavori ultimati
PA182	B	PA	CORLEONE	1.578.183,23	lavori ultimati
TP170	B	TP	POGGIOREALE	1.500.000,00	lavori ultimati
TP171	B	TP	SALEMI	1.650.000,00	lavori ultimati

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*  
*Assessorato Regionale*  
*del Territorio e dell'Ambiente*

*Ufficio di gabinetto*

Repubblica Italiana  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario Delegato  
Mitigazione Rischio Idrogeologico in Sicilia  
Via Costantino Nigra, 5 - 90141 Palermo  
Prot. 2904 del 16/5 Ass. S.A.

PROT. N. 3368/6AB

del 25 MAG. 2015

Al Dirigente Generale  
A.R.T.A. - Dipartimento regionale dell'Ambiente  
Via Ugo La Malfa, 169  
PALERMO  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Struttura commissariale per la  
Mitigazione del Rischio Idrogeologico  
Via Costantino Nigra, 5  
PALERMO  
→  
[postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it](mailto:postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it)

**OGGETTO:** Trasmissione III Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la regione Siciliana finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia del III Atto integrativo di cui in oggetto, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193, che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle integrazioni e variazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo già precedentemente trasmessi da questo Ufficio di gabinetto.

Si chiede, stante l'interesse pubblico che riveste la materia, di programmare con sollecitudine ogni azione utile all'avvio delle procedure tecnico amministrative necessarie per l'attuazione dei suddetti interventi.

Il Capo di Gabinetto  
(dott. Carmelo FRITTITTA)

*Carmelo Frittitta*



4.6.15 S.A.

*[Handwritten signature]*

*[Small handwritten mark]*





Roma, .....

*Ministero dell' Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL  
TERRITORIO E DELLE ACQUE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE...

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio  
e delle Acque

*Prot. n. H:*

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0004746/STA del 15/04/2015

Al Presidente della Regione Siciliana  
Piazza Indipendenza n. 31  
90129 PALERMO

**OGGETTO:** Terzo Atto integrativo all'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico -

Si comunica che il Decreto n. 0000006/STA del 19.02.2015 con il quale è stato approvato il Terzo Atto integrativo all'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana indicato in oggetto, di cui si allega copia conforme, è stato registrato alla Corte dei conti il 25.03.2015, reg. 1, f.1193.

IL DIRIGENTE  
(Dr.ssa Maddalena Mattel Gentili)



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO  
E DELLE ACQUE**

Prot. n. **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

**DEC STA - REGISTRAZIONE**  
Prot. 0000006/STA del 19/02/2015

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l' articolo 2, comma 240;

**VISTA** la legge di stabilità n. 13/12/2010 n. 220;

**VISTA** la legge 13.12.2010 n. 221 relativa al bilancio di previsione 2011-2013;

**VISTO** il Regolamento del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DPCM 10 luglio 2014, n. 142;

**VISTA** la Direttiva generale sull' attività amministrativa e sulla gestione per il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l' anno 2014 di cui al Decreto Ministeriale n. 49 del 31/01/2014;

**VISTO** l' Accordo di Programma tra il Ministero dell' Ambiente e la Regione Sicilia, sottoscritto il 30 marzo 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 03/05/2010, Reg. n. 4, Fog. 297, finalizzato all' individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sicilia, con il quale sono stati stanziati complessivamente € 304.337.176,92 di cui € 152.692.572,11 a valere sulle risorse statali e € 151.644.604,81 a valere sulle risorse regionali;

**VISTO** l' Atto integrativo all' Accordo di Programma 30 marzo 2010 sopraccitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011, registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011, Reg. 14, Fog. 104, con il quale sono stati ulteriormente stanziati complessivi € 21.251.185,84, di cui € 12.756.002,61 a valere sulle risorse statali e € 8.495.183,23 a valere sulle risorse regionali;

**VISTA** la deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012, con la quale per gli 11 interventi a valere sulle risorse statali inseriti nel citato Atto integrativo all' Accordo di programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 03/05/2011, nonché identificati nella delibera stessa, è stata assegnata la somma di € 12.756.002,61 di cui € 1.153.004,80 di quota statale e € 11.602.997,81 di quota regionale;

**VISTO** il secondo Atto integrativo all' Accordo di Programma 30 marzo 2010 sopraccitato, stipulato tra il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014, registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014, Reg. 1, Fog. 4854, con il quale sono stati ulteriormente stanziati complessivi € 25.000.000,00 di cui € 10.000.000,00 a valere sulle risorse statali e € 15.000.000,00 a valere sulle risorse regionali;

**VISTI** i verbali delle riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo (Comitato) del 21 ottobre 2010, 24 febbraio 2011, 24 marzo 2011, 15 settembre 2011, 18 maggio 2012, 15 febbraio 2013, 23 settembre 2013, 6 giugno 2014 e 6 ottobre 2014;

**CONSIDERATO** che nelle sopra citate riunioni del Comitato è stata concordata la correzione di alcuni errori materiali, la rimodulazione, la revoca e la riprogrammazione di vari interventi a valere sia sul finanziamento statale che sul finanziamento regionale, l'inserimento di una parte programmatica e l'aggiornamento di alcuni codici ai fini della loro compatibilità con il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS);

**VISTO** l'art. 1 comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede, tra l'altro, che al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare verifica la compatibilità degli Accordi di programma e dei connessi crono programmi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi e propone alle Regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 4563/YRI dell'11 febbraio 2014, poi integrata con note prot.8954/TRI del 26 marzo 2014 e prot. 11232/TRI del 18 aprile 2014, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in attuazione di quanto disposto dalla legge sopra citata, in esito ad una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi compresi in Accordo, ha trasmesso alla Regione Siciliana una proposta di aggiornamento dell'Accordo sottoscritto;

**VISTO** il verbale della riunione del Comitato del 18 maggio 2012, nel corso del quale l'intervento con codice ME051A/10 in Comune di Ali Terme (ME), "Interventi urgenti di consolidamento centro abitato", finanziato per un importo pari ad € 900.000,00, stanti i maggiori oneri resisi necessari, è stato rimodulato in complessivi € 1.321.010,50;

**VISTA** la nota dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato prot. n. 2017 del 28 aprile 2014, firmata congiuntamente dal Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con la quale si comunica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, che per quanto riguarda gli adempimenti di cui al comma 111, art. 1, della legge 147/2013, in riferimento alla necessità di appaltare i lavori o comunque pubblicare il bando di gara degli interventi entro il 31 dicembre 2014, esistono criticità tali da non potere garantire Obblighi giuridicamente vincolanti entro il termine previsto in merito ai seguenti interventi:

- Intervento in Comune di Ali Terme (ME), codice ME051A, importo € 1.321.010,50;
- Intervento in Comune di Gagliano Castelferrato (EN), codice EN044A, importo € 800.000,00;
- Intervento in Comune di Modica (RG), codice RG159A, importo € 800.000,00;
- Intervento in Comune di Belmonte Mezzagno (PA), codice PA136A, importo € 3.000.000,00;
- Intervento in Comune di Pachino (SR) codice SR163A, importo € 2.000.000,00;
- Intervento in Comune di Portopalo di Capo Passero (SR), codice SR165A, importo € 800.000,00;

per un importo complessivo pari ad € 8.721.010,50.

**CONSIDERATO** che gli interventi da sostituire, di cui sopra, non risultano ricompresi nell'elenco degli interventi di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012;

**CONSIDERATO** che con la stessa nota prot. n. 2017 del 28 aprile 2014 la Regione Sicilia ha chiesto la sostituzione di tali interventi con altri interventi, dotati di progetti esecutivi immediatamente cantierabili, come di seguito indicati:

- Intervento in Comune di Cammarata (AG), Consolidamento in prossimità di Via Roma compreso tra la Chiesa S.Domenico e la Scuola Elementare, codice PAI 063-1CR-007, importo € 2.380.000,00;

- Intervento in Comune di Naso (ME), Consolidamento del centro abitato versante sud (1° stralcio – zona Municipio), codice PAI 014-5NA-023/029, importo € 3.841.010,50;
- Intervento in Comune di Prizzi (PA), Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi (1° stralcio), codice PAI 061-6PR-010, importo € 2.500.000,00;

per un importo complessivo equivalente, ovvero pari ad € 8.721.010,50;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/RIA/29514 del 05/06/2014 con la quale lo stesso Dipartimento ha preso atto della rimodulazione del programma degli interventi urgenti e prioritari contenuti nella proposta di cui alla citata nota prot. n. 2017 del 28 aprile 2014, nonché ha auspicato che gli interventi originariamente previsti dall'Accordo di programma del 30/03/2010 ed oggetto della citata proposta di riprogrammazione, possano trovare successiva copertura economica con eventuali economie e/o con ulteriori stanziamenti da parte dei soggetti sottoscrittori, compatibilmente con le disponibilità finanziarie;

**VISTA** la nota prot. n. 39686 del 2 settembre 2014 con la quale la Regione Siciliana ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, di dare corso alla sostituzione degli interventi di cui alla nota prot. n. 2017 del 28 aprile 2014;

**VISTO** il verbale della riunione del Comitato del 6 ottobre 2014, nel corso del quale si è preso atto della proposta di rimodulazione degli interventi presentata dalla Regione Siciliana con la nota prot. n. 2017 del 28 aprile 2014 convenendo che tale rimodulazione degli interventi vada formalizzata attraverso un atto integrativo all'Accordo di Programma;

**VISTA** la nota prot. 29625 del 25 giugno 2014 con la quale la Regione Siciliana ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, per l'intervento in comune di Malfa (ME), codice ME084B, lo spostamento dell'intervento, dall'area a codice PAI 103-5MA-010 corrispondente all'intervento inserito in Accordo di Programma con la denominazione "*Messa in sicurezza e consolidamento del costone in località Torricella della frazione Capo*", all'area a codice PAI 103-5MA-005 corrispondente ad altro intervento avente denominazione "*Consolidamento del costone roccioso compreso tra punta Scario e Pollara*";

**VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/RIA/50526 del 03/10/2014 con la quale lo stesso Dipartimento ha preso atto dell'intendimento del Comune di Malfa di avanzare la proposta di variazione dell'area a rischio destinataria del finanziamento e che la proposta di variazione dell'area a rischio avanzata dal Comune di Malfa ha la finalità di prevenzione, mitigazione e protezione del rischio idrogeologico ed ha un effettivo impatto per la tutela dell'incolumità della vita umana, nonché ha auspicato che l'intervento originariamente previsto dall'Accordo di programma del 30/03/2010 ed oggetto della citata proposta di variazione possa trovare successiva copertura economica con eventuali economie e/o con ulteriori stanziamenti da parte dei soggetti sottoscrittori, compatibilmente con le disponibilità finanziarie;

**VISTO** il verbale della riunione del Comitato del 6 ottobre 2014, nel corso del quale si è preso atto della richiesta di sostituzione dell'intervento in comune di Malfa (ME), codice ME084B, presentata dalla Regione Siciliana con la nota prot. n. 20625 del 25 giugno 2014, convenendo che tale sostituzione vada formalizzata attraverso un atto integrativo all'Accordo di Programma;

**VISTA** la nota prot. 39686 del 2 settembre 2014 con la quale la Regione Siciliana ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, di dare corso alla sostituzione degli interventi di cui alla nota n. 2017 del 28/04/2014 e, pertanto, di procedere con lo stralcio dalla fase attuativa

dell'Accordo di Programma dell'intervento in comune di Ali Terme, codice ME051A, destinando, però, tale intervento in comune di Ali Terme in area programmatica dell'Accordo di Programma;

**CONSIDERATO** che, stante le difficoltà insorte con ANAS e RFI in merito alla realizzazione di interventi sulle infrastrutture di loro competenza risultanti propedeutici alla realizzazione dell'intervento previsto in comune di Ali Terme, codice ME051A, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria nota n. 28655/TRI-X dell'11 aprile 2013 ha chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, col quesito: "per l'intervento in Comune di Ali Terme, ricompreso nell'accordo di programma con la Regione Sicilia, se sia possibile porre gli oneri degli adeguamenti a carico di questa Amministrazione, considerata sempre la natura giuridica di ANAS e RFI";

**VISTA** la nota prot. n. 276031P in data 26 giugno 2014, per mezzo della quale l'Avvocatura Generale dello Stato si è espressa ritenendo che nulla osti all'impiego di parte dei fondi statali destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico per il finanziamento degli interventi di adeguamento delle strutture di proprietà dell'ANAS e di RFI, senza i quali le opere programmate non potrebbero ottenere i risultati attesi, con grave pericolo per la pubblica incolumità;

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario Delegato n. 3857/14 del 08/08/2014, per mezzo della quale, in adempimento a quanto disposto nella seduta del Comitato del 06/06/2014, si comunica che le economie derivanti dalla conclusione degli interventi a finanziamento statale di cui all'Accordo di Programma, alla data del 08/08/2014, ammontano ad € 2.238.614,32;

**CONSIDERATO** che nel corso della riunione del 6 ottobre 2014 del Comitato, la Regione Sicilia ha chiesto di destinare l'intervento in comune di Ali Terme, codice ME051A, in una apposita fase programmatica dell'Accordo di Programma ricoprendolo con l'importo derivante dalle economie di cui alla ricognizione della nota del Commissario n. 3857/14, nonché di ulteriori economie di prossima valutazione, ovvero rideterminando l'importo dell'intervento in complessivi € 3.000.000,00 al momento ritenuto presumibilmente congruo a coprire l'onere dell'intervento;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/RIA/50530 del 03/10/2014 con la quale lo stesso Dipartimento prende atto dell'intendimento dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, di destinare l'intervento di Ali Terme in area programmatica finanziandolo con l'importo derivante dalle economie di cui alla ricognizione della nota prot. n. 3857 del 08/08/2014 dell'Ufficio del Commissario straordinario delegato, nonché del carattere prioritario ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela dell'incolumità della vita umana;

**VISTO** il verbale della riunione del Comitato del 6 ottobre 2014, nel corso del quale si è preso atto della richiesta della Regione Siciliana di destinare l'intervento in comune di Ali Terme (ME), codice ME051A, in fase programmatica dell'Accordo di Programma, ricoprendolo con l'importo derivante dalle economie di cui alla ricognizione della nota Commissariale n. 3857/14, nonché di ulteriori economie di prossima valutazione, ovvero rideterminando l'importo dell'intervento in complessivi Euro 3.000.000,00, come proposto dalla Regione Siciliana, convenendo che la costituzione di tale fase programmatica vada formalizzata attraverso un atto integrativo all'Accordo di Programma;

**VISTA** la nota prot. n. 5998 del 2 dicembre 2014 con la quale la Regione Siciliana, stante quanto rappresentato e convenuto nell'ambito del Comitato del 6 ottobre 2014, anche facendo seguito a quanto già assunto nel corso delle precedenti sedute del Comitato nonché di quanto disposto dagli Atti integrativi già formalizzati, ha comunicato il quadro economico complessivo dell'accordo di programma nonché l'elenco complessivo, completo e aggiornato degli interventi posti in fase

attuativa, nonché in fase programmatica, da allegare al presente Terzo Atto integrativo all'Accordo di Programma;

**CONSIDERATO** che con la nota prot. n. 5998 del 2 dicembre 2014 la Regione Siciliana ha inoltre segnalato che l'elenco complessivo degli interventi, allegato alla stessa, recepisce anche la correzione di modesti errori materiali riscontrati nel testo di alcuni atti precedenti, nonché ha rappresentato quanto segue:

- Stante le rimodulazioni operate nel corso dei vari Comitati sul programma degli interventi, risultano disponibili, a valere sulle risorse statali, economie per complessivi Euro 613.104,30 che potranno essere utilizzate a copertura degli interventi posti in fase programmatica e di altri interventi da determinare;
- L'importo dell'intervento ME066A/10, in comune di Ficarra, resta pari a Euro 1.450.000,00, considerato che invece di utilizzare l'importo pari a Euro 350.000,00 convenuto nel corso del Comitato del 23/09/2013, il maggiore importo previsto sarà a carico del ribasso d'asta eventualmente autorizzato, ai sensi della legislazione vigente;
- L'intervento cod. AG014A/10 in comune di Santo Stefano di Quisquina (AG), "Opere di consolidamento e rifacimento regimazione idrica zona a valle villa comunale", dell'importo di Euro 2.360.195,11, non ancora avviato, ricompreso nell'ambito degli interventi cofinanziati dalla Regione Siciliana, stante recenti approfondimenti condotti in fase di progettazione è stato rimodulato in complessive Euro 2.272.997,00;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. DPC/RIA/63721 del 03 dicembre 2014 con la quale lo stesso Dipartimento prende atto di quanto comunicato dalla Regione Siciliana con la citata nota prot. n. 5998 del 2 dicembre 2014;

**VISTO** l'art. 10 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116;

**VISTO** l'art. 7 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 che prevede che "L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

**VISTO** il Terzo Atto integrativo stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia;

#### DECRETA:

Art. 1 - E' approvato l'unito Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia, a valle delle motivazioni specificatamente descritte nelle premesse dell'Atto Integrativo stesso.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per il prescritto riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Maurizio Pernice)



REG. TO ALLI PORTI DEL FONTE  
Add. *2015*  
UFFICIO CONTROLLO ACQUA MARE  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI DEL MINISTERO  
DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE  
Per *1193*  
IL CONSIGLIERE  
*[Signature]*







*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

*e*

*Regione Siciliana*

**3° ATTO INTEGRATIVO**

**ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30/03/2010**

**FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL  
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E  
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO**

## PREMESSE

**VISTO** l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, sottoscritto il 30 marzo 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 3/5/2010, Reg. n. 4 Fog. 297, finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, con il quale sono stati stanziati complessivamente Euro 304.337.176,92 di cui Euro 152.692.572,11 a valere sulle risorse statali e Euro 151.644.604,81 a valere sulle risorse regionali;

**VISTO** l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 03/05/2011, ed il relativo Decreto approvativo in data 03/08/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 104, con il quale sono stati ulteriormente stanziati complessivamente Euro 21.251.185,84 di cui Euro 12.756.002,61 a valere sulle risorse statali e Euro 8.495.183,23 a valere sulle risorse regionali;

**VISTA** la Deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012, con la quale per gli 11 interventi a valere sulle risorse statali inseriti nel citato Atto integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 03/05/2011, nonché identificati nella delibera stessa, ha assegnato la somma di Euro 12.756.002,61 di cui Euro 1.153.004,80 di quota statale e Euro 11.602.997,81 di quota regionale;

**VISTO** il Secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 28/10/2014, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale sono stati ulteriormente stanziati complessivamente Euro 25.000.000,00 di cui Euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse statali e Euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse regionali;

**VISTI** i verbali delle riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo (Comitato) del 21 ottobre 2010, 24 febbraio 2011, 24 marzo 2011, 15 settembre 2011, 18 maggio 2012, 15 febbraio 2013, 23 settembre 2013, 6 giugno 2014 e 6 ottobre 2014;

**CONSIDERATO** che nelle sopra citate riunioni del Comitato è stata concordata la correzioni di alcuni errori materiali, la rimodulazione, la revoca e la riprogrammazione di vari interventi a valere sia sul finanziamento statale che sul finanziamento regionale, l'inserimento di una parte programmatica e l'aggiornamento di alcuni codici ai fini della loro compatibilità con il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS);

**VISTO** l'art. 1 comma 111 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede, tra l'altro, che al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare verifica la compatibilità degli Accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi e propone alle Regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 4563/TRI del 11 febbraio 2014, poi integrata con note prot. 8954/TRI del 26 marzo 2014 e prot. 11232/TRI del 18 aprile 2014, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in attuazione di quanto disposto dalla legge sopra citata, in esito ad una ricognizione sulla stato di attuazione degli interventi compresi in Accordo, ha trasmesso alla Regione Siciliana una proposta di aggiornamento dell'Accordo sottoscritto;

**VISTO** il verbale della riunione del Comitato del 18 maggio 2012, nel corso del quale l'intervento con codice ME051A/10 in Comune di Ali Terme (ME), "Interventi urgenti di consolidamento centro abitato", finanziato per un importo pari ad Euro 900.000,00, stante i maggiori oneri resisi necessari è stato rimodulato in complessive Euro 1.321.010,50;

VISTA la nota dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato prot. n. 2017 del 28 aprile 2014, firmata congiuntamente dal Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con la quale si comunica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, che per quanto riguarda gli adempimenti di cui al comma 111, art. 1, della legge 147/2013, in riferimento alla necessità di appaltare i lavori o comunque pubblicare il bando di gara degli interventi entro il 31 dicembre 2014, esistono criticità tali da non potere garantire Obblighi Giuridicamente Vincolanti entro il termine previsto in merito ai seguenti interventi:

- Intervento in Comune di Ali Terme (ME), codice ME051A, importo € 1.321.010,50;
- Intervento in Comune di Gagliano Castelferrato (EN), codice EN044A, importo € 800.000,00;
- Intervento in Comune di Modica (RG), codice RG159A, importo € 800.000,00;
- Intervento in Comune di Belmonte Mezzagno (PA), codice PA136A, importo € 3.000.000,00;
- Intervento in Comune di Pachino (SR), codice SR163A, importo € 2.000.000,00;
- Intervento in Comune di Portopalo di Capo Passero (SR), codice SR165A, importo € 800.000,00;

Per un importo complessivo pari ad € 8.721.010,50.

CONSIDERATO che gli interventi da sostituire, di cui sopra, non risultano ricompresi nell'elenco degli interventi di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 2017 del 28 aprile 2014 la Regione Siciliana ha chiesto la sostituzione di tali interventi con altri interventi, dotati di progetti esecutivi immediatamente cantierabili, come di seguito indicati:

- Intervento in Comune di Cammarata (AG), Consolidamento in prossimità di via Roma compreso tra la Chiesa S. Domenico e la Scuola Elementare, codice PAI 063-1CR-007, importo € 2.380.000,00;
- Intervento in Comune di Naso (ME), Consolidamento del centro abitato versante sud (1° stralcio - zona Municipio), codice PAI 014-5NA-023/029, importo € 3.841.010,50;
- Intervento in Comune di Prizzi (PA), Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via De Gasperi (1° stralcio), codice PAI 061-6PR-010, importo € 2.500.000,00;

Per un importo complessivo equivalente, ovvero pari ad € 8.721.010,50.

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. DPC/RIA/29514 del 05/06/2014 con la quale lo stesso Dipartimento ha preso atto della rimodulazione del programma degli interventi urgenti e prioritari contenuti nella proposta di cui alla citata nota prot. n. 2017 del 28 aprile 2014, nonché ha auspicato che gli interventi originariamente previsti dall'Accordo di programma del 30/03/2010 ed oggetto della citata proposta di riprogrammazione, possano trovare successiva copertura economica con eventuali economie e/o con ulteriori stanziamenti da parte dei soggetti sottoscrittori, compatibilmente con le disponibilità finanziarie

VISTA la nota prot. 39686 del 2 settembre 2014 con la quale la Regione Siciliana ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, di dare corso alla sostituzione degli interventi di cui alla nota n. 2017 del 28 aprile 2014;

VISTO il verbale della riunione del Comitato del 6 ottobre 2014, nel corso del quale si è preso atto della proposta di rimodulazione degli interventi presentata dalla Regione Siciliana con la nota prot. n. 2017 del 28 aprile 2014, convenendo che tale rimodulazione degli interventi vada formalizzata attraverso un atto integrativo all'Accordo di Programma;

VISTA la nota prot. 29625 del 25 giugno 2014 con la quale la Regione Siciliana ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, per l'intervento in comune di Malfa (ME), codice ME084B, lo

spostamento dell'intervento, dall'area a codice PAI 103-5MA-010 corrispondente all'intervento inserito in Accordo di Programma con la denominazione "*Messa in sicurezza e consolidamento del costone in località Torricella della frazione Capo*", all'area a codice PAI 103-5MA-005 corrispondente ad altro intervento avente denominazione "*Consolidamento del costone roccioso compreso tra punta Scario e Pollara*";

**VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. DPC/RIA/50526 del 03/10/2014 con la quale lo stesso Dipartimento ha preso atto dell'intendimento del Comune di Malfa di avanzare la proposta di variazione dell'area a rischio destinataria del finanziamento, e che la proposta di variazione dell'area a rischio avanzata dal Comune di Malfa ha la finalità di prevenzione, mitigazione e protezione del rischio idrogeologico ed ha un effettivo impatto per la tutela dell'incolumità della vita umana, nonché ha auspicato che l'intervento originariamente previsto dall'Accordo di programma del 30/03/2010 ed oggetto della citata proposta di variazione, possa trovare successiva copertura economica con eventuali economie e/o con ulteriori stanziamenti da parte dei soggetti sottoscrittori, compatibilmente con le disponibilità finanziarie;

**VISTO** il verbale della riunione del Comitato del 6 ottobre 2014, nel corso del quale si è preso atto della richiesta di sostituzione dell'intervento in comune di Malfa (ME), codice ME084B, presentata dalla Regione Siciliana con la nota prot. n. 29625 del 25 giugno 2014, convenendo che tale sostituzione vada formalizzata attraverso un atto integrativo all'Accordo di Programma;

**VISTA** la nota prot. 39686 del 2 settembre 2014 con la quale la Regione Siciliana ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, di dare corso alla sostituzione degli interventi di cui alla nota n. 2017 del 28/04/2014, e pertanto di procedere con lo stralcio dalla fase attuativa dell'Accordo di Programma dell'intervento in comune di Ali Terme, codice ME051A, destinando però tale intervento in comune di Ali Terme in area programmatica dell'Accordo di Programma;

**CONSIDERATO** che, stante le difficoltà insorte con ANAS e RFI in merito alla realizzazione di interventi sulle infrastrutture di loro competenza risultanti propedeutici alla realizzazione dell'intervento previsto in comune di Ali Terme, codice ME051A, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria nota n. 28655/TRI-X del 11 aprile 2013 ha chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, avente quesito: "*per l'intervento in Comune di Ali Terme, ricompreso nell'accordo di programma con la Regione Sicilia, se sia possibile porre gli oneri degli adeguamenti a carico di questa Amministrazione, considerata sempre la natura giuridica di Anas ed RFI*";

**VISTA** la nota prot. n. 276031P in data 26 giugno 2014, per mezzo della quale l'Avvocatura Generale dello Stato si è espressa ritenendo che nulla osti all'impiego di parte dei fondi statali destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico per il finanziamento degli interventi di adeguamento delle strutture di proprietà dell'ANAS e di RFI, senza i quali le opere programmate non potrebbero ottenere i risultati attesi, con grave pericolo per la pubblica incolumità;

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario Delegato n. 3857/14 dell'8/08/2014, per mezzo della quale, in adempimento a quanto disposto nella seduta del Comitato del 6/06/2014, si comunica che le economie derivanti dalla conclusione degli interventi a finanziamento statale di cui all'Accordo di Programma, alla data dell'8/08/2014, ammontano ad € 2.238.614,32

**CONSIDERATO** che nel corso della riunione del 6 ottobre 2014 del Comitato, la Regione Siciliana ha chiesto di destinare l'intervento in comune di Ali Terme, codice ME051A, in una apposita fase programmatica dell'Accordo di Programma ricoprendolo con l'importo derivante dalle economie di cui alla ricognizione della nota del Commissario n. 3857/14, nonché di ulteriori economie di prossima valutazione, ovvero rideterminando l'importo dell'intervento in complessivi Euro 3.000.000,00 al momento ritenuto presumibilmente congruo a coprire l'onere dell'intervento;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. DPC/RIA/50530 del 03/10/2014 con la quale lo stesso Dipartimento prende atto dell'intendimento dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente, di destinare l'intervento di Ali Terme in area

programmatica finanziandolo con l'importo derivante dalle economie di cui alla ricognizione della nota prot. n. 3857 del 08/08/2014 dell'Ufficio del Commissario straordinario delegato, nonché del carattere prioritario dell'intervento ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela dell'incolumità della vita umana;

**VISTO** il verbale della riunione del Comitato del 6 ottobre 2014, nel corso del quale si è preso atto della richiesta della Regione Siciliana di destinare l'intervento in comune di Ali Terme (ME), codice ME051A, in fase programmatica dell'Accordo di Programma, ricoprendolo con l'importo derivante dalle economie di cui alla ricognizione della nota Commissariale n. 3857/14, nonché di ulteriori economie di prossima valutazione, ovvero rideterminando l'importo dell'intervento in complessivi Euro 3.000.000,00, come proposto dalla Regione Siciliana, convenendo che la costituzione di tale fase programmatica vada formalizzata attraverso un atto integrativo all'Accordo di Programma;

**VISTA** la nota prot. n. 5998 del 2 dicembre 2014 con la quale la Regione Siciliana, stante quanto rappresentato e convenuto nell'ambito del Comitato del 6 ottobre 2014, anche facendo seguito a quanto già assunto nel corso delle precedenti sedute del Comitato nonché di quanto disposto dagli Atti integrativi già formalizzati, ha comunicato il quadro economico complessivo dell'accordo di programma nonché l'elenco complessivo, completo e aggiornato degli interventi posti in fase attuativa, nonché in fase programmatica, da allegare al presente Terzo Atto integrativo all'Accordo di Programma;

**CONSIDERATO** che con la nota prot. n. 5998 del 2 dicembre 2014 la Regione Siciliana ha inoltre segnalato che l'elenco complessivo degli interventi, allegato alla stessa, recepisce anche la correzione di modesti errori materiali riscontrati nel testo di alcuni atti precedenti, nonché ha rappresentato quanto segue:

- Stante le rimodulazioni operate nel corso dei vari Comitati sul programma degli interventi, risultano disponibili, a valere sulle risorse statali, economie per complessivi Euro 613.104,30 che potranno essere utilizzate a copertura degli interventi posti in fase programmatica e di altri interventi da determinare;
- L'importo dell'intervento ME066A/10, in comune di Ficarra, resta pari a Euro 1.450.000,00, considerato che invece di utilizzare l'importo pari a Euro 350.000,00 convenuto nel corso del Comitato del 23/09/2013, il maggiore importo previsto sarà a carico del ribasso d'asta eventualmente autorizzato, ai sensi della legislazione vigente;
- L'intervento cod. AG014A/10 in comune di Santo Stefano di Quisquina (AG), "Opere di consolidamento e rifacimento regimazione idrica zona a valle villa comunale", dell'importo di Euro 2.360.195,11, non ancora avviato, ricompreso nell'ambito degli interventi cofinanziati dalla Regione Siciliana, stante recenti approfondimenti condotti in fase di progettazione è stato rimodulato in complessive Euro 2.272.997,00;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. DPC/RIA/63721 del 03 dicembre 2014 con la quale lo stesso Dipartimento prende atto di quanto comunicato dalla Regione Siciliana con la citata nota prot. n. 5998 del 2 dicembre 2014;

**VISTO** l'art. 10 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116;

**VISTO** l'art. 7 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 che prevede che "L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

**VISTA** la necessità di provvedere con Terzo Atto integrativo ad operare al programma degli interventi di cui all'allegato 1 dell'Accordo di Programma del 30/03/2010 e successivi Atto

integrativo del 03/05/2011 e Secondo Atto integrativo del 28/10/2014, le modifiche concordate dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma nel corso delle citate riunioni del Comitato;

### **TUTTO CIÒ PREMesso E CONSIDERATO**

Tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana (di seguito denominate *Parti*)

si conviene e si stipula il presente

## **TERZO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Articolo 1**

*(Premesse)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, come integrato e modificato con l'Atto Integrativo del 03/05/2011 e con il Secondo Atto Integrativo del 28/10/2014, e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

### **Articolo 2**

*(Oggetto e finalità)*

Il presente Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 30 marzo 2010 (nel seguito denominato Terzo Atto Integrativo) è finalizzato all'attuazione del comma 111, dell'art. 1 della legge 147/2013 ed al recepimento delle modifiche sottoposte al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo.

### **Articolo 3**

*(Programma degli interventi)*

1. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana sono elencati nella sezione attuativa e nella sezione programmatica dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Terzo Atto Integrativo.
2. Il relativo finanziamento, volto a coprire il costo complessivo degli interventi elencati nella sezione attuativa, resta invariato nell'importo complessivo di Euro 350.588.362,76.
3. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui all'articolo 5 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010.

### **Articolo 4**

*(Copertura finanziaria degli interventi)*

La copertura finanziaria del fabbisogno, pari a complessivi Euro 350.588.362,76, è analiticamente descritta nella successiva Tabella n. 1, che sostituisce le omologhe Tabella 1 dell'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010, Tabella 1 dell'art. 4 dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 3 maggio 2011 e Tabella 1 dell'art. 4 del Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 28 ottobre 2014, nonché recepisce quanto disposto con la Deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20/01/2012.

**Tabella 1**

MATTM	cap. 8640 (01) e.f. 2008	55.500.000,00
	cap. 8531 (01) e.f. 2008	13.993.170,00
	cap. 8531 (05) e.f. 2008	1.500.000,00
	cap. 8640 (01) e.f. 2009	62.514.881,54
	cap. 8531 (01) e.f. 2009	15.602.830,00
	cap. 8531 (03) e.f. 2009	3.581.690,57
	Delibera CIPE n. 8/2012 (L. 266/2005 e L. 183/2011)	1.153.004,80
	Fondi OPCM n. 3980/2011	10.000.000,00
	<b>TOTALE RISORSE MATTM</b>	<b>Euro 163.845.576,91</b>
REGIONE	Cap. 842057 (Fondi PO FESR 2007-2013)	110.461.226,64
	Cap. 842068 (Risorse PAC Salvaguardia)	26.974.000,00
	Cap. 842037 (Risorse PAC Nuove Azioni)	37.704.561,30
	Cap. 842067 (Delibera CIPE n. 8/2012 - Risorse PAR - PAIN)	11.602.997,81
	<b>TOTALE RISORSE REGIONE</b>	<b>Euro 186.742.785,85</b>

#### Articolo 5

*(Modalità di attuazione)*

L'attuazione degli interventi di cui al presente Atto, in base al disposto dell'art. 7 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di governo contro il dissesto con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

#### Articolo 6

*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Terzo Atto Integrativo, comprendente l'allegato 1, l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010, l'Atto Integrativo del 30 maggio 2011 ed il Secondo l'Atto Integrativo del 28 ottobre 2014, come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Gli interventi previsti nella Sezione Programmatica potranno trovare successiva copertura finanziaria con eventuali economie derivanti dalla attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010, dell'Atto Integrativo sottoscritto in data 3 maggio 2011, del

Secondo Atto Integrativo sottoscritto in data 28 ottobre 2014, del presente Terzo Atto Integrativo e con ulteriori eventuali stanziamenti da parte dei soggetti sottoscrittori.

3. Il presente Terzo Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti.

4. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Terzo Atto Integrativo, si fa riferimento a quanto riportato nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010.

Letto, approvato, sottoscritto.

.....

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministro

Dott. Gian Luca Galletti

---

Per la Regione Siciliana

L'Assessore del Territorio e dell'Ambiente

Dott. Maurizio Croce

---



**3° ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE SICILIANA**

**PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO**

**INTERVENTI FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(Accordo di programma del 30/03/2010)**

CODICE	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
AG001B/10	AG	AGRIGENTO	Comprensorio urbano	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	2.000.000,00
AG21BA/10	AG	CAMMARATA	Centro abitato	Consolidamento in prossimità di Via Roma compreso tra la chiesa di S. Domenico e la Scuola Elementare	2.380.000,00
AG005A/10	AG	FAVARA	Zona tra le vie De Gasperi e De Pretis	Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis	1.500.000,00
AG007A/10	AG	LUCCA SICULA	Centro Urbano	Opere di consolidamento centro urbano	1.500.000,00
AG010B/10	AG	RIBERA	Comprensorio urbano	Completamento consolidamento centro abitato secca grande	2.600.000,00
AG011A/10	AG	RIBERA	Centro Urbano	Opere di consolidamento centro urbano	939.021,00
AG015A/10	AG	SCIACCA	Parete coda di Volpe	Opere di consolidamento parete Coda di Volpe	800.000,00
CT022A/10	CT	BRONTE	C.da Fontanelle	Consolidamento frana	1.092.500,00
CT023A/10	CT	CALATABIANO	Lapide-Pasteria	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria	250.000,00
CT024A/10	CT	CASTEL DI IUDICA	Frazione Cinquegrana	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti	3.000.000,00
CT025A/10	CT	GIARRE	Fraz. S. Maria la Strada	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti - Fraz. S. Maria la Strada	1.000.000,00
CT026A/10	CT	GIARRE	Codavolpe	Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe	1.000.000,00
CT027A/10	CT	GRAMMICHELE	Scarpata sottostante la via B. Buozzi	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la Via B. Buozzi	700.000,00
CT031A/10	CT	MISTERBIANCO	Fraz. Poggio Lupo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo	500.000,00
CT033A/10	CT	PIEDIMONTE ETNEO	Fraz. Presa	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa	500.000,00
CT034A/10	CT	RADDUSA	C.da San Nicolò	Opere di consolidamento del versante	2.000.000,00
CT036A/10	CT	RAMACCA	Centro abitato	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato	1.200.000,00
CT037B/10	CT	RANDAZZO	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	950.000,00
EN175A/10	EN	BARRAFRANCA	Centro abitato	Mitigazione rischio idrogeologico (zona a monte dell'intervento già finanziato con Accordo di Programma del 30 marzo 2010)	1.500.000,00
EN042B/10	EN	CENTURIPPE	Comprensorio urbano	Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario	770.000,00
EN047B/10	EN	REGALBUTO	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	1.500.000,00
ME049A/10	ME	ALCARA LI FUSI	C.da Cappuccini	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini	1.200.000,00
ME052A/10	ME	BASICO'	C/da Badiazza	Drenaggi e opere di convogliamento - C/da Badiazza	1.300.000,00
ME053A/10	ME	BROLO	C.da Jannello	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - C.da Jannello	3.630.000,00
ME056A/10	ME	CAPRI LEONE	Frazione Rocca	Opere di risagomatura e protezione versanti - Frazione Rocca	550.000,00
ME057A/10	ME	CAPRI LEONE	Capri Leone Centro	Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali - Capri Leone Centro	600.000,00
ME058A/10	ME	CARONIA	Centro abitato	Consolidamento centro abitato	3.653.083,31
ME059B/10	ME	CASALVECCHIO SICULO	Comprensorio urbano	Consolidamento centro abitato	1.363.853,00
ME061A/10	ME	CASTEL DI LUCID	Via Durante e Via S. Lucia	Consolidamento via Durante e Via S. Lucia	1.500.000,00
ME062A/10	ME	CASTELL'UMBERTO	Contrada Sfaranda Inferiore	Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sfaranda Inferiore	300.000,00
ME063B/10	ME	CASTROREALE	Comprensorio urbano	Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato - Completamento	1.650.000,00
ME066A/10	ME	FICARRA	Contrada Rinella - San Noto	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto	1.450.000,00
ME071A/10	ME	FRAZZANO'	Centro abitato	Monitoraggio delle aree in frana del centro abitato e delle aree ad elevato rischio idrogeologico (RA)	300.000,00
ME072A/10	ME	GALATI MAMERTINO	C.da Galini	Disgaggioamento massi, messa in sicurezza versante - C.da Galini	500.000,00
ME073A/10	ME	GALATI MAMERTINO	Pilieri	Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pilieri	1.100.000,00
ME078B/10	ME	LETOJANNI	Comprensorio urbano	Opere di difesa costiera	2.000.000,00
ME079A/10	ME	LIBRIZZI	Librizzi centro - C.da Nasidi e Via Fratale	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Librizzi centro e Contada Nasidi e Via Fratale	2.150.000,00
ME081A/10	ME	LIBRIZZI	Ronco Marurà	Opere di consolidamento versante e sistemazione - Zona Ronco Marurà	500.000,00
ME087B/10	ME	MESSINA	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento località Giampilleri	24.000.000,00
ME088B/10	ME	MESSINA	Comprensorio urbano	Opere di salvaguardia centro abitato	3.000.000,00
ME089A/10-1	ME	MESSINA	Galati	Opere di consolidamento località Galati	900.000,00
ME089A/10-2	ME	MESSINA	Milli San Marco	Opere di consolidamento località Milli San Marco	1.390.000,00
ME089A/10-3	ME	MESSINA	Milli San Pietro	Opere di consolidamento località Milli San Pietro	510.000,00

ME089A/10-4	ME	MESSINA	Santa Margherita	Opere di consolidamento località Santa Margherita	650.000,00
ME089A/10-5	ME	MESSINA	Santo Stefano	Opere di consolidamento località Santo Stefano	550.000,00
ME091A/10	ME	MIRTO	Centro abitato	Consolidamento centro abitato	2.500.000,00
ME092A/10	ME	MISTRETTA	Centro abitato di Mistretta - Torrente Santa Domenica	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta - Torrente Santa Domenica	800.000,00
ME095A/10	ME	NASO	Gattina	Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Gattina	1.650.000,00
ME219A/10	ME	NASO	Centro abitato	Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio	3.841.010,50
ME099A/10	ME	PIRAINO	Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole	Opere di consolidamento - Zona Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole	1.100.000,00
PA220A/10	PA	PRIZZI	Centro abitato	Consolidamento zona a valle del corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi 1° Stralcio	2.500.000,00
ME107B/10	ME	SAN FRATELLO	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento centro abitato	18.000.000,00
ME109A/10	ME	SAN PIER NICETO	Centro abitato	Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato	600.000,00
ME113A/10	ME	SANTA MARINA SALINA	Fraz. Lingua e zona del Faro	Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro	2.000.000,00
ME115A/10-1	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	Contrada Barba	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba	3.000.000,00
ME115A/10-2	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	Contrada Cartelli	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli	2.930.000,00
ME115A/10-3	ME	SANT'ANGELO DI BROLO	Centro urbano	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano	2.070.000,00
ME119A/10	ME	SINAGRA	Contrada Faranò	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò	3.000.000,00
ME120A/10	ME	SINAGRA	Martini	Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini	1.000.000,00
ME121A/10	ME	SINAGRA	Contrada Mulinazzo	Drenaggi e gabbioni - C/da Mulinazzo	2.500.000,00
ME125A/10	ME	TORTORICI	Lembo - Pellizza	Muri e paratie monteevalle e opere idrauliche - Zona Lembo-Pellizza	1.500.000,00
ME126A/10	ME	TORTORICI	S. Antonio Sciortino	Muri su pali e raccolta acque - Zona S. Antonio-Sciortino	500.000,00
ME128A/10	ME	TORTORICI	Batana - Pagliara - S. Leone	Muri e barriere paramassi - Zona Batana-Pagliara-S. Leone	500.000,00
ME132A/10	ME	UCRIA	Via Annunziata	Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio - Zona Via Annunziata	2.500.000,00
PA137A/10-1	PA	BLUFI	Burrone San Domenico Malpasso e centro urbano	Opere di sistemazione idraulica burrone San Domenico Malpasso e consolidamento del centro urbano	1.310.000,00
PA137A/10-2	PA	BLUFI	Centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli	Opere di consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli	690.000,00
PA141B/10	PA	CAPACI	Comprensorio urbano	Consolidamento centro abitato	1.200.000,00
PA142A/10	PA	CARINI	Zona Industriale	Barriere paramassi - Zona Industriale	1.000.000,00
PA143A/10	PA	CASTELBUONO	C/da Liccia	Opere di drenaggio e consolidamento - C/da Liccia	2.000.000,00
PA149A/10	PA	MISILMERI	C/da piano Stoppa	Opere di regimazione idraulica - C/da piano Stoppa	2.000.000,00
PA154A/10	PA	POLIZZI GENEROSA	Via G. Borgese	Opere di consolidamento - Zona Via G. Borgese	500.000,00
PA156A/10	PA	TERMINI IMERESE	Foce Fiume Torto	Risagomatura argini e opere di pulitura - Zona foce Fiume Torto	800.000,00
PA157A/10	PA	VALLEDOLMO	C/da Renella	Opere di consolidamento - C/da Renella	500.000,00
SR161A/10	SR	AVOLA	C/da cavagrande del cassibile	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C/da Cavagrande del Cassibile	600.000,00
SR162A/10	SR	CARLENTINI	Centro abitato via venezia via 4 novembre via dei caduti	Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	800.000,00
SR177A/10	SR	CARLENTINI	Zona Carlentini Nord	Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)	2.500.000,00
SR167A/10	SR	ROSOLINI	Vallone ristallo-mascugno	Consolidamento versante e sistemazione idraulica - Zona vallone Ristallo-Mascugno	1.500.000,00
TP168A/10	TP	ERICE	Crocifissello	Consolidamento costone roccioso - Zona Crocifissello	500.000,00
TP169A/10	TP	MAZARA DEL VALLO	Tonnarella	Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture - Zona Tonnarella	800.000,00
TP172A/10	TP	SAN VITO LO CAPO	Makari	Collocazione rete paramassi - Zona Makari	450.000,00
Economie disponibili, derivanti dalle rimodulazioni operate sul programma degli interventi					613.104,30
<b>TOTALE</b>					<b>152.692.572,11</b>

**INTERVENTI FINANZIATI SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERA CIPE N. 8/2012 DEL 20/01/2012**  
**(1° Atto Integrativo all'Accordo di programma del 3/05/2011) - Delibera CIPE n. 8/2012**

CODICE	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
ME178A/10	ME	CAPRI LEDRE	Centro abitato	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)	1.000.000,00
ME194A/10	ME	BROLO	C.da Iannello Alto	Consolidamento e salvaguardia fabbricati	600.000,00
PA179A/10	PA	ALTOFONTE	Centro abitato	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	600.000,00
PA180A/10	PA	CEFALU'	Località Testardita	Messa in sicurezza movimenti franosi	90.000,00
PA181A/10	PA	CEFALU'	Località Testardita - Proprietà Greco	Messa in sicurezza movimenti franosi	400.000,00
SR184A/10	SR	AVOLA	Linea di costa di Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	2.000.000,00
SR185A/10	SR	BUSCEMI	Santuario della Madonna del Mosco	Consolidamento costone sottostante il Santuario	200.000,00
SR186A/10	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Casuzze - Scalo Mandrie	Regimazione acque e consolidamento scarpata	600.000,00
SR187A/10	SR	ROSOLINI	Centro abitato	Intervento di sistemazione della voregine del centro abitato	1.800.000,00
SR188A/10	SR	SIRACUSA	Falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio - 2 lotto	Lavori di ripristino e consolidamento della falesia	3.465.002,61
TP189A/10	TP	MAZARA DEL VALLO	Bacino portuale e del retrostante porto canale Zona Foce Fiume Mazza	Stralcio lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale	2.000.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>12.756.002,61</b>

**INTERVENTI FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**(2° Atto Integrativo all'Accordo di programma del 28/10/2014)**

CODICE	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
AG195A/10	AG	Casteltermini	Centro abitato	Cappuccini	800.000,00
AG196A/10	AG	Aragona	Centro abitato	Consolidamento dell'area abitata in frana a valle del P.P.E B. Naselli	700.000,00
AG197A/10	AG	Palma di Montechiaro	C.da Clotta	Messa in sicurezza e ripristino del versante in frana di C.da Clotta - Facciomare	700.000,00
CL198A/10	CL	Mussomeli	Centro abitato	Lavori di sistemazione e consolidamento del fronte roccioso soggetto a crollo a monte della Via Acquaviva	700.000,00
CT199A/10	CT	Randazzo	Centro abitato	Consolidamento del costone roccioso e bonifica dell'argine del T. Annunziata posto a valle del centro abitato	700.000,00
EN200A/10	EN	Troina	Centro abitato	Consolidamento di Monte Mugena completamento	1.240.000,00
ME201A/10	ME	Lipari	Portinente	Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in loc. Portinente (Porto delle Genti)	2.400.000,00
ME202A/10	ME	Santa Marina Safina	Vallone Nero	Lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico ricadente il loc. Vallone Nero	700.000,00
PA203A/10	PA	Castronovo di Stabia	Centro abitato	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Largo Passalacqua	800.000,00
PA204A/10	PA	Petralia Sottana	Centro abitato	Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento	460.000,00
PA205A/10	PA	Valledolmo	Centro abitato	Lavori di consolidamento della Via Generale di Maria e zone limitrofe	800.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>10.000.000,00</b>

**INTERVENTI COFINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA**  
(Accordo di programma del 30/03/2010)

CODICE	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
AG002B/10	AG	CALTABELLOTTA	Comprensorio urbano	Interventi di consolidamento del centro abitato	600.000,00
AG003A/10	AG	CAMMARATA	Quartiere Santa Lucia	Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia	1.050.000,00
AG004A/10	AG	CATTOLICA ERACLEA	Eraclea minoa	Opere di consolidamento - Zona Eraclea Minoa	1.480.000,00
AG174B/10	AG	CATTOLICA ERACLEA	Comprensorio urbano	Consolidamento centro abitato - - 063 - 1CE - 001	1.170.000,00
AG005B/10	AG	CIANCIANA	Comprensorio urbano	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante ovest del centro abitato	855.618,05
AG008B/10	AG	MONTALLEGRO	Comprensorio urbano	Consolidamento della parete Est del Monte Lupo sovrastante il centro abitato	1.435.536,03
AG009B/10	AG	RAVANUSA	Comprensorio urbano	Consolidamento zona Est Centro abitato	996.908,73
AG012A/10	AG	SAMBUCA DI SICILIA	Quartiere "Saraceno"	Opere di consolidamento delle cavità sotterranee con sostegni metallici e in c.a.- chiodature - Quartiere "Saraceno"	1.025.000,00
AG013B/10	AG	SAN GIOVANNI GEMINI	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	2.474.826,76
AG014A/10	AG	SANTO STEFANO DI QUISSUINA	Zona a valle villa comunale	Opere di consolidamento e rifacimento regimazione idrica zona a valle villa comunale	2.272.957,00
CL016B/10	CL	ACQUAVIVA PLATANI	Comprensorio urbano	Consolidamento della parete rocciosa a monte della Via Marino Mistretta	986.525,06
CL018A/10	CL	BUTERA	Pendici del centro Storico	Opere di consolidamento pendici del centro storico	800.000,00
CL017B/10	CL	BUTERA	Comprensorio urbano	Consolidamento centro abitato	1.200.000,00
CL019A/10	CL	CALTANISSETTA	Zona collina S. Anna, centro storico, quartiere Saccara	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della Collina S. Anna, Centro Storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e inerbimento dei versanti dell'abitato	4.160.000,00
CT021B/10	CT	ACI CATENA	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Vampolieri	4.500.000,00
CT028B/10	CT	LICODIA EUBEA	Comprensorio urbano	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	880.000,00
CT029B/10	CT	MANIACE	Comprensorio urbano	Consolidamento Sponda sinistra T.te Martello	1.500.000,00
CT030A/10	CT	MANIACE	Contrada Galatese-petrosino	Opere di regimazione idraulica e consolidamento delle scarpate - C/dè Galatese-Petrosino	1.000.000,00
CT032B/10	CT	MOTTA SANT'ANASTASIA	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato: Area Nord Est	1.500.000,00
CT035A/10	CT	RADDUSA	Centro abitato	Trincea drenante a monte del centro abitato e parate di pali	2.500.000,00
CT038B/10	CT	SANTA VENERINA	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badiu-T. Fago	1.000.000,00
CT039B/10	CT	SANT'AGATA LI BATTIATI	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi	1.000.000,00
CT040B/10	CT	TRECASTAGNI	Comprensorio urbano	Interventi di consolidamento del centro abitato	446.849,79
EN041B/10	EN	BARRA FRANCA	Comprensorio urbano	Mitigazione del rischio zona Bivio Catena	1.608.973,06
EN043B/10	EN	GAGLIANO CASTELFERRATO	Comprensorio urbano	Consolidamento centro abitato	1.557.285,46
EN045A/10-1	EN	LEONFORTE	Monte Cernigliero (zona soprastante scuola Verga)	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliero - Zona soprastante scuola Verga	400.000,00
EN046B/10	EN	PIAZZA ARMERINA	Comprensorio urbano	Interventi nel quartiere Itria	1.130.000,00
ME048B/10	ME	ALCARA LI FUSI	Comprensorio urbano	Consolidamento costone roccioso sovrastante Centro Abitato	1.880.000,00
ME050B/10	ME	ALI'	Comprensorio urbano	Opere di salvaguardia centro abitato	900.000,00
ME054B/10	ME	CAPIZZI	Comprensorio urbano	Interventi di consolidamento del centro abitato	1.192.623,56
ME055B/10	ME	CAPO D'ORLANDO	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	1.000.000,00
ME060B/10	ME	CASTEL DI LUCIO	Comprensorio urbano	Completamento degli interventi di mitigazione per il rischio idrogeologico in località Calvario per la S.P. 176 e per il Centro Abitato - Via S. D'Acquisto	999.676,87
ME064B/10	ME	CESARO'	Comprensorio urbano	Consolidamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del Centro Abitato in zona Castello Colonna-Rocca a Sud dell'Abitato	965.547,00
ME065A/10	ME	FICARRA	Contrada grenne	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne	1.028.981,00
ME067B/10	ME	FONDACHELLI-FANTINA	Comprensorio urbano	Opere di salvaguardia centro abitato	1.000.000,00
ME068B/10	ME	FORZA D'AGRO'	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	414.163,28

ME069A/10	ME	FRAZZANO'	Centro abitato - Via San Filippo di Fragala' - Zona Piazzale S.Lorenzo	lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via S. Filippo di Fragala' - Zona Piazzale S.Lorenzo	1.165.000,00
ME070A/10	ME	FRAZZANO'	Centro abitato	Opere di consolidamento ad est del centro abitato	2.500.000,00
ME074A/10	ME	GIARDINI-NAXOS	Orto Grande	Consolidamento versante - Località Orto Grande	2.200.000,00
ME176B/10	ME	GIARDINI-NAXOS	Comprensorio urbano	Erosione costiera Porto Recanati	1.400.000,00
ME075B/10	ME	GUALTIERI SICAMBYO'	Comprensorio urbano	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	1.651.041,00
ME076A/10	ME	ITALA	Frazione Borgo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Frazione Borgo	1.500.000,00
ME077A/10	ME	LENI	Finella	Opere di difesa costiera a difesa del centro abitato	1.500.000,00
ME082B/10	ME	LIMINA	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	1.666.000,00
ME083B/10	ME	LONGI	Comprensorio urbano	Interventi di consolidamento del centro abitato	1.474.985,06
ME084B/10	ME	MALFA	Comprensorio urbano	Consolidamento del costone roccioso compreso tra Punta Scario e Pollara	1.000.000,00
ME085B/10	ME	MALVAGNA	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	1.000.000,00
ME086B/10	ME	MANDANICI	Comprensorio urbano	Opere di salvaguardia centro abitato	1.149.942,49
ME090B/10	ME	MILITELLO ROSMARINO	Comprensorio urbano	Consolidamento all'interno del centro abitato in c/da Ramisi	1.500.000,00
ME093B/10	ME	MONFORTE SAN GIORGIO	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	1.200.000,00
ME094B/10	ME	MOTTA CAMASTRA	Comprensorio urbano	Completamento consolidamento del Centro Abitato per le zone Nord di Rocca Mancusa	993.521,35
ME096B/10	ME	NOVARA DI SICILIA	Comprensorio urbano	Consolidamento del centro abitato	399.110,40
ME097B/10	ME	PAGLIARA	Comprensorio urbano	Interventi di consolidamento del centro abitato	1.000.000,00
ME098B/10	ME	PATTI	Comprensorio urbano	Consolidamento frazione Sorrentino	1.085.544,63
ME101B/10	ME	REITANO	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento centro abitato	980.000,00
ME102B/10	ME	ROCCALUMERA	Comprensorio urbano	Consolidamento del centro abitato	850.000,00
ME103B/10	ME	ROCCAVALDINA	Comprensorio urbano	Consolidamento centro abitato	1.885.000,00
ME104B/10	ME	ROCCELLA VALDEMOINE	Comprensorio urbano	Opere di salvaguardia centro abitato	875.000,00
ME105A/10	ME	ROMETTA	Lungomare centro abitato	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	1.000.000,00
ME106A/10	ME	SANT'ALESSIO SICULO	Centro abitato	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato	5.000.000,00
ME108B/10	ME	SAN PIER NICETO	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	1.550.000,00
ME110A/10	ME	SAN PIERO PATTI	Centro abitato - Via L. Da Vinci, Via Catania, Via Umbria, Via Roma, SP. 122 San Piero Patti - Favoscuvo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica del centro abitato	1.850.000,00
ME111B/10	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Comprensorio urbano	Consolidamento centro abitato	1.300.000,00
ME112B/10	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Comprensorio urbano	Consolidamento ed eliminazione rischio idrogeologico perimetro urbano in Contrada Grazie in prossimità del Viale dei Pini	1.200.000,00
ME114B/10	ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	Comprensorio urbano	Intervento di difesa idraulica del centro abitato	1.710.000,00
ME116B/10	ME	SAVOCA	Comprensorio urbano	Consolidamento centro abitato	1.195.875,88
ME117B/10-1	ME	SCALETTA ZANCLEA	Comprensorio urbano	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della c/da Guldomandri Superiore Codice PAI 102-55Z-016	2.700.000,00
ME117B/10-2	ME	SCALETTA ZANCLEA	Comprensorio urbano	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della c/da Guldomandri Superiore Codice PAI 102-55Z-020	1.000.000,00
ME118A/10	ME	SCALETTA ZANCLEA	Centro abitato - T. Divieto	Sistemazione idraulica a monte del centro abitato - Zona Torrente Divieto	1.400.000,00
ME122B/10	ME	SPADAFORA	Comprensorio urbano	Consolidamento centro abitato	1.327.891,32
ME123A/10	ME	SPADAFORA	Fraz S. Martino	Consolidamento dell'area - Fraz. S. Martino	1.500.000,00
ME124A/10	ME	TERME VIGLIATORE	Terme Marchesana	Ripascimento scogliere - Zona Terme Marchesana	3.823.875,00
ME127A/10	ME	TORTORICI	S.Paolo	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - Zona S.Paolo	2.300.000,00
ME129A/10	ME	TORTORICI	Via Zappulla	Opere di consolidamento, regimazione idraulica e drenaggi - Zona via Zappulla	4.000.000,00
ME130A/10	ME	TUSA	Castel di Tusa (Viale Europa Unita)	Proseguimento della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	1.500.000,00
ME131B/10	ME	UCRIA	Comprensorio urbano	Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile-Belvedere	1.261.000,00
ME133B/10	ME	VALDINA	Comprensorio urbano	Protezione, Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - versante Est	2.000.000,00
ME134B/10	ME	VENETICO	Comprensorio urbano	Consolidamento del centro abitato	1.554.100,81
PA135B/10	PA	ALTOFONTE	Comprensorio urbano	Consolidamento centro abitato	789.270,00
PA138B/10	PA	CALTAVUTURO	Comprensorio urbano	Consolidamento centro abitato	793.690,51
PA139A/10	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	C/da Belvedere	Opere di consolidamento - C/da Belvedere	1.500.000,00
PA140A/10	PA	CAMPOREALE	Centro abitato	Opere di consolidamento del centro abitato -	1.500.000,00
PA144B/10	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Comprensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato:versante Est a difesa della Scuola Elementare di Via Mazzini, ecc.	1.600.000,00
PA145A/10	PA	CASTRONOVO DI SICILIA	Centro Urbano	Opere di consolidamento centro urbano	1.344.000,00
PA146B/10	PA	GERACI SICULO	Comprensorio urbano	Progetto di consolidamento della zona nord orientale	1.057.000,00

PA147B/10	PA	MARINEO	Comrensorio urbano	Consolidamento centro abitato	2.257.528,69
PA148A/10	PA	MEZZOJUSO	Collina Brigna	Opere di consolidamento - Zona Collina Brigna	2.144.660,00
PA150A/10	PA	PALERMO	C/da Belmonte Chiavelli	Opere di regimazione idraulica - C/da Belmonte Chiavelli	4.300.000,00
PA151B/10	PA	PARTINICO	Comrensorio urbano	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio	950.000,00
PA152A/10	PA	PETRALIA SOTTANA	Quartiere Casale e Scavarello	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello	1.200.000,00
PA153B/10	PA	POLIZI GENEROSA	Comrensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	908.469,01
PA155B/10	PA	TERMINI IMERESE	Comrensorio urbano	Intervento di monitoraggio del centro abitato	198.195,38
RG158B/10-1	RG	MODICA	Comrensorio urbano	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato	2.000.000,00
RG158B/10-2	RG	MODICA	Comrensorio urbano	Consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso della collina Monserrato	1.000.000,00
RG160B/10	RG	RAGUSA	Comrensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	1.674.051,32
SR164B/10	SR	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Comrensorio urbano	Opere di salvaguardia e difesa del centro abitato	719.000,00
SR166B/10	SR	ROSOLINI	Comrensorio urbano	Opere di consolidamento del centro abitato	1.500.000,00
TP170B/10	TP	POGGIOREALE	Comrensorio urbano	Consolidamento versante orientale dell'abitato	1.500.000,00
TP171A/10	TP	SALEMI	C/da Monte Rose	Sistemazione del costone roccioso Monte Rose a monte della via Marsala - Zona C/da Monte Rose	1.650.000,00
TP173A/10	TP	TRAPANI	Salinagrande	Opere di regimazione idraulica - Zona Salinagrande	4.000.000,00
TOTALE					151.644.604,81

**INTERVENTI COFINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA**  
(1° Atto Integrativo all'Accordo di programma del 3/05/2011)

CODICE	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
AG1918/10	AG	NARO	Zone adiacenti la via rotabile Agrigento e tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla SS 576	Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato	1.057.000,00
AG1928/10	AG	PALMA DI MONTECHIARO	Centro urbano	Lavori di rinaturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano	1.800.000,00
CT1938/10	CT	SANT'ALFIO	Torrente Tagliaborse	Completamento consolidamento costone	1.900.000,00
PA1828/10	PA	CORLEONE	Contrada San Giovanni	Messa in sicurezza costone roccioso	1.578.183,23
PA1838/10	PA	POLLINA	Rupe San Pietro	Consolidamento	800.000,00
TP1908/10	TP	SAN VITO LO CAPO	Cala di Grottazza nel territorio comunale	Consolidamento del tratto di costa	1.350.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>8.495.183,23</b>

**INTERVENTI COFINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA**  
(2° Atto Integrativo all'Accordo di programma del 28/10/2014)

CODICE	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
ME2068/10	ME	Antillo	Canigiani	Opere di drenaggio e contenimento statico a monte del Centro abitato di Canigiani e sistemazione idraulica dell'alveo del torrente a lato dell'abitato	1.500.000,00
ME2078/10	ME	Barcellona P.G.	C.da Carmine	Consolidamento centro abitato Barcellona C.da Carmine	800.000,00
ME2088/10	ME	Castroreale	C.da Calo - Via Nazionale	Consolidamento centro abitato C.da Calo - Via Nazionale	800.000,00
ME2098/10	ME	Condò	Ariella	Centro abitato di Condò: 3 dissesti 1) periferia nord in prossimità dell'imbocco della SP 65; 2) a monte della SP 65; 3) periferia est C.da	1.200.000,00
ME2108/10	ME	Messina	Villaggio Mill S.Pietro	Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel vill. Mill S.Pietro	1.270.000,00
ME2118/10	ME	Milazzo	Castello	Intervento di consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo -	1.350.000,00
ME2128/10	ME	Pace del Mela	Torrente Bagnara - affluente Rio Cucugliata o S. Archi	Intervento di realizzazione di opere idrauliche, di adeguamento delle sezioni e di innalzamento argini del torrente Bagnara	1.400.000,00
ME2138/10	ME	Roccalvina	Centro abitato di San Salvatore	Intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del centro abitato di San Salvatore	1.000.000,00
ME2148/10	ME	Rodi Milici	C.da Gerbia nel centro abitato di Rodi	Lotto di completamento lavori di consolidamento del versante Sud a protezione Gerbia del centro Rodi	1.000.000,00
ME2158/10	ME	Saponara	Frazione S.Pietro	Sistemazione idraulico forestale raccolta e regimentazione delle acque etc. Borgata Monachella Fraz. S.Pietro	1.700.000,00
ME2168/10	ME	Saponara	Centro abitato	Sistemazione idraulico forestale raccolta e regimentazione delle acque Ingresso Saponara Centro zona Madonnina	1.570.000,00
ME2178/10	ME	Villafraanca Tirrena	Frazione Calvaruso	Lavori per la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione Calvaruso	1.400.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>15.000.000,00</b>

<b>TOTALE ACCORDO</b>	<b>350.588.362,76</b>
-----------------------	-----------------------

**SEZIONE PROGRAMMATICA**

**INTERVENTI DA FINANZIARE CON EVENTUALI ECONOMIE  
DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA SEZIONE ATTUATIVA**

CODICE	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
ME051A/10	ME	All Terme	Centro abitato	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	3.000.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>3.000.000,00</b>



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

20 gennaio 2015

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 4FEDE6DCE14A830E758464A0763A1F39

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: Ministero ambiente e tutela del territ. e mare/97047140583

Nome comune: Galletti Gian Luca

Numero di serie del DN: IT:GLLGLC61L15A944G

Nome: Gian Luca

Cognome: Galletti

DN Qualifier: 13136031

Titolo: Ministro

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification AuthorityC

Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 04/06/2014 00.00.00

Certificato valido fino al: 03/06/2017 23.59.59

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 20/01/2015 11.56.52

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 20/01/2015 11.59.29

Esito: Verifica Corretta

Firmatario 2

Numero di serie: 3BE6499A974055BA

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: REGIONE SICILIANA/80012000826

Unità Organizzativa: UFFICIO DI GABINETTO

Unità Organizzativa: ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

Titolo: ASSESSORE

Cognome: CROCE

Nome: MAURIZIO

Numero di serie del DN: IT:CRMRZ71S02F158G

Nome comune: MAURIZIO CROCE

DN Qualifier: 2423-1417528647303

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: Actalis S.p.A./03358520967

Unità Organizzativa: Qualified Certification Service Provider

Nome comune: Actalis Qualified Certificates CA G1

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.159.1.1.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.2

InfoCert S.p.A.

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)





**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Elenco dei principali dati relativi alla Firma**

**20 gennaio 2015**

Limite D'Uso: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 02/12/2014 13.58.12

Certificato valido fino al: 02/12/2016 13.58.12

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 15/12/2014 14.17.54

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 20/01/2015 11.59.29

Esito: Verifica Corretta

**InfoCert S.p.A.**

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)
