

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014*

Prot 5217 del 08 AGU. 2018

Al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
segreteria.ministro@pec.minambiente.it
dgsta@pec.minambiente.it

Al Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno
gab.mincoesionemezzogiorno@pec.governo.it

All'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

e p.c.

All'Agenzia di Coesione e Sviluppo
direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it

Al Dipartimento per le Politiche di Coesione
dip.politichecoesione@pec.governo.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro
dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale della Programmazione
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.

Trasmissione relazione sulle attività espletate al 31 luglio 2018

Si trasmette relazione descrittiva analitica, trasmessa in data 2/08/2018 dal Soggetto attuatore, relativa alle attività espletate dall'Ufficio del Commissario di Governo alla data del 31 luglio 2018

Cordiali Saluti

Il Presidente

n.q. di Commissario di Governo

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n°164/2014*

Nello Musumeci



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014*

Relazione al 31 Luglio 2018

02/08/2018

Soggetto Attuatore
Dott. Maurizio Croce

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Croce", written over the printed name of the subject.



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

1. ISTITUZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO

1.1 – Il Commissario Straordinario Delegato

Le attività dei commissari regionali straordinari delegati hanno avuto inizio con l'articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale possano essere utilizzate anche tramite accordi di programma sottoscritti dalle Regioni interessate e dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, consentendo alle Regioni di operare con la massima flessibilità operativa e di far confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad una programmazione organica ed unitaria rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico.

Alla luce della disposizione di legge sopra richiamata, in data 30/03/2010 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programma finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, elencati nell'Allegato 1 allo stesso Accordo di Programma e volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori sono stati autorizzati ad avvalersi di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, da nominarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1.2 - Il Presidente della Regione nelle funzioni di Commissario Straordinario Delegato

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 24/06/2014 n° 91, pubblicato in pari data sulla GURI, sono subentrati nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati, relativamente ai territori di competenza, i Presidenti delle Regioni i quali, ai sensi dei commi 2ter e 4 dell'art. 10 del DL 91/2014 convertito con legge 11/08//2014 n. 116, possono *"delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

1.3 - Il soggetto Attuatore

i Presidenti delle Regioni i quali, ai sensi dei commi 2ter e 4 dell'art. 10 del DL 91/2014 convertito con legge 11/08//2014 n. 116, possono *"delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116 - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato, al quale



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014*

sono stati altresì delegati i poteri di firma del Commissario di Governo.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 518 del 18/03/2015 è stato successivamente nominato Soggetto Attuatore il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale di Protezione Civile ing. Calogero Foti, riconfermato nell'incarico con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 529 del 03/07/2015.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 570 del 15/09/2017 è stato nominato Soggetto Attuatore il Dott. Maurizio Croce che riveste tale incarico anche alla data odierna.

1.4 - La Normativa vigente

Le attività del Commissario Delegato sono comprese in diverse normative che conferiscono allo stesso competenze e poteri di deroga utili all'attuazione degli interventi, e più precisamente:

- **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO**: decreto-legge 24/06/2014 n° 91, pubblicato in pari data sulla GURI, sono subentrati nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati, relativamente ai territori di competenza, i Presidenti delle Regioni i quali, ai sensi dei commi 2ter e 4 dell'art. 10 del DL 91/2014 convertito con legge 11/08/2014 n. 116 al fine di completare le attività di cui agli accordi di programma;
- **PROGRAMMAZIONI DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO**: LEGGE 11 novembre 2014, n. 164 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (G.U. n. 262 dell'11 novembre 2014), che prevede, all'art. 7, comma 2 come a partire dalle programmazioni 2015 in materia di contrasto al dissesto idrogeologico siano assicurate dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- **PATTI PER LO SVILUPPO**: Delibere CIPE 25 e 26 del 2016 e sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Sicilia, o i Sindaci delle Aree Metropolitane per i Patti relativi alle stesse, prevedono assegnazioni e stanziamenti di risorse utili al contrasto per il dissesto idrogeologico la cui attuazione è assicurata dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, giusta L. 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", art. 1, comma 512 che prevede come "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, "..... *confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati* " cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116". Le Delibere Regionali ne coordinano la governance.
- **FONDO PROGETTAZIONE**: Delibera CIPE 32/2015 e DPCM 14 luglio 2016 che prevedono 100 MLN di Euro da destinare alla progettazione esecutiva di interventi utili alla mitigazione del rischio idrogeologico di competenza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, sull'intero territorio nazionale. La Regione Siciliana risulta beneficiaria per un importo complessivo pari ad € 15.925.000,00.

1.5 - La Struttura Commissariale

Secondo quanto disposto dall'art. 1 dell'OPCM 3886 del 09 luglio 2010, come modificato ed integrato dall'art. 21 dell'OPCM 3916 del 30 dicembre del 2012 che ha ulteriormente dettagliato i compiti e i poteri del Commissario



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014*

Straordinario Delegato-Soggetto Attuatore, ai fini del sollecito espletamento delle attività tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario Straordinario Delegato può avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Il Commissario ha pertanto istituito con Disposizioni Commissariali nn. 3, 5 e 6 del 2010 un gruppo di lavoro.

Con DPCM del 20/07/2011 sono state impartite ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati di dare attuazione agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, prevedendo tra l'altro la possibilità di dotarsi di una struttura di supporto per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi.

A tal fine il gruppo di lavoro è stato incrementato avvalendosi di altro personale proveniente da Dipartimenti Regionali, dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, dal Ministero Pubblica Istruzione, dalla Regione che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 21 della OPCM 3916/10, è stato posto in posizione di comando sia a tempo pieno che parziale, nel numero massimo di 10 unità, oltre che il personale utilizzato ai sensi del C. 4 dell'Art. 1 della OPCM 3886/10.

Con l'art.7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 2011, il numero dei componenti è stato elevato a 20 unità.

Con provvedimento prot. 3845 del 07/08/2015 è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 529 del 03/07/2015.

Con deliberazione di Giunta Regionale 411 del 13/12/2016 sono state assegnate all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo dei fondi previsti per la realizzazione degli interventi prioritari e strategici per il territorio come individuati – per aree di intervento- nel Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana ex D. CIPE n. 26/2016.

In considerazione delle risorse assegnate e delle specifiche competenze attribuite all'ufficio del Commissario di Governo, con relazione prot. 5465 del 21/12/2016 il Soggetto attuatore pro tempore, ing. Calogero Foti, ha sottoposto all'attenzione del Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo la necessità di incrementare il gruppo di lavoro dell'ufficio, risultante ormai sottodimensionato, sia in termini numerici che in termini di professionalità, proponendo uno schema di dotazione organica costituita da non oltre 50 unità di personale al fine di completare tutte le attività previste nell'Accordo di programma siglato il 30 marzo 2010 e nei successivi atti integrativi e al fine di avviare ogni utile iniziativa per la completa attuazione degli interventi a valere della delibera CIPE 26/2016.

Con decreto commissariale n. 573 del 22 dicembre 2016 – in attuazione della citata delibera di giunta regionale n.411/2016 – è stata approvata una nuova dotazione organica, funzionale alle nuove competenze attribuite all'ufficio, costituita da non oltre 50 unità di personale, tra funzionari direttivi, istruttori ed eventuali collaboratori esterni, da selezionare mediante atto di interpello per il personale organico della pubblica amministrazione e tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse per i collaboratori esterni.

Con deliberazione n.169 del 21 aprile 2017 la Giunta regionale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, ha modificato la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SIGECO, in luogo Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, e individuando quest'ultimo quale organismo intermedio nell'ambito Patto per il Sud , area tematica "Ambiente", obiettivo strategico " Dissesto idrogeologico".

Con decreto commissariale n. 249 del 10 maggio 2017, in considerazione della strategicità e complessità degli interventi così come implementati dalle ulteriori competenze affidate al Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, nonché per ridurre i tempi per il raggiungimento degli obiettivi, è stata modificata la dotazione organica della struttura commissariale di cui al citato decreto n. 573/2016 prevedendo una struttura commissariale costituita da non oltre 51 unità di personale.

Con Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12/09/2017 è stato approvato il piano di rafforzamento dell'Ufficio



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.

Nel seguito viene riportato l'elenco del personale di cui è dotata la struttura Commissariale, con indicazione dell'Amministrazione di appartenenza e della disposizione di nomina e decorrenza.

Tabella riepilogativa del personale in posizione di comando

PERSONALE in posizione di comando ex art. 1, c. 4, c. 5 e c. 7 ex OPCM 3886/2010, così come modificato ed integrato dall'art. 21, dell'OPCM 3916/10 e dall'art. 7 dell'OPCM 3975/11 ex art. 1, c. 5 del DPCM del 20.07.2011			
N° ordine	Cognome e nome	Amministrazione di appartenenza Ruolo nell'ufficio del commissario	Disposizione Commissariale di nomina e decorrenza
1	AZZARA CIRO	Risorse Ambiente Palermo S.p.A	Provvedimento. n.536 del 04/02/2016 – orario pomeridiano
2	ARNONE MARIA FRANCESCA	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Disp. Comm. n. 42 del 09.12.2013 di proroga comando con decorrenza dal 01.01.2013
3	BRUNO MADDALENA	Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia	Disp. Comm. n. 20 del 22.12.2014 di proroga comando fino al 31/12/2016
4	CIRRINCIONE GIROLAMO	Regione Siciliana - Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale - Servizio 8 Autoparco regionale	Disposizione Comm. n. 4 del 29.01.2015 – cessazione comando Disposizione Commis. N. 23 del 11.12.2017
5	DI MAGRO GIOVANNI PIERO	Regione Siciliana - Assessorato Energia e Servizi Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti	Disp. Comm. Prot. n. 4185 del 15.09.2015 – Decr. Ass. n. 441/Gab del 28/09/2015 -
6	FERRANTE GIUSEPPE	Regione Siciliana – Ass. Infrastrutture e Mobilità	Disp. Comm. n. 36 del 09.12.2013 proroga comando.
7	FERRANTE MARCO	Risorse Ambiente Palermo S.p.A	Provvedimento. n.535 del 04/02/2016 – orario pomeridiano
8	GENTILE BIAGIO	Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti- genio civile	Disp. Comm. n. 43 del 09.12.2013 proroga comando
9	GRECO LUCCHINA ENZO PIETRO	Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti	Disp. Comm. n. 10 del 08.09.2017
10	LA FATA VINCENZO	Regione Siciliana - Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro Dipartimento del Lavoro	Disposizione 9 del 14/03/2013 - Posto in quiescenza dal 01/10/2017, nota F.P. n.62213 del 31/05/17



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

11	LA PLACA GIUSEPPE	Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti	Disp. Comm. n. 38 del 09.12.2013 proroga comando
12	LI CAUSI PASQUALE ROBERTO	Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi	Disp. Comm. n. 5 del 05.07.2017
13	LOMBARDO VINCENZO	Comune di Altavilla Milicia	Disp. Comm. n. 45 del 09.12.2013 proroga comando – cessazione comando Dispos. Comm n.1 del 30/01/2017
14	MANCUSO FRANCO	ATO MESSINA 4	Disp. Comm. n. 2 del 25.02.2016 – cessazione avvalimento dal 31/07/17 per scadenza del comando
15	NICASTRO ANGELO SALVATORE	Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti Responsabile Area Personale	Disp. Comm. n. 40 del 09.12.2013 proroga comando
16	NICOLICCHIA PIETRO	Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti	Disp. Comm. n. 15 del 10.10.2017
17	SPARACINO ROMINA	Regione Emilia Romagna	Disp. Comm. n. 31 del 09.12.2013 proroga comando
18	PROFETA RENATO	Regione Siciliana - Presidenza della Regione - Segreteria Generale	Disp. Comm. n. 28 del 27.11.2013 proroga comando
19	MAMMO ZAGARELLA DIEGO	Invitalia Attività Produttive S.p.A.	Disposizione n. 4 del 05.07.2017
20	REALE TERESA	ATO MESSINA 4	Disp. Comm. n. 23 del 26/11/2013 proroga comando
21	SAVETTIERE UGO	Regione Siciliana - Presidenza della Regione – Dipartimento Protezione Civile	Disp. Comm. n. 76 del 22/02/2016
22	SCAPARRA ROSA	Comune di Gangi	Disp. Comm. n. 20 del 26/11/2013 proroga comando
23	TUCCIO EMANUELE	Comune di Gela	Provved. 31578 del 21.03.2017 cessazione comando Dispos. Comm n.24 del 11/12/2017
24	USTICANO FRANCESCA	Comune di Castellammare del Golfo	Disp. Comm. n. 26 del 26/11/2013 proroga comando
25	VALLONE STEFANIA	Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi Responsabile Monitoraggio	Disp. Comm. n. 08 del 12.07.2017
26	ZAMBUTO MARCO	Ministero della Pubblica Istruzione	Disp. Comm. n. 9 del 08.09.2017



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

Tabella riepilogativa dei rapporti di collaborazione

Il Decreto Commissariale del 10/05/2017 n. 249 , in considerazione della strategicità e complessità degli interventi così come implementati dalle ulteriori competenze affidate al Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, nonché per ridurre i tempi per il raggiungimento degli obiettivi, ha modificato la dotazione organica dell'Ufficio di cui al precedente decreto 573/2016, prevedendo una struttura commissariale costituita da non oltre 51 unità di personale e pertanto sono state contrattualizzate n. 21 figure esterne (n.1 profilo "A" - n. 10 profilo "B" - n. 10 profilo "C", - vedi avviso pubblicato in data 4 gennaio 2017

<i>Incarico</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Titolo professionale e profilo</i>	<i>Disposizione commissariale di nomina</i>
Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa	Puccio Salvo	Geologo Profilo A Coordinatore della struttura commissariale	Decreto di nomina n. 103 del 27/02/2017 – contratto con scadenza 27/02/2020
	Sergi Maria	Archeologo Profilo B	Decreto di nomina n. 625 del 22/09/2017 – contratto con scadenza 22/09/2020
	Scimone Alessia	Ingegnere Profilo B	Decreto di nomina n. 394 del 20/06/17 – contratto con scadenza 20/06/2020
	Grassi Adriano	Ingegnere Profilo B Referente ufficio gare	Decreto di nomina n. 273 del 23/05/2017 – contratto con scadenza 23/05/2020
	Giordano Marco	Ingegnere Profilo B	Decreto di nomina n. 398 del 20/06/17 – cessato con Decreto 590 del 05/09/2017
	Daina Ester	Avvocato Profilo B	Decreto di nomina n. 396 del 20/06/2017 – contratto con scadenza 20/06/2020
	Gaglio Gerlando	Geologo Profilo B	Decreto di nomina n. 272 del 23/05/2017 – contratto con scadenza 23/05/2020
	Cannella Calogero	Geologo Profilo B	Decreto di nomina n. 397 del 20/06/17 – contratto con scadenza 20/06/2020
	Caffarelli Alessandra	Ingegnere Profilo B	Decreto di nomina n. 398 del 20/06/17 – contratto con scadenza 20/06/2020
	Iacono Manno Daniela	Ingegnere Profilo B Responsabile Area Amministrativa	Decreto di nomina n. 270 del 23/05/2017 – contratto con scadenza 23/05/2020
	Zumbè Rossella	Ingegnere Profilo B	Decreto di nomina n. 393 del 20/06/2017 – contratto con scadenza 23/05/2020
	Vinci Irene	Ingegnere Profilo B	Decreto di nomina n. 274 del 23/05/2017 – contratto con scadenza 23/05/2020
	Cascino Fabrizio	Geometra Profilo C	Decreto di nomina n. 269 del 23/05/2017 – contratto con scadenza 23/05/2020
	Barcellona Alberto	Diploma maturità Classica Profilo C	Decreto di nomina n. 389 del 20/06/2017 – contratto con scadenza 23/05/2020



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

Bonura Sara F.	Laurea Giurisprudenza Profilo C	Decreto di nomina n. 390 del 20/06/2017 – contratto con scadenza 23/05/2020
Cannistraci Simona	Laurea in Scienze Politiche Profilo C	Decreto di nomina n. 391 del 20/06/2017 – contratto con scadenza 20/06/2020
Lipari Andrea	Geologo Profilo C	Decreto di nomina n. 392 del 20/06/2017 – contratto con scadenza 20/06/2020
Mancuso Anna Maria	Laurea Giurisprudenza Profilo C	Decreto di nomina n. 387 del 20/06/2017 – contratto con scadenza 23/05/2020
Sorce Vincenzo	Ingegnere	Decreto di nomina n. 388 del 20/06/2017 – contratto con scadenza 20/06/2020
Venuti Rossella	Geometra Referente Area Tecnica	Decreto di nomina n. 271 del 23/05/2017 – contratto con scadenza 23/05/2020
Vitale Giuseppina	Diploma maturità scientifica	Decreto di nomina n. 386 del 20/06/2017 – contratto con scadenza 20/06/2020
Volpe Salvatore	Geologo	Decreto di nomina n. 385 del 20/06/2017 – contratto con scadenza 20/06/2020

2. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

2.1 - Premessa – Piani e programmi affidati alla struttura commissariale

Con l'entrata in vigore del decreto legge 12/09/2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014 n. 164, così detto "Sblocca Italia", all'art. 7 comma 2, al Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo è stata affidata l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge 20/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116.

Al 31/12/2017 risultava affidata al Commissario di Governo l'attuazione degli interventi previsti dai provvedimenti o programmi di seguito in dettaglio specificati:

- A. Accordo di Programma del 30/03/2010 e successivi Atti Integrativi
- B. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Direzione Generale per il clima e l'energia n° 349/CLE del 14/12/2015"
- C. Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico
- D. Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio (DPCM 15/09/2015)
- E. Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Palermo
- F. Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina
- G. Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud)
- H. PAC Nuove Azioni - Interventi di mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorgono il Duomo, l'intera area diocesana ed il centro storico di Agrigento in adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

di Giunta Regionale n.150 del 20/05/2011, n. 151 del 20/06/2014, n. 203 del 10/08/2015 e n. 490 del 30/10/2017

- I. PAC Nuove Azioni - Interventi di manutenzione delle opere di difesa degli alvei fluviali di cui al D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 1026 del 23 novembre 2015, in adempimento di quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta n. 151 del 20 giugno 2014, n. 203 del 10 agosto 2015 e n. 490 del 30 ottobre 2017 previo eventuale aggiornamento delle priorità.

Si riporta di seguito una sintesi dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

2.2 – Accordo di Programma 2010 ed atti integrativi

Prospetto riepilogativo degli interventi lettera "A" e lettera "B" di competenza del Commissario

In definitiva al Commissario è attribuita la competenza dell'attuazione di 142 interventi come elencati nel prospetto riepilogativo di seguito riportato che tiene conto:

- dei 102 interventi lettera "A" elencati nel III Atto Integrativo;
- della suddivisione di n° 4 interventi (AG001, ME089_4, ME099 e ME219) in 11 sub-interventi, con un incremento quindi di 7 sub-interventi;
- dell'accorpamento dei 2 interventi PA180 e PA181 in un intervento unitario con un decremento di 1 intervento;
- della realizzazione di 11 interventi relativi a lavori complementari;
- dei 23 interventi lettera "B" di competenza della Regione per i quali il Soggetto Attuatore è stato individuato come beneficiario del finanziamento.

INTERVENTI	Lettera "A"	Lettera "B"	totale
Interventi principali III Atto Integrativo	102	23	125
Lavori complementari	11	0	11
Interventi derivanti da suddivisione dell'intervento principale	7	0	7
Interventi accorpati (PA180-PA181)	-1	0	-1
TOTALE	119	23	142

2.3 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI LETTERA "A" al 31/07/2018


Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli interventi lettera "A" previsti nel III Atto Integrativo, suddivisi in relazione allo stato di attuazione:



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014


STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI lettera "A"			
Fase di attuazione	N° interventi	Importo da III Atto Integrativo	% sul totale
Interventi in fase di progettazione, acquisizione pareri, approvazione e finanziamento	11	12.480.000,00	7,11%
Interventi in fase di gara o aggiudicazione e contratto lavori	5	4.900.000,00	2,79%
Interventi in fase di esecuzione	8	12.128.010,50	6,91%
Interventi ultimati e/o collaudati	95	145.327.459,92	82,83%
Economie da riprogrammare		613.104,30	0,35%
TOTALE	119	175.448.574,72	100,00%

N° interventi



- Interventi in fase di progettazione, acquisizione pareri, approvazione e finanziamento
- Interventi in fase di gara o aggiudicazione e contratto lavori
- Interventi in fase di esecuzione
- Interventi ultimati e/o collaudati

% sul totale



- Interventi in fase di progettazione, acquisizione pareri, approvazione e finanziamento
- Interventi in fase di gara o aggiudicazione e contratto lavori
- Interventi in fase di esecuzione
- Interventi ultimati e/o collaudati
- Economie da riprogrammare



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

2.4 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI LETTERA "B*" al 31/07/2018

In merito ai 23 interventi lettera "B*" alla data del 31/12/2017, lo stato di attuazione può sintetizzarsi come segue:

N° 1 Intervento annullato:

1. TP190 SAN VITO LO CAPO – intervento annullato

N° 4 Interventi in fase di progettazione o di adeguamento del progetto al D.Lgs 50/2016:

2. AG174 CATTOLICA ERACLEA – adeguamento progetto in corso
3. ME068 FORZA D'AGRO' – progettazione in corso
4. SI_1_13016 - RG158 MODICA – Decreto 403/2015 di presa atto DDG finanziamento; è in corso l'adeguamento del progetto al D.Lgs 50/2016
5. SR166 ROSOLINI – intervento annullato in quanto transitato nel PATTO x il SUD

N° 2 Interventi con progetto esecutivo validato in attesa di DDG di finanziamento

1. AG004 CATTOLICA ERACLEA – progetto validato in attesa di finanziamento (decreto 892/2017)
2. AG014 SANTO STEFANO DI QUISQUINA - progetto validato in attesa di finanziamento (decreto 851/2017)

N° 5 Interventi con progetto esecutivo approvato, DDG di finanziamento ed in fase di avvio gara:

1. SI_1_14129 - PA140 CAMPOREALE – DDG 997 del 08/11/2017 di finanziamento intervento
2. SI_1_14121 – CL017 BUTERA – Decreto 141/2017 di presa atto DDG finanziamento
3. SI_1_14122 – CL018 BUTERA - Decreto 713/2017 di presa atto DDG finanziamento
4. SI_1_14127 – ME127 TORTORICI - Decreto 695/2017 di presa atto DDG finanziamento
5. SI_1_14130 – PA151 PARTINICO - Decreto 815/2017 di presa atto DDG finanziamento

N° 5 Interventi in fase di esecuzione lavori:

1. SI_1_10778 – CL019 CALTANISSETTA – pagati anticipazione e SAL1 (caricati su CARONTE)
2. SI_1_11241 – CT039 SANT'AGATA LI BATTIATI – pagati: SAL1
3. SI_1_14065 – ME105 ROMETTA – contratto 26/07/2016 - pagati: spese pubblicazione
4. SI_1_8845 – ME106 SANT'ALESSIO SICULO – pagati: SAL1 e SAL2 – presa atto PV
5. SI_1_13008 – PA148 MEZZOJUSO – contratto 11/04/2016 – pag ANAC e spese pubblicazione


N° 6 Interventi con lavori ultimati/collaudati e/o con DDG di chiusura intervento:

1. ME065 FICARRA (intervento realizzato con fondi statali)
2. SI_1_8250 - ME124 TERME VIGLIATORE – lavori collaudati
3. SI_1_8249 - ME130 TUSA - lavori collaudati
4. SI_1_11240 – CT028 LICODA EUBEA – lavori ultimati in attesa di collaudo
5. SI_1_13984 – CT038 SANTA VENERINA – lavori collaudati
6. SI_1_8608 - PA152 PETRALIA SOTTANA - lavori collaudati e DDG di chiusura intervento

Stato di attuazione interventi lettera "B*"	N°	Importo AdP	%
Interventi fermi per criticità	1	1.350.000,00	3,40%
Interventi in fase di progettazione, acquisizione pareri, validazione	4	5.084.163,28	12,81%
Progetti approvati in attesa di finanziamento	2	3.752.997,00	9,46%
Interventi finanziati in fase di gara	5	6.750.000,00	17,01%
Interventi in fase di esecuzione lavori	5	13.304.000,00	33,53%
Lavori ultimati	2	1.908.981,00	4,81%
Lavori collaudati	4	7.523.875,00	18,96%
SOMMANO	23	39.674.016,28	100,00%



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

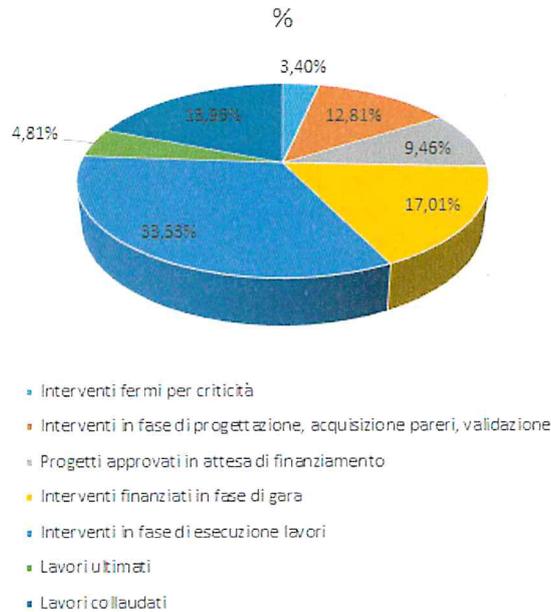

2.5 ALTRI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

In relazione ai programmi la cui attuazione è affidata alla struttura commissariale in aggiunta all'Accordo di Programma del 30/03/2010, si riporta di seguito una sintesi delle attività svolte e dello stato di attuazione al 31/12/2017.

2.5.1 - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Direzione Generale per il clima e l'energia n° 349/CLE del 14/12/2015 "

Con Decreto della Direzione Generale per il clima e l'energia D.D. n° 349/CLE del 14/12/2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha disposto il finanziamento di 3 interventi per l'importo complessivo di € 3.008.336,28 da trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto-legge 12/09/2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014 n. 164.

Codice RENDIS	Provincia	Comune	Titolo	Importo
19IR900/G1	ME	Casalvecchio Siculo	Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'autoparco comunale	208.336,28
19IR174/G1	PA	Sclafani Bagni	Lavori di salvaguardia, bonifica e consolidamento costoni rocciosi inerenti il centro abitato	1.000.000,00
19IR899/G1	ME	Montalbano Elicona	Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio	1.800.000,00
TOTALE				3.008.336,28

Con nota prot. 97 del 12/01/2016, assunta al protocollo 155/Gab in pari data, la Direzione Generale per il Clima e l'Energia ha trasmesso il D.D. 349/2015 all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, il quale ha immediatamente notificato il decreto D.D. 349/2015 al Commissario di Governo, individuato quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi, con le note:



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

Stato di attuazione degli interventi di cui al D.D. 349/2015 al 31/08/2018

In ottemperanza a quanto previsto dall'ex art. 3 dell'Accordo Procedimentale di cui al D.D. prot. n. 349/CLE del 14.12.2015, l'Ufficio commissariale ha proceduto all'inserimento nella piattaforma telematica RENDIS della documentazione aggiornata all'attuale stato dell'arte degli interventi finanziati come in dettaglio di seguito specificato:

B.1.1 - Codice RENDIS I9IR900/G1 CASALVECCHIO SICULO (ME) – “Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'autoparco comunale” – LAVORI ULTIMATI

Con decreto n° 345 del 22/07/2016 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo e a finanziare l'intervento per l'importo complessivo di € 208.336,28 di cui € 141.287,25 per lavori e € 67.049,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con decreto n° 474 del 19/10/2016 si è disposto di approvare lo schema di lettera d'invito e di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 3, comma 1, lettera uuu), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. c) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del GD.Lgs 50/2016;

Con decreto n° 509 del 10/11/2016 è stata nominata la commissione di valutazione delle offerte pervenute in relazione alla procedura negoziata;

Con decreto n° 42 del 24/01/2017 si è proceduto ad approvare i verbali di gara e a disporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori all'impresa ROMEO COSTRUZIONI srl con sede a Roccalumera in Via Umberto I n. 63, CF/Partita IVA 02911839830 che ha offerto un ribasso del 25,8795% corrispondenti ad un importo di € 105.807,79 di cui € 101.615,39 per lavori ed € 4.192,40 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA;

In data 14/03/2017 è stato sottoscritto tra il soggetto attuatore e l'impresa Romeo Costruzioni srl il contratto d'appalto registrato a Palermo in data 16/03/2017 al n. 3191 Serie 1T.

Con decreto n° 465 del 20/07/2017, si è provveduto ad approvare la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento post gara e ad assumere l'impegno di spesa nella misura di € 162.326,41, ad integrazione dell'impegno di spesa già assunto con i decreti n° 104/2017, 136/2017 e 157/2017, per un ammontare complessivo di € 208.336,28;

I lavori sono stati iniziati in data 27/03/2017 e sono stati ultimati in data 21/06/2017.

In merito all'avanzamento della spesa al 31/12/2017 sono stati effettuati i seguenti pagamenti per complessivi € 82.127,58.

Codice RENDIS 19IR899/G1 MONTALBANO ELICONA (ME) - “Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio”: LAVORI IN CORSO

Con decreto n° 40 del 24/01/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice dei contratti della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, a favore dell'Arch. Felice Testagrossa con un ribasso del 9,50% sull'importo a base di gara di € 95.768,78 corrispondenti a € 86.670,75 oltre oneri e IVA;

Con Decreto n° 540 del 04/08/2017 è stato approvato il progetto esecutivo validato dal RUP in data 27/07/2017 ed è stato finanziato l'intervento per l'importo complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.177.085,77 per lavori e € 600.393,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con Decreto n° 552 del 08/08/2017 si è disposto di prendere atto della determina a contrarre del RUP, di approvare lo schema di lettera d'invito e di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 3, comma 1, lettera uuu), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. c) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

Codice RENDIS 19IR174/G1 SCLAFANI BAGNI (PA) - "Lavori di salvaguardia bonifica e consolidamento dei costoni rocciosi inerenti il centro abitato" - LAVORI IN CORSO

Con decreto n. 6 del 11/01/2017 si è proceduto ad aggiudicare all'Ing. Michele Zafonti i servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

In data 22/02/2017 si è svolta la conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto esecutivo trasmesso dal RUP con nota prot. 1123 del 10/02/2017;

Il progetto esecutivo è stato verificato con verbale del 06/03/2017 e validato dal RUP con verbale del 06/03/2017;

Con Decreto n° 170 del 04/04/2017 si è disposto il finanziamento dell'intervento per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;

Con decreto a contrarre 425 del 05/04/2017 si è proceduto ad avviare la gara per l'affidamento dei lavori da svolgersi con procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del Codice invitando 15 operatori economici scelti dall'Albo delle imprese della stazione appaltante;

Con Decreto n° 514 del 02/08/2017 si è disposto di approvare lo schema di lettera d'invito e di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 3, comma 1, lettera uuu), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. c) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del GD.Lgs 50/2016;

Con Decreto n° 579 del 04/09/2017 si è proceduto a nominare la Commissione di valutazione delle offerte pervenute;

Con nuovo decreto a contrarre n. 819 del 02/08/2017, in ragione della natura dei lavori e ai fini di dell'acquisizione di una proposta migliorativa in fase di realizzazione dei lavori, si è ritenuto di autorizzare l'esperimento della gara con procedura aperta come definita dall'art. 3 comma 1 lettera sss) del Codice nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo Codice, con l'applicazione dei termini ridotti per la ricezione delle offerte (procedura accelerata) di cui all'art. 60 comma 3 del Codice in ragione dell'urgenza di eseguire i lavori.

Alla data odierna sono ancora in corso di espletamento le procedure di gara per l'affidamento dei lavori.

In merito all'avanzamento della spesa al 31/12/2017 sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

19IR900/G1	CASALVECCHIO SICULO (ME)	"Messa in sicurezza del tratto di strada di accesso all'autoparco comunale"	€ 154.825,38
19IR899/G1	MONTALBANO ELICONA (ME)	"Consolidamento del quartiere Serro a ridosso della strada di accesso alla via S. Antonio"	€ 88.281,60
19IR174/G1	SCLAFANI BAGNI (PA)	"Lavori di salvaguardia bonifica e consolidamento dei costoni rocciosi inerenti il centro abitato"	€ 3.065,35

3. Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

Per promuovere ed agevolare la realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, l'art. 55 della legge 28/12/2015 n. 221 ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" nel quale affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con Delibera CIPE n° 32 del 20/02/2015 nonché le risorse le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo.



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

Il Fondo è ripartito tra le Regioni e ciascuna quota è versata nella contabilità speciale del Presidente di ciascuna regione nella qualità di Commissario di Governo, al quale, fermi restando i poteri speciali e di deroga attribuiti dalla vigente normativa, è affidata la responsabilità diretta della alla creazione di un parco progetti sui quali far convergere le risorse di volta in volta disponibili per la realizzazione degli interventi.

La quota del Fondo assegnata alla Sicilia in base agli indicatori di cui al DPCM 05/12/2016 ammonta a complessivi € 15.925.200,00 ed il trasferimento alla contabilità speciale è prevista in tre quote pari al 26%, al 47% e al 27% del finanziamento, corrispondenti rispettivamente a € 4.140.552,00, € 7.484.844,00 e € 4.299.804,00.

Il funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" è disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016, che all'art. 2 ha previsto che: *"...Sono beneficiari delle risorse del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art.7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n°133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n°164"*.

Con nota prot. 0004633 del 01/03/2017, il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'avvio del procedimento per l'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento della progettazione a valere sul Fondo e per il trasferimento alla contabilità speciale del Commissario di Governo della prima quota delle risorse assegnate, richiedendo al Commissario di porre in essere ogni iniziativa finalizzata a date attuazione a quanto previsto dal DPCM 14/07/2016 anche alla luce della allegata "nota esplicativa" nella quale sono state dettagliate le peculiarità della gestione del Fondo e delle fasi amministrative connesse.

Per ciascuna regione il Ministero ha formulato una graduatoria preliminare degli interventi suscettibili di finanziamento della progettazione, tratta dai dati presenti nel data-base RENDIS sulla scorta della quale definire, sulla scorta di una successiva fase istruttoria, l'elenco definitivo delle progettazioni da finanziare e l'importo del relativo finanziamento a valere sul Fondo.

Allo scopo di dare seguito a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la citata nota prot. 4633/2017, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con nota prot. 21859 del 22 marzo 2017 ha richiesto di avviare una collaborazione con l'ufficio del Commissario di Governo utile all'aggiornamento del data base RENDIS necessario all'istruttoria degli interventi suscettibili di finanziamento della progettazione.

L'Ufficio ha, pertanto, estrapolato dal data-base RENDIS l'elenco preliminare degli interventi suscettibili di finanziamento della progettazione, completo dei dati relativi alla tipologia, importo, categoria, livello di progettazione, ordine di priorità e punteggio attribuito in base ai criteri di cui al DPCM 28/05/2015, provvedendo a:

- individuare gli interventi già finanziati con altri fondi trasferendoli nel gruppo "Interventi con finanziamento totale già acquisito" precisando la fonte di finanziamento;
- verificare la categoria del dissesto indicando nel caso di intervento misto la tipologia prevalente;
- integrare, ove necessario, la documentazione richiesta per lo studio preliminare di cui al comma 4 dell'art. 3 del DPCM 14/07/2016 ovvero integrare: una relazione illustrativa dell'ubicazione e natura del dissesto su cui si intende intervenire, dei suoi effetti, obiettivi, requisiti, modalità e costo, nonché degli elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, della compatibilità paesaggistica e dei vincoli archeologici dell'intervento;
- la stima sommaria dei lavori da eseguire;
- il quadro economico preliminare;
- il cronoprogramma orientativo di tutte le attività a partire dalla progettazione fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione;



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

- per gli interventi dotati di progetto definitivo precisare se è stato approvato indicando gli estremi dell'atto di approvazione;
- per gli interventi dotati di progetto esecutivo confermarne la disponibilità completando l'inserimento dei dati nel sistema;
- per gli interventi per i quali la progettazione è già stata affidata, indicare il livello di progettazione e e gli estremi dell'affidamento;
- per gli interventi che prevedono opere accessorie, verificare la completa compilazione dei campi relativi nel sistema;
- validare la scheda istruttoria una volta ultimati gli aggiornamenti dei dati nel sistema.

Sulla scorta dell'aggiornamento effettuato dall'Ufficio del Commissario, il Ministero, di concerto con la Struttura di Missione, ha condotto l'istruttoria definitiva verificando gli effettivi livelli di progettazione già conseguiti e disponibili, formalizzando la graduatoria degli interventi suscettibili di finanziamento della progettazione, ed attribuendo a ciascun intervento il finanziamento previsto dal DPCM 14/07/2016.

Con Decreto MATTM STA.DEC.STA. n° 571 del 21/12/2017 è stato approvato il primo stralcio di n. 39 interventi contro il dissesto idrogeologico per un importo di euro 10.868.905,53 a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione per come di seguito indicato:

Codice ReNDiS	Comune	Provincia	Descrizione	Importo totale in Rendis (Euro)	Importo da finanziare (Euro)
19IR021/G3	PALERMO	PA	Interventi di manutenzione canali di Maltempo e sistemazione degli argini canale	€ 5.500.000,00	€ 272.500,00
19IR039/G3	CATANIA	CT	Completamento collettore pluviale B	€ 48.821.000,00	€ 403.975,08
19IR975/G1			INTERVENTI DI REQUILIBRIO LITORANEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELLA SPIAGGIA IN LOCAL		
19IRA01/G1	NOTO	SR	Lavori di ricostruzione, protezione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale del litorale in I	€ 12.000.000,00	€ 496.003,50



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

19IR919/G1	CONDRO'	ME	Mitigazione rischio idrogeologico a protezione del centro abitato mediante sistemazione e risagomatu	€ 1.550.000,00	€ 159.595,80
19IRB64/G1	CAPO D'ORLANDO	ME	Intervento urgente per la difesa e salvaguardia di tratti dell'arenile di Capo d'Orlando	€ 4.985.000,00	€ 253.586,16
19IR988/G1	GALATI MAMERTINO	ME	CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO ZONA S. ANTONIO	€ 770.000,00	€ 66.000,00
19IRC17/G1	LETOJANNI	ME	Riqualificazione e recupero ambientale torrente Papale Comune di Letojanni	€ 2.800.000,00	€ 116.698,00
19IR938/G1	SCALETTA ZANCLEA	ME	Messa in sicurezza di C. Scaletta e ricostruzione della spiaggia a tutela delle strutture viarie	€ 4.650.000,00	€ 87.151,95
19IR911/G1	SCALETTA ZANCLEA	ME	Completamento dei lavori di protezione dell'abitato della Fraz. Divieto cod. PAI 102-5SZ-020	€ 1.541.386,48	€ 58.016,01
19IRC41/G1	PAGLIARA	ME	Lavori di sistemazione idraulica della Via Vallone Piazza a salvaguardia del centro abitato - codic	€ 1.500.000,00	€ 74.370,00
19IR533/G1	SAN PIERO PATTI	ME	Opere di consolidamento zona centro abitato compresa tra la via Leonardo Da Vinci e la Via Catania.	€ 2.010.000,00	€ 69.706,98



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

19IR928/G1	RAVANUSA	AG	COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLE AREE A VALLE DEL CENTRO ABITATO	€ 1.934.519,54	€ 67.823,89
19IR935/G1	ROMETTA	ME	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELLE AREE COSTIERE E DELLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE	€ 12.200.000,00	€ 183.234,15
19IR543/G1	SANTA TERESA DI RIVA	ME	Intervento di mitigazione del rischio idraulico, della fiumara d'Agro' a difesa del centro abitato	€ 2.417.000,00	€ 126.787,53
19IRB86/G1	PALERMO	PA	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI	€ 30.545.000,00	€ 1.599.400,11
19IR983/G1	LETOJANNI	ME	consolidamento mediante opere strutturali e di ingegneria naturalistica di protezione passiva e attiv	€ 7.000.000,00	€ 507.381,00
19IRB94/G1	PALERMO	PA	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALL	€ 1.900.000,00	€ 248.010,00
19IR966/G1	LIBRIZZI	ME	CONSOLIDAMENTO E CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE A TUTELA DI UNA PORZIONE DEL CENTRO ABITATO F	€ 2.025.000,00	€ 192.074,40
19IR422/G1	GALATI MAMERTINO	ME	Consolidamento e messa in sicurezza del versante località Pileri	€ 1.200.000,00	€ 135.664,20



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

19IRC57/G1	CALATI MAMERTINO	ME	Lavori di disaggancio massi a protezione dell'abitato di C.da Galini- Lotto di completamento	€ 450.000,00	€ 22.396,50
19IR961/G1	PATTI	ME	CONSOLIDAMENTO AREA URBANA CASE NUOVE RUSSO, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO - DISSEST	€ 1.980.000,00	€ 188.997,48
19IRB90/G1	PALESTRO	PA	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI DI MONTE GALLO SOVRASTANT	€ 2.025.000,00	€ 221.100,00
19IRB91/G1	PALERMO	PA	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI DI MONTE PELLEGRINO SOVRA	€ 12.707.000,00	€ 1.088.675,70
19IR202/G1	SPERLINGA	EN	CONSOLIDAMENTO DELL'AREA SOVRASTANTE IL CENTRO ABITATO E PARCO SUBURBANO ZONA CASTELLO	€ 1.800.000,00	€ 176.689,80
19IR156/G1	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	Eliminazione del rischio idrogeologico in Contrada Perriera	€ 1.400.000,00	€ 54.488,70
19IR893/G1	BELMONTE MEZZAGNO	PA	REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA DI RACCOLTA PIOGGIE INTENSE DEL VERSANTE S. CATERINA LUNGO IL M	€ 3.000.000,00	€ 44.955,00
19IRB62/G1	SALAPARUTA	TP	Progetto per il consolidamento mediante opere di risagomatura e rinforzo opere di sostegno; Opere d	€ 980.000,00	€ 119.813,40



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

19IR886/G1	FRANCOFONTE	EN	lavori di consolidamento per la mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato	€ 2.380.000,00	€ 216.347,88
19IRC59/G1	LETOJANNI	ME	Mitigazione dell'erosione cost. tratto di litorale compreso tra via Catania e torrente Letojanni	€ 6.500.000,00	€ 308.191,50
19IRB97/G1	MARO	ME	Consolidamento e Messa in Sicurezza Per La Mitigazione del rischio idrogeologico in località Sa	€ 1.000.000,00	€ 100.000,00
19IRC64/G1	PIAZZA ARMERINA	EN	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI SOTTOSTANTI VIA MAZZINI	€ 2.000.000,00	€ 190.365,00
19IRC50/G1	TAORMINA	ME	Opere di salvaguardia e restauro geoambientale della spiaggia di "Isola Bella".	€ 2.895.383,74	€ 161.734,98
19IR450/G1	MOTTA CAMASTRA	ME	Consolidamento e risanamento ambientale dell'area prospiciente la casa comunale sita in P.zza Croce a	€ 1.360.000,00	€ 53.490,78
19IRB92/G1	PALERMO	PA	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI DI MONTE GALLO AREA N-E	€ 5.000.000,00	€ 534.450,00
19IR235/G1	CASTELMOLA	ME	Progetto per il consolidamento dell'abitato di Castelmola nei tratti	€ 2.000.000,00	€ 69.457,50



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

19IRB63/G1	ANTILLO	ME	LAVORI DI REGIMENTAZIONE ALVEO TORRENTE ACQUA VENA, COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI, S	€ 4.700.000,00	€ 136.817,10
19IRC31/G1	PALERMO	PA	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI DI MONTE CUCCITELLO SOVRA	€ 850.000,00	€ 142.800,00
19IRB89/G1	PALERMO	PA	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI DI MONTE PELLEGRINO SOVRA	€ 2.132.000,00	€ 273.010,10
					€ 10.868.905,53

Risulta in corso di registrazione l'ulteriore decreto di finanziamento fino alla concorrenza di € 15.925.200,00 disponibili per la Regione Siciliana.

Il commissario di Governo ha provveduto, nella fase attuativa, a:

- definire i reali livelli di progettazione;
- acquisire le progettazioni da parte dei proponenti;
- calcolare le risorse necessarie per ogni singolo intervento ai fini delle procedure di gara;
- nominare i singoli responsabili dei procedimenti;
- procedere al finanziamento dei singoli servizi di ingegneria;

Risultano in corso, al 31 luglio 2018, le attività propedeutiche relative alle procedure di gara per i servizi di ingegneria ed architettura.

4. Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio (DPCM 15/09/2015)

Con DPCM del 15 settembre 2015 è stata individuata la lista degli interventi rientranti nel Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane come risultante dall'esito della selezione delle varie istanze di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico caricate sulla piattaforma telematica ReNDIS-web, ed è stata altresì prevista l'assegnazione alla Regione Siciliana di risorse per l'attuazione di interventi nelle aree metropolitane delle città di Catania, Messina e Palermo.

In particolare sono state assegnate risorse pari a:

- ✓ **€ 87.786.165,19** per il finanziamento dei seguenti interventi compresi nella **Tabella C** nella quale sono elencati gli interventi non compresi nella sezione attuativa che saranno ammessi a finanziamento previo svolgimento dell'istruttoria e redazione della graduatoria ai sensi del DPCM 28/05/2015:



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

Codice RENDIS	Titolo	Comune	Importo
19IRD68/G3	Sistemazione idraulica del Torrente Annunziata e ricostruzione dell'Alveo dissestato	Messina	2.000.000,00
19IR032/G3	Regimentazione delle acque piovane in via Trieste nella frazione Ficarazzi	Catania	399.888,16
19IR039/G3	Completamento collettore pluviale B	Catania	48.821.000,00
19IR011/G3	Riqualificazione ambientale e risanamento igienico-sanitario dell'alveo del torrente Cataratti-Bisconte	Messina	30.000.000,00
19IR043/G3	Completamento del I lotto della rete fognante del centro abitato stralcio rete acque bianche	Catania	1.265.277,03
19IR044/G3	Realizzazione tratti di rete acque bianche nel territorio comunale	Catania	2.300.000,00
19IR035/G3	Progetto rete fognante comunale mista – terzo lotto esecutivo	Catania	5.000.000,00

- ✓ **€ 5.500.000,00** per il finanziamento del seguente intervento compreso nell'**Allegato D** al DPCM nel quale sono indicati gli interventi di mitigazione del rischio alluvionale che presentano un livello di progettazione preliminare o studio di fattibilità indicati e validati dalle regioni in quanto prioritari e urgenti che saranno ammessi a finanziamento a valere sulle risorse che residuino all'esito del finanziamento degli interventi immediatamente cantierabili elencati negli Allegati B e C :

19IR021/G3	Interventi di manutenzione canali di maltempo e sistemazione degli argini canale	Palermo	5.500.000,00
------------	--	---------	--------------

Il comma 5 dell'art. 2 del DPCM 15/09/2015 dispone che: "ai sensi dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 91/2014, con accordi di programma da stipularsi tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto-legge 133/2014, saranno finanziati gli interventi e saranno regolate le relative modalità di attuazione".

La copertura finanziaria dei sopracitati interventi verrà assicurata mediante strumenti finanziari diversi quali, accordi di programma, programmi nazionali e regionali, fondi europei, investimenti mediante la BEI; lo stato di attuazione, quindi, tiene con esclusivemente delle progettazioni esecutive finanziate con il fondo di progettazione ex DPCM 14 luglio 2016 finanziate di diritto per gli interventi di cui al citato Piano Nazionale.

5 PATTI PER LO SVILUPPO

5.1 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana

In data 10/09/2016 è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana" con il quale le Parti si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione Siciliana, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio.

A tale fine, le Parti, tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Regione Siciliana ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell'Allegato A al Patto (Masterplan), per la cui attuazione è stata ritenuta necessaria un'azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nonché la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, e ricorrendo altresì ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc.;



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

L'importo complessivo degli interventi, e le risorse finanziarie previste per la loro attuazione sono indicati in dettaglio negli Allegati A (Masterplan) e B (Elenco degli interventi) al Patto e sono sinteticamente descritte, per macro-categorie, nella seguente tabella, suddivise in 5 aree di intervento:

Area di intervento	Costo totale interventi	Risorse già assegnate	Risorse FSC 2014-2020	Altre risorse disponibili
Infrastrutture	1.873.194.701,18	1.188.000.552,63	607.900.000,00	77.000.000,00
Ambiente	2.521.303.916,36	972.332.984,03	1.174.000.000,00	375.149.000,00
Sviluppo economico ed attività produttive	965.495.822,37	265.000.000,00	208.500.000,00	492.258.077,37
Turismo e cultura	267.275.503,60	0,00	216.500.000,00	50.489.821,66
Sicurezza, legalità e vivibilità del territorio	118.654.548,16	5.694.055,98	113.100.000,00	0,00
Totale costi e risorse	5.745.924.491,67	2.431.027.592,64	2.320.000.000,00	994.896.899,03

In particolare, l'Area d'intervento "Ambiente" risulta suddivisa in 3 Ambiti d'Intervento denominati: "Acque e Rifiuti", "Dissesto Idrogeologico" e "Territorio".

Con Deliberazione n° 411 del 13 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha attribuito al Presidente della Regione Siciliana in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 7, comma 2, ultima parte, del decreto legge 12/09/2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 la competenza alla gestione, al monitoraggio ed al controllo degli interventi strategici da realizzare per un fabbisogno finanziario complessivo di euro 591.448.516,66, corrispondenti agli interventi di cui al Settore Prioritario "4.Ambiente", Ambito di intervento "Dissesto idrogeologico", finalizzati alla mitigazione dell'erosione costiera, la messa in sicurezza di infrastrutture, la mitigazione del rischio alluvioni e del rischio frane, finanziati a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

In particolare, per quanto concerne il dissesto idrogeologico, il Patto prescrive che:

- gli interventi contro il rischio di dissesto idrogeologico da finanziare con risorse pubbliche devono essere coerenti con le mappé della pericolosità e rischio e con gli obiettivi e le priorità correlate individuati nei Piani di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi della direttiva 2007/60/CE, approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei Comitati Istituzionali Integrati delle Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs. N. 219/2010 e per quanto riguarda la pericolosità da alluvione fluviale e costiera e nelle pianificazioni di assetto idrogeologico (PAI) per quanto attiene alla pericolosità geomorfologica, in applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione individuati nel DPCM 28 maggio 2015;
- i progetti per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, come risultanti dal sistema telematico Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo-ReNDIS e validati dalla Regione, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, siano ammessi a finanziamento utilizzando i criteri di scelta e di attribuzione delle risorse che, ai sensi dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono stati approvati con DPCM 28 maggio 2015 recante "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Elenco degli interventi

L'elenco degli interventi previsti nel Patto per il Sud approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 301 del 10/09/2016 e contenuto nell'Allegato B al Patto sottoscritto in pari data, ha subito le rimodulazioni approvate con le deliberazioni di Giunta Regionale n.358 del 26/10/2016, n.20 del 18/01/2017, n. 29 del 21/01/2017, n.302 del 26/07/2017, n° 366 del 31/08/2017 e n. 200 del 15 maggio 2018 (**ALLEGATO 1**).

In particolare con la deliberazione 302 del 26/07/2017 come modificata con la deliberazione 366 del 31/08/2017, la Giunta Regionale ha provveduto a riclassificare tutti gli interventi previsti nel settore strategico "dissesto idrogeologico" in base alla verifica dell'effettivo livello di cantierabilità dei progetti anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice di cui al D.Lgs 50/2016, confluiti in due distinti elenchi denominati:

- **Allegato B riprogrammato** contenente gli interventi di immediata cantierabilità;
- **Allegato B2 programmatico** contenente gli interventi non aventi immediata cantierabilità e/o non chiara specifica attinenza ai dettami del DPCM 28/05/2015, per i quali si procederà comunque alla implementazione



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

dei livelli progettuali mediante l'utilizzo delle economie prodotte dall'attuazione degli interventi dell'Elenco B riprogrammato fino all'assorbimento delle risorse disponibili;

Al 31/07/2018 alla luce della rimodulazione di cui alle delibere di Giunta Regionale 302/2017, 366/2017 e 200/2018, l'Allegato B riprogrammato degli interventi contro il dissesto idrogeologico affidati per l'attuazione alla struttura commissariale contempla **237** interventi a valere sulle risorse FSC 2014-2020, suddivisi in 4 categorie: erosione costiera, messa in sicurezza infrastrutture, rischio alluvioni e rischio frane.

Attività svolta al 31/07/2018

L'attività relativa al Patto per il Sud è stata formalmente avviata a seguito della nota prot. 8596/Gab. Del 20/12/2016 con la quale l'Assessore Territorio e Ambiente ha notificato la deliberazione di Giunta Regionale 411 del 13/12/2016 con la quale la struttura Commissariale è stata individuata quale soggetto responsabile della gestione, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie destinate all'obiettivo strategico "Rischio idrogeologico" del patto per il Sud – Regione Siciliana.

Il Commissario ha immediatamente invitato i Sindaci di tutti i Comuni e le Province interessati dagli interventi previsti nel Patto del Sud a raccordarsi urgentemente con l'Ufficio al fine di procedere all'accreditamento dei RUP presso la Stazione Appaltante quale primo atto utile e preordinato all'attuazione degli interventi.

La struttura commissariale ha prontamente attivato le procedure per la verifica ed il censimento dettagliato del livello progettuale di ogni singolo intervento così come proposto nella banca dati ReNDiS nonché per la valutazione degli atti amministrativi propedeutici alle progettazioni al fine di accertare la rispondenza con la normativa di riferimento in materia di conferimento degli incarichi.

Tale attività di ricognizione ha consentito di suddividere, a cavallo tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, tutti gli interventi previsti nel Patto del Sud in base al livello di progettazione conseguito e di decretare il finanziamento dei primi 12 progetti verificati, validati ed approvati.

Contestualmente si è proceduto ad avviare l'attività istruttoria accertando i requisiti di esecutività e cantierabilità dei progetti esecutivi già disponibili per i quali sono stati adottati i relativi decreti di finanziamento.

Stato di attuazione interventi FSC

Gli interventi previsti nell'Area Tematica Ambiente – Dissesto Idrogeologico di cui all'Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 200 del 15 maggio 2018 risultano complessivamente **237 (ALLEGATO 2)** per un'importo complessivo di **€ 591.499.400,00**, suddivisi in quattro aree tematiche così come riportato nella tabella seguente:

Tipologia Dissesto	Numero Interventi	Risorse FSC assegnate (Allegato A Patto per il SUD)	Importo interventi (Allegato – DDG 200/2018)
Rischio frane	119	251.000.000,00	249.868.823,63
Rischio alluvioni	37	108.000.000,00	107.943.201,31
Messa in sicurezza infrastrutture	61	132.500.000,00	132.828.931,55
Erosione costiera	20	100.000.000,00	100.858.437,51
	TOTALE	591.500.000,00	591.499.400,00


Lo stato dell'arte degli interventi per tipologia di dissesto è stato sviluppato per singole schede negli **Allegati 3, 4, 5 e 6** della presente relazione.

Qui di seguito vengono riportati alcune tabelle e grafici riepilogativi ed in particolare ad oggi risultano come livello di progettazione il seguente:



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

<i>Stato Progettazione al 31/07/2018</i>			
	LIVELLO PROGETTAZIONE	N. Interventi	Percentuale
	Definitiva	73	30,80%
	Esecutiva	77	32,49%
	Preliminare	87	36,71%
	<i>Totale</i>	<i>237</i>	<i>100,00%</i>

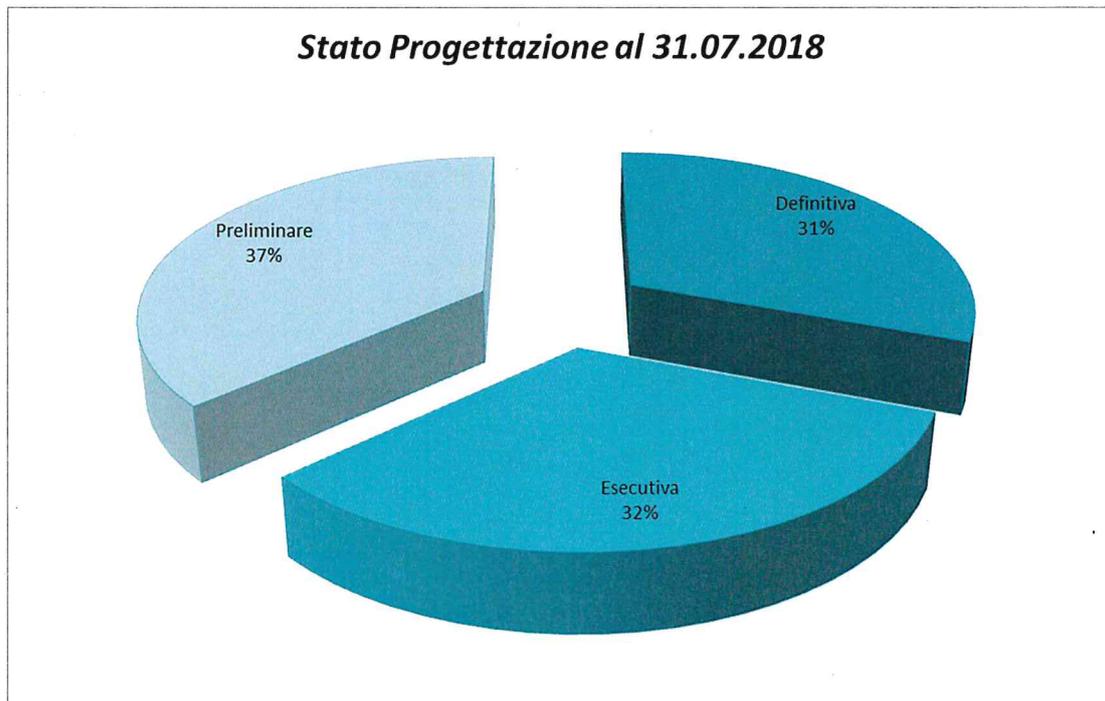

Al fine di procedere all'integrazione dei livelli di progettazione, nel primo semestre 2018 sono stati predisposti n. 42 decreti di finanziamento per servizi di ingegneria per un importo complessivo di € 5.447.052, 16 i cui dettagli sono riportati in **ALLEGATO 7**.

Per quanto riguarda invece l'attuazione degli interventi che sono risultati, in fase istruttoria, quali immediatamente cantierabili sono stati effettuati finanziamenti per lavori per n. 48 interventi per un importo complessivo di € 127.709.383,18 ed i cui dettagli sono riportati in **ALLEGATO 8**.

Al fine di avere un prospetto riepilogativo al 31/07/2018 si riportano una tabella ed un grafico riassuntivo dello stato dell'arte generale riferito al Patto per il SUD ed in particolare:




COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

<i>MACROVOCI - Dati Aggregati</i>			
<i>Voci</i>	<i>STATO DELL'ARTE</i>	<i>N. Interventi</i>	<i>Percentuale</i>
3	Acquisizione/Aggiornamento	88	37,13%
3	Gara in Corso Integrata/Servizi/Lavori	44	18,57%
2	In attesa di pareri ed in corso di Approvazione	15	6,33%
2	Lavori in Corso	2	0,84%
2	Lavori Conclusi	1	0,42%
2	Predisposizione Atti Gara Lavori + Indagini	18	7,59%
1	Predisposizione Atti Gara Servizi	42	17,72%
1	Progettazione In corso	22	9,28%
1	Contratto Costa	5	2,11%
<i>Totale Interventi FSC</i>		<i>237</i>	<i>100,00%</i>

Stato Attuazione Interventi al 31.07.2018

- Acquisizione/Aggiornamento
- In attesa di pareri ed in corso di Approvazione
- Lavori Conclusi
- Predisposizione Atti Gara Servizi
- Contratto Costa
- Gara in Corso Integrata/Servizi/Lavori
- Lavori in Corso
- Predisposizione Atti Gara Lavori + Indagini
- Progettazione In corso

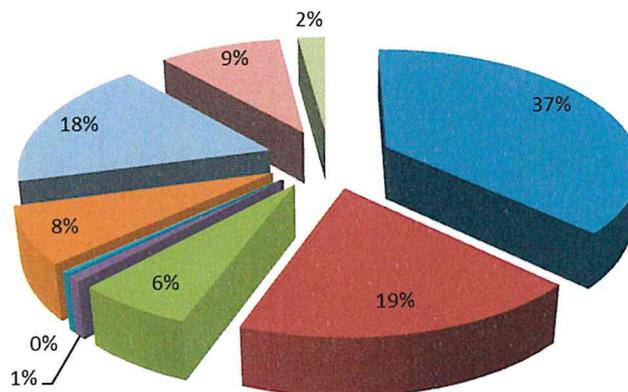

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014*

6 - Interventi di mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorgono il Duomo, l'intera area diocesana ed il centro storico di Agrigento in adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.150 del 20/05/2011, n. 151 del 20/06/2014, n. 203 del 10/08/2015 e n. 490 del 30/10/2017

Con deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, la Giunta regionale di Governo ha approvato la scheda revisionata della linea 5.B.6 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuando quali beneficiari dell'Azione A gli enti locali della Regione Siciliana con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l'Emergenza idrogeologica in Sicilia e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca.

In data 20/11/2017 è stato sottoscritto tra il Dipartimento regionale dell'Ambiente e il Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 un Accordo che regola le modalità di esecuzione degli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in adempimento di quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta n.151 del 20 giugno 2014, n. 203 del 10 agosto 2015 e n. 490 del 30 ottobre 2017.

In particolare oggetto dell'Accordo è la progettazione delle azioni volte alla mitigazione del dissesto idrogeologico del costone sottostante il Duomo di Agrigento secondo il cronoprogramma di cui al predetto Accordo che prevede le seguenti fasi:

Raccolta Bibliografica e Documentale e predisposizione atti;

Analisi della documentazione e redazione di un documento unico (Progetto di fattibilità tecnica ed economica) da porre alla base dell'affidamento dei servizi di progettazione ai sensi dell'art. 23 di cui al D.Lgs 50/2016 e smi.

Sintesi della documentazione esistente in un unico documento preliminare definibile quale progetto di fattibilità tecnica ed economica utile ad inquadrare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire in ossequio al comma 5) del citato art. 23 del Codice degli Appalti

3) Appalto dei servizi relativi alla progettazione esecutiva delle opere tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili nell'ambito delle risorse programmate a tal uopo

Predisposizione del bando relativo all'appalto dei servizi di ingegneria ed architettura omnicomprensivi, approvazione e finanziamento del bando, pubblicazione ed acquisizione delle offerte

Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura: Nomina della commissione giudicatrice, espletamento delle procedure di gara, individuazione dell'operatore economico aggiudicatario e verifica dei requisiti relativi all'aggiudicazione definitiva con relativa notifica, stipula del contratto ed avvio dei servizi aggiudicati

4) Espletamento dei servizi di ingegneria ed approvazione soluzione progettuale o Espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura, previa esecuzione di eventuali indagini e rilievi integrativi, convocazione della conferenza speciale dei servizi, acquisizione dei pareri ed approvazione della soluzione progettuale finale

L'Accordo sottoscritto il 20/11/2017 è stato approvato con DDG 1041 del 21/11/2017. Per la realizzazione dell'intervento il Commissario Straordinario Delegato opera nella qualità di attuatore e stazione appaltante, svolgendo tutte le attività tecniche di pertinenza, dalla progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva utili alla realizzazione delle opere mediante le risorse finanziarie derivanti dalle economie realizzate nella esecuzione degli interventi già finanziato nel Masterplan del Patto per il Sud, conformemente alle disposizioni del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e nel rispetto, comunque, dei principi comunitari, avvalendosi qualora lo ritenesse necessario delle prerogative di cui alla Legge 11 agosto 2014, n.116, art.10, commi 4 e 5, mentre resta nelle competenze del Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'istruttoria amministrativa finalizzata all'emissione del decreto di finanziamento.

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

Con DDG 1156 del 20/12/2017, è stato finanziato l'importo di €. 1.893.803,81 per la realizzazione del progetto degli interventi di mitigazione dei "dissesti che interessano la collina su cui sorgono il Duomo, l'intera area diocesana ed il centro storico di Agrigento" di cui all'Azione A1 della Scheda 5.B6 del PAC Nuove Azioni, a seguito della riproduzione delle somme con il D.D. n. 1956/2017 del 16/10/2017, è impegnato per euro 90.000,00 nell'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di cassa, e per euro 1.803.803,81 nell'esercizio finanziario 2018 sul Cap. 842437 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente.

7 - Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Palermo

Con Delibera n. 26 del 10/08/2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha assegnato al Comune di Palermo la somma di euro 332.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020 e ha approvato le regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 di cui al Patto.

In data 30/04/2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della città Palermo in qualità di Autorità Urbana, hanno sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Palermo", con il quale le Parti:

- si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Città e dell'Area Metropolitana di Palermo, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
- tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Città di Palermo ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell'Allegato A al Patto, suddivisi per macro-categorie e per aree di intervento per la cui attuazione è ritenuta necessaria un'azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- si sono impegnano a dare attuazione ai contenuti del Patto mediante la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, nonché ricorrendo ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc. per un importo complessivo degli interventi pari a € 770.890.807,57 di cui:
 - € 432.059.988,83 di risorse già assegnate con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc.
 - € 332.000.000,00 di risorse FSC 2014-2020 (di cui € 61.000.000,00 Risorse finanziarie FSC al 2017);
 - € 6.830.800,00 di altre risorse (Risorse regionali (da apposito protocollo d'intesa); Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti Nazionali)
- Tra gli interventi previsti nel Patto per lo sviluppo della Città di Palermo sono contemplati gli "Interventi volti alla mitigazione del rischio di frana, crollo e smottamento dei rilievi montuosi che circondano la città" come di seguito elencati:

N°	Codice RENDIS	Titolo	Importo
1	19IRB84/G1	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo sovrastante l'area urbana di Mondello. Completamento	1.764.958,00
2	19IRB85/G1	Interventi di protezione dell'area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino	913.287,48
3	19IRB86/G1	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura	30.545.000,00
4	19IRB87/G1	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose sovrastanti l'abitato di Boccadifalco	3.700.000,00
5	19IR146/G1	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose di Monte Pellegrino Capo Gallo, Boccadifalco e area della colonia estiva comunale . Il fase - completamento	20.579.000,00
TOTALE			57.502.245,48



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

- Con nota prot. 1951468 del 09/12/2016 il Comune di Palermo, stante le indicazioni riportate nel Patto per lo Sviluppo della città di Palermo e dall'art. 7 comma 2 della L.133/2014, ha richiesto al Commissario di Governo la concreta attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sotto elencati ed inseriti all'interno del predetto Patto per la Città di Palermo:

N°	Codice RENDIS	Titolo	Importo
1	19IRB84/G1	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Gallo sovrastante l'area urbana di Mondello. Completamento	1.764.958,00
2	19IRB85/G1	Interventi di protezione dell'area della colonia estiva comunale e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino	913.287,48
3	19IRB86/G1	Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura	30.545.000,00
4	19IRB87/G1	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose sovrastanti l'abitato di Boccadifalco	3.700.000,00
		TOTALE	36.923.245,48

- Con nota di riscontro prot. n.132 del 11 gennaio 2017 il Commissario Straordinario delegato, stante la documentazione pervenuta dal comune di Palermo, ha rappresentato la propria disponibilità a quanto richiesto in merito all'attuazione degli interventi di difesa del suolo compresi nel "Patto per lo sviluppo della città di Palermo", richiedendo l'accreditamento dei RUP dei vari interventi presso la piattaforma ANAC, e la trasmissione della stima della spesa utile e necessaria alla cantierabilità dei progetti nonché, ove possibile, la disponibilità alla progettazione mediante personale dipendente dell'amministrazione comunale.
- Con deliberazione n. 91 del 27/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione afferente la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, inclusi nella linea di intervento "Riqualficazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per lo sviluppo della Città di Palermo";
- Con determinazione Dirigenziale n° 64 del 03/05/2017 il Capo Area Tecnica della Riqualficazione Urbana ha approvato lo schema di convenzione;
- In data 05/05/2017 tra il Commissario di Governo Dott. Maurizio Croce, il Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando ed il Capo Area Tecnica della Riqualficazione Urbana Arch. Mario Li Castri è stata stipulata apposita Convenzione per l'attuazione degli interventi inclusi nella linea di intervento "Riqualficazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per lo sviluppo della Città di Palermo" sottoscritto il 30/04/2016.
- La predetta Convenzione disciplina i rapporti tra la Città di Palermo, Beneficiario dei finanziamenti ed il Commissario di Governo, individuato quale Ente Attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge 116/2014 con i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
- In veste di Ente Attuatore il Commissario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, emana gli atti e i provvedimenti, cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, ed è responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa degli interventi e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

In riferimento alla Convenzione sottoscritta in data 05/05/2017, per ciascun intervento è stato nominato il RUP il quale ha provveduto ad accreditarsi presso ANAC per l'Ufficio del Commissario quale Stazione Appaltante.

Subito dopo è stata avviata una serie di incontri finalizzati ad accertare per ciascun intervento il livello di progettazione disponibile agli atti del Comune anche in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e ad acquisire la documentazione necessaria all'aggiornamento delle schede presenti sul data base ReNDiS.

Dei 4 interventi oggetto della Convenzione, 3 sono muniti di progetto preliminare mentre 1 di progetto definitivo che necessita di adeguamento al D.Lgs 50/2016.

Per l'attuazione degli interventi è stato previsto l'avvio, nel 2018, delle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

8 - Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina

Con Delibera n. 26 del 10/08/2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha assegnato al Comune di Messina la somma di euro 332.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020 e ha approvato le regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 di cui al Patto.

In data 22/10/2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della città metropolitana di Messina in qualità di Autorità Urbana, hanno sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Messina", con il quale le Parti:

- si sono impegnate ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio dell'Area Metropolitana di Messina, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
- tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Città Metropolitana di Messina ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell'Allegato A al Patto, suddivisi per macro-categorie e per aree di intervento per la cui attuazione è necessaria un'azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- si sono impegnano a dare attuazione ai contenuti del Patto mediante la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, nonché ricorrendo ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc. per un importo complessivo degli interventi pari a € 777.889.686,80 di cui:
 - € 253.915.737,21 di risorse già assegnate con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc.
 - € 332.000.000,00 di risorse FSC 2014-2020 (di cui € 61.000.000,00 Risorse finanziarie FSC al 2017);
 - € 191.973.949,59 di altre risorse (Risorse regionali (da apposito protocollo d'intesa); Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti Nazionali)

Con nota prot. 15346 del 19.01.2017 il Comune di Messina, stante le indicazioni riportate nel Patto per lo Sviluppo della città di Messina e dall'art. 7 comma 2 della L.133/2014, ha richiesto al Commissario di Governo la concreta attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sotto elencati ed inseriti all'interno del predetto Patto per la Città di Messina:

N°	Titolo	Importo
1	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel centro abitato di Pezzolo – Messina	121.500,00
2	Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana lenta posta nel villaggio di Altolia – Messina	269.800,00
3	Lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del torrente Portella Arena in corrispondenza della cooperativa Futura	650.000,00
4	Mitigazione del rischio Alluvione con opere di sistemazione in alveo e dei sistemi arginali dei torrenti Lardereria, Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo a salvaguardia della popolazione e del tessuto economico	7.900.000,00
5	Lavori per la mitigazione del rischio idraulico mediante l'eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi con la realizzazione di manufatti preferibilmente prefabbricati a tutela della sicurezza pubblica	3.000.000,00
	TOTALE	11.941.300,00

Con nota di riscontro prot. n.947 del 31 gennaio 2017 il Commissario Straordinario delegato, stante la documentazione pervenuta dal comune di Messina, ha rappresentato la propria disponibilità a quanto richiesto in merito all'attuazione degli interventi di difesa del suolo compresi nel "Patto per lo sviluppo della città di Messina", richiedendo l'accreditamento dei RUP dei vari interventi presso la piattaforma ANAC, e la trasmissione della stima



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

della pesa utile e necessaria alla cantierabilità dei progetti nonché, dove possibile, la disponibilità alla progettazione mediante personale dipendente dell'amministrazione comunale.

Con deliberazione n. 367 del 06/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione afferente la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, inclusi nella linea di intervento "Riqualificazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per lo sviluppo della Città di Messina";

In data 16/06/2017 tra il Soggetto Attuatore ed il Dirigente del Dipartimento di Protezione Civile e Difesa del Suolo del Comune di Messina è stata stipulata apposita Convenzione per l'attuazione degli interventi inclusi nella linea di intervento "Riqualificazione e sicurezza urbana" prevista nel "Patto per la Città Metropolitana di Messina" sottoscritto il 22/10/2016.

La predetta Convenzione disciplina i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina, Beneficiario dei finanziamenti ed il Commissario di Governo, individuato quale Ente Attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge 116/2014 con i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

In veste di Ente Attuatore il Commissario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, emana gli atti e i provvedimenti, cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, ed è responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa degli interventi e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

Attività svolte al 31/07/2018

In riferimento alla Convenzione sottoscritta in data 16/06/2017, per ciascun intervento è stato nominato il RUP il quale ha provveduto ad accreditarsi presso ANAC per l'Ufficio del Commissario quale Stazione Appaltante.

Subito dopo è stata avviata una serie di incontri finalizzati ad accertare per ciascun intervento il livello di progettazione disponibile agli atti del Comune anche in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e ad acquisire la documentazione necessaria all'aggiornamento delle schede presenti sul data base ReNDiS.

Per l'attuazione degli interventi è stato previsto l'avvio, nel 2018, delle procedure per l'affidamento delle indagini geognostiche (relativamente alle frane nel centro abitato di Pezzolo e nel villaggio Altolia) e per l'affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (per l'intervento di sistemazione dei torrenti Larderia, Papardo, Salmei-Grasso, Ortoliuzzo). Infine per gli interventi relativi al torrente Portella Arena e eliminazione attraversamenti e guadi rispettivamente il progettista incaricato ed il Comune si sono impegnati a trasmettere i progetti per convocare la conferenza dei servizi.

Il dettaglio dei singoli interventi previsti nel Patto Città Metropolitana di Messina ed il Patto Città metropolitana di Palermo oggetto delle convenzioni in essere viene riportato in **ALLEGATO 9**.

9 – FONDI PAC – NUOVE AZIONI - SOTTOAZIONE A2 "MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEGLI ALVEI " - Interventi di manutenzione delle opere di difesa degli alvei fluviali di cui al D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 1026 del 23 novembre 2015, in adempimento di quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta n. 151 del 20 giugno 2014, n. 203 del 10 agosto 2015 e n. 490 del 30 ottobre 2017 previo eventuale aggiornamento delle priorità.

Con deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, la Giunta regionale di Governo ha approvato la scheda revisionata della linea 5.B.6 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuando quali beneficiari dell'Azione A gli enti locali della Regione Siciliana con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l'Emergenza idrogeologica in Sicilia e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca.



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

In data 27/11/2017 è stato sottoscritto tra il Dipartimento regionale dell'Ambiente, il Dipartimento Regionale Tecnico e il Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 un Accordo che regola le modalità di esecuzione degli interventi di "manutenzione delle opere di difesa degli alvei fluviali di cui all'Allegato 1 – Elenco degli interventi prioritari - e, a scorrimento, quelli individuati dall'Allegato 2 "Elenco degli interventi a scorrimento" del D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 1026 del 23 novembre 2015, in adempimento di quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta n. 151 del 20 giugno 2014, n. 203 del 10 agosto 2015 e n. 490 del 30 ottobre 2017 previo eventuale aggiornamento delle priorità.

L'Accordo sottoscritto il 27/11/2017 è stato approvato con DDG 1080 del 01/12/2017 notificato con nota del Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento Regionale Ambiente prot. 84456 del 06/12/2017, assunta al protocollo commissariale n. 6872 del 11/12/2017.

L'accordo Per la realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo il Commissario Straordinario Delegato opera nella qualità di stazione appaltante, svolgendo tutte le attività tecniche di pertinenza, dalla progettazione esecutiva, all'affidamento e direzione dei lavori ed al relativo collaudo, conformemente alle disposizioni del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e nel rispetto, comunque, dei principi comunitari, avvalendosi qualora lo ritenesse necessario delle prerogative di cui alla Legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 10, commi 4 e 5, mentre resta nelle competenze del Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'istruttoria amministrativa finalizzata all'emissione del decreto di finanziamento.

Per la progettazione e realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate le "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi in materia di manutenzione dei corsi d'acqua del demanio idrico fluviale" adottate dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente e nei quadri economici dei progetti dovranno essere previsti, fra le somme a disposizione dell'amministrazione, gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo, alla centrale di committenza, etc. di cui all'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 7 del citato Accordo, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente trasferisce le risorse necessarie per l'esecuzione degli interventi con accredito sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato il quale provvede nella qualità di stazione appaltante agli adempimenti di competenza.

Infine, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, in conformità alle Delibere di Giunta n. 286 del 7 agosto 2013 e n. 257 del 22 settembre 2014 i sistemi di gestione e controllo concernenti gli interventi finanziari sono quelli previsti dal SI.GE.CO. per il PO FESR 2007-2013.

Il Commissario Straordinario Delegato adempirà in qualità di REO alle attività connesse al monitoraggio della spesa sul sistema CARONTE.

Gli interventi finanziati a valere del D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 1026 del 23 novembre 2015 risultano i seguenti:

SOTTOAZIONE A2 "MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEGLI ALVEI"

	CORSO D'ACQUA	PROV.	COMUNI INTERESSATI	MOTIVO DELL'INTERVENTO	IMPORTO LAVORI
1	FIUME VERDURA	AG	CALTABELLOTTA - VILLAFRANCA SICULA	Lavori di risagomatura e di pulizia dell'alveo del fiume Verdura nel tratto compreso tra C/DA Giraffe e la C/DA Castello.	€ 600.000,00



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

2	VALLONE BAIATA- FOCE DI MEZZO	AG	SCIACCA	Lavori di pulizia, decespugliamento, rimozione dei detriti e risagomatura dell'alveo nel tratto a monte della S.S.115 fino alla foce.	€ 250.000,00
3	TORRENTE RE	AG	PORTO EMPEDOCLE	Lavori di pulizia del tratto d'alveo del Torrente compreso tra la S.S. 115 e la foce.	€ 80.000,00
4	TORRENTE GATTANO	CL	GELA	L'intervento ipotizzato consiste nella pulitura e risagomatura dell'alveo ipotizzando la sistemazione del materiale, ove possibile, lungo le sponde. Preliminarmente comunque detto materiale dovrà essere analizzato dall'Arpa per verificarne l'idoneità.	€ 633.479,00
5	TORRENTE BUTTACETO E RETE SCOLANTE COLLEGATA	CT	CATANIA - MISTERBIANCO - PATERNO' - PALAGONIA	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	€ 306.823,00
6	CANALE JUNGETTO E SUOI AFFLUENTI	CT	CATANIA	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	€ 78.900,00
7	CANALE BICOCCA AFFLUENTE IN DX CANALE BICOCCA	CT	CATANIA	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	€ 27.200,00
8	CANALE ARCI	CT	CATANIA	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	€ 31.200,00
9	CANALI AFFERENTI LA BASE MILITARE DI SIGONELLA	CT	LENTINI - RAMMACCA	Eliminazione di vegetazione e rimozione del sedime in alveo e riprofilatura scarpate.	€ 110.000,00
10	FIUME SALSO	EN	REGALBUTO	Rimozione di materiale alluvionale e della vegetazione spontanea e realizzazione di argini e recinzioni.	€ 300.000,00



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

11	TORRENTE CALDERARI	EN	ENNA	Risagimatura del corso d'acqua al fine di ripristinare la sezione idraulica e garantire la risagomatura del corso d'acqua al fine di ripristinare la sezione idraulica e garantire il libero deflusso delle acque a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.	€ 300.000,00
12	FIUME DITTAINO	EN	ASSORO	Rimozione di materiale, alluvionale e della vegetazione spontanea, realizzazione di argini di terra.	€ 200.000,00
13	FIUME SIMETO	EN	CENTURIPPE	Rimozione di materiale alluvionale e della vegetazione spontanea, realizzazione di argini.	€ 300.000,00
14	TORRENTI MELA E FLORIPOTEMA	ME	S.LUCIA	Messa in sicurezza delle aree adiacenti Torrenti Mela e Floripotema.	€ 130.000,00
15	TORRENTE BOTTE	ME	SAVOCA	Ricostruzione di tratti di argini crollati, consolidamento delle opere longitudinali scalzate, svuotamento e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del Torrente Botte.	€ 250.000,00
16	TORRENTE PATRI'	ME	FONDACHELLI FANTINA	Ricostruzione di un tratto di muro d'argine crollato in sponda destra del Torrente Patri e la realizzazione di una scogliera a protezione delle infrastrutture comunali nella frazione chiesa.	€ 251.930,00
17	TORRENTE MELA	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del Torrente Mela in località Furia nella frazione Femminamorta, a protezione del nucleo abitato della omonima frazione.	€ 250.000,00
18	TORRENTE MUTO	ME	PACE DEL MELA	Ricostruzione del muro d'argine con inevitabile ricostruzione del muro d'argine in sponda sinistra del Torrente Muto.	€ 192.000,00



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

19	TORRENTE SALICE	ME	SANT'ALESSIO SICULO	Ripristino delle opere di protezione della condotta fognaria sottomarina nel tratto fociale del Torrente Salice.	€ 288.243,00
20	TORRENTE CARONIA	ME	CARONIA	Ripristino opere idrauliche danneggiate nel Torrente Caronia in località "Case Giordano" a protezione dell'acquedotto intrecomunale Caronia - Santo Stefano di Camastra.	€ 166.000,00
21	TORRENTE ROSMARINO	ME	ALCARA LI FUSI	Ripristino delle sezione idraulica del Torrente Rosmarino nel tratto a valle del ponte a tre Archi.	€ 200.000,00
22	TORRENTE PAGLIARA	ME	PAGLIARA	Ripristino opere idrauliche danneggiate nel Torrente Pagliara a protezione dell'acquedotto.	€ 150.000,00
23	TORRENTE LONGANO	ME	BARCELLONA P..G.	Ripristino di un tratto di argine in sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul Torrente Longano.	€ 250.000,00
24	TORRENTE SANT'ANTONIO IN CORRISPONDENZA DELLA VIA MARINAI NEL MONDO	PA	MARINEO	Scavi di sbancamento, demolizione dello scalatore dissestato, rimozione del materiale crollato all'interno dell'alveo, ricostruzione dell'opera idraulica interrata e rifacimento del piazzale ed opere varie per il ripristino dei luoghi.	€ 254.225,00
25	FIUME IRMINIO	RG	GIARRATANA E RAGUSA	Pulizia di tutta la sezione idraulica partendo a monte della S.S. 194 fino a 100 metri a valle del muro di contenimento, il materiale alluvionale spostato dal fondo alveo verrà perlopiù utilizzato per rinforzare le sponde. Le canne, gli arbusti ed eventuale materiale di risulta verranno conferiti in discarica.	€ 65.000,00



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

26	FIUME TELLARO	SR	NOTO	Rifacimento dell'argine in terra con le medesime caratteristiche. Prelievo del materiale in loco con sistemazione della livelletta che presenta innalzamenti per depositi alluvionali.	€ 140.000,00
27	TORRENTE CANALOTTO - TRATTO VALLIVO	TP	ALCAMO	Manutenzione straordinaria del corso d'acqua mediante interventi di scavo e diserbo manuale e con mezzi meccanici.	€ 150.000,00
28	FIUME SAN FRANCESCO (MISILISCEMI)	TP	TRAPANI	Manutenzione straordinaria del corso d'acqua mediante interventi di scavo e diserbo manuale e con mezzi meccanici e realizzazione di opere di difesa idraulica.	€ 45.000,00

Lo stato dell'arte dei singoli interventi previsti a valere sui Fondi PAC viene riportato in **ALLEGATO 10**.



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

10 - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI E DELL'ALBO DELLE IMPRESE – SERVIZIO E PROCUREMENT

Al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, la struttura commissariale che svolge funzioni di Stazione Appaltante, ha provveduto ad istituire un "Albo dei professionisti" ed un "Elenco delle imprese" di seguito descritti e a dotarsi di un servizio di e-procurement per l'espletamento delle procedure di gara in modalità informatica.

11 - Albo professionisti

In data 20 aprile 2011, con decreto commissariale n° 55, è stato emanato il Bando per la istituzione presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'albo dei professionisti a cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006.

L'elenco ha validità per il triennio 2011/2013 così come stabilito dal Bando di cui sopra, è previsto un aggiornamento dello stesso ogni anno.

Con tale inserimento si possono affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

I suddetti ELENCHI sono stati suddivisi in ragione delle classi e categorie di cui alla tabella dell'art.14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii.

Le modalità di aggiornamento dell'elenco è regolamentato dallo stesso bando il quale prevede che:

- "Entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, i Professionisti iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall'Elenco dei Professionisti, una richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati";
- "Le nuove domande pervenute entro il 30 maggio di ogni anno verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo; le conferme dell'iscrizione, da effettuarsi entro la stessa data, saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione.

In data 17 maggio 2012 si è pertanto provveduto alla pubblicazione dell'avviso sul sito www.ucomidrogeosicilia.it relativo alla istanza e/o al rinnovo dell'iscrizione da effettuare mediante collegamento on line al sito dedicato al Commissario <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor>.

Inoltre, al fine di dare maggiore pubblicità all'obbligo di conferma della propria istanza, il predetto avviso è stato, trasmesso in data 18 maggio 2012 ai tutti professionisti già inseriti nell'elenco pubblicato in data 20 luglio 2011 mediante e-mail certificata e/o fax pena la cancellazione dall'Elenco;

Con Decreto n. 515 del 04 ottobre 2012 è stato approvato l'Aggiornamento dell'Elenco Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000 (euro centomila/00), con le modalità di cui all'art.91, comma2, del d.lgs. n. 163/2006, per l'anno 2012-2013.

In data 15 Maggio 2014, con nota n° 2323 del 15 Maggio 2014, è stato emanato il Bando per la istituzione presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'elenco dei professionisti a cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006.

L'elenco ha validità fino al 31 Dicembre 2015 così come stabilito dal Bando di cui sopra.

Con tale inserimento si possono affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

I suddetti Elenchi sono stati suddivisi in ragione delle classi e categorie di cui alla tabella dell'art.14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii.

Le modalità di aggiornamento dell'elenco è regolamentato dallo stesso bando il quale prevede che:

“Le nuove domande pervenute oltre i termini previsti dal Bando di ogni anno verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo e saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Con Decreto Commissariale 454 del 4 Luglio 2014, pubblicato lo stesso giorno sul sito del Committente www.ucomidrogeosicilia.it, è stato approvato l'elenco delle istanze pervenute, fornendo ai professionisti 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso per presentare eventuali richieste di chiarimento e/o integrazione. Le istanze pervenute, sono 349 e sono state pubblicate nell'ordine alfabetico delle denominazioni pervenute.

Con Decreto n. 266 del 21 maggio 2015 è stato approvato l'Aggiornamento dell'Elenco Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000 (euro centomila/00), con le modalità di cui all'art.91, comma2, del d.lgs. n. 163/2006. In sede di integrazione le istanze pervenute, sono state 27, le quali sommate alle 349 istanze del già recepite, compongono un elenco complessivo di 376 istanze e sono state pubblicate in allegato al suddetto decreto nell'ordine alfabetico delle denominazioni pervenute.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” - che si applica anche al Commissario di Governo – gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo complessivo inferiore ad euro 100.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 24, ovvero a quelli di cui al comma 1 lettere a,b,c,d,e,f dell'art. 46 del codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'art. 63 comma 6 del Codice dei Contratti.

Con Decreto n.566 del 20/12/2016 è stato emanato un Bando per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici (professionisti) ai quali affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato non superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 D.Lgs 50/2016 iva esclusa, secondo le procedure previste dall'art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2015, pubblicato sul sito istituzionale in data 22/12/2016 e prorogato di 10 giorni naturali e consecutivi fino al 20/01/2017.

Ai sensi dell'art. 8 del predetto Bando, l'elenco dei professionisti è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici che possiedono i requisiti le cui istanze, anche se inoltrate oltre i termini di presentazione previsti dal bando, saranno sempre prese in considerazione ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'elenco la cui validità ed efficacia si intende mantenuta fino al completamento delle attività della struttura commissariale, salva la conferma dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. A tal fine, nel rispetto del principio comunitario di libera concorrenza e circolazione dei beni e dei servizi, la struttura commissariale procederà ad effettuare l'aggiornamento costante dell'elenco dei professionisti inseriti senza cadenze temporali predeterminate, accettando in continuo le nuove istanze di iscrizione o le modifiche delle istanze già presentate, mediante istruttoria sul singolo procedimento sia delle domande che perverranno i cui esiti di valutazione dei requisiti di qualificazione e delle dichiarazioni prodotte saranno comunicati ad hoc agli interessati.

In ottemperanza a quanto previsto dal Bando, nel corso del 2017 si è proceduto quindi ad aggiornare l'elenco con i decreti: 229/2017, 261/2017, 354/2017, 415/2017, 462/2017, 588/2017, 703/2017 e 804/2017.



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

12 Albo Imprese

Il Commissario Straordinario Delegato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha istituito, con il Decreto Commissariale n° 54 del 20 aprile 2011, l'albo delle imprese per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Occorre evidenziare che, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi previsti dall'A.d.P., il Commissario ha direttamente provveduto alla predisposizione ed all'affidamento delle procedure di gara relative agli interventi, individuando un numero congruo di soggetti, iscritti agli Albo di Fiducia, da invitare tra coloro che hanno dichiarato di possedere idonei requisiti.

In particolare, si rappresenta che il Commissario ha provveduto:

-per l'anno 2011: ad istituire l'Albo di Fiducia con il Decreto Commissariale n° 54 del 20 aprile 2011.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web www.ucomidrogeosicilia.it nonché per estratto sulla G.U.R.I. – Serie speciale n.51 del 02.05.2011, sulla G.U.R.S. del 20 maggio 2011 e su il Sole 24ore del 04.05.2011, su La Repubblica del 04.05.2011, su La Sicilia del 04.04.2011 e su Il Giornale di Sicilia del 04.05.2011.

Entro i termini previsti sono pervenute n. 492 istanze di ammissione all'Albo delle imprese 2011.

Per l'anno 2012: si è provveduto ad istituire, con Decreto Commissariale n. 323 del 15 novembre 2011, l'Albo di Fiducia Imprese.

Avendo attivato nel corso del 2011 la piattaforma e-procurement, di cui al successivo punto, i soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro il 15 dicembre 2011 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it.

Entro i termini previsti sono pervenute n. 481 istanze di ammissione all'Elenco delle imprese 2012. Il cui elenco è stato pubblicato sul sito della Struttura Commissariale www.ucomidrogeosicilia.it in data 26 gennaio 2012.

In data 30 ottobre 2012 è stato aggiornato l'Elenco Imprese 2012 limitatamente ai cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, mediante l'integrazione con le domande ammissibili pervenute nel corso del terzo trimestre, entro il 26 ottobre 2012. Il numero delle istanze ammonta complessivamente a 610 imprese.

Per le procedure ristrette semplificate, l'Elenco imprese istituito non può per legge essere integrato e l'elenco a cui si deve far riferimento rimane quello pubblicato il 26 gennaio 2012 con 481 iscritte.

Per l'anno 2013: si è provveduto ad istituire, con Decreto Commissariale n. 651 del 27 novembre 2012, l'Albo di Fiducia Imprese.

I soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro le ore 24:00 del 15 dicembre 2012 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it.

Entro i termini previsti sono pervenute più di 520 istanze di ammissione all'Elenco delle imprese 2013. Allo stato sono in corso le verifiche al fine di poter procedere con la pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale www.ucomidrogeosicilia.it.

L'albo 2013 è stato aggiornato a seguito emissione del Decreto commissariale n. 264 del 08/04/2013.

I soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it.

Entro i termini previsti sono pervenute più di 370 istanze di ammissione all'Elenco delle imprese 2013. Il nuovo albo aggiornato è stato pubblicato sul sito della Struttura Commissariale www.ucomidrogeosicilia.it giusto Decreto commissariale n. 452 del 17/07/2013



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

In data 27 Novembre 2013, il Commissario Straordinario Delegato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha emanato un Avviso di Costituzione Bando per la costituzione di un elenco imprese di fiducia per l'anno 2014.

Entro i termini previsti sono pervenute n. 306 richieste di iscrizione. L'elenco definitivo è stato pubblicato sul sito della Struttura Commissariale www.ucomidrogeosicilia.it in data 06 Maggio 2014 con Decreto Commissariale n° 262 del 29 Aprile 2014, che ha approvato l'elenco delle imprese di fiducia per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web www.ucomidrogeosicilia.it nonché per estratto sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n.141 del 02.12.2013, e su il Sole 24ore del 03.12.2013, sul Corriere della Sera del 03.12.2013, su La Repubblica ed. Palermo del 03.12.2013, sul Quotidiano di Sicilia del 03.12.2013.

Inoltre, al fine di dare maggiore pubblicità, il predetto avviso è stato pubblicato sul sito del Committente www.ucomidrogeosicilia.it in data 15 Maggio 2014, e, conformemente a quanto previsto dall'art 123 del D.lgs 163/2006, inviato all'Osservatorio dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici in data 06 Maggio 2104.

L'istituzione dell'Albo di Fiducia delle imprese ha consentito la predisposizione di procedure di gara relative all'appalto dei lavori per l'esecuzione degli interventi, individuando un numero congruo di soggetti, iscritti, da invitare tra coloro che hanno dichiarato di possedere idonei requisiti.

Relativamente alla costituzione dell'albo di fiducia per l'anno 2014 in data 27 Novembre 2013, il Commissario, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha emanato un Avviso di Costituzione Bando.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web www.ucomidrogeosicilia.it nonché per estratto sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n.141 del 02.12.2013, e su il Sole 24ore del 03.12.2013, sul Corriere della Sera del 03.12.2013, su La Repubblica ed. Palermo del 03.12.2013, sul Quotidiano di Sicilia del 03.12.2013.

Entro i termini previsti sono pervenute n. 306 richieste di iscrizione. L'elenco definitivo è stato pubblicato sul sito della Struttura Commissariale www.ucomidrogeosicilia.it in data 06 Maggio 2014 con Decreto Commissariale n° 262 del 29 Aprile 2014, che ha approvato l'elenco delle imprese di fiducia per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Relativamente alla costituzione dell'albo di fiducia per l'anno 2015 in data 27 Novembre 2014, il Commissario, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha emanato un Avviso di Costituzione Bando per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Ai fini della costituzione del suddetto Elenco sono stati considerati validi esclusivamente i Questionari presentati tra la data di pubblicazione del suddetto bando sul sito sul sito del Committente www.ucomidrogeosicilia.it in data 27 novembre 2014 e le ore 23:59'59" del 15 dicembre 2014.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web www.ucomidrogeosicilia.it nonché per estratto sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n.138 del 1.12.2014, e su Italia Oggi ed. Nazionale del 2.12.2015 e su Milano Finanza ed Sicilia del 2.12.2015.

Entro i termini previsti sono pervenute n. 1254 richieste di iscrizione.

Con Decreto Commissariale n° 167 del 26 marzo 2015, è stato ha approvato l'elenco delle imprese di fiducia per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

In data 29 aprile 2015 alle ore 10:00, la Stazione Appaltante ha proceduto al sorteggio pubblico ai sensi dell'art



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014*

123 D.lgs 163/2006, dinanzi ad un pubblico ufficiale, per ordinare randomicamente le istanze pervenute e stabilire l'ordine definitivo dell'elenco delle imprese per inviti a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2015, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara. Il risultato del sorteggio è stato pubblicato sul sito del Committente www.ucomidrogeosicilia.it in data 18 maggio 2015.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - che si applica anche al Commissario di Governo - al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rotazione nell'affidamento di lavori di importo non superiore a 1.000.000,00 di euro IVA esclusa, con decreto n. 2 del 05/01/2017, è stato approvato il Bando per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco di imprese per l'espletamento di gare mediante piattaforma informatica con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando così come definita dall'art. 3 comma 1 lettera uuu) e dall'art. 63 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 6 del predetto Bando, l'elenco delle imprese è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici che possiedono i requisiti le cui istanze, anche se inoltrate oltre i termini di presentazione previsti dal bando, saranno sempre prese in considerazione ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'elenco la cui validità ed efficacia si intende mantenuta fino al completamento delle attività della struttura commissariale, salva la conferma dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. A tal fine, nel rispetto del principio comunitario di libera concorrenza e circolazione dei beni e dei servizi, la struttura commissariale procederà ad effettuare l'aggiornamento costante dell'elenco delle imprese inserite senza cadenze temporali predeterminate, accettando in continuo le nuove istanze di iscrizione o le modifiche delle istanze già presentate, mediante istruttoria sul singolo procedimento sia delle domande che perverranno i cui esiti di valutazione dei requisiti di qualificazione e delle dichiarazioni prodotte saranno comunicati ad hoc agli interessati.

In ottemperanza a quanto previsto dal Bando, nel corso del 2017 si è proceduto quindi ad aggiornare l'elenco delle imprese con i decreti: 219/2017, 254/2017, 301/2017, 432/2017, 570/2017, 639/2017 e 886/2017.

13 - E-procurement

Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto di lavori, secondo quanto previsto dall'art. 85 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii, si è provveduto, all'individuazione di una soluzione tecnologica in modalità Software as a Service (SaaS)/Application Service Provider (ASP), che consenta l'esecuzione di gare telematiche, la gestione di Elenchi di Operatori Economici, la fornitura di servizi di Help Desk Tecnico e Informativo, la formazione degli utenti.

Con Decreto Commissariale n. 129 del 12.07.11, è stato disposto, a seguito di procedura di gara comunitaria esperita presso la sede del Commissario Straordinario di Roma c/o IAP l'affidamento della suddetta fornitura e la gestione del relativo servizio di e-procurement all'Impresa I-FABER S.p.A..

La piattaforma e-Procurement sviluppata da i-Faber per il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia è composta da due moduli, perfettamente integrati tra di loro: la piattaforma per la gestione dell'Elenco Fornitori e la piattaforma per la gestione delle gare telematiche.

La finalità del suddetto servizio è quella di conseguire celermente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, gli obiettivi previsti dall'Accordo di Programma.

I principali vantaggi della Piattaforma elettronica sono:



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

- E' stata sviluppata specificamente per il settore italiano P.A. conforme al D.Lgs. 163/2006, recependo immediatamente eventuali modifiche del quadro normativo;
- Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 296, comma 2, D.P.R. 207/2010 e dall'art. 70, commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006, permette una riduzione dei tempi dell'intero processo di gara: i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti di sette giorni se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica; se le stazioni appaltanti offrono per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i termini minimi per la ricezione delle offerte sono ridotti di ulteriori 5 giorni per le procedure aperte e ristrette;
- Gestisce tutto il processo di acquisto, dalla pubblicazione del bando di gara all'aggiudicazione dell'appalto nell'ambito dei lavori, beni e servizi;
- Garantisce una totale trasparenza sul processo negoziale;
- Permette una riduzione del contenzioso.

La Piattaforma elettronica è pienamente funzionante dal 1 gennaio 2012 e si precisa, a tal proposito, che tutte le gare esperite a decorrere da tale data sono state espletate mediante procedure telematiche. Il fornitore della piattaforma e-Procurement è la società i-Faber SPA ed è composta da due moduli, perfettamente integrati tra di loro:

- modulo per la gestione dell'Elenco Fornitori e quindi delle imprese e dei professionisti iscritti all'albo del Commissario;
- modulo per la gestione delle gare telematiche.

L'utilizzo della piattaforma permette di velocizzare le procedure di gara, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità e degli obiettivi previsti dall'Accordo di Programma e dalla normativa vigente.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, tenuto conto del notevole incremento delle attività di competenza della struttura commissariale, il Commissario di Governo, in coerenza con i propri obiettivi e con lo scopo di rinnovare, ottimizzare e rendere più trasparenti i processi di affidamento e gestione degli interventi, non potendo prescindere dall'utilizzo di soluzioni di e-procurement, già in uso per lo svolgimento delle procedure telematiche nella piena rispondenza alle norme ed in particolare alle normative europee e al codice, ha ritenuto di avviare le procedure finalizzate all'affidamento del predetto servizio di e-procurement al fine di mantenere i requisiti già posseduti dalla struttura commissariale e di potenziarne l'efficacia.

14. Trasferimento delle risorse

14.1 Trasferimento delle risorse dei Patti di cui alle Delibere CIPE 25/2016 e 26/2016

Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli interventi, il Patto dispone che: "Le risorse finanziarie a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020, verranno assegnate da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)" e che "Con delibera CIPE verranno indicati i criteri ed i meccanismi per il trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 e per la revoca totale o parziale delle stesse risorse di cui al presente Patto".

Con nota prot. MIN_COEMEZ-0000361-P-28/02/2017, assunta al protocollo commissariale 2031 del 30/03/2017, il Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, Prof. Claudio De Vincenti, ha riscontrato la richiesta della Regione Siciliana di trasferimento delle risorse FSC 2014-2020 destinate agli interventi dell'obiettivo "Rischio idrogeologico" ricompreso nel "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" per un valore complessivo di 591,0 milioni di euro, richiamando le modalità stabilite dalla Delibera CIPE 26/2016, ha



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

evidenziato come la Regione Siciliana non avesse ancora provveduto all'inserimento dei dati relativi agli interventi finanziati all'interno del sistema unitario di monitoraggio istituito presso il MEF (Ministero dell'economia e delle finanze) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato inclusi i cronoprogrammi di spesa di ciascun intervento.

La citata Delibera prevede le seguenti modalità di trasferimento:

- anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato per singolo intervento;
- pagamenti intermedi fino all'85% dell'importo assegnato a ciascun intervento, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
- saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito di domanda finale di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione corredata da attestato di chiusura dell'intervento.

Pertanto, con nota prot. 2035 del 30/03/2017, il Commissario ha richiesto al Dipartimento della Programmazione l'attivazione della PATT del Sistema CARONTE per consentire alla struttura l'inserimento degli interventi dell'obiettivo "Rischio idrogeologico" ricompresi nel Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana per un valore di 591,4 milioni di euro, in ottemperanza al punto 3.1 della Delibera CIPE 26/2016 nonché a quanto richiesto dal Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno con nota prot. MIN_COEMEZZ-0000361-P-28/02/2017.

Con L. 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e più precisamente l'art. 1, comma 512 che prevede come "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, "..... confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati " cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"

Pertanto, per quanto sopra indicato, il commissario ha provveduto ad implementare la banca dati Caronte al fine di poter far confluire in BDU ogni informazione utile alla richiesta delle anticipazioni per ogni singolo intervento previsto dal Patto, "portandoli" tutti in attuazione, come da Delibera CIPE 26/2016, al fine di ottenere l'anticipazione pari al 10% di ogni singolo intervento.

Le risorse relative alla citata anticipazione sono in fase di trasferimento da parte dell'IGRUE.

15 - LOGISTICA

Dal punto di vista logistico la struttura commissariale ha iniziato a svolgere la propria attività presso alcuni locali messi a disposizione dal Dipartimento regionale di Protezione Civile con sede a Palermo, Via Abela n°5. Successivamente la struttura ha trasferito la propria sede presso gli uffici ubicati in Palermo Via Costantino Nigra 5, condotti in locazione a far data dal mese di maggio 2011.

A far data dal 21/03/2018 la struttura si è trasferita presso l'attuale sede in Piazza Ignazio Florio 24 - Disposizione Commissariale n. 4 del 13/04/2018.



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

16 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

16.1- Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente

<i>Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente</i>				
<i>8415 – 8531 - 8640</i>				
<i>Importo trasferito</i> <i>(nel semestre anteriore alla data)</i>		<i>Importo cumulato</i> <i>(sino alla data)</i>		
		<i>Trasferito</i>	<i>Speso</i>	<i>Residuo</i>
Totale al 30.06.2014		110.249.576,91	59.154.632,52	51.094.944,39
31.12 2014		110.249.576,91	71.764.393,44	38.485.183,47
30.06 2015		110.249.576,91	78.091.116,48	32.158.460,43
31.12 2015		110.249.576,91	85.073.423,66	25.176.153,25
31.12 2016	12.498.500,88	122.748.077,79	91.701.206,53	31.046.871,26
31 dic 2017	0,00	122.748.077,79	97.772.992,48	24.975.085,31

16.2 - Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente

<i>Interventi "PATTO del SUD" – Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016</i>				
<i>Importo trasferito</i> <i>(nel semestre anteriore alla data)</i>		<i>Importo cumulato</i>		
		<i>Trasferito</i>	<i>Speso</i>	<i>Residuo</i>
31.07 2018		24.766.161,25	129.579,74	24.636.581,51

Le spese di cui sopra, relative agli interventi previsti dal piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno (Delibera CIPE 26/2016), sono state anticipate, in quanto considerate di somma urgenza, con i fondi a disposizione dell'Ufficio inerenti ad altri interventi in fase di realizzazione. Si precisa che in data 05 giugno 2018 con quietanza d'entrata n. 7, il M.E.F ha provveduto ad accreditare sulla contabilità speciale 5447, intrattenuta presso la locale Tesoreria dello Stato e intestata al Commissario, la somma, a titolo d'anticipo, di € 24.766.161,25 propedeutica all'avvio del programma in questione.



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

16.3 - Risorse economiche provenienti dalla Regione

Risorse economiche provenienti dalla Regione				
Importo trasferito (nel semestre anteriore alla data)		Importo cumulato (sino alla data)		
		Trasferito	Speso	Residuo
Totale al 30.06.2014		1.160.400,00	1.190.052,87	- 29.652,87
31 dic 2014	1.160.199,56	2.320.599,56	3.637.493,48	- 1.316.893,92
30 giu 2015	2.900.749,45	5.221.349,01	4.419.965,97	801.383,04
31 dic 2015	6.381.648,79	11.602.997,80	6.423.435,34	5.179.562,46
31 dic 2016	712.824,72	12.315.822,52	7.882.298,75	4.030.600,24
31 dic 2017	1.698.793,04	14.014.615,56	10.478.112,50	3.536.503,06

16.4 Risorse economiche provenienti da altre fonti

Risorse economiche provenienti da altre fonti (spese anticipate e restituite, escussione cauzioni, ecc)				
Importo trasferito (nel semestre anteriore alla data)		Importo cumulato (sino alla data)		
		Trasferito	Speso	Residuo
Totale al 30.06.2014		287.711,39	244.517,97	43.193,42
31 dic 2014	48.463,05	336.174,44	328.307,33	7.867,11
30 giu 2015	44.531,09	380.705,53	336.686,73	44.018,80
31 dic 2015	37.947,15	418.652,68	396.849,16	21.803,52
31 dic 2016	190.441,68	609.094,36	543.034,30	66.060,06
31 dic 2017	38.978,61	648.072,97	626.500,22	21.572,75



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

Interventi "FONDO PROGETTAZIONE" – Delibera CIPE n. 32 del 2015

Importo trasferito (nel semestre anteriore alla data)		Importo cumulato (sino alla data)		
		Trasferito	Speso	Residuo
31.07.				
2018		2.825.915,44	0,00	2.815,44

16.5 Risorse economiche totali

RISORSE ECONOMICHE TOTALI

Importo trasferito (nel semestre anteriore alla data)		Importo cumulato (sino alla data)		
		Trasferito	Speso	Residuo
Totale al 30.06.2014		111.697.688,30	60.589.203,36	51.108.484,94
31 dic				
2014	1.208.662,61	112.906.350,91	75.730.194,25	37.176.156,66
30 giu				
2015	2.945.280,54	115.851.631,45	82.847.769,18	33.003.862,27
31 dic				
2015	6.419.595,94	122.271.227,39	91.893.708,16	30.377.519,23
31 dic				
2015	13.401.767,28	135.672.994,67	100.529.463,11	35.143.531,56
31 dic				
2017	1.737.771,65	137.410.766,32	108.995.432,52	28.415.333,80

16.6 - Prospetto Contabilità Speciale

Risorse economiche AL 31 LUGLIO 2018

Importo accreditato	Speso	Residuo
	165.027.771,00	112.155.868,00



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n°116/2014 e n°164/2014

Allegati:

- ✓ **ALLEGATO 1: Copia della Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 15 maggio 2018**
- ✓ **ALLEGATO 2: Elenco degli interventi**
- ✓ **ALLEGATO 3: Stato dell'arte "Interventi – Rischio Frane"**
- ✓ **ALLEGATO 4: Stato dell'arte "Interventi – Rischio Alluvioni"**
- ✓ **ALLEGATO 5: Stato dell'arte "Interventi – Messa in sicurezza Infrastrutture"**
- ✓ **ALLEGATO 6: Stato dell'arte "Interventi – Erosione costiera"**
- ✓ **ALLEGATO 7: Dettaglio interventi finanziati per servizi di ingegneria**
- ✓ **ALLEGATO 8: Dettaglio interventi finanziati per lavori**
- ✓ **ALLEGATO 9: Elenco interventi Patti Citta' Metropolitana di Messina e Palermo**
- ✓ **ALLEGATO 10: Elenco Interventi FONDI PAC**

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.
